FECHA (D/M/A): 18-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO | CANTIDAD: 4,85 TON

ZONA: DOS

COMUNA: DOCE DE OCTUBRE

BARRIO: (KENEDY) KENNEDY

FRENTE DE TRABAJO: DOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00AM
TERMINACIÓN: 5:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: ———

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO
TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE PRESENTA INCONVENIENTES CON EL MARTILLO DEL COMPRESOR EN EL INICIO DE JORNADA INICIANDO ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN A LAS 10:40AM SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL SOBRE LA CR 79 CON FLUJO CONSTANTE CON CONTROL DE TRAFICO Y CIERRE PARCIALES CUANDO LAS ACTIVIDADES LO AMERITABAN.

SE INTERVIENE BACHE UNO ENCONTRANDOSE SUBRE ESPESURAS DE 0,12M EN PROMEDIO REDUCIENDO EL ALCANCE DE LA MEZCLA, PARA LOS BACHES DOS Y TRES SE INTERVIENE UNA CAPA SUPERFICIAL QUE SE LOGRA EXTRAER CON EL COMPRESOR.

SE IDENTIFICA BACHES CON ALTO RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES EN VIA DE ALTA PENDIENTE EN LA CR 93 CON CL 92-17B EL CUAL CUENTA CON FLUJO DE RUTA DE BUSES LAS CUALES DEBEN DE SER DESVIADAS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN. POR LO ANTERIOR SE INFORMAN TANTO AL CONTRATISTA COMO LOS RESIDENTES DE LA SITUACIÓN.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

Soramy C.

NOMBRE: Soramy Andrea Ceballos
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Juan Diego Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALDEIRO SUAREZ MENDOZA			
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MURA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	N/A WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	WILSON MEZATE	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HYSQUARNA LP 6500I	X		
2	Compresor	INGERSOLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MANGUERA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	PECOM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHE UNIVERT	X		
16	Volqueta(s)	SMV 676	X		

Powered by CamScanner

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000272	166940	1	CR 79 91A-59	3,50	1,50	0,21	5,25	1,10	2,65
2000272	166941	2	CR 79 91A-81	0,50	0,50	0,04	0,25	0,01	0,02
2000272	166942	3	CR 79 91A-71	3,60	2,10	0,12	7,56	0,91	2,18
TOTALES							13,06	2,02	4,85 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236489 ✓	SMV676	4,85 ✓	4,85	141	26043 ✓	SMV 676	SENCILLA	1	PRO COPOY ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-2026

10. ESQUEMAS

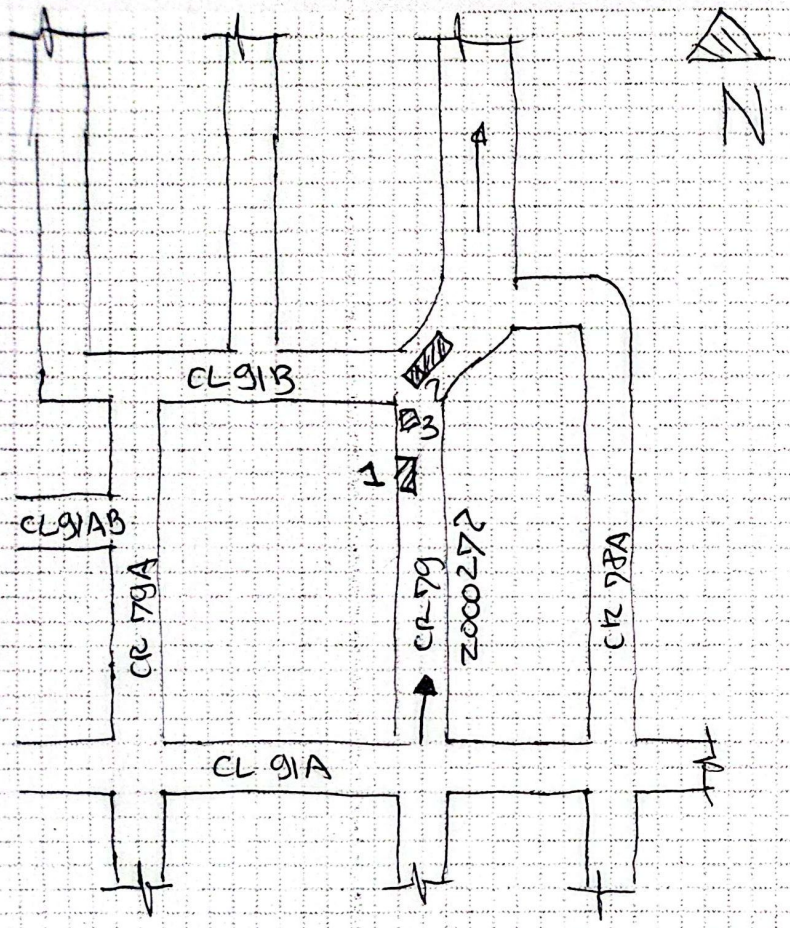

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4	BSTON ✓
BARRIO	KENNEDY	DIRECCIÓN	CR 79 ENTRE CL 91A Y CL 91B

Powered by CamScanner

EST Y PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratista

jonathan muñoz

TIQUETE DE BASCULA: 236489

FECHA: 18/02/2026

HORA: 8:50:56 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 12.40 Tonnes

PESO TARA: 7.55 Tonnes

PESO NETO: 4.85 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141 °C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.85 Tonnes

Sorany C

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26043

PROVEEDOR: Frente 2 · Viaducto

VALE POR UN VIAJE: Escombros

18 febrero 26

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

PROCOPAL S.A.

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

18 FEB 2026

Sorany C

DESPACHOS - BASCULA

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
