FECHA (D/M/A): 19-02-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: CERO	CANTIDAD: 4,80 TON
ZONA	CINCO
COMUNA	EL POBLADO
BARRIO	POBLADO / MANILA
FRENTE DE TRABAJO:	2

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00AM	
TERMINACIÓN: 3:30PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	DESPEJADO
TARDE	DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE INTERVIENE BACHES MEDIANTES EN LA CL 9A 37-02 CON PASO POR UN CARRIL Y CIERRES PARCIALES CUANDO LAS ACTIVIDADES LO AMERITABAN, EL CUAL SE INTERVINIERON EL BACHE CON SU RESPECTIVA PATOLOGIA. ES DE INFORMAR QUE EL COMERCIO DE LA ZONA FUE INFORMADO PREVIAMENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y ESTAS CULMINARON ANTES DEL MEDIO DIA PARA NO AFECTAR LOS ESTABLECIMIENTOS.

SE REALIZA CAMBIO EN LAS INTERVENCIONES FALLANTES DEBIDO A BACHE PRONUNCIADO SOBRE LA CR 43B - CL 4 QUE CONSTITUYE UN RIESGO INMINENTE PARA LOS ACTORES VIALES, ENCONTRANDOSE EXCAVACIÓN DISMINUIDAS EN LA YÁ CATADA DE INSPECCIÓN DURANTE DEL NIVEL DE VÍA A CUAL FACILITA EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA. SE REALIZA CONFORMACIÓN DE SUBBASE SIN. LLEGAR A REALIZAR LA EXCAVACIÓN Y POSTERIOR COMPACTACIÓN DONDE SE BUSCA MITIGAR EL RIESGO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jorany Andrea Ceballos	John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Diego Rodriguez	NOMBRE: Cristian D. Cano A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JORDY ANDRES CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON VERA JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CORDOBA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MORA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN CORRADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELFIN RUIZ	X		
30	ANX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQUARNA LP 650D	X		
2	Compresor	INGERSOLLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZF 320 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SRV 697	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO | CANTIDAD: 4,80 TON

ZONA: CERO

COMUNA: EL POBLADO

BARRIO: POBLADO / MANILA

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00

TERMINACIÓN: 3:30

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

V ES UN PROBLEMA QUE AUN EPM NO HA DADO UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA IMPEDIR EL ARRASTRE DE FINOS QUE SE GENERA EN LA ZONA CADAVEZ QUE SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS; POR LO TANTO SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA MITIGAR EL RIESGO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Ceballos Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Julian Rivera Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhon Jairo Rodriguez G Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Sorany C.

Cristian D. Colito A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003580	166959	1	CL9A 37-02	2,94	1,60	0,14	4,70	0,66	1,58
5003580	165838	2	CL9A 37-03	2,43	1,21	0,14	2,94	0,41	0,99
4806410	166977	3	CR43B CL 14	1,70	2,73	0,20	4,64	0,93	2,23
TOTALES							12,29	2,00	4,80 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236527 ✓	SMV 697	4,80	4,80	140	25332 ✓	SMV 697	SENCILLA	1	pro copan ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

10. ESQUEMAS

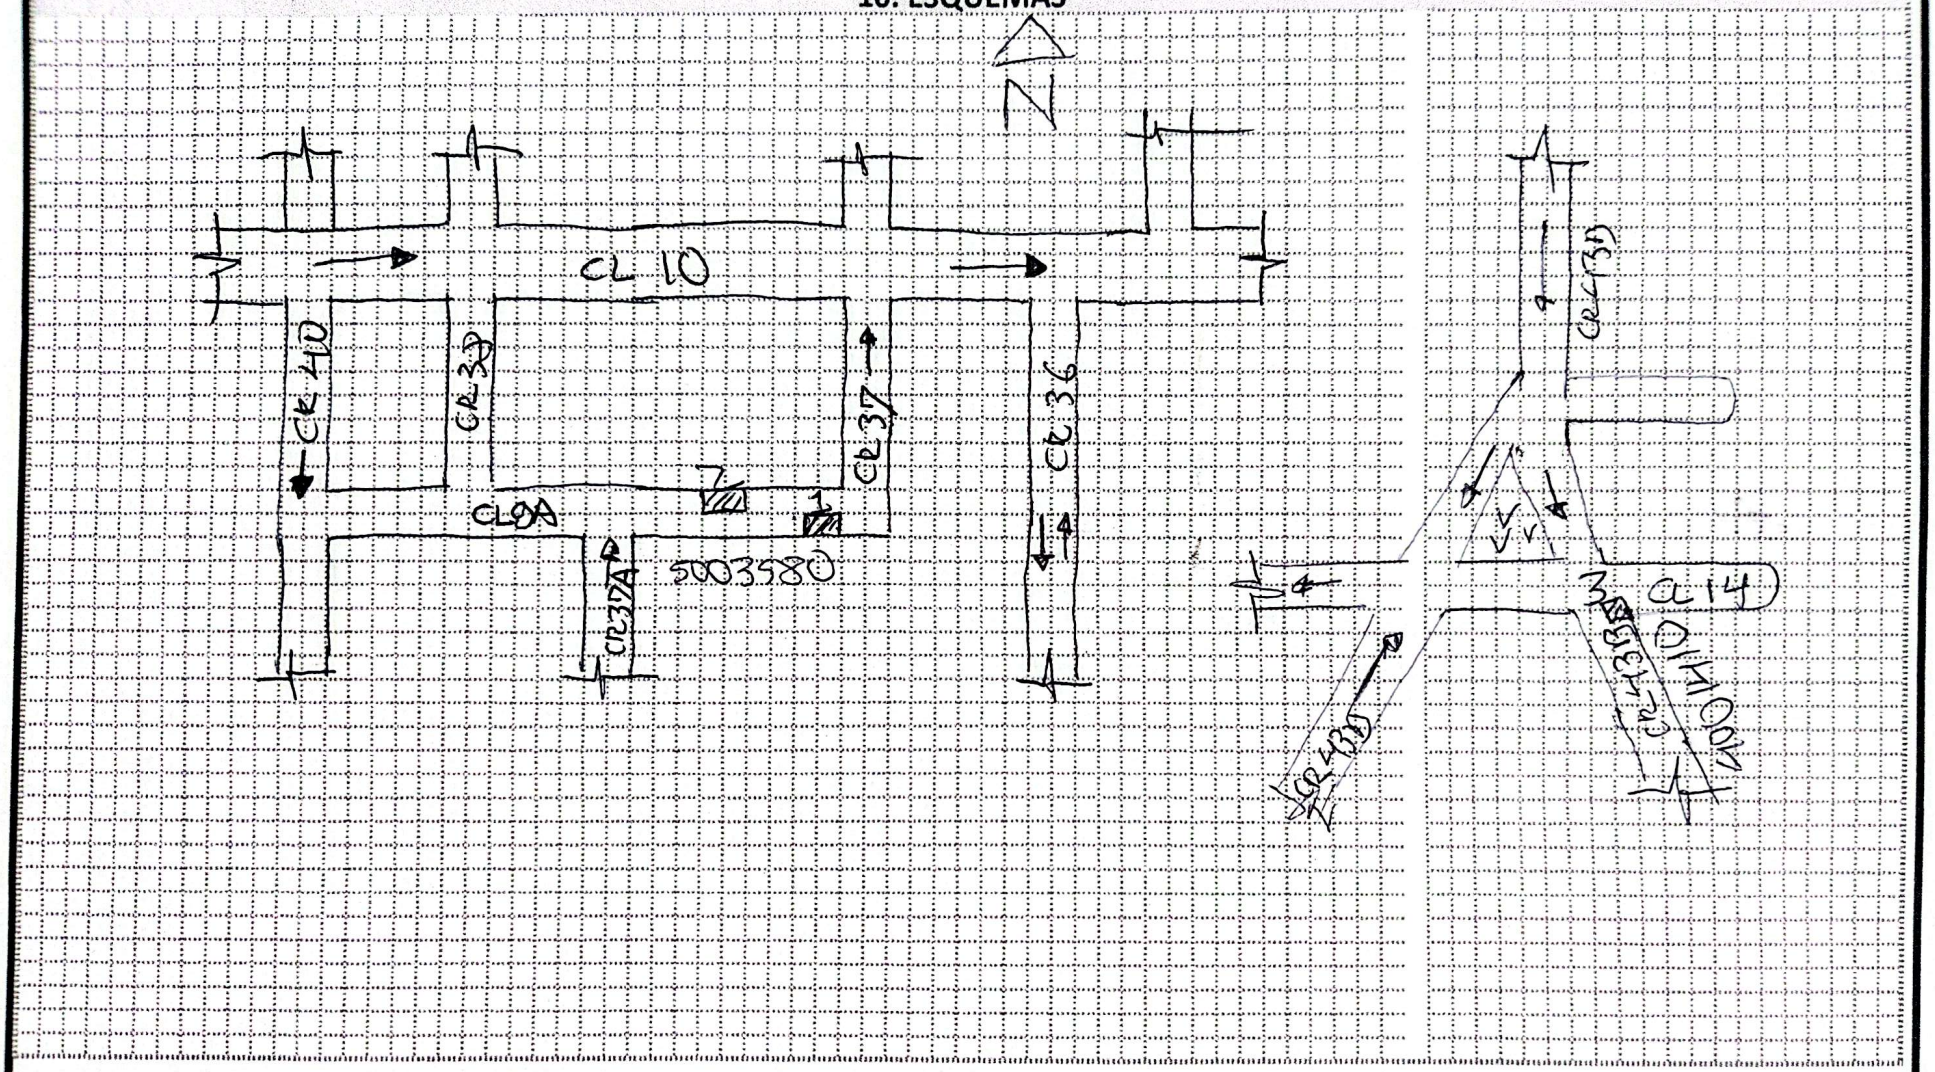

TIPO DE INTERVENCIóN:	MANTENIMIANTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4180 TON
BARRIO	EL POBLADO	DIRECCIóN	CL9A ENTRE CR 37 Y CR 37A

Powered by CamScanner

EST Y PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Consultista

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236527

FECHA: 19/02/2026

HORA: 8:09:36 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.23 Tonnes

PESO TARA: 7.43 Tonnes

PESO NETO: 4.80 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.80 Tonnes

Soreny C.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25332

PROVEEDOR: Frente 2 . Vialidad

VALE POR UN VIAJE: Escombros

14-02-2026

PLACA No: SMV677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Soreny C.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
