FECHA (D/M/A): 20-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: CERO	CANTIDAD: 4,81 TON
ZONA: CUATRO	FRENTE DE TRABAJO: 2
COMUNA: LAURELES - ESTADIO	
BARRIO: LORENA	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	—
TERMINACIÓN: 1:00PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE ENCONTRO YA DE TRES CARILES HABILITANDO UN CARRIL PARA EL TRAFICO VEHICULAR, SE REALIZA SEÑALIZACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PMT PARA ESTAS VIAS.

SE INTERVINAN SOBRE LA CL42 TRES BACHES CON FALLA EN BLOQUE ASOCIADO INTERVINIENDO LA PATOLOGIA MAS PRONUNCIADA QUE (A LARGO) CORTO PLAZO VAYA A FALLAR.

SE INTERVIENE BACHES GENERADOS POR DESPRENDIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA SOBRE CR76 41-5

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURRIERÓN CON NORMALIDAD

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany A. Ceballos	John Rivera
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhonatan Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20 - 02 - 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ROJERA CERATIUS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON URIAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MANRIQUE	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MORA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	BIKIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA INTERNACIONAL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 6500	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARTILLA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECON F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 320 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 6T7 INTERNACIONAL	X		

Powered by CamScanner

20-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5004294	167015	1	CL42 76-44	2,08	1,66	0,14	3,45	0,48	1,16
5004294	142708	2A	CL42 76-21	3,65	1,81	0,13	6,24	0,81	1,95
5004294	142708	2B	CL42 76-21	1,22	0,92	0,13	1,12	0,15	0,35
5004294	167016	3	CL42 76-29	1,55	1,85	0,13	2,87	0,37	0,89
4002964	167017	4	CR76 41-5	1,45	2,16	0,05	3,13	0,16	0,38
4002964	167018	5	CR76 41-7	0,80	1,40	0,03	1,12	0,03	0,08
TOTALES							17,94	2,00	4,81 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236557 ✓	SMV 677	4,81 ✓	4,81	141	25333 ✓	SMV 677	SENCILLA	1	PROCOPAL ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-02-2026

10. ESQUEMAS

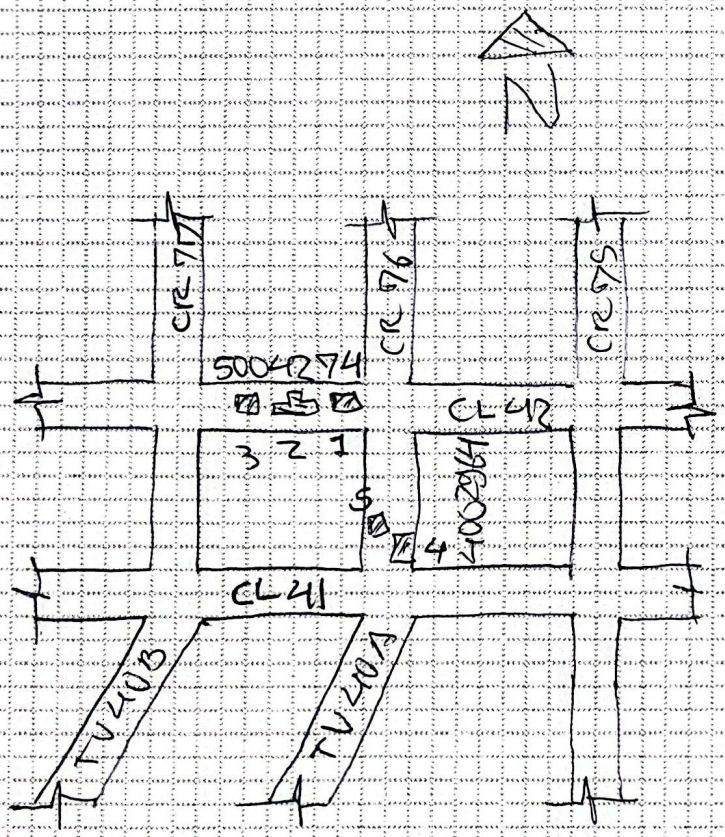

TIPO DE INTERVENCIóN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CARO	CANTIDAD:	4 (81 TON ✓
BARRIO	LORENA	DIRECCIóN	CL 42 ENTRE 76 Y 77

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHO-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236557

FECHA: 20/02/2026

HORA: 8:50:48 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.20 Tonnes

PESO TARA: 7.39 Tonnes

PESO NETO: 4.81 Tonnes

PRODUCTO: 11

MEZ: DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.81 Tonnes

Sorany C

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25333

PROVEEDOR: Frente 2. Vial Med.

VALE POR UN VIAJE: Escombros

20-01-2026

PLACA No: SMV677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

PROCOPAL S.A.
NIT: 890.906.388-0

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
