FECHA (D/M/A): 23-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO | CANTIDAD: 41,82 TON ✓

ZONA: CUATRO

COMUNA: LAURELES - ESTADIO

BARRIO: LA CASTELLANA

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00AM

TERMINACIÓN:

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: ———

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA INSTALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y POSTERIOR CIERRE DE UN CARRIL DE LA AVDO ENTRE CL 33 B Y CL 34 PERMITIENDO EL FLUJO VEHICULAR SIN MAYORES CONTRATIEMPOS PARA LOS ACTORES VIALES. SE REALIZA CIERRE EN LA CL 34 ENTRE AVDO Y CR 80 PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN DE LOS BACHES 2 Y 3, DESVIANDO EL FLUJO VEHICULAR HACIA LA CL 33 AA.

SE ENCONTRO ESPESORES DE 0,16M Y 0,17M LIMITANDO LAS ÁREAS A INTERVENIR; ABARCANDO EL BACHE Y LA PATOLOGÍA ASOCIADA.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURREN CON NORMALIDAD.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL CAMBIO DE LA PALA DEL MARTILLO YA QUE ESTE NO PERMITE EL PERFILADO ADECUADO DEL BACHE.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Sorany Andrea Ceballos Jordany C.	John Rivera
	Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA		Cristian D. Cano A.
NOMBRE:	Juan David Rodriguez	
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	EDRANY ANDRES CEBALLOS	X		
2	Encargado	NIA			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	NIA			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	NIA			
12	Ayudante	NIA			
13	Ayudante	NIA			
14	Ayudante	NIA			
15	Ayudante	NIA			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MURCIA	X		
18	Operador fresadora	NIA			
19	Operador finisher	NIA			
20	Operador Retroexcavadora	NIA			
21	Operador Vibrocompactador	NIA			
22	Operador Compactador llantas	NIA			
23	Operador Cortador Asfalto	NIA			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	NIA			
26	Operador Barredora	NIA			
27	Coductor Carrotanque	NIA			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELFIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	LITOSQUIMNA LP 6500	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	NIA			
4	Finisher	NIA			
5	Retroexcavadora	NIA			
6	Vibrocompactador	NIA			
7	Compactador llantas	NIA			
8	Cortador Asfalto	NIA			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	NIA			
12	Mini cargador	NIA			
13	Barredora	NIA			
14	Carrotanque	NIA			
15	Camión	SZD 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 677 INTERNACIONAL			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000750	166448	1	CR 81 33B-36	1,67	1,36	0,16	2,27	0,36	0,87
2000750	167050	2A	CR 81 33B-53	2,20	2,53	0,164	5,57	0,91	2,19
2000750	167050	2B	CR 81 33B-53	1,43	1,66	0,164	2,37	0,39	0,93
2000044	167055	3	CR 81 C134	1,65	1,31	0,16	2,16	0,35	0,83
TOTALES							12,37	2,01	4,82 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
(236587) 236585	SMV 677	4,82 ✓	4,87	142	29334 ✓	SMV 677	SENCILLA	1	PROCOPAL ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-02-2026

10. ESQUEMAS

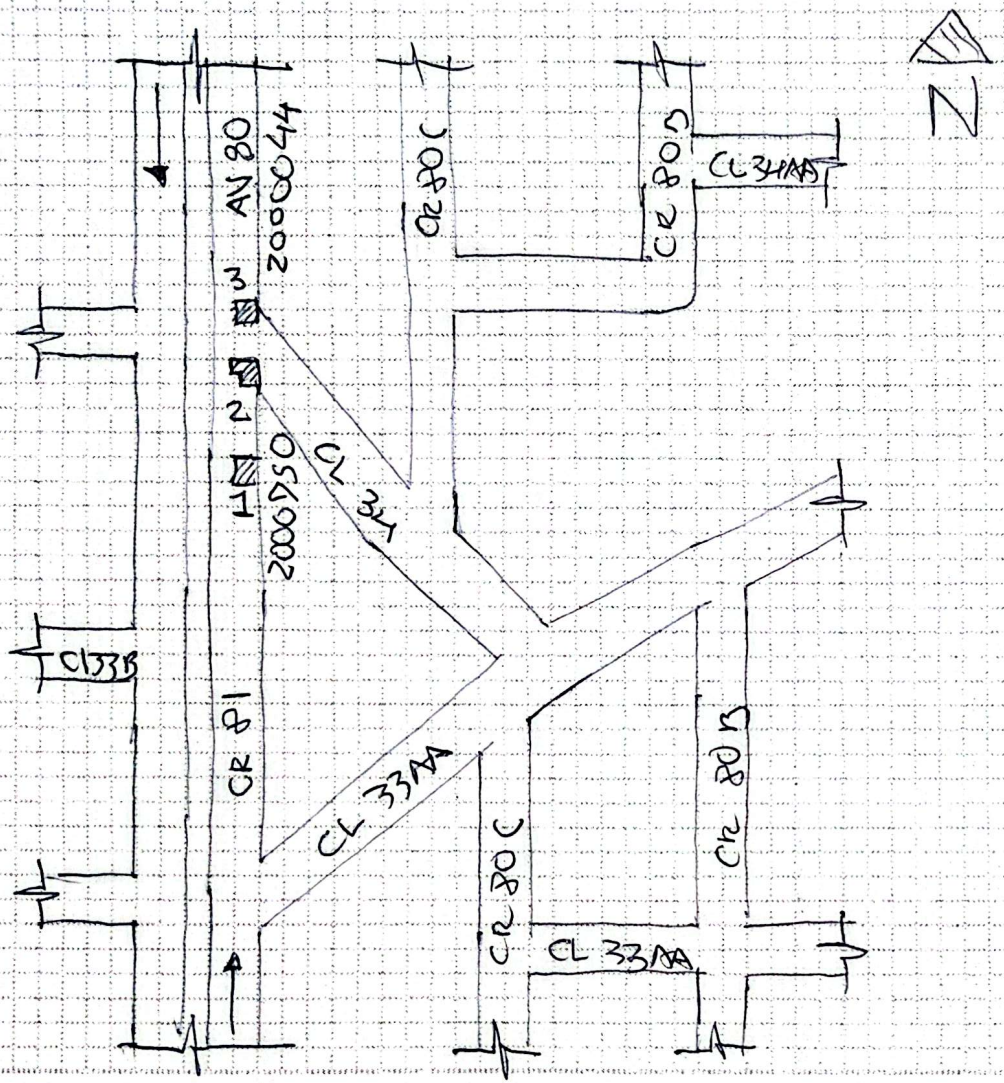

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO.	CANTIDAD:	4,82 TON
BARRIO	LA CASTELLANA	DIRECCIÓN	CR 81 ENTRE CL 33B Y CL 34

Powered by CamScanner

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Co...

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236585

FECHA: 23/02/2026

HORA: 8:54:36 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.21 Tonnes

PESO TARA: 7.39 Tonnes

PESO NETO: 4.82 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.82 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25334**

PROVEEDOR: Frente 2. Vial nal

VALE POR UN VIAJE: Ecombro

23-02-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

NIT. 890.906.388-0

Sandra C.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
