FECHA (D/M/A): 24-02-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO:	LEVE
CANTIDAD:	4,84 TON ✓
ZONA	SEIS
COMUNA	BELEN
BARRIO	ROSALES
FRENTE DE TRABAJO:	2

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00AM	
TERMINACIÓN: 2:30PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	DESPEJADO
TARDE	DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA SEÑALIZACIÓN PUNTUAL DEL BACHE UNO EN LA CR 71 D 67 45 INTERVINIENDO BACHE CON LA PATOLOGIA MAS AVANZADA YA QUE LA ZONA PRESENTA FALLA EN SU CONJUNTO.

SE INTERVIENEN BACHES DOS Y TRES CON CLARET DE UN MARTILLO EN VÍA RESIDENCIAL ATENDIENDO LOS BACHES CON LA ZONA MAS DETERIORADA, EL SEGMENTO PRESENTA MULTIPLES GRIETAS Y FISURAS TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES.

SE ATIENDE BACHE EN LA CLS CON CR 83 COMO MITIGACIÓN RETIRANDO PARTE DE LA PATOLOGIA DE FORMA MANUAL Y PAVIMENTANDO; RETIRANDO EL RIESGO QUE CONSTITUIDA PARA LOS ACTORES VIALES

EL BACHE TRES QUEDO EN PRIMERA CAPA; POR LO QUE QUEDA PENDIENTE POR FINALIZAR SU CARA JURIDICA DEBIDO A FALTA DE MEZCLA

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andreet Ceballos (Sorany C.)	John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Juan Camilo Rodríguez G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓ
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RUIS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SOARES MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MORA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EIKIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 6500 I	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	HERRADA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMU 697 INTERNACIONAL	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001257	167023	1A	CR 91 D6 94B	1,91	2,85	0,135	5,44	0,73	1,76
5001257	167023	1B	CR 91 D6 94B	1,52	1,57	0,135	2,39	0,32	0,77
5001510	167074	2	CR 92A 31-16	2,39	1,71	0,08	4,05	0,32	0,78
5001510	167072	3	CR 92A 31-34	3,11	2,22	0,08	6,90	0,55	1,33
4004968	167056	4	CLS CR 83	0,60	2,00	0,07	1,20	0,08	0,20
TOTALES							19,99	2,07	4,84 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236615 ✓	SMV677	4,84 ✓	4,84	.141	25335 ✓	SMV677	SENCILLA	1	PROCOPY ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24-02-2026

10. ESQUEMAS

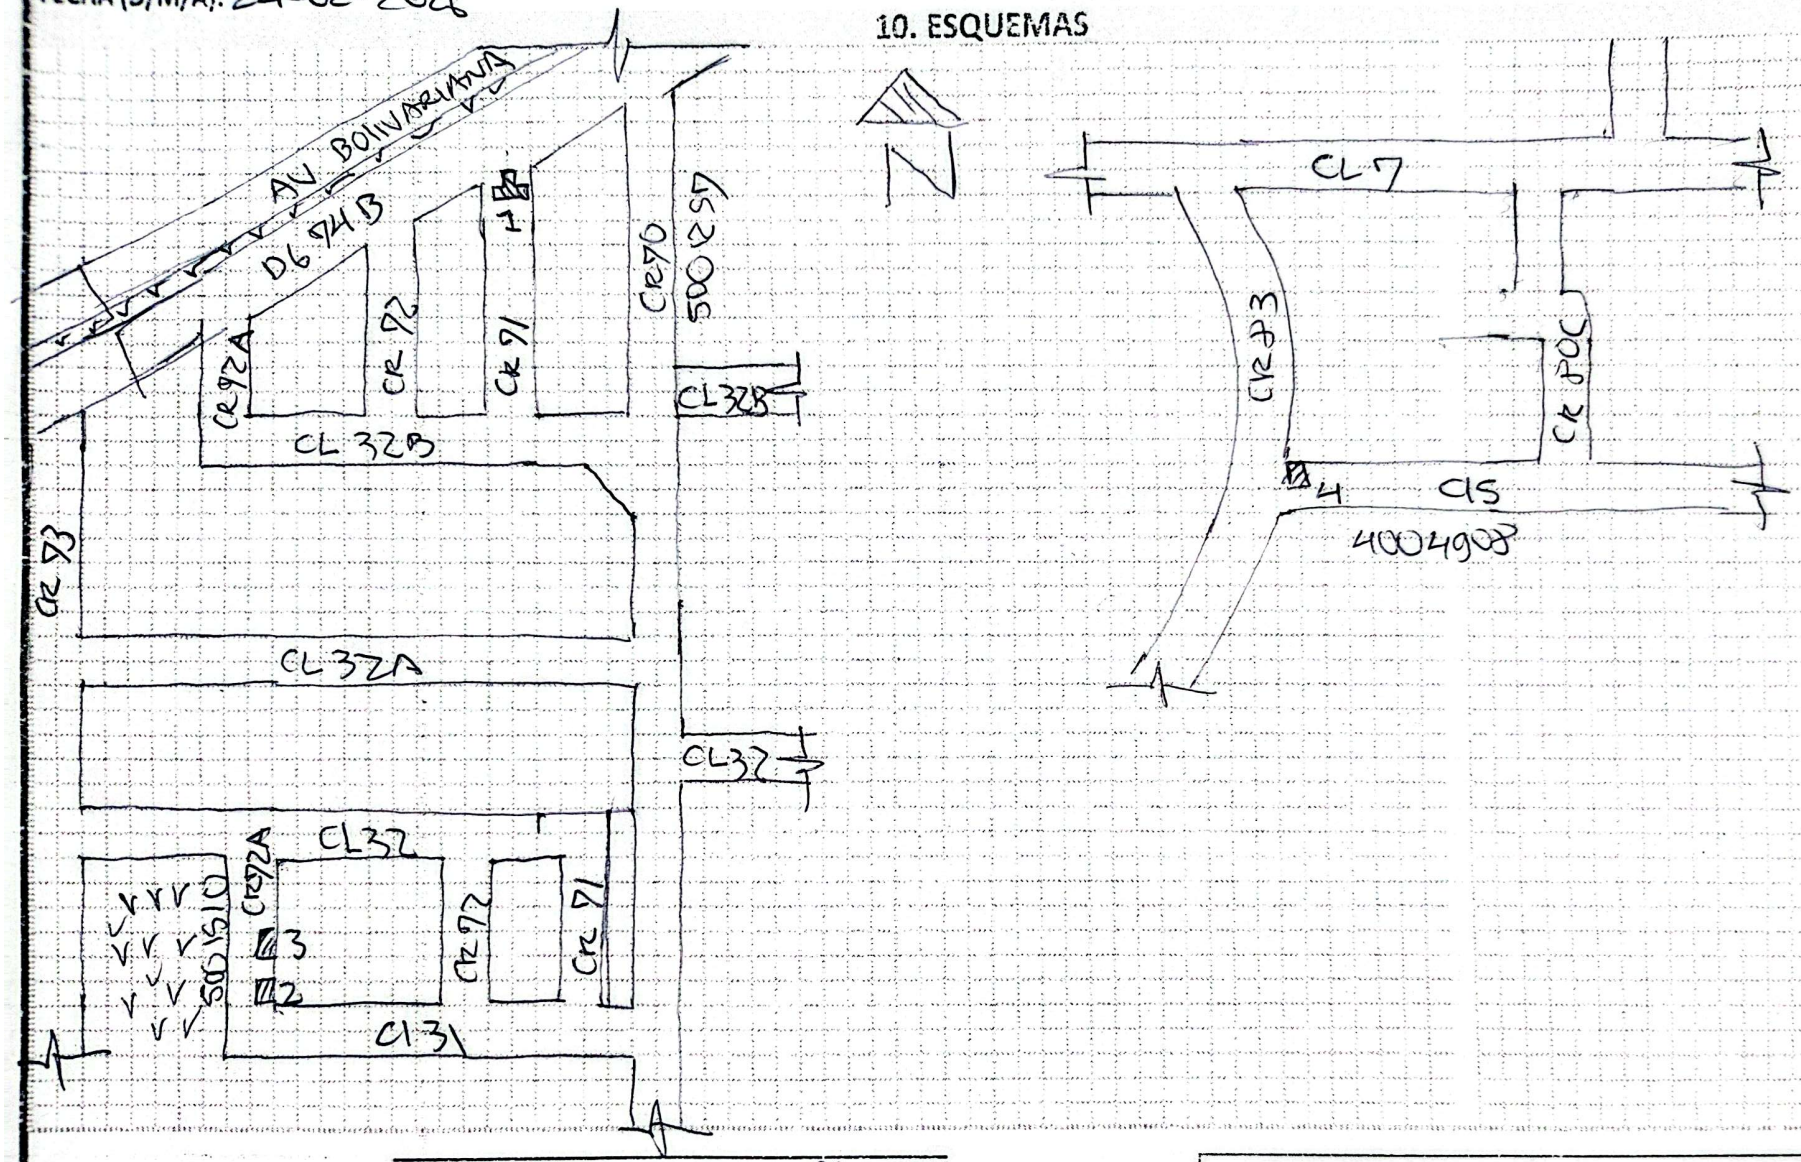

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,84 TON ✓
BARRIO	BELEN ROSA LES	DIRECCIÓN	CR 72A ENTRE CL 31 Y CL 32 CR 70 DG 74B

Powered by CamScanner

ESTUV PAVIDS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Consultores

TIQUETE DE BASCULA: 236615

FECHA: 24/02/2026

HORA: 9:04:29 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 12.20 Tonnes

PESO TARA: 7.36 Tonnes

PESO NETO: 4.84 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.84 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25335

PROVEEDOR: Frente 2. Vial Med

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
