FECHA D/M/A: 25-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO

CANTIDAD: 4,83 TON

ZONA: CINCO

COMUNA: EL POBLADO

BARRIO: PATIO BONITO

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 3:30 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza por parte del área SST inspección de elementos de seguridad, Se hace pausas activas antes de iniciar jornada y charla SST.

SE REALIZA OCUPACIÓN DE UN CARRIL SOBRE LA CL 7 ENTRE CR45 Y CR47 CON PASO VEHICULAR EN UN SOLO SENTIDO POR EL OTRO CARRIL, SE INSTALA SEÑALIZACIÓN ACORDE AL PMT VIGENTE ATENDIENDO DOS BACHES CON SU RESPECTIVA PATOLOGÍA; QUEDANDO PENDIENTE UN AREA CON AHUELLAMIENTO Y PIEL DE COCODRILO QUE NO SE ALCANZO A ABORDAR.

SE REALIZA SEÑALIZACIÓN PUNTUAL SOBRE CR43B CON CL1A SUR CON CONTROL DEL TRAFICO VEHICULAR CON AYUDA DE UNA AUX VIAL

SE REALIZA MITIGACIÓN EN LA CL 11 SUR 290-27 YA QUE CONSTITUIA UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES; EL CUAL REQUIRIÓ EL APOYO DE UNA AUX VIAL PARA SU ATENCIÓN. ADICIONAL EN EL SEGMENTO SE IDENTIFICO MULTIPLES BACHES LOS CUALES SE PROGRAMARÁN EN LA SIGUIENTE SEMANA.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN/EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURREN CON NORMALIDAD

5. VISITANTES

Kelly Punt

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Ceballos	John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JUAN [illegible] Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓ
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MANDUCA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MURIA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELKIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	TEDDY UNDA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQUARNA LP 6001	X		
2	Compresor	INGER SOILRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FROSH F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	GTP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 670 INTERNACIONAL	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003656	1670988	1A	CR 43B CL 1A SUR	3,96	1,04	0,135	4,12	0,56	1,33
5003656	1670988	1B	CR 43B CL 1A SUR	1,66	0,59	0,135	0,98	0,13	0,32
4001009	1610588	2	CL 1 CR45-150	2,11	1,09	0,13	2,30	0,30	0,72
4001009	1670997	3A	CL 1 CR 47	0,70	1,68	0,135	1,18	0,16	0,38
4001009	1670997	3B	CL 1 CR 47	4,35	1,24	0,135	5,39	0,73	1,75
5003694	1659144	4	CL 11 SUR 29D-27	2,76	0,84	0,06	2,32	0,14	0,33
			TOTALES				16,29	2,01	4,83 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISION No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236644 ✓	SMV 697	4,83 ✓	4,83	141	25336 ✓	SMV 697	SENCILLA	1	PROCOPA ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-02-2026

10. ESQUEMAS

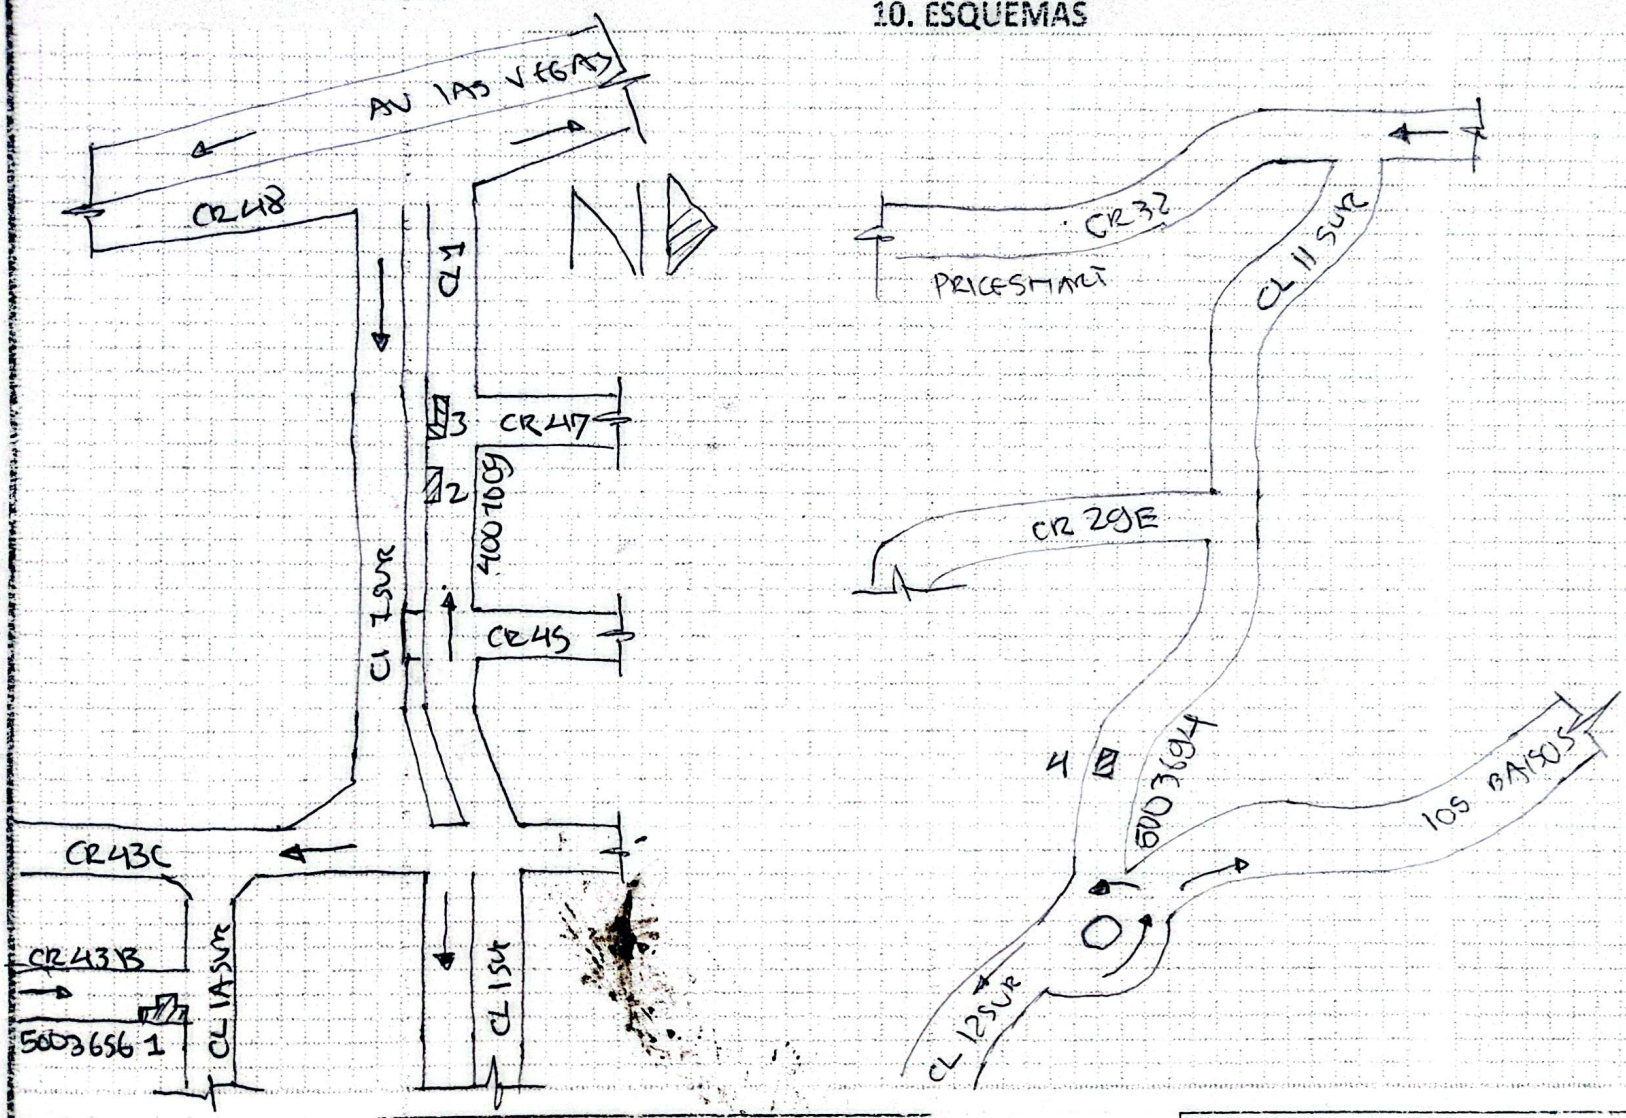

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,83 TON ✓
BARRIO	PATIO BONITO	DIRECCIÓN	CL 1 ENTRE CR45 Y CR47 CL43B CL1ASUR

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.

Ingenier[illegible]

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236644

FECHA: 25/02/2026

HORA: 8:56:04 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.17 Tonnes

PESO TARA: 7.34 Tonnes

PESO NETO: 4.83 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.83 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25336

PROVEEDOR: Frente 2 Vialnet

VALE POR UN VIAJE: Escombros

25-02-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
