FECHA (D/M/A): 26-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,90TON

ZONA	DOS	FRENTE DE TRABAJO:	2
COMUNA	ROBLEDO		
BARRIO	LA PILARICA / FACULTAD DE MINAS		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	———
TERMINACIÓN: 2:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: DESPEJADO
	TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA CR 73C ENTRE CL 79A Y CL 75 CON CONTROL VIAL DE UNO DE LOS AYUDANTES, EN LA CL 75 ENTRE CR 74D Y CR 73C SE REQUIRIO DOS AYUDANTES PARA EL CONTROL DEL TRAFICO VEHICULAR PARA LA ATENCIÓN DE DOS BACHES.

EL BACHE UNO SE ENCONTRO INMERSO EN PVC DE SUCONDRIO, SEGUNDO ALTAMENTE FRACTURADO QUE REQUIERE ES UNA REHABILITACIÓN, PERO DEBIDO A LA PROFUNDIDAD DEL BACHE SE INTRODUCE UN AREA QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL BACHE EMPALMANDO CON SUPERFICIE SANA EN TRES CARAS DE LOS CUATRO MITIGANDO EL RIESGO QUE PRESENTABA.

LOS BACHES DOS Y TRES LOCALIZADOS A DE DE LA SUR INTERVENIR DE FORMA PUNTUAL YA QUE EL PAVIMENTO DEL PERIMETRO ESTA EN BUEN ESTADO.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURRE CON NORMALIDAD.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Ceballos	NOMBRE:
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	NIA			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	NIA			
6	Ayudante	SIMON URAN JARAMILLO.	X		
7	Ayudante	HUGO RUIS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	NIA			
12	Ayudante	NIA			
13	Ayudante	NIA			
14	Ayudante	NIA			
15	Ayudante	NIA			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MEJIA	X		
18	Operador fresadora	NIA			
19	Operador finisher	NIA			
20	Operador Retroexcavadora	NIA			
21	Operador Vibrocompactador	NIA			
22	Operador Compactador llantas	NIA			
23	Operador Cortador Asfalto	NIA			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	NIA			
26	Operador Barredora	NIA			
27	Coductor Carrotanque	NIA			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELKIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LEINY USUGA		X	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	INGERSOLL RAND LP (5500)	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	NA			
4	Finisher	NIA			
5	Retroexcavadora	NIA			
6	Vibrocompactador	NIA			
7	Compactador llantas	NIA			
8	Cortador Asfalto	NIA			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	NIA			
12	Mini cargador	NIA			
13	Barredora	NIA			
14	Carrotanque	NIA			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV (676) INTERNATIONAL	X		SMV 676

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-2020

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005487	166147	1	CR 73C 74-85	3,24	3,35	0,124	10,85	1,35	3,123
4004388	166016	2	CL 75 73C-39	1,63	1,34	0,15	2,18	0,33	0,179
4004388	167123	3	CL 75 73C-41	1,75	1,40	0,15	2,45	0,37	0,188
TOTALES							15,49	2,04	4,90

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236672	SMV676	4,90	4,90	142


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25737	SMV676	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-2026

10. ESQUEMAS

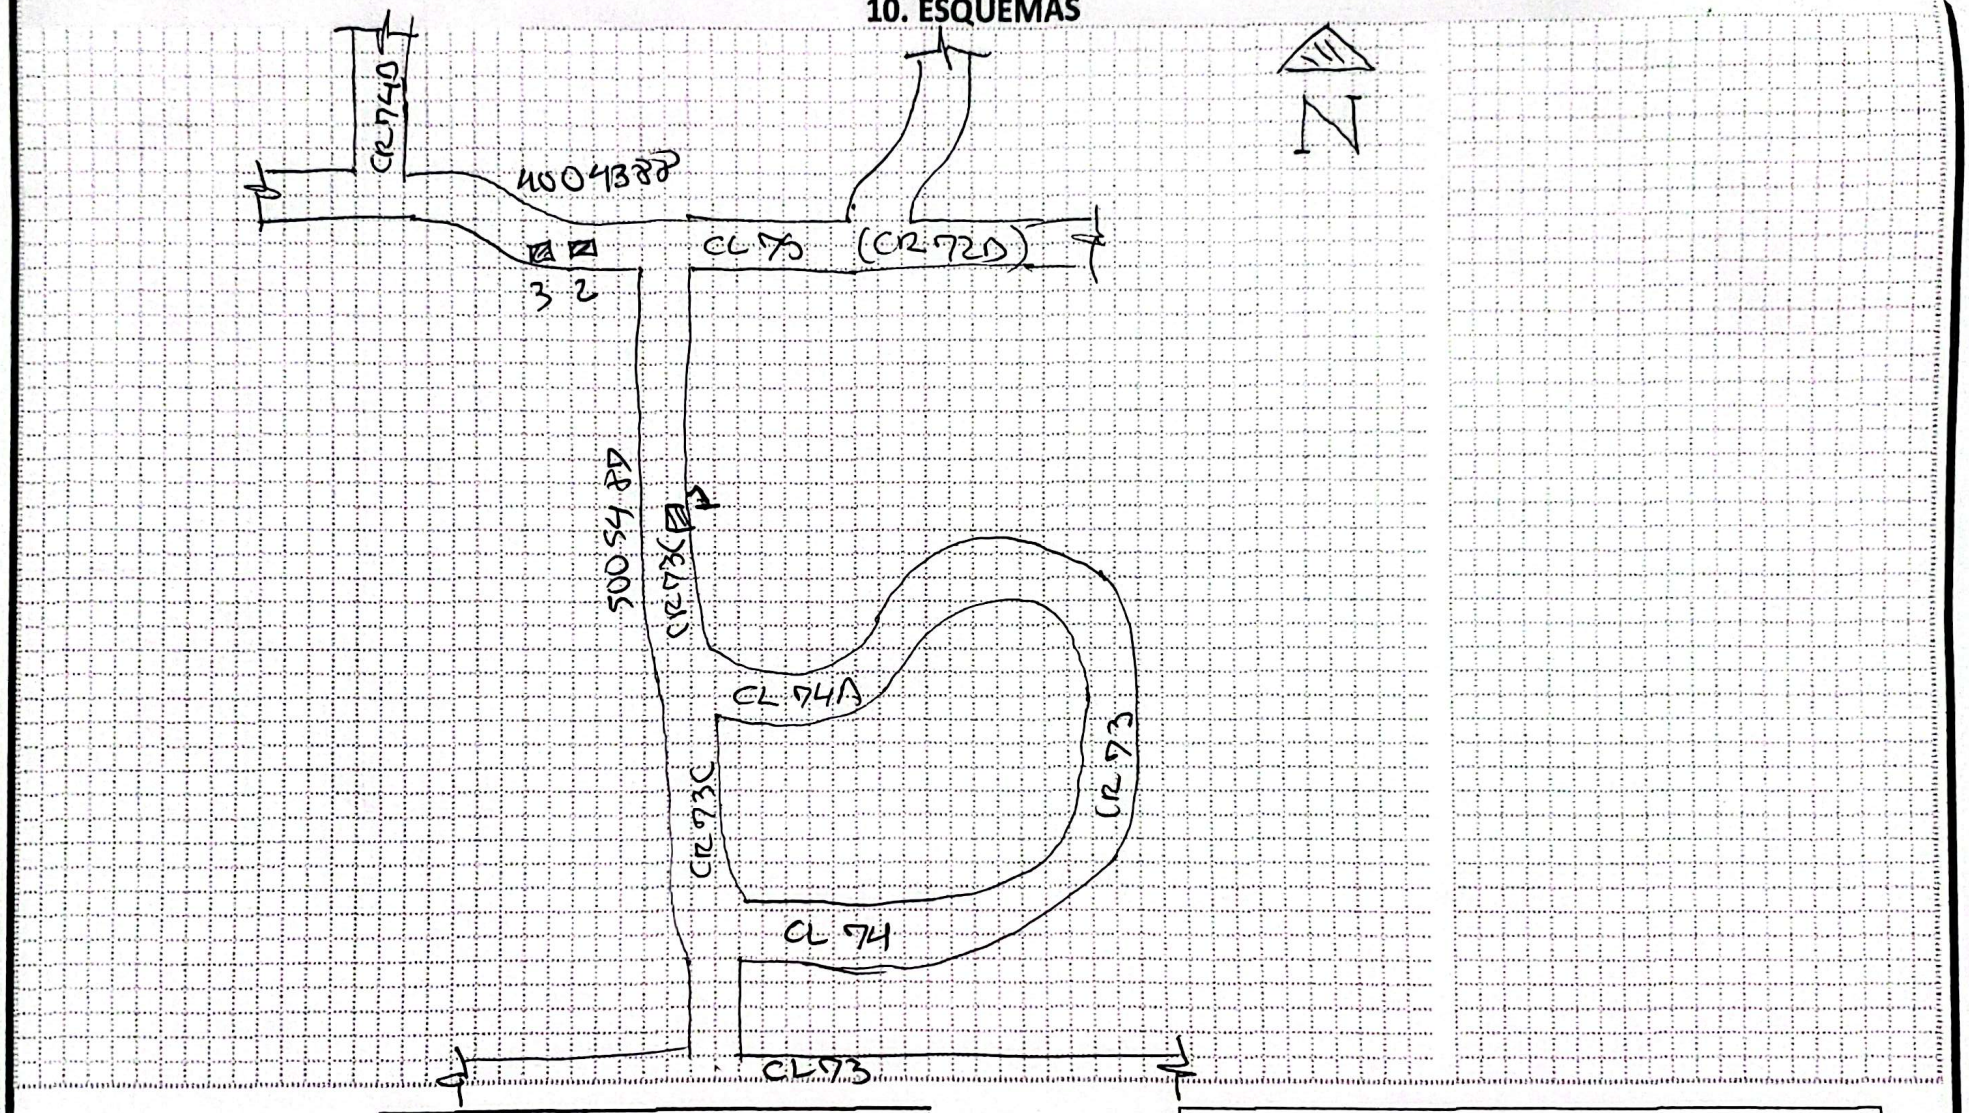

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	C GRO.	CANTIDAD:	4,90 TON ✓
BARRIO	LA PILARICA FACULTAD DE MINAS	DIRECCIÓN	CR 73C ENTRE CL 75 Y CL 74

Powered by CamScanner

EST Y PAVOS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Con

Jonathan Muñoz

TIQUETE DE BASCULA: 236672

FECHA: 26/02/2026

HORA: 8:38:30 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.43 Tonnes

PESO TARA: 7.53 Tonnes

PESO NETO: 4.90 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.92 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25337

PROVEEDOR: Frente 2. Vial nal

VALE POR UN VIAJE: escombros

26-02-2026

PLACA No: SMV676 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
