FECHA (D/M/A): 27-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO

CANTIDAD: 4,82 TON

ZONA: SEIS

COMUNA: BELEN

BARRIO: ROSALES

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00AM

TERMINACIÓN: 2:30PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE PRESENTA FALLAS MECANICAS CON EL CAMIÓN POR LO QUE SE DESCARGA TODOS LOS ELEMENTOS EN LAS ZONAS A INTERVENIR Y EL VEHICULO PUEDA SER REPARADO MIENTRAS SE REALIZABA LAS ACTIVIDADES.

SE INTERVIENE BACHE UNO JUNTO CON SU PATOLOGÍA ASOCIADA, INTERVINIENDO LA ZONA MAS CRITICA.

SE INTERVIENE BACHE DOS ATENDIENDO LOS BACHES MULTIPLES EN EL PUNTO Y SE INSTALA SEGUNDA CAPA QUE ESTABA PENDIENTE DE LA JORNADA 25-02-2026 UBICADO EN LA CRUZA 31-32.

LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURREN CON NORMALIDAD

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Soruny Andrey Ceballos Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	John RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Diego Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Cristian D. Cano A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SIRANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MUÑA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAM COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELFIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 65001	X		
2	Compresor	INGERSOLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SFP 329 CHEVROLET	X		falla con cardan
16	Volqueta(s)	SMV 677 INTERNACIONAL	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (ts)
5001210	167 158	1	CL 32D 69B-8	3,33	2,42	0,14	8,06	1,13	2,71
5001385	167 159	2	CL 30C 65F-24	2,91	2,16	0,14	6,29	0,88	2,11
TOTALES							14,34	2,01	4,82

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No.	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No.	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236702	SMV677	4,82	4,82	140	(2538)				
					25338	SMV677	SENCILLA	1	PTO COPEY

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-02-2026

10. ESQUEMAS

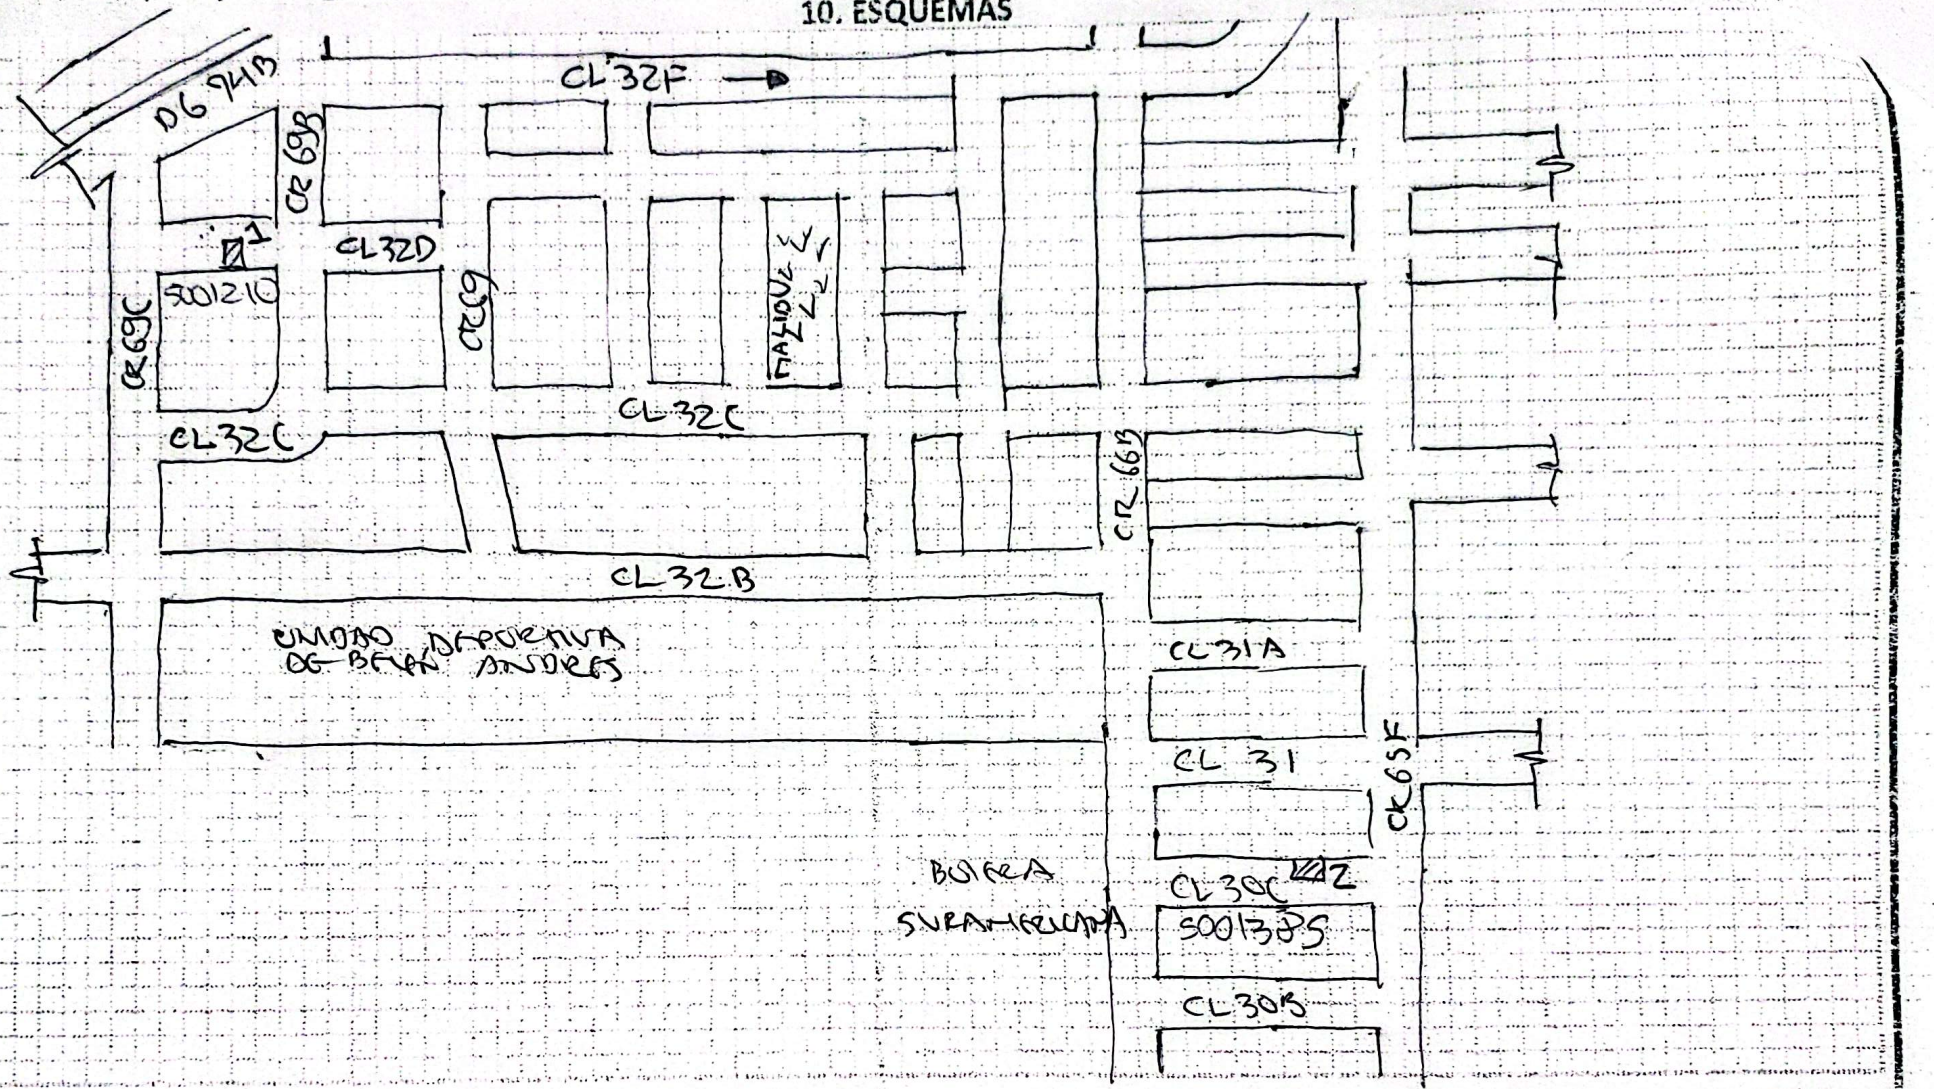

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,82 TON
BARRIO	ROSALES	DIRECCIÓN	CL 32D 69B-8 CL 30C 65F-24

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25338**

PROVEEDOR: Fiente 2. Vidimed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

27-02-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
