FECHA (D/M/A): 16 FEBRERO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento PUNTUAL

RANGO: 1 CANTIDAD: 11.04 TON.

ZONA: 4

COMUNA: 11

BARRIO: LOS COLORES

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 5:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL ÁREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LOS BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENCONTRADA EN LOS BACHES QUE ESTAN SIENDO INTERVENIDOS.
- IMPRIMACIÓN DE BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA TJZ305, CON 11.04 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 10:30 AM.
- CHEQUEO DE TEMPERATURA 134°C
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
- RECOLECCIÓN ESCOMBROS
- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Soy	MARTHA C. LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Restrepo	NOMBRE: José Luis Guzmán
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 16 FEBRERO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SEENS	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	JOHSN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
8	Ayudante	ALSINO DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ	X		
10	Ayudante	EDUARDO URIBE	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SEENS	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	GIOVANY CASTANO	X		
		PABLO AGUIRRE	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	SIRSOUL	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	TTI 305	X		
		Unidad sanitaria	X		

FECHA (D/M/A): 16 FEBRERO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5000862	166910	1	CL53A CR79A-15	1.74	3,62	0.12	6,30	0,76	1.82
5000861	157392	2A	CL53A CR 79-49	3,30	2,90	0.11	9,57	1,05	2,52
5000861	157392	2B	CL53A CR79 -49	1.60	1.74	0.11	2,78	0,31	0,74
5000862	166911	3	CL53A CR79A-05	2,60	1.83	0.11	4.76	0,52	1.25
5000862	166912	4A	CL53A CR79A-05+5M	1,22	1.77	0.11	2.16	0,24	0,58
5000862	166912	4B	CL53A CR79A-05-5M	0,95	1.30	0.11	1,24	0.14	0,34
5000861	157906	5	CL53A CR79A	1.95	0,90	0.12	1.76	0,21	0,50
5000861	166834	6	CL53A CR78-126	1.50	1,38	0.12	2,07	0,25	0,60
5000861	166913	7A	CL53A CR78-126 ±5m	2,30	2,50	0.12	5,75	0,69	1-66
5000861	166913	7B	CL53A CR78-126+5M	3,20	1,13	0.12	3,62	0,43	1,03
TOTALES							40,01	4.60	11,04

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
535773	TJI305	11,04		146

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25625	TJI305	SENCILLO	1	PROCOPOL

FECHA (D/M/A): 16 FEBRERO 2026

10. ESQUEMAS

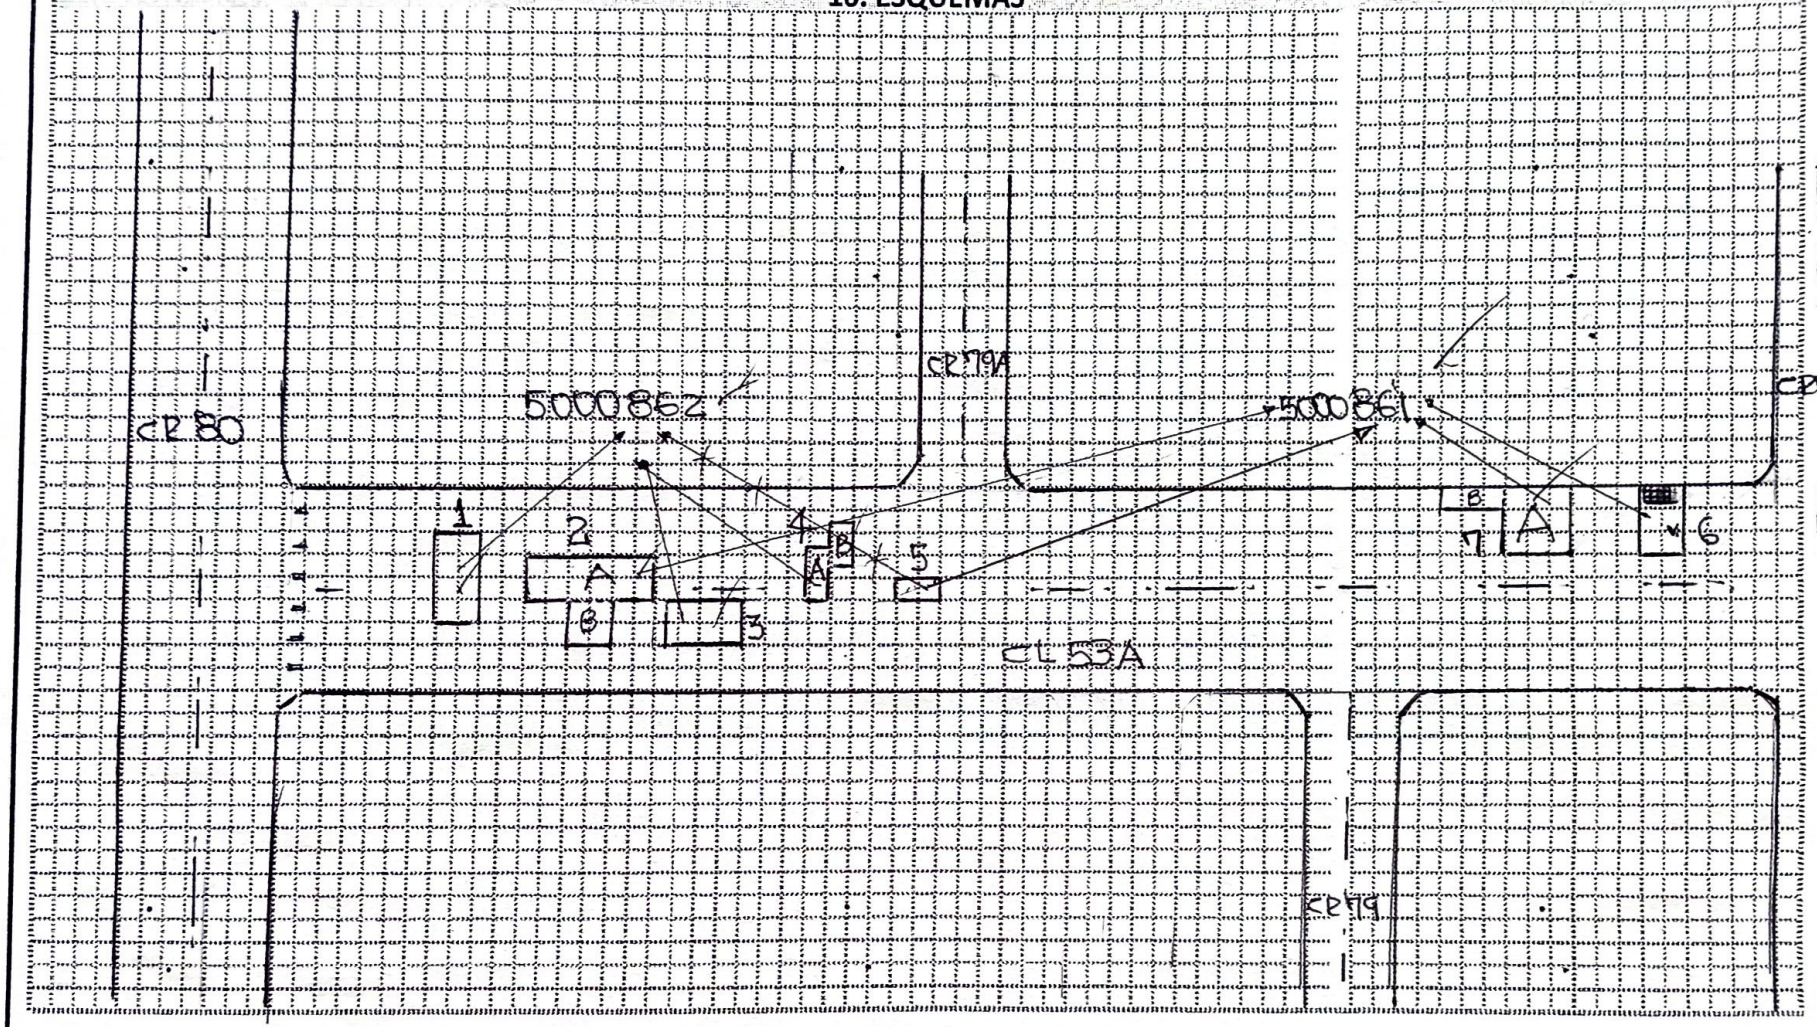

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.04 /	CANTIDAD:	
BARRIO	LOS COLORES	DIRECCIÓN	cl 53A cr 78-126	DIRECCIÓN	

FECHA (D/M/A): 16 FEBRERO 2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,04 TON
ZONA	4	FRENTE DE TRABAJO:	9
COMUNA	11		
BARRIO	LOS COLORES		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 AM	—
TERMINACIÓN: 5.00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

NOTA AMBIENTAL: EN LA FECHA CORRESPONDIENTE SE INICIÓ LA INTERVENCIÓN DEL BACHE PROGRAMADO; SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LA PRESENCIA DE RAICES SUPERFICIALES DE ÁRBOL EXISTENTE EN EL ÁREA AFECTADA. CON EL FIN DE NO AFECTAR DICHAS RAICES Y PRESERVAR EL COMPONENTE ARBÓREO, LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DEBIO FRACCIONARSE EN DOS ETAPAS. ES DECIR, 2 BACHES EN EL SITIO. AL EVIDENCIAR ESTA CONDICIÓN, SE REALIZÓ LA CONSULTA CON EL ÁREA AMBIENTAL, LA CUAL INDICÓ QUE EL PUNTO DEBE DEJARSE EN SU ESTADO ACTUAL HASTA CONTAR CON UNA DIRECTRIZ TÉCNICA ESPECÍFICA QUE DEFINA EL MANEJO ADECUADO DE LAS RAICES Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA INTERVENCIÓN DEFINITIVA.

UTILIZANDO EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN SE CONSULTÓ CON LA PROFESIONAL AMBIENTAL DE LA SIF, QUIEN INDICÓ QUE PARA EL TIPO DE INTERVENCIÓN, NO SE TIENE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PARA EL CORTE O PODA DE RAICES, POR LO QUE NO SE PUEDE EJECUTAR ACTIVIDAD CERCA DEL ÁRBOL UBICADO EN ESTE FRENTE DE OBRA, LO CUAL TAMBIEN FUE CONFIRMADO POR EL PROFESIONAL FORESTAL DE LA SIF. POR LO QUE SE DEBE AJUSTAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA Y EVITAR EL ACERCAMIENTO DE DICHAS ACTIVIDADES A ESTAS RAICES.

5. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Pena	NOMBRE: MARTHA P. LÓPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Jorge Monsalve	FIRMA:
NOMBRE: Jorge Monsalve Ing	NOMBRE: José Luis Cuzcano S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Juan Alex Restrepo

REMISIONES DEL 16 ~~FEBRERO~~ 2026

20260216 09:16
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S/A
NIT. 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535773
PLACA: TJZ305
CONDUCTOR: YOBANY CASTAÑO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,04 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:19.040,00

ENTRADA: 16 [illegible] 2026 -m09:16 a.
SALIDA: 16 [illegible] 2026 -m 09:16 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25625

PROVEEDOR: [illegible]
VALE POR UN VIAJE: [illegible]
PLACA No: TJZ 305 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: PROCOPAL
RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

16-2-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson Soto
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ
