FECHA (D/M/A): 18 FEBRERO 2026	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 11.08 TON
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 9
COMUNA: 11	
BARRIO: CUARTA BRIGADA	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	- camion llega a las 9:00am debido a que el compresor presento daño en una llanta - se trabaja en 2 carriles con alto flujo vehicular
TERMINACIÓN: 8:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO
TARDE: SOLEADO.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

.SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
.CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS
.MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS.
. ACOPIO TEMPORAL DE ESCOMBROS.
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN CADA BACHE EN INTERVENCIÓN.
. IMPRIMACION DE BACHES.
. LLEGADA DE VOLQUETAS SENCILLAS TJ1305, CON 11.09 TON. DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBI, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 9:40Am.
. CHEQUEO DE TEMPERATURA. 140°
. EXTENSION DE MEZCLA
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
. RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Pena Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	MARTHA LOPEZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman.D Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18 FEBRERO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	JOHSN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	AIDIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
8	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE.	X		
9	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
10	Ayudante	CONRADO (DIAZ) MOLINA	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	GIOVANY CASTAÑO	X		
		JULIANA DIAZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	AIRSOUL	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	6TX043	X		
16	Volqueta(s)	TJF 305	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18 FEBRERO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001307	166951	1	CL51 CR70A-28	1.30	2.33	0.16	3.03	0.48	1.15
4001307	166932	2	CL51 CR70A-08	0.90	7.0	0.15	6.30	0.95	2.28
4001306	166952	3	CL51 CR70-29	2.98	2.65	0.16	7.90	1.26	3.02
4001306	166931	4A	CL51 CR70-32	1.62	5.65	0.15	9.15	1.37	3.29
4001306	166931	4B	CL51 CR70-32	2.22	1.37	0.15	3.04	0.46	1.10
4001330	166953	5	CL53 CR71	1.0	0.95	0.10	0.95	0.10	0.24
TOTALES							30.37	4.62	11.08

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
535954	TJZ305	11.09		144


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25627	TJZ305	SENCILLO	1	PAVIMOBRA

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18 FEBRERO 2026

10. ESQUEMAS

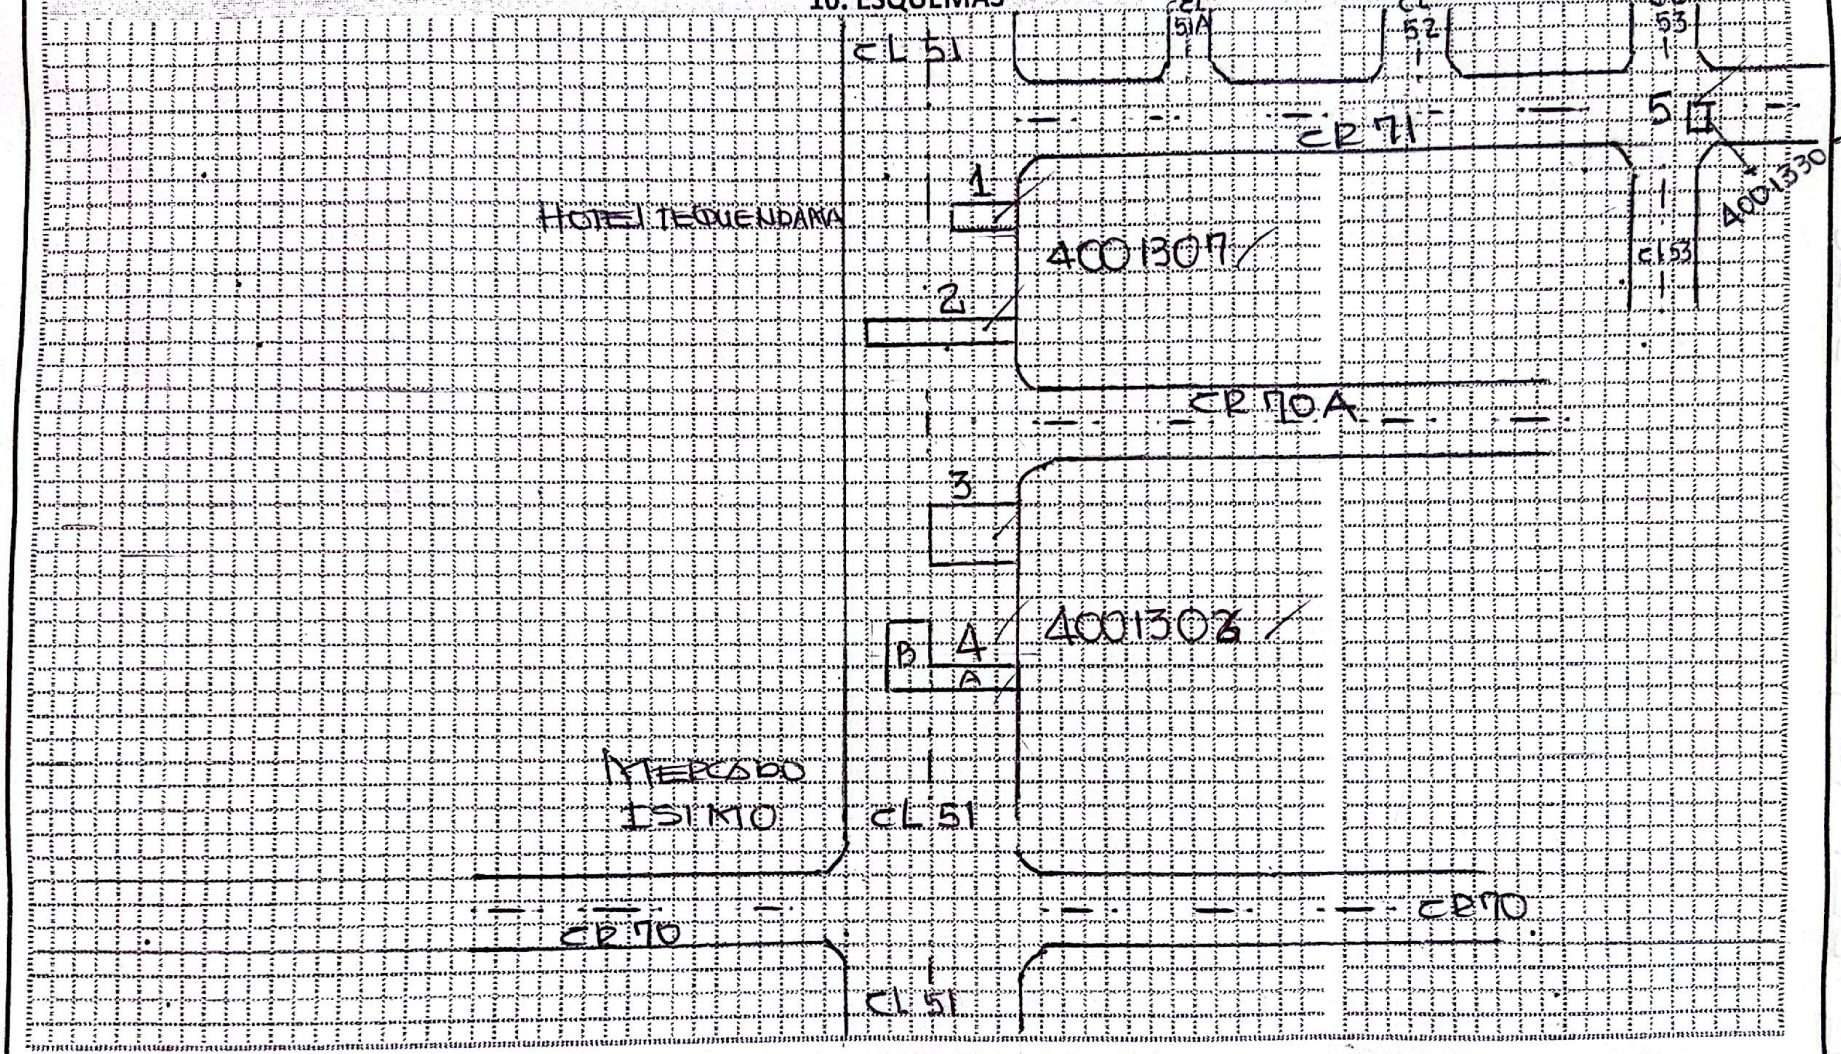

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL.	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,08 TON	CANTIDAD:
BARRIO	CUARTA BRIGADA	DIRECCIÓN	CL 51 CR 70A-08	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 18 FEBRERO 2026

REMISION DE MATERIALES 20260218 00:07
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA 335954
PLACA: TJZ305
CONDUCTOR: YOBANY CASTAÑO

PRODUCTO:14524-P Mezcla asfaltica MD
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:19.090,00

ENTRADA: 18 feb 2026 - 00:07 a.
SALIDA: 18 feb 2026 - 00:07 a.
TEMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LÓPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

ESCOMBROS

REMISION DE MATERIALES 20260219 07:04
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA 25437
PLACA: TJZ305
CONDUCTOR: YOBANY CASTAÑO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 19 feb 2026 - 07:20 a.
SALIDA: 19 feb 2026 - 07:20 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LÓPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso Bruto18270
Peso Tara8000
Peso neto10270

Powered by CamScanner
