PENDIENTE RECIBO FISICO DE ESCOMBROS

| FECHA (D/M/A): 20 FEBRERO 2026 | BITACORA DE OBRA |
|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): | Mantenimiento puntual |
| RANGO: 1 | CANTIDAD: 10.09 TON |
| ZONA 4 | FRENTE DE TRABAJO: 9 |
| COMUNA 11 | |
| BARRIO CARLOS E RESTREPO | |

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

**2. DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | CONTRATO No. 4600105052 DE 2025 |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | CONTRATO No. 4600105322 DE 2025 |

| HORARIO DE LABORES: | JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: |
|---|---|
| INICIO : 7:00 AM | — |
| TERMINACIÓN: 4:30 pm | |

| 3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO: | |
|---|---|
| MAÑANA | SOLEADO |
| TARDE | SOLEADO |

**4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES**

- SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN LOS BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN
- IMPRIMACION DE BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA TJI 305, CON 10.09 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIPO, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTOS A LAS 9:30AM.
- CHEQUEO DE TEMPERATURA. 140°
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS
- RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

**5. VISITANTES**

| | |
|---|---|
| | |

**6. FIRMAS**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Wilson Lara<br>Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | MARTHA LOPEZ<br>Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: JUAN DAVID RODRIGUEZ<br>Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | NOMBRE: JOSE LUIS GUZMAN A<br>Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

PENDIENTE RECIBO FÍSICO DE ESCOMBROS

FECHA (D/M/A): 20 FEBRERO 2026

**BITACORA DE OBRA**

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): | Mantenimiento puntual |
| RANGO: 1 | CANTIDAD: 10.09 TON |
| ZONA | 4 |
| COMUNA | 11 |
| BARRIO | CARLOS E RESTREPO |
| FRENTE DE TRABAJO: | 9 |

## 2. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | CONTRATO No. 4600105052 DE 2025 |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | CONTRATO No. 4600105322 DE 2025 |

| | |
|---|---|
| HORARIO DE LABORES: | JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: |
| INICIO : 7:00 AM | — |
| TERMINACIÓN: 4:30 PM | |

## 3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

| | |
|---|---|
| MAÑANA | SOLEADO |
| TARDE | SOLEADO |

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

.SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
.CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS.
.MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN LOS BACHES IDENTIFICADOS.
.ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN
.IMPRIMACION DE BACHES.
.LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA JJZ 305, CON 10.09 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 9:30AM.
.CHEQUEO DE TEMPERATURA. 140°
.EXTENSIÓN DE MEZCLA
.NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS
.RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
.RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

## 5. VISITANTES

## 6. FIRMAS

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Wilson Pena | MARTHA LOPEZ |
| Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: JUAN DAVID RODRIGUEZ | NOMBRE: JOSE LUIS GUZMAN A |
| Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

FECHA (D/M/A): 20 FEBRERO 2026

## 7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

| No | CARGO | NOMBRE COMPLETO | ASISTENCIA | | EMPRESA DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Si | No | |
| 1 | Tecnólogo/Ingeniero | WILSON SERNA | X | | |
| 2 | Encargado | | | | |
| 3 | Liguero | | | | |
| 4 | Rastrillero | JOHAN STIVEN QUINTERO | X | | |
| 5 | Rastrillero | | | | |
| 6 | Ayudante | YAIR ANTONIO ASPRILLA | X | | |
| 7 | Ayudante | ALAIN DE JESÚS JULIO GARCIA | X | | |
| 8 | Ayudante | LUIS CARLOS MONSALVE | X | | |
| 9 | Ayudante | SANTIAGO MUÑOZ | X | | |
| 10 | Ayudante | CORNADO MOLINA. | X | | |
| 11 | Ayudante | | | | |
| 12 | Ayudante | | | | |
| 13 | Ayudante | | | | |
| 14 | Ayudante | | | | |
| 15 | Ayudante | | | | |
| 16 | Operador Rodillo manual | NELSON SERNA | X | | |
| 17 | Operador compresor | JAVIER RAMIREZ | X | | |
| 18 | Operador fresadora | | | | |
| 19 | Operador finisher | | | | |
| 20 | Operador Retroexcavadora | | | | |
| 21 | Operador Vibrocompactador | | | | |
| 22 | Operador Compactador llantas | | | | |
| 23 | Operador Cortador Asfalto | | | | |
| 24 | Operador Equipo Imprimación | | | | |
| 25 | Operador Mini cargador | | | | |
| 26 | Operador Barredora | | | | |
| 27 | Coductor Carrotanque | | | | |
| 28 | Conductor Camión | WALTER MUNOZ | X | | |
| 29 | Conductor Volqueta(s) | GIOVANNY CASTAÑO | X | | |
| | | PABLO AGUIRRE | X | | |
| | | JULIANA DIAZ | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO) | OPERACIÓN | | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Si | No | |
| 1 | Rodillo manual | EA 330 | X | | |
| 2 | Compresor | IRSOURCE PLUS | X | | |
| 3 | Fresadora | | | | |
| 4 | Finisher | | | | |
| 5 | Retroexcavadora | | | | |
| 6 | Vibrocompactador | | | | |
| 7 | Compactador llantas | | | | |
| 8 | Cortador Asfalto | | | | |
| 9 | Equipo Imprimación | Marmita | X | | |
| 10 | Placa vibratoria | FECON | X | | |
| 11 | Soplador | | | | |
| 12 | Mini cargador | | | | |
| 13 | Barredora | | | | |
| 14 | Carrotanque | | | | |
| 15 | Camión | GTX043 | X | | |
| 16 | Volqueta(s) | TJE305 | X | | |
| | | Unidad sanitaria | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FECHA (D/M/A): 20 FEBRERO 2026

## 9. CALCULO DE CANTIDADES

| SEGMENTO | CONSECUTIVO HUECOS MED | FIGURA No. | DIRECCIÓN | DIMENSIONES L (m) | DIMENSIONES A (m) | DIMENSIONES e (m) | Area (m2) | Vol (m3) | Ton (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001304 | 166998 | 1 | CL51CR67B-35 | 2,59 | 1.45 | 0.14 | 3,73 | 0,52 | 1.25 |
| 4001304 | 166997 | 2 | CL51 CR67B-53 | 1.65 | 1.70 | 0.14 | 2.81 | 0,39 | 0.94 |
| 4001304 | 167000 | 3 | CL51 CR67B-56 | 1.30 | 1.08 | 0.11 | 1.40 | 0.15 | 0,36 |
| 4001304 | 167001 | 4 | CL51 CR67B-61 | 8.25 | 1.20 | 0.16 | 9.90 | 1.58 | 3.79 |
| 4001304 | 167002 | 5 | CL51CR67B-84 | 3,40 | 0,82 | 0.15 | 2,79 | 0,42 | 1,01 |
| 4001304 | 167003 | 6 | CL51 CR67B-105 | 1.85 | 1.15 | 0.15 | 2.13 | 0,32 | 0,77 |
| 4001304 | 167004 | 7 | CL51CR67B-124 | 3.86 | 1:41 | 0.15 | 5.44 | 0,82 | 1.97 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 28.20 | 4.20 | 10.09 |

### MEZCLA ASFALTICA


| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | CANT (TON) | ACUM (TON) | TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 536123 | TJZ305 | 10.09 | | 146 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### BOTADA DE ESCOMBROS

| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | TIPO (DOBLE/SENCILLA) | No VIAJES | SITIO DISPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 25629 | TJI305 | SENCILLO | 1 | (Parimentos) Procopal |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FECHA (D/M/A): 20 FEBRERO 2026

## 10. ESQUEMAS

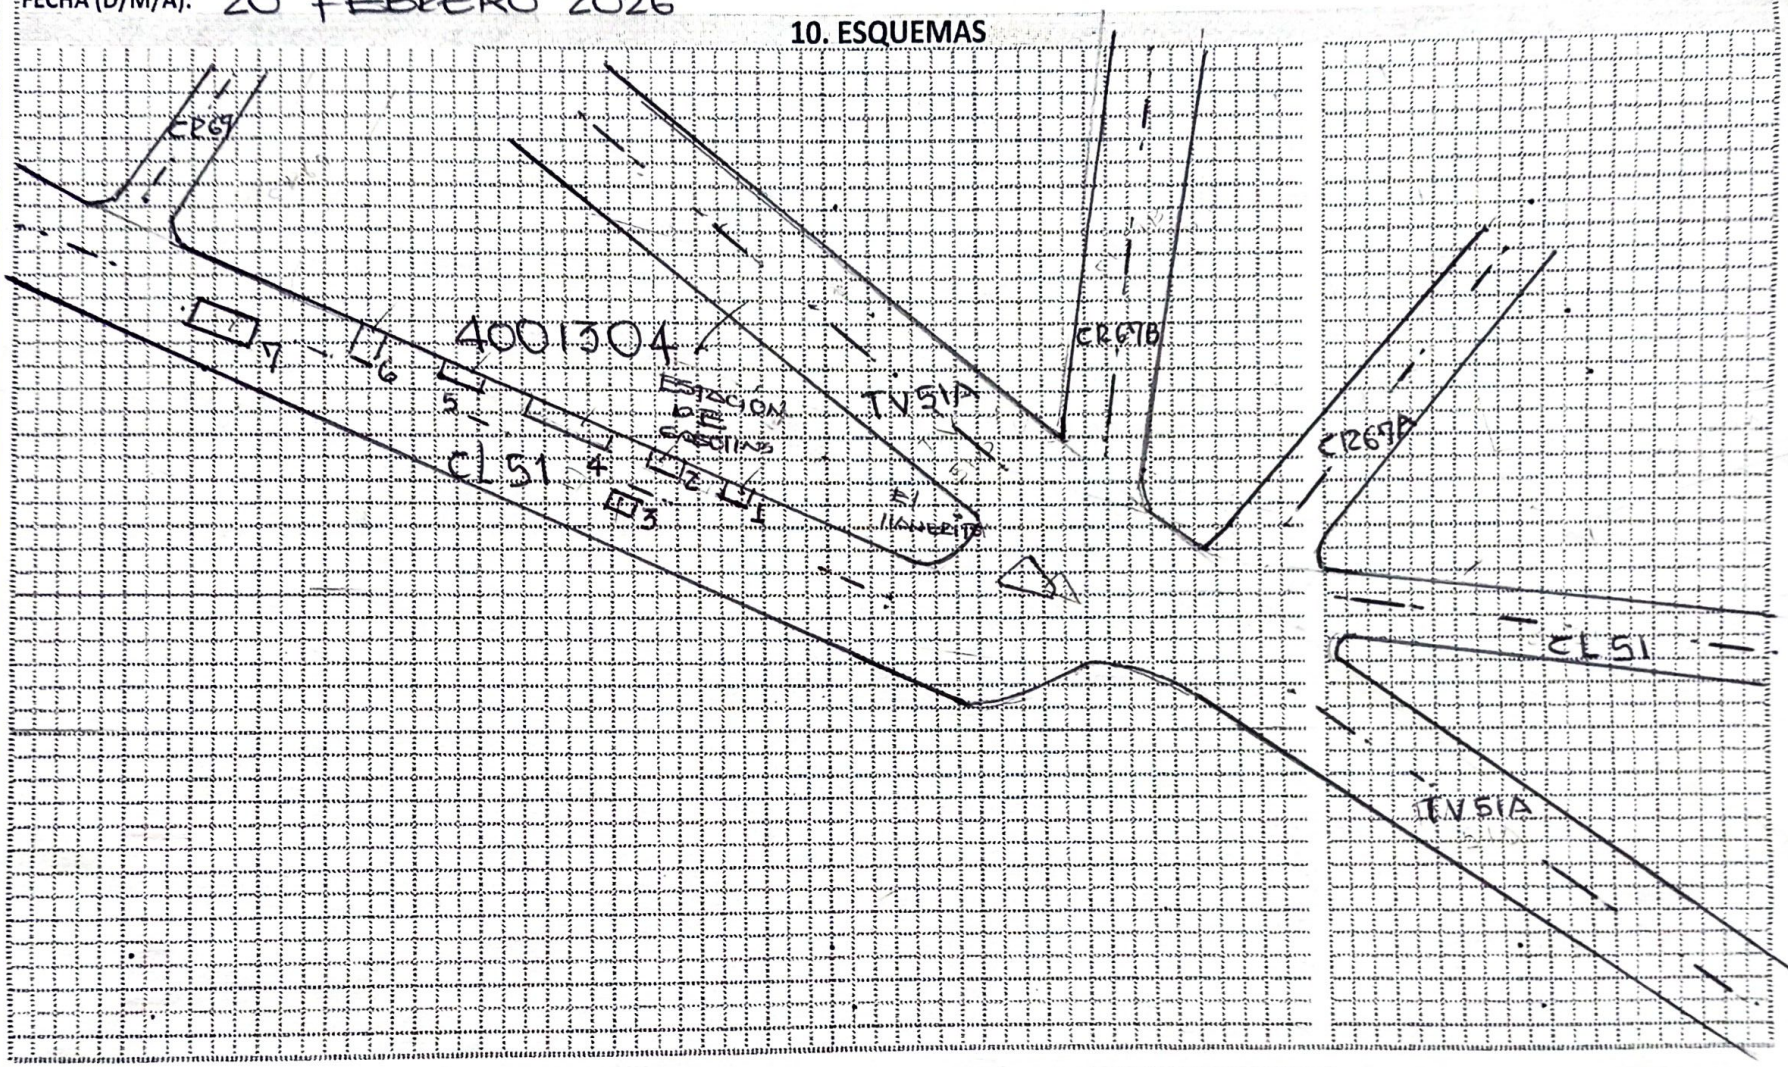


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN: | Mantenimiento puntual | FRENTE | 9 | FRENTE |
| RANGO: | I | CANTIDAD: | 10.09 TON | CANTIDAD: |
| BARRIO | CARLOS E RESTREPO | DIRECCIÓN | CL51CR67B-35 | DIRECCIÓN |

# REMISIONES DEL 20 FEBRERO 2026

REMISION DE MATERIALES -20260220 08:29
PAVIMENTAR S.A
NIT: 900.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536123
PLACA: TIZ305
CONDUCTOR: YOBANY CASTAÑO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDE-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - BAR
CANT. NETA: 10,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V0000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:19.090,00

ENTRADA: 20 Feb 2026 - 08:30 a.
SALIDA: 20 Feb 2026 - 08:30 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

**ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S**
**NIT: 900.243.322-4**

**SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS** **Nº 25629**

PROVEEDOR: Val Mat
VALE POR UN VIAJE: Excelso
20-2-26
PLACA No: TSL 305 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: PROCOPAL S.A
RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

**NOTA IMPORTANTE**
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

**Firma Autorizada**

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
