FECHA D/M/A: 13-02-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	N.A.
CANTIDAD:	
ZONA	1
COMUNA	01 – Popular
BARRIO	0103, Popular
FRENTE DE TRABAJO:	10

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 a.m.
TERMINACIÓN: 5:00 p.m.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: nublada, seca
TARDE: lluviosa

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- El sitio cuenta con cerramiento con balizas, malla naranja, valla tijera.
- El día de hoy se tiene programada la instalación de adoquines en el carril derecho frente a la CL 110A.
- Desmonte de adoquín para instalación de cordón jardinero. Se inicia excavación, a los 30 cm de profundidad se encuentra carpeta asfáltica (se demuele con martillo demoledor) y un atraque en concreto de tubería, el cual no se va a demoler para evitar daños; por tal razón el tramo de cordón que se instale allí será recortado en altura.
- La reinstalación de adoquín se encuentra suspendida en espera de suministro de arena de pega.

12:40 – 12:55 lluvias fuertes
3:15 – 4:30 lluvias fuertes

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: JAIME NACA Vo. Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Natalia Marín Vélez. Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Aguña Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACI
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	~~Rastrillero~~ Oficial	Juan Carlos Briceño	X		
5	~~Rastrillero~~ Oficial	Jorge Salas	X		
6	Ayudante	Juan Camilo Castillo	X		
7	Ayudante	Alex Martinez Hoyos	X		
8	Ayudante	Andres Beltrán Hernández	X		
9	Ayudante	Jesús David Lasso	X		
10	Ayudante Aux tránsito	Erestevana Bello Velasquez	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	~~Rodillo manual~~ Cortadora	Cortadora de disco	X		
2	~~Compresor~~ Planta eléctrica	Planta eléctrica	X		
3	~~Fresadora~~ Martillo demoledor	Martillo demoledor	X		
4	~~Finisher~~ Vibro comp. placa	Vibrocompactador de placa	X		
5	~~Retroexcavadora~~ Rana	Rana	X		
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001842	N.A.	1.4.5	CR42B CL110A-20	4.3	0.5		2.15		DEMOL CARPETA ASFALTICA.
4001842	N.A.	2.1.7.	CR42B CL 110A-20	4.9	0.5		2.45		DESMONTE ADOQUIN
4001842	N.A.	2.1.8	CR42B CL110A-20	4.9	0.3		1.47		INSTALADOQUIN
4001842	N.A.	2.2.1	CR42B CL 110A -20	4.9	0.5	0.3		0.74	EXCAV. BRECHA CORDON
4001842	N.A.	3.2.5	CR42B CL110A-20	4.9					INST. CORDON JARDINERO
4001842	N.A.	3.2.13	CR42B CL 110A-20	4.3	0.3	0.32		0.41	CONCRETO ATRAQUE CORDON
4001842	N.A.	3.2.13	CR 42B CL 110A-20	0.6	0.17	0.3	.	0.03	CONCRETO ATRAQUE CORDON
4001842	N.A	2.1.7	CR 42 B CL 110A-20				-2.45	se reporta en 2.1.8.	
4001842	N.A.	2.2.4	CR 42 B CL 110 A -20	12,6	0,2	0,07		0.18	SUM, TTE, INST. BASE.
4001842	N.A.	2.4.5	CR 42 B CL 110A - 20	1,68	0,25			0.42	SUM, TTE, INST. ADOQUIN
4001842	N.A.	3.2.5	CR 42 B CL 110A - 20	- 2.81					INSTAL. CORDON
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13 - 02 - 2026

10. ESQUEMAS

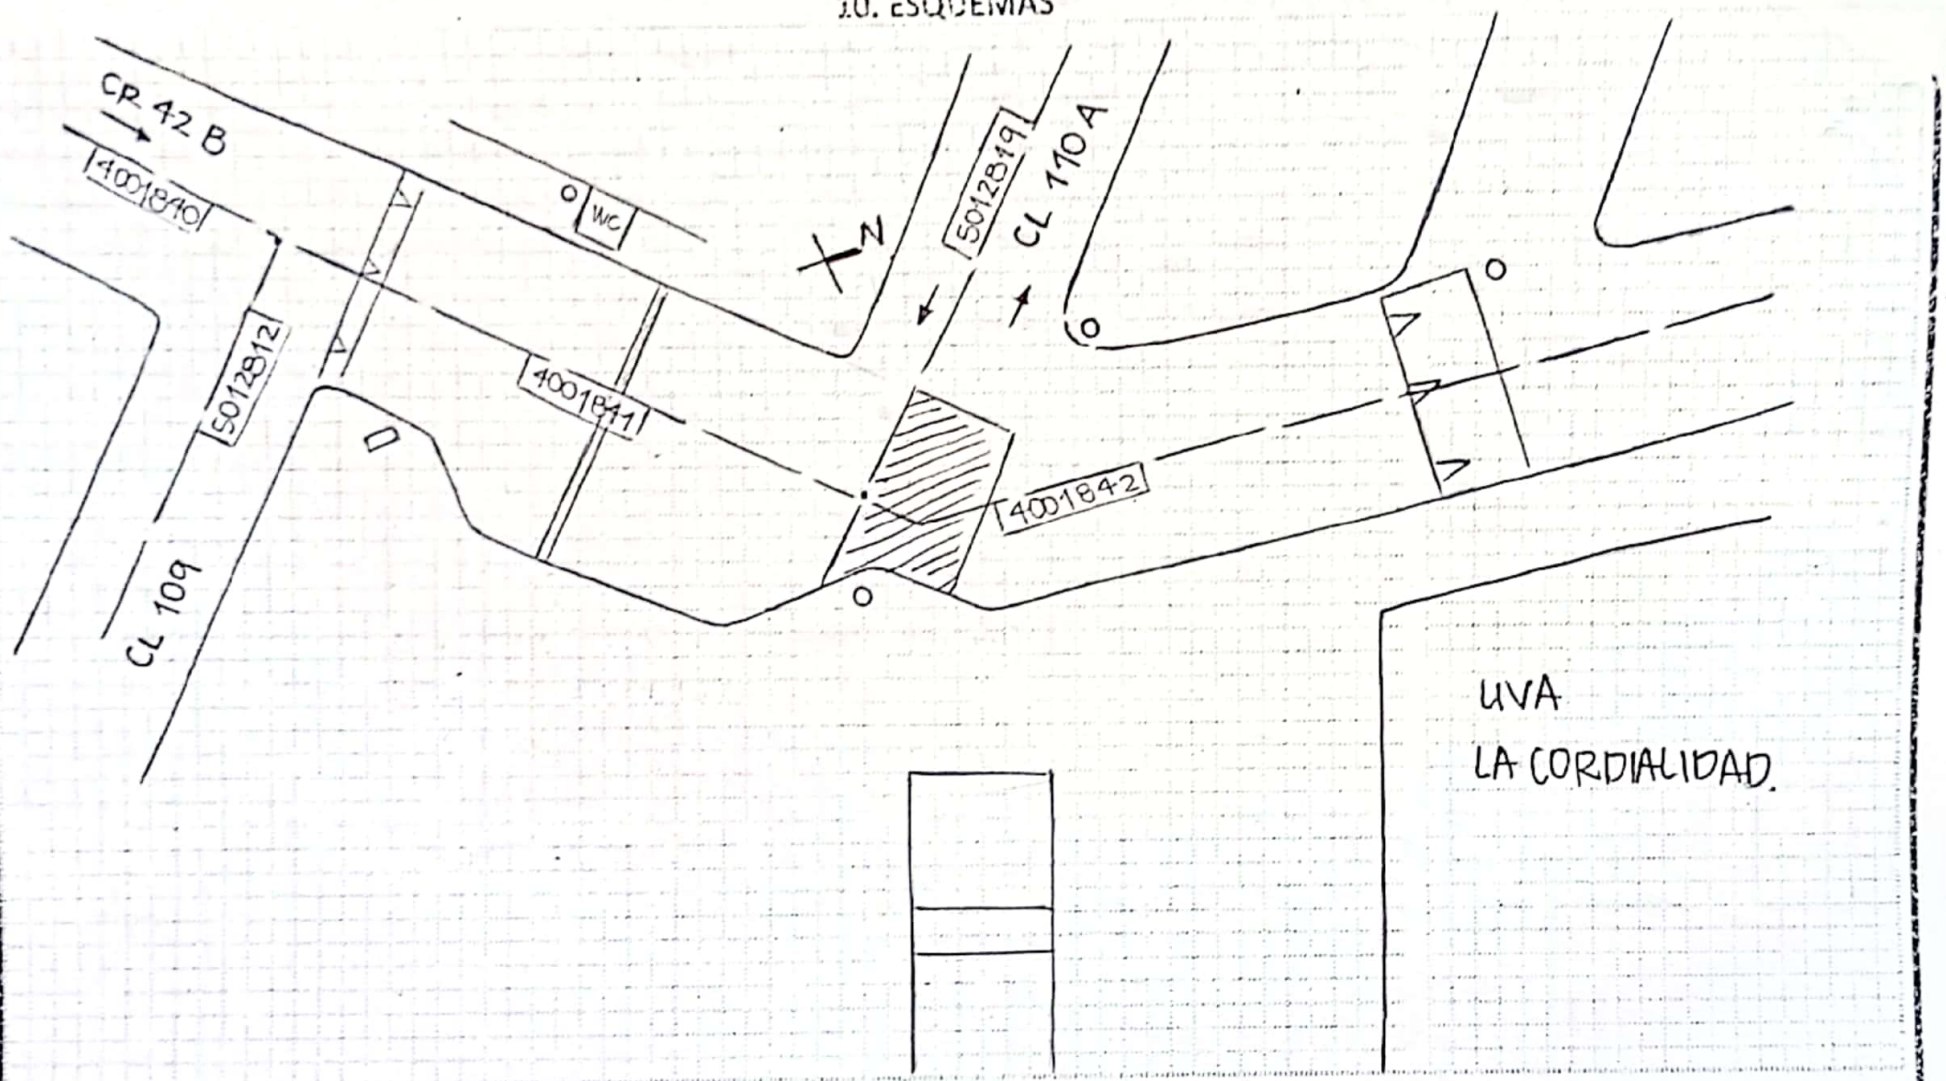

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:	N A.	CANTIDAD:	
BARRIO	Popular	DIRECCIÓN	CR 42 B CL 110 A - 20

Powered by CamScanner
