FECHA (D/M/A): 18-02-2026.

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras complementarias.
RANGO:	NA.
CANTIDAD:	
ZONA	05
COMUNA	14 - El Poblado
BARRIO	1409, El Tesoro
FRENTE DE TRABAJO:	10.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m.	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	nublado, seco
TARDE	nublado, lloviznas.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- A las 7:00 a.m se presenta personal en la obra, pero las actividades inician hacia las 11:00 a.m que llega el camión con herramientas, equipos y señalización.
- Se realiza cerramiento con balizas, malla naranja y valla tijera. Se instala señalización vertical. Se barre parte superior del sumidero y se instala malla naranja para protección.
- Se inicia retiro (demolición) de placas laterales en concreto de la cuneta, así como la demolición del fondo con el martillo demoledor, se recibe baño móvil, excavación
- Se recoge material RCD en costales
- Se realiza limpieza de sumidero cerca a la urb. Málaga 1; se instala malla naranja para protección.
- Se presentan lloviznas al final de la tarde.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	Natalia Marín Vélez
Vo Bo TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo Bo TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: David Arenas G.	NOMBRE: Edgar Rojas Lopez
Vo Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	~~Rastrillero~~ Oficial	Jorge Salas	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Alex Martinez Hoyos ①	X		
7	Ayudante	Andrés Beltrán Hernández	X		
8	Ayudante	Jesús David Lasso	X		
9	Ayudante Aux. tránsito	Luz Mery Cordero	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
		① Se dirige hacia otro frente, debido a que no se tienen herramientas ni equipos			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	~~Rodillo manual~~ Planta eléctrica	Planta eléctrica	X		
2	~~Compresor~~ Martillo demoledor	Martillo demoledor	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-2026.

8. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
30001192	N.A.	2.1.5	CL 6A CR 29	8.3					CERRAM. VIAL MALLA - BALIZA
30001192	N.A.	2.1.6	CL 6A CR 29	2 x 6.10	0.40	0.12		0.59	DEMOL. PAREDES CUNETA.
30001192	N.A.	2.1.6	CL 6A CR 29	6.10	0.90	0.12		0.66	DEMOL. FONDO CUNETA.
30001192	N.A	3.1.3	CL 6A CR 29	1 un.					DESOBS. Y LIMP. SUMIDERO
30002201	N.A.	3.1.3.	CL 6A CR 29	1 un	cerca a Urb. Málaga		1.		DESOBS Y LIMP. SUMIDERO
30001192	N.A.	2.2.1	CL 6A CR 29	6.10	0.90	0.15		0.82	EXCAV. MANUAL 0-2 m. CUNETA.
30001192	N.A.	2.1.6.	CL 6A CR 29	0.20	0.20	0.05		0.002	DEMOL. ATRAQUE TUBERIA EXIST.
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-2026

10. ESQUEMAS

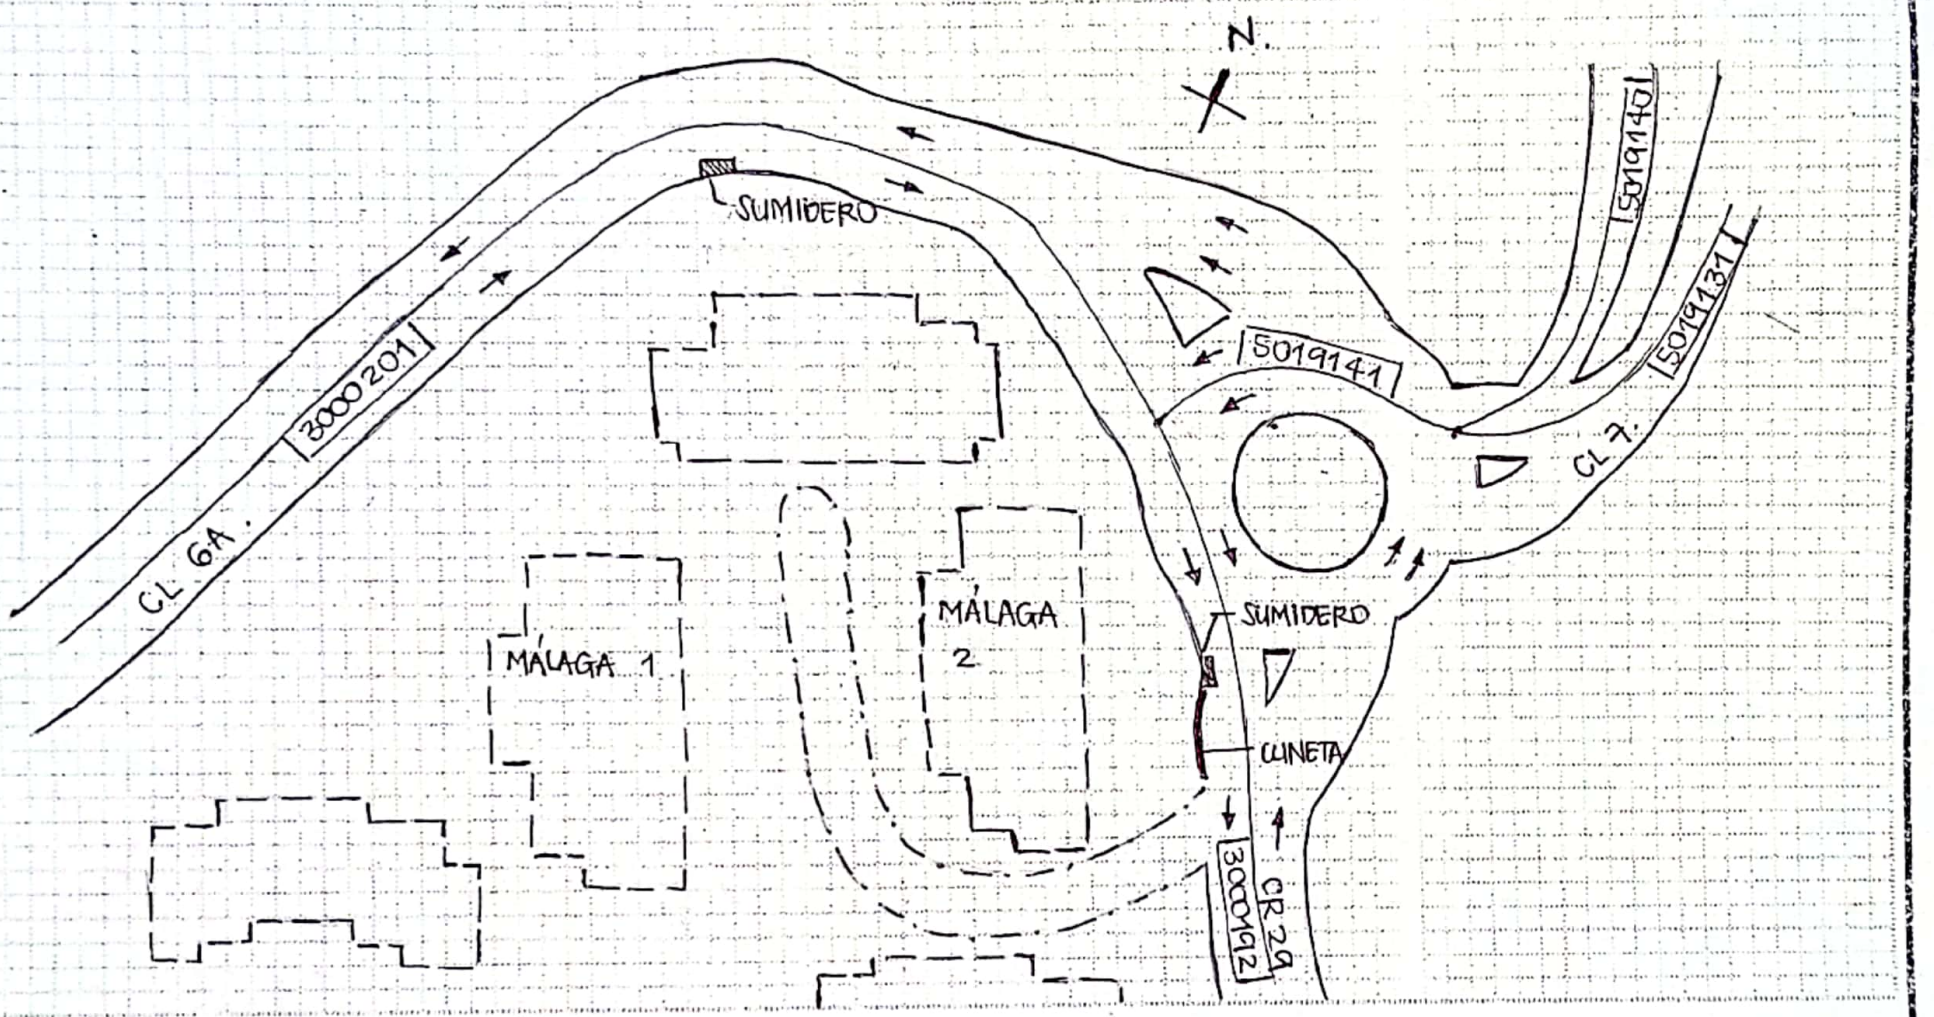

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	
BARRIO	El Tesoro	DIRECCIÓN	CL GA CR 29.

Powered by CamScanner
