FECHA (D/M/A): 19-02-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras complementarias
RANGO: N.A.	CANTIDAD:
ZONA: 5	FRENTE DE TRABAJO: 10
COMUNA: 14, El Poblado	
BARRIO: 1409, El Tesoro	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m.	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: nublado, seco
	TARDE: nublado, seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza cerramiento con malla naranja, balizas. Valla fijera
- Suministro tubería Novafort ϕ12" L:6.0m + L:0.90 m.
- Se realiza corte en carpeta asfáltica para alinear la cuneta nueva.
- Se realiza limpieza y mantenimiento de baño
- Se realiza demolición de sumidero (a realzar), excavación para sumidero y cuneta.
- Se realiza corte y aplicación de cicatrizante de raíces, en raíces secundarias

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Damintok Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Natalia Marín Vélez Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Duque G Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Sí	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	~~Rastrillero~~ Oficial	Jorge Salas	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Alex Martinez Hoyos	X		
7	Ayudante	Andrés Beltrán Hernández	X		
8	Ayudante	Jesús David Lasso	X		
9	Ayudante Aux. transito	Luz Mery Cordero	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Sí	No	
1	~~Rodillo manual~~ Planta eléctra	Planta eléctrica	X		
2	~~Compresor~~ Martillo demoledor	Martillo demoledor	X		
3	~~Fresadora~~ Cortadora	Cortadora de disco	X		
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000 192	N.A.	1.4.6	CL GA CR 29	10.4					CORTE CARPETA ASFALTICA.
3000192	N.A.	1.4.5	CL GA CR 29	6.5	0.2		1.3		DEMOL CARPETA ASFALTICA.
3000 192	N.A.	2.1.6	CL GA CR 29	3.0	0.83	0.10		0.25	DEMOL CONCRETO CUNETA (SEC.)
3000 192	N.A.	2.2.1	CL GA CR 29	3.0	0.83	0.15		0.37	EXCAV. MANUAL 0-2 m CUNETA.
3000 192	N.A.	2.2.1	CL GA CR 29	1.1	0.80	0.25		0.22	EXCAV. MANUAL 0-2 m SUMIDERO
3000192	N.A.	1.4.6.	CL GA CR 29	1.5					CORTE CARPETA ASFALTICA
3000 192	N.A.	3.1.4	CL GA CR 29	1 un.					DEMOL. SUMIDERO
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

10. ESQUEMAS

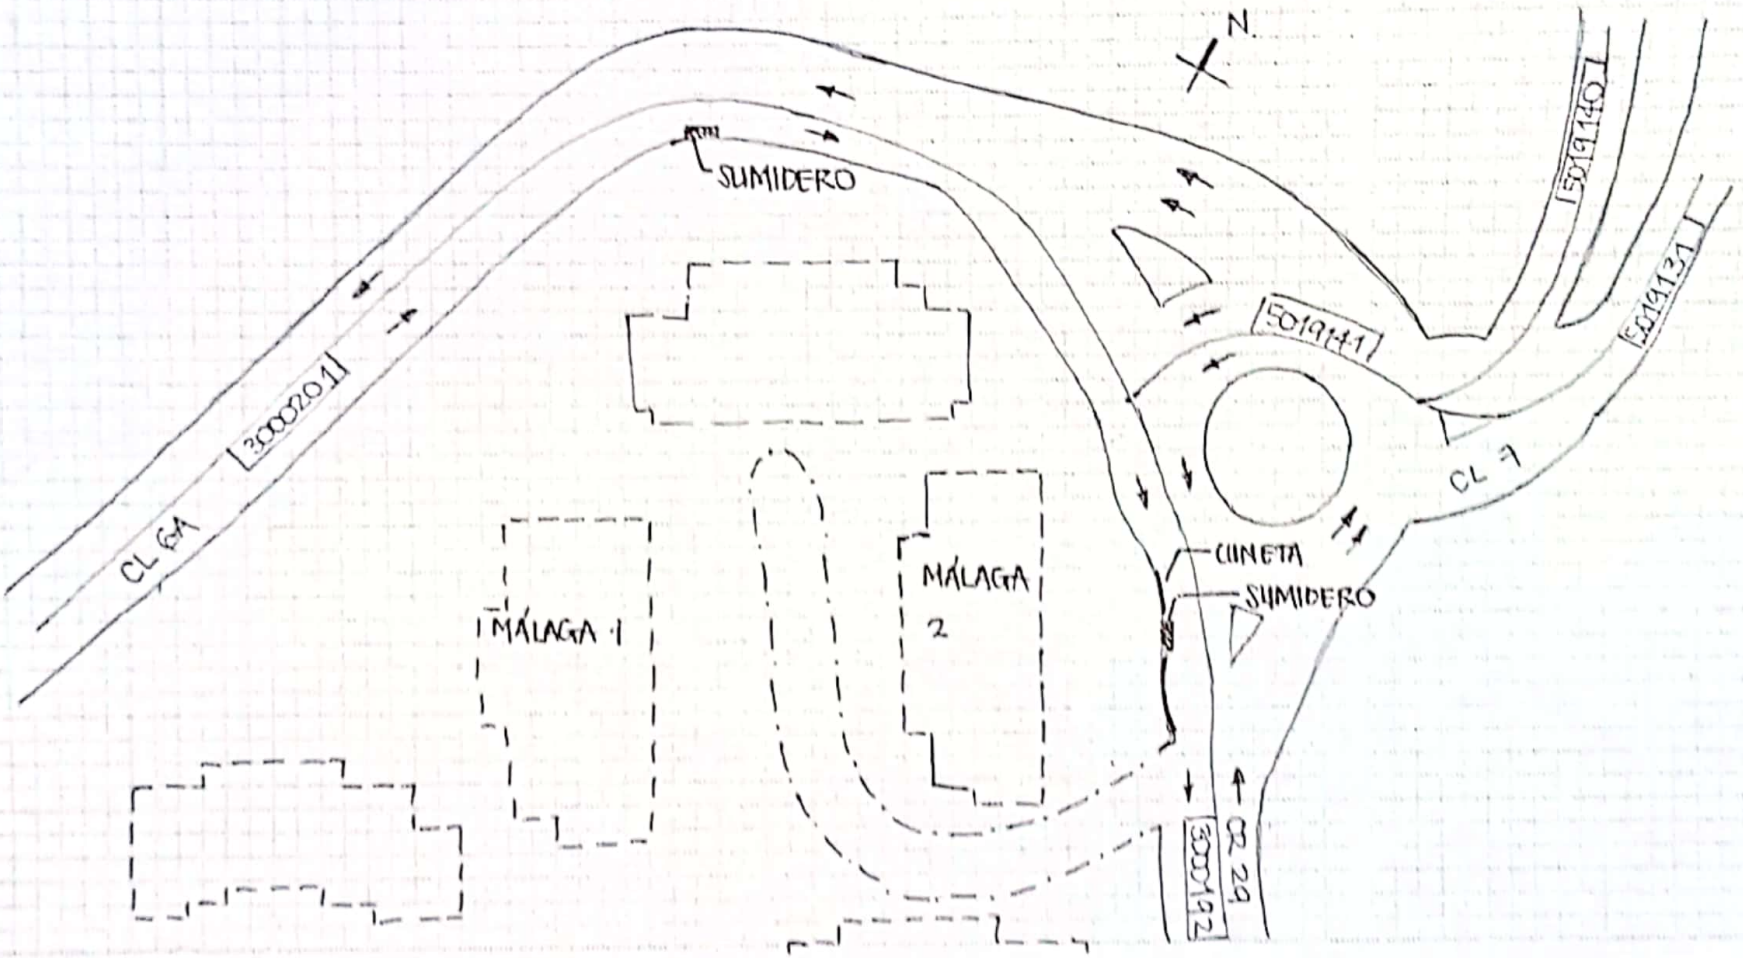

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	
BARRIO	El Tesoro	DIRECCIÓN	CL 6A CR 29

Powered by CamScanner
