FECHA (D/M/A): 20 - 02 - 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO: N.A.	CANTIDAD:
ZONA	05
COMUNA	14 - El Poblado
BARRIO	1409, El Tesoro
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m.	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: nublado, seco
	TARDE: nublado, seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- El sitio cuenta con cerramiento vial en malla naranja y balizas. Señalización vertical.
- Se realiza corte y demolición de andén en concreto
- Se instala tubería Novafort ϕ 12", cama en triturado. Se realiza atraque en limo y en concreto.
- Se realiza armado de acero de refuerzo para sumidero
- Se realiza corte en carpeta asfáltica.
- Se instala formaleta para sumidero y se realiza vaciado de fondo y paredes
- Se realiza excavación para andén

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jamilton	Natalia Marín Vélez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado Maestro	Jorge Monsalve	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero Oficial	Jorge Salas	X		
5	Rastrillero- Oficial	Yohn Jayro Orrego	X		
6	Ayudante	Alex Martínez Anyes	X		
7	Ayudante	Andrés Beltrán Hernández	X		
8	Ayudante	Jesús David Lasso	X		
9	Ayudante Aux. tránsito	Luz Mery Cordero	X		
10	Ayudante	José David Gil	X		
11	Ayudante	Manuel Antonio Ruiz	X		
12	Ayudante Aux. tránsito	Mariana Mosquera	X		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual Planta eléctrica	Planta eléctrica	X		
2	Compresor Martillo demoledor	Martillo demoledor	X		
3	Fresadora Cortadora	Cortadora de disco	X		
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000192	N.A.	2.3.1	CL GA CR 29	7 ϕ 1/2" L: 1.80 m		acero de refuerzo sumidero			12.55
3000192	N.A.	2.3.1	CL GA CR 29	5 ϕ 1/2" L: 2.10 m		acero de refuerzo sumidero			10.46
3000192	N.A.	2.3.1	CL GA CR 29	5 EST ϕ 1/2" L: 3.35 m		acero de refuerzo sumidero			16.68
3000192	N.A.	3.4.1	CL GA CR 29	1 UN.					CONSTRUCCION SUMIDERO.
3000192	N.A.	3.2.13	CL GA CR 29	6.0	0.60	0.10		0.36	CONCRETO 21 MPa ATRAQUE TUBO
3000192	N.A.	3.2.13	CL GA CR 29	6.0	0.30	0.05		0.09	CONCRETO 21 MPa ATRAQUE TUBO
3000192	N.A.	3.2.13	CL GA CR 29	0.50	0.60	0.10		0.03	CONCRETO 21 MPa ATRAQUE TUBO
3000192	N.A.	3.2.13	CL GA CR 29	0.50	0.30	0.30		0.045	CONCRETO 21 MPa ATRAQUE TUBO
3000192	N.A.	1.4.6	CL GA CR 29	1.32					CORTE CARPETA ASFALTICA.
3000192	N.A.	1.4.5	CL GA CR 29	0.91	0.41		0.37		DEMOL. CARPETA ASFALTICA.
3000192	N.A.	2.2.6	CL GA CR 29	6.1	0.90	0.10		0.55	RECUP. Y PERFIL. SUBRASANTE.
3000192	N.A.	2.2.6	CL GA CR 29	3.0	0.83	0.10		0.25	RECUP. Y PERFIL. SUBRASANTE.
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-02-2026

10. ESQUEMAS

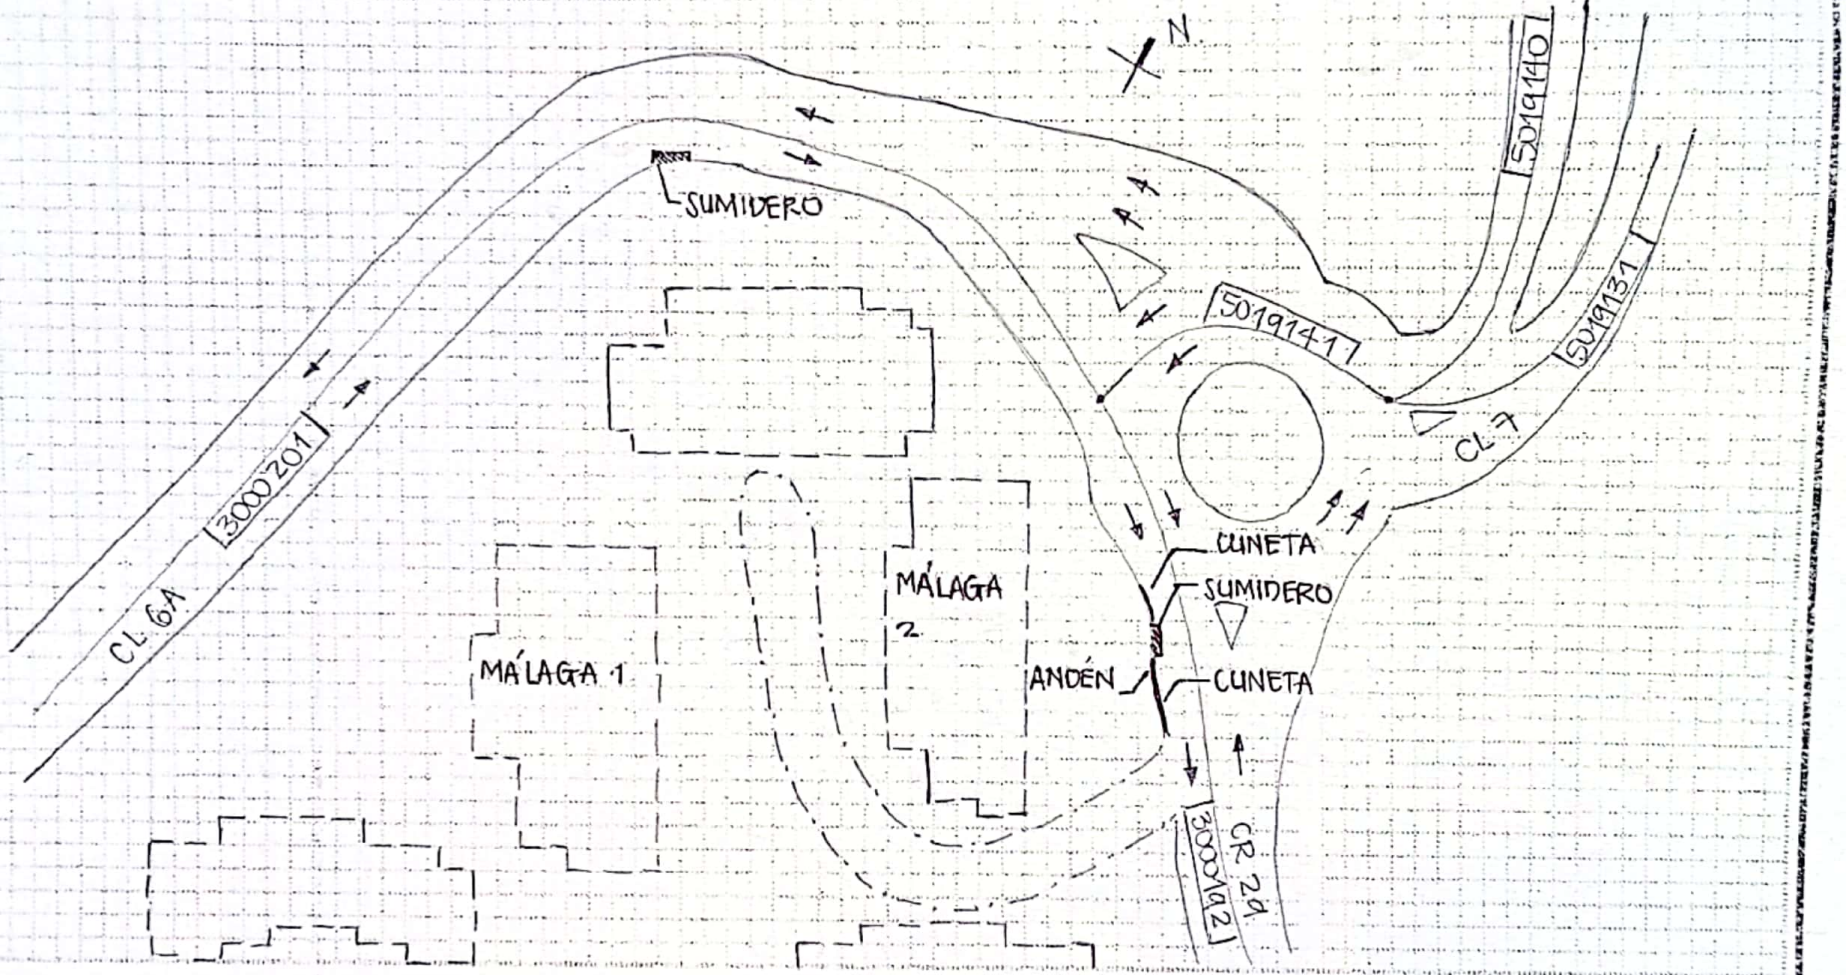

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	
BARRIO	El Tesoro	DIRECCIÓN	CL 6A CR 29

Powered by CamScanner
