FECHA (D/M/A): 21-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO: N.A.	CANTIDAD:
ZONA	05
COMUNA	14 - El Poblado
BARRIO	1409 ; El Tesoro
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO : 7:00 a.m. TERMINACIÓN: 1:00 p.m.	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: nublado, seco TARDE: nublado, lloviznas.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- El sitio cuenta con arramiento en malla naranja y balizas. Señalización vertical
- Se realiza demolición de carpeta asfáltica
- Se realiza suministro de tapa para sumidero tipo B.
- Se realiza suministro de punto ecológico y camilla.
- Se realiza suministro de acero de refuerzo para cordón-cuneta y malla electrosoldada para andén.
- Se realiza armado de acero para cordón-cuneta
- Se arma formaleta para vaciado de andén
- Se instala rejilla de sumidero

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jamin Tom Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Natalia Marín Vélez. Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Bueno G Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-07-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	~~Rastrillero~~ Oficial	Jorge Salas	X		
5	~~Rastrillero~~ Oficial	John Jairo Orrego	X		
6	Ayudante	Alex Martinez Hoyos.	X		
7	Ayudante	Andres Beltran Hernandez	X		
8	Ayudante	Jesus David Lasso	X		
9	Ayudante Aux. tránsito	Luz Mery Cordero	X		
10	Ayudante	Jose David Gil	X		
11	Ayudante	Manuel Antonio Ruiz	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	~~Rodillo manual~~ Planta eléctrica	Planta eléctrica	X		
2	~~Compresor~~ Martillo demoledor	Martillo demoledor	X		
3	~~Fresadora~~ Cortadora	Cortadora	X		
4	~~Finisher~~ Rana	Rana	X		
5	~~Retroexcavadora~~ Concretadora	Concretadora	X		
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-02-2026.

5. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L(m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000192	N.A.	3.1.1.	CL 6A CR 29	7.4	0.80		5.92		DEMOLICIÓN ANDEN EXIST.
3000192	N.A.	2.3.1.	CL 6A CR 29	7.2	5 ϕ 1/2"	acero de refuerzo cuneta ppal.			35,86
3000192	N.A.	2.3.1	CL 6A CR 29	1.15	18 ϕ 3/8"	acero de refuerzo cuneta ppal.			11.53
3000192	N.A.	2.5.7.	CL 6A CR 29	1 UN.					SUM, TTE, INST. REJILLA SUMIDERO
3000192	N.A	2.2.1	CL 6A CR 29	7.4	0.80	0.15		0.89	EXCAV. MANUAL ANDÉN.
3000192	N.A.	2.2.4	CL 6A CR 29	7.40	0.80	0.12		0.71	SUM, TTE, INST. BASE.
3000192	N.A.	2.2.6	CL 6A CR 29	7.40	0.80	0.10		0.59	RECUP Y PERFIL SUBRASANTE.
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-02-2026

10. ESQUEMAS

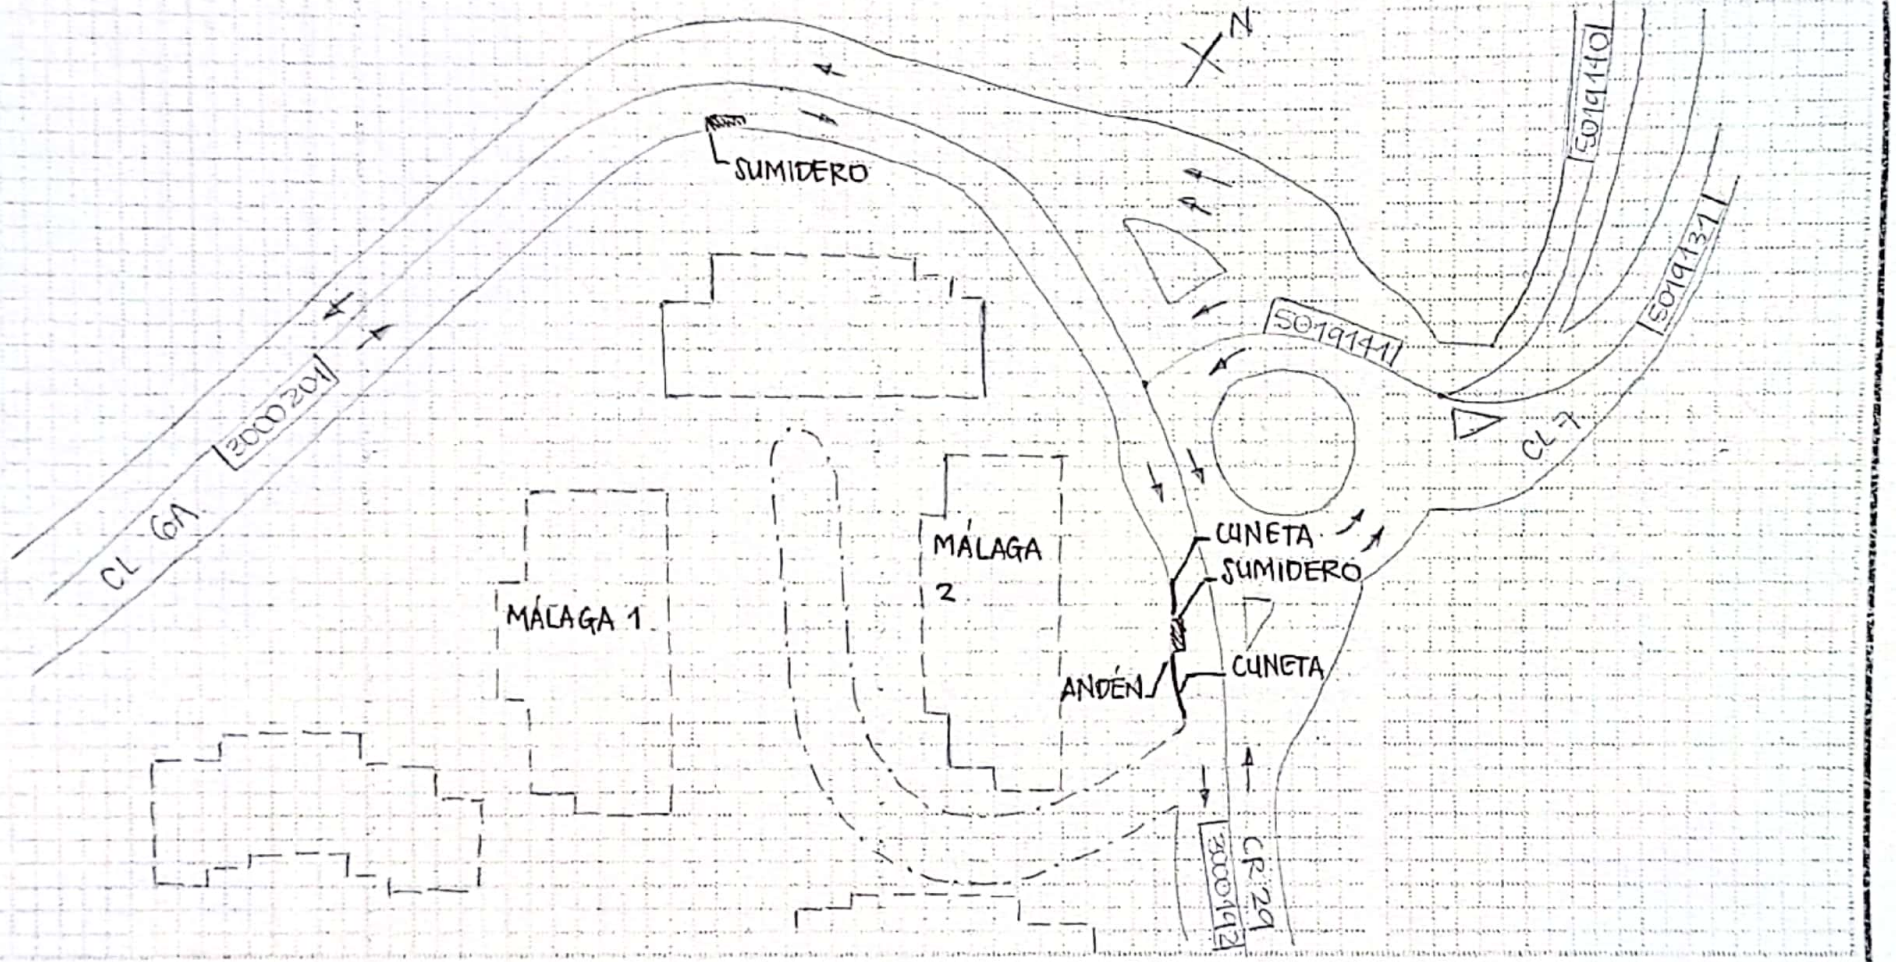

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:	N A.	CANTIDAD:	
BARRIO	El Tesoro	DIRECCIÓN	CL 6A CR 29

Powered by CamScanner
