FECHA (D/M/A): 03-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	36,63 m² Instalación Adoquín
ZONA	3
COMUNA	10 La Candelaria
BARRIO	la Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8.00 P.M	
TERMINACIÓN: 6.00 A.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Comienzan las actividades a las 8:00 p.m.
En el transcurso de la jornada se trabaja sobre el módulo N°3, al cual se le realiza el reemplazo de base y compactación previamente.
Se instala cama de arena (Arena de concreto) y posteriormente se realiza la instalación del adoquín Nuevo (10x20x8). El área total de instalación es de 36,63 m². Posterior a la colocación del adoquín se aplica sello con arena de revogare y esparciendo y confinando la misma con ayuda de la placa vibratoria.
Concluye la jornada con normalidad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jaime Orozco Noreña Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniel Sánchez Vo Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edwin Bolaño Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Samuel Orozco Noriega	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Omar Cárdenas (oficial)	✓		Ingealquipos
8	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		Ingealquipos
9	Ayudante	Emerson Córdoba	✓		Ingealquipos
10	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		Ingealquipos
11	Ayudante	Fraider Gómez	✓		Ingealquipos
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Byama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Voiqueta(s)				
	Planta eléctrica		✓		
	Pulidora		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Instalación Adoquin Item (2.4.5)		C1 50 x Cr 52	11,10	3,30		36,63		
			TOTALES						

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-02-2026

10. ESQUEMAS

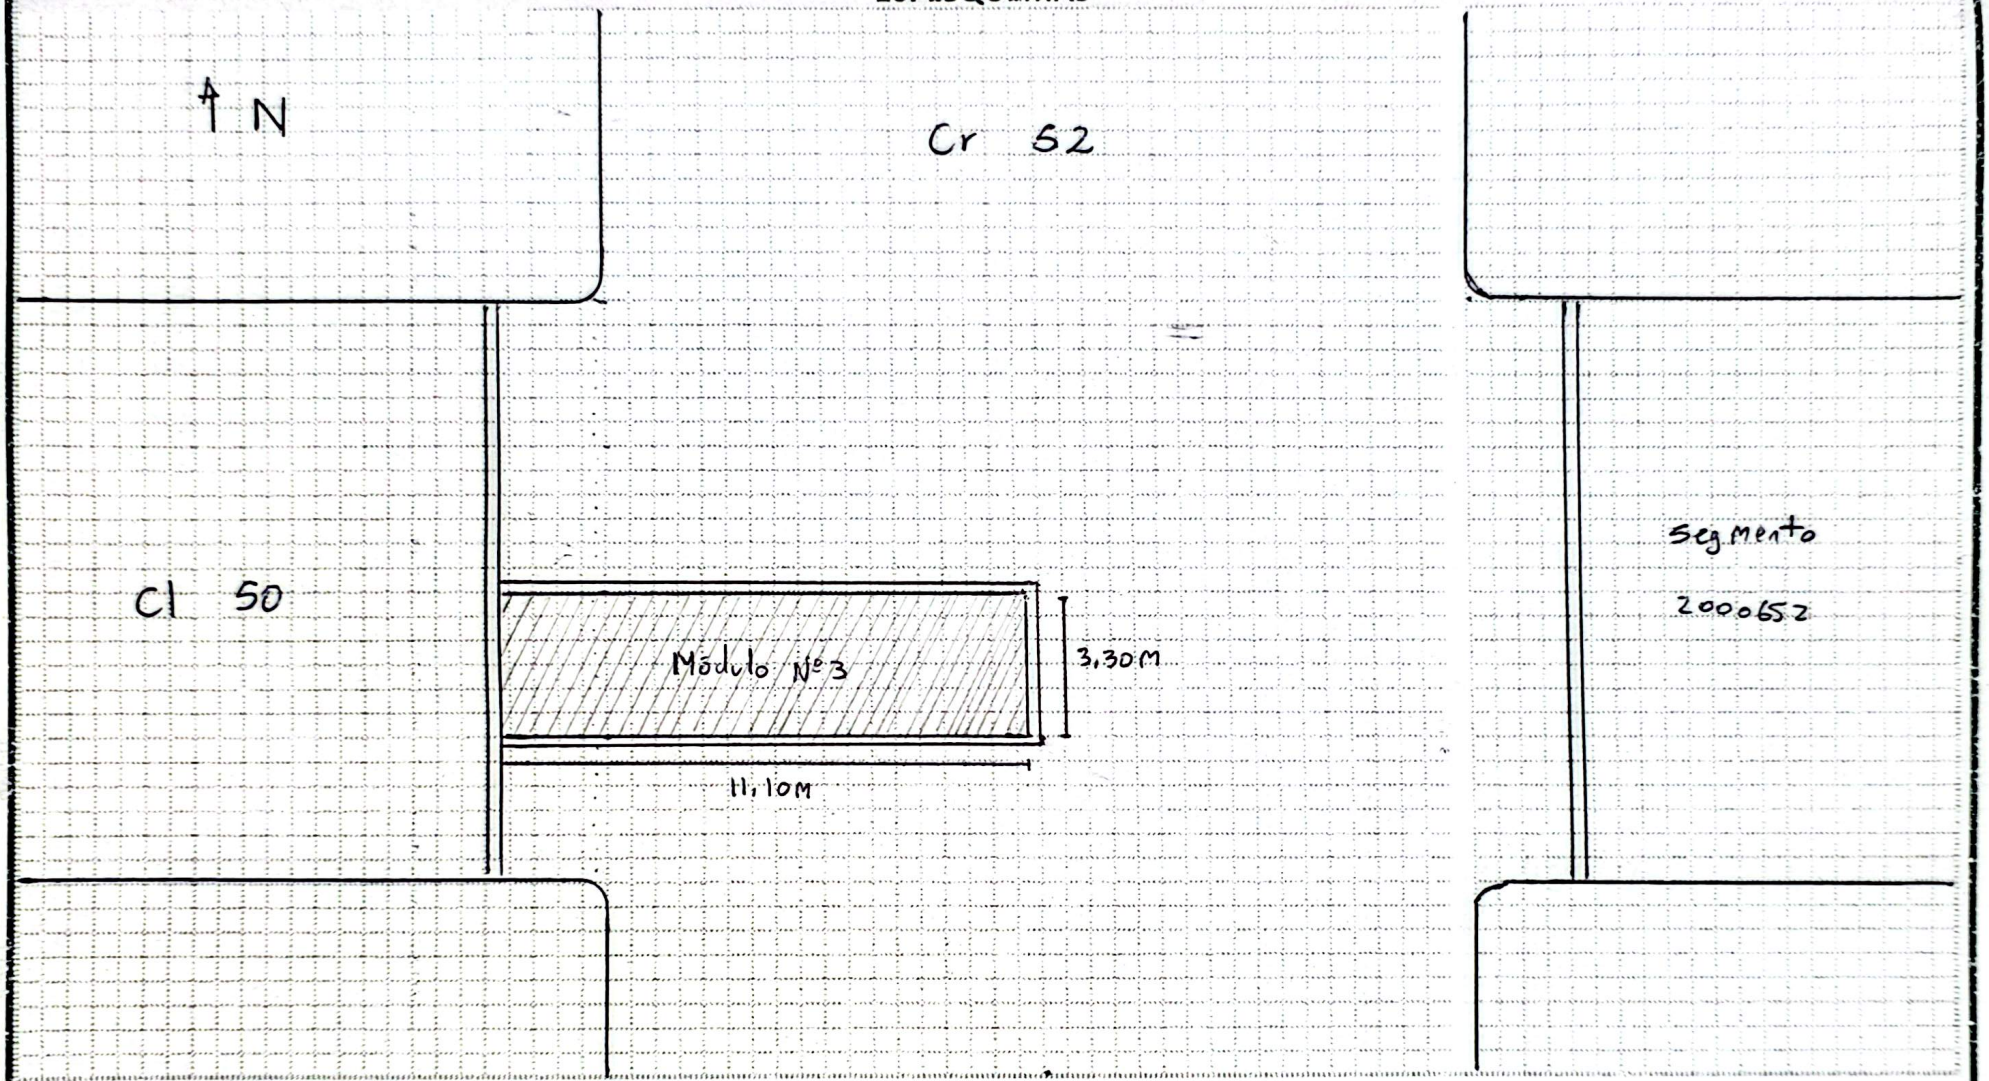

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras complementarias	FRENTE	10.
RANGO:		CANTIDAD:	36,63 m^2 Instalacion Adoquin
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52

Powered by CamScanner
