FECHA (D/M/A): 10 - 02 - 2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	36,63 m² Instalación Adoquín
ZONA	3
COMUNA	10 La Candelaria
BARRIO	La Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	10

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 P.M	
TERMINACIÓN: 6:00 A.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Inicia la jornada a las 8:00 P.M.
Se comienza con la instalación de 36,63 m² de adoquín en el Módulo Nº5. Cabe resaltar que durante el transcurso del día se realizó la prueba de densidad para verificar que el reemplazo de base hubiese quedado debidamente compactada. Dicho ensayo fue aprobatorio.
Simultáneo a la instalación del adoquín, otro grupo de colaboradores realiza mitigación de bache sobre pavimento articulado en Cl 46 x Cr 52, tapando bache con adoquines desmontados sobrantes de la dirección principal. Esta medida es provisional, mientras se realiza intervención en esta zona.
Ademas de lo anterior, se instala concreto reforzado de 28 Mpa en caja de telecomunicaciones ubicada sobre el módulo 2, debido a que el concreto anteriormente instalado falló debido al tráfico masivo. Al final de la jornada se realiza orden y aseo.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Daniel Sánchez
	Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA
	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	
NOMBRE: David Acuña G	
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Omar Cárdenas (oficial)	✓		Ingealquipos
8	Ayudante	Emerson Córdoba	✓		Ingealquipos
9	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		Ingealquipos
10	Ayudante	Frayder Gómez	✓		Ingealquipos
11	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		Ingealquipos
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Juan Guillermo Gaviria	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Tyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Canguro		✓		
	Planta eléctrica		✓		
	Pulidora		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Instalacion Adoquin	(2.4.5)	Cl 50 x Cr 52.	11,10	3,30		36,63		
2000652	Concreto 28 MPa		Cl 50 x Cr 52.	4,16	0,20	0,20		0,17	
2000652	Acero Refuerzo	(2.3.1)	Cl 50 x Cr 52.	8,84					
2	Mitigacion Bache Adoquin.		Cl 46 x Cr 52.	1,50	1,50				
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-02-2026

10. ESQUEMAS

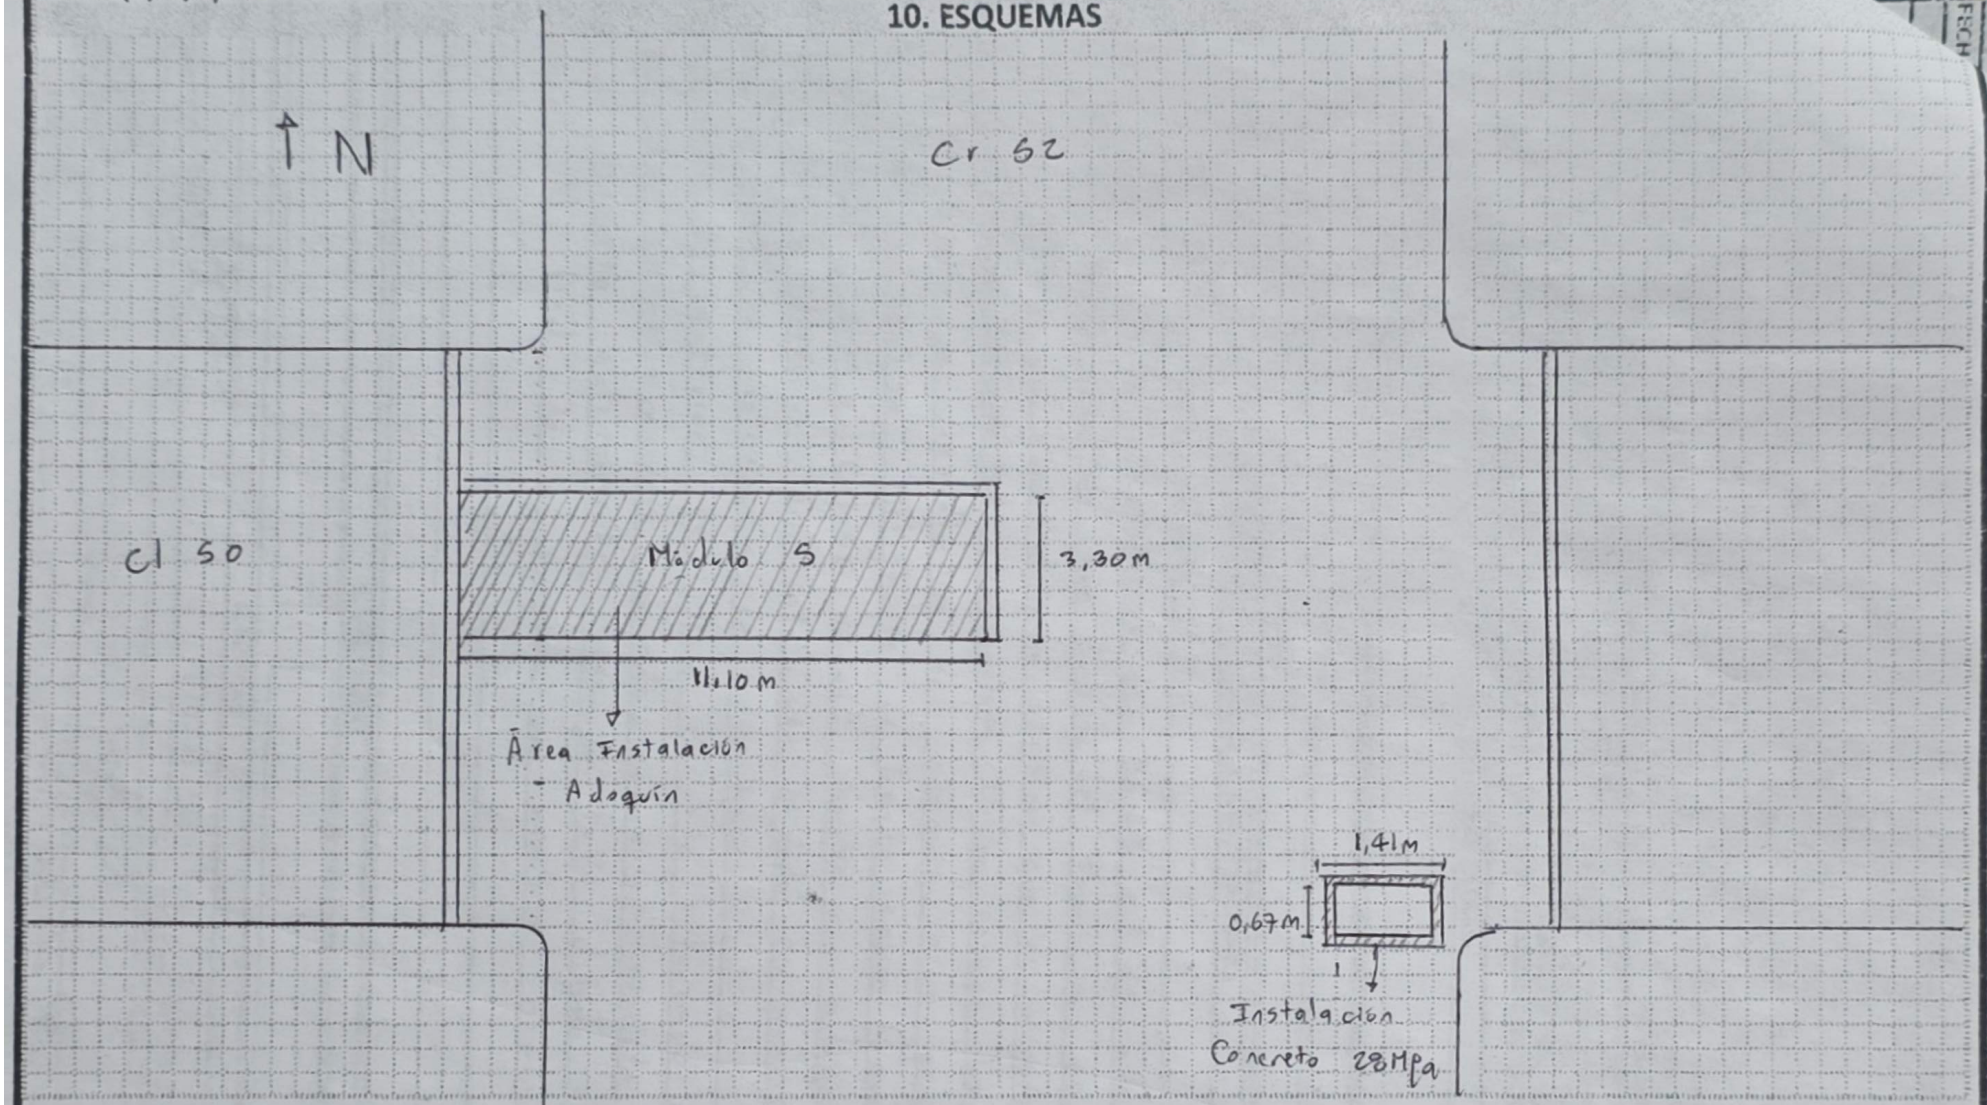

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	36,63 m^2 Instalación Adoquín
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52.

Powered by CamScanner
