FECHA (D/M/A): 11-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Obras Complementarias

RANGO:

CANTIDAD: 10,40m Instalación Cordón

ZONA: 3

COMUNA: 10 La Candelaria

BARRIO: La Candelaria

FRENTE DE TRABAJO: 10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 P.M

TERMINACIÓN: 6:00 A.M

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA:

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se da inicio a las actividades a las 8:00 p.m.
En la jornada de hoy se ejecutan actividades de excavación necesarias para realizar brecha para cordones y para reemplazo de base. En total resultan m^3 de material de excavación.
Posterior a esto, se instalan 10.40 metros de cordon. Todo esto sobre el modulo Nº 6.
Ademas se emplea Concreto de 28 Mpa (0,11 m^3) para realizar reparación (resane) de Viga de Confinamiento.
Al finalizar la jornada se realiza cargue de Volqueta con RCD. se hace Orden y aseo. Se deja Cubierto con plástico el restante de RCD pendiente por recoger.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: David Acuña G
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealgrupos
7	Ayudante	Omar Cárdenas (oficial)	✓		Ingealgrupos
8	Ayudante	Emerson Cordoba	✓		Ingealgrupos
9	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		Ingealgrupos
10	Ayudante	Fraider Gomez		✓	Ingealgrupos
11	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		Ingealgrupos
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Juan Guillermo Gaviria	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Planta electrica		✓		
	Canguro		✓		
	Pulidora		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Excavación Brecha	(2.2.1)	Cl 50 x Cr 52	10,40	0,35	0,40		1,46	
2000652	Excavación	(2.2.1)	cl 50 x Cr 52	10,40	3,20	0,20		6,66	
2000652	Instalación Cerdan	(3.2.5)	Cl 50 x Cr 52	10,40					
2000652	Concreto Atraque. 21Mpa	(3.2.13)	Cl 50 x Cr 52	10,40	0,20	0,25		0,52	
2000 652	Concreto Viga 28Mpa	(2.4.2)	Cl 50 x Cr 52	0,20	3,55	0,15		0,11	
2000 652	Aditivo Acelerante	(2.4.3)	Cl 50 x Cr 52					0,11	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-02-2026

10. ESQUEMAS

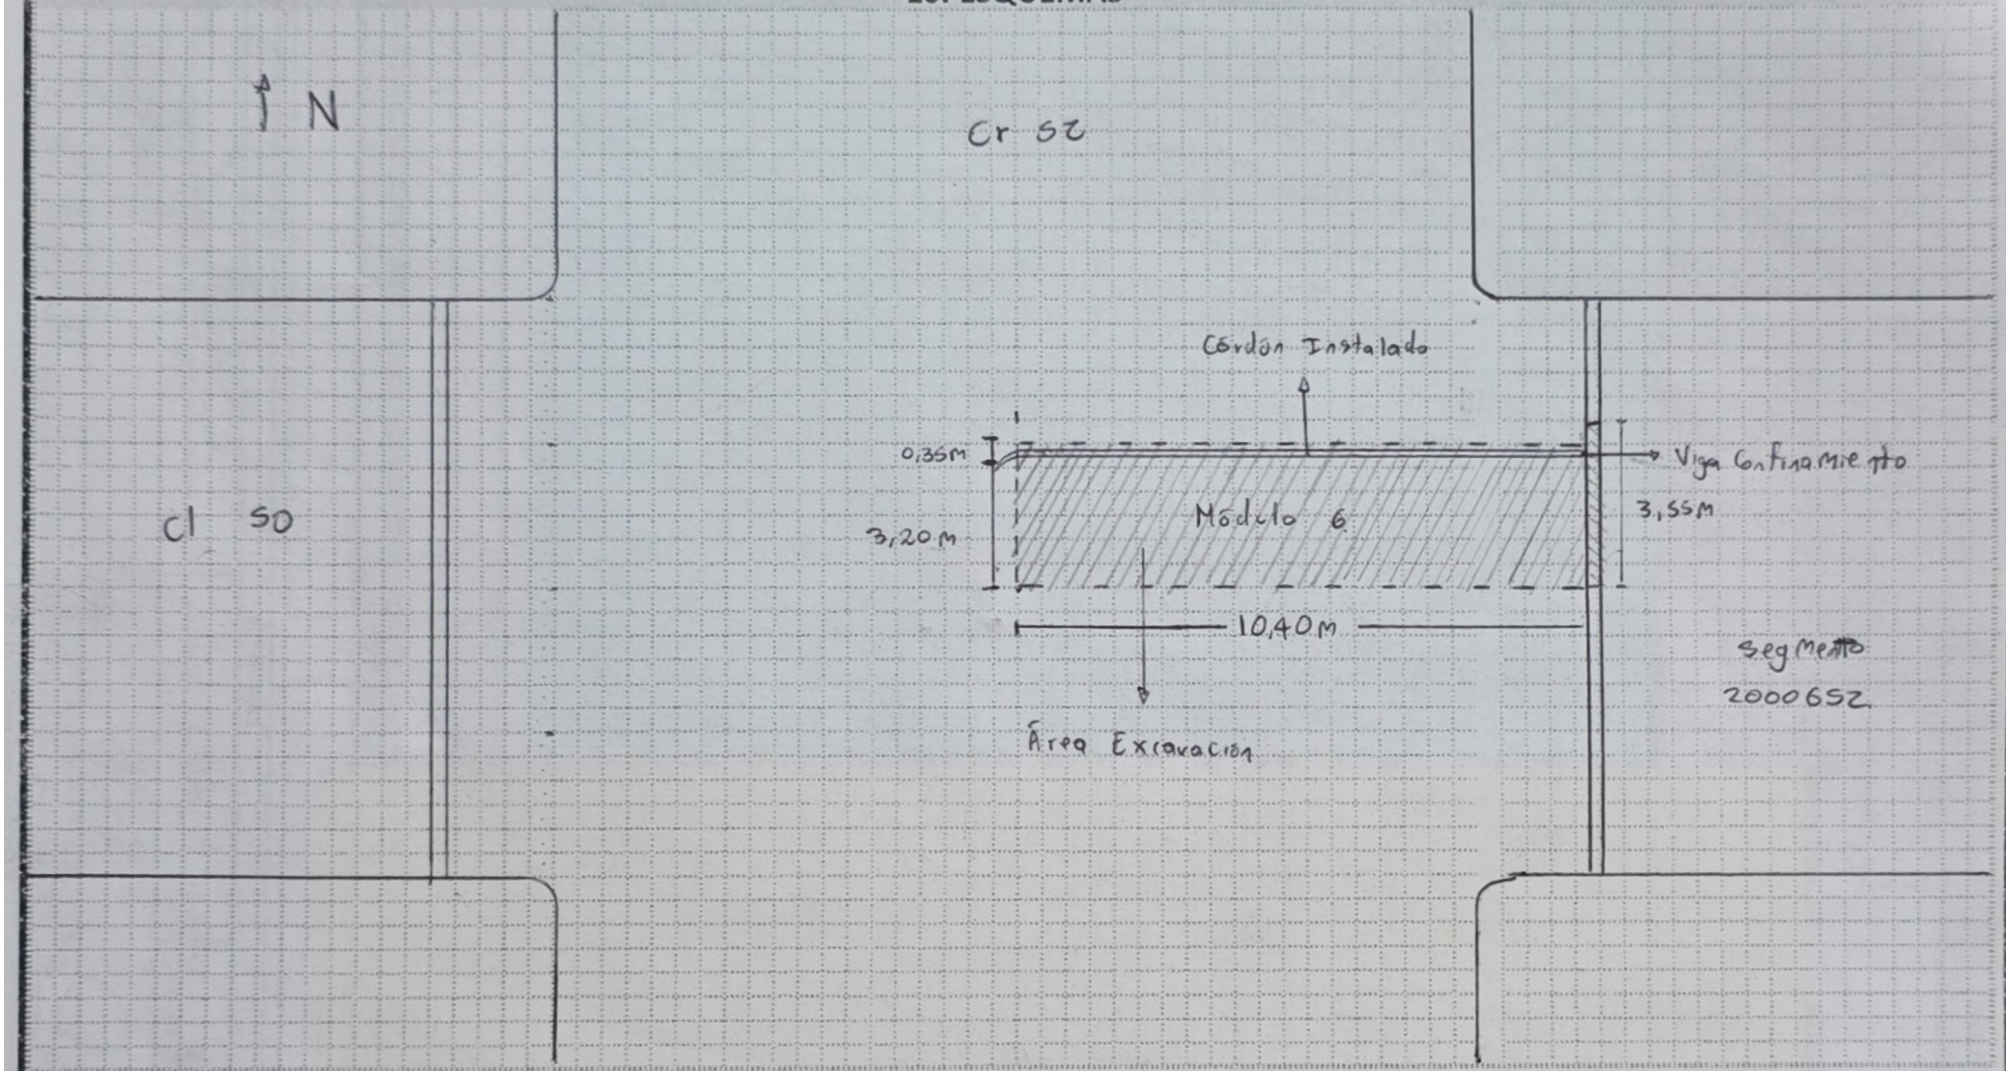

TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	10,40 m Instalación Cordón
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52

Powered by CamScanner

Somos Grandes Contribuyentes..
18548

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0364427

Fecha 12/02/2026 07:35

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TLY806
Conductor: FRANCINI FERNANDEZ

Item: MBROS
Desc: Vial Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @ 37.815,0
==========

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

==========
Gracias por su compra...

PBX: 604 444 1327

Remisión: Nº 18548

Origen: Vereda Cardoso

Destino: Bolombolo

No. Recibo Cantera: 18548

Vehiculo Placa: TLY

Dimensiones: 9m

Hora: | | | AM/PM

Fecha: DD 12 | MM 02 | AAAA 26

Cubo: 9m

CÓDIGO	DETALLE	No. VIAJES	CUBO	TOTAL M3
	ARENA			
	TRITURADO			
	GRAVILLA			
	PIEDRA GAVION			
	PIEDRA FILTRO			
X	MATERIAL EXCAVACIÓN		9m	
	AFIRMADO			
	BASE GRANULAR			
	SUB BASE GRANULAR			
	ARENILLA			
	LIMO			
	ACARREOS			
	ALQUILER POR HORA			
	DÍA DE TRABAJO COMPLETO			
	DÍA DE TRABAJO A MEDIO TIEMPO			

Recibe

Entrega

Powered by CamScanner
