FECHA (D/M/A): 12-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	6,86M³ Suministro Base.
ZONA	3
COMUNA	10 La Candelaria
BARRIO	La Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 P.M	
TERMINACIÓN: 6:00 A.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Comienzan las actividades Siendo las 8:00 P.M

En el desarrollo de la jornada se realizan actividades de excavación de brecha para realizar instalación de Cordón de confinamiento Resultan en total 0,59 m³ de material de excavación y se instalan 2,47 metros lineales de cordón, situado transversalmente entre los Modulos 7 y 8. Dichos cordones se Ajustaron con Concreto de 21 Mpa.

Por otro lado se realiza reemplazo de la base en el módulo Nº 6 (6,86 m³). Esta fue compactada con apisonador (canguro) y con rodillo manual.

Antes de finalizar la jornada se realiza cargue manual de RCD en la Volqueta.

Se realiza pago de Derechos de disposición final de RCD desde el dia 26 de enero, hasta la fecha, con total de 33,08 m³.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Daniel Sánchez
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA / Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: David Acuña G	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	omar cardenas (oficial)	✓		" "
8	Ayudante	Emerson Cordoba	✓		" "
9	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		" "
10	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		" "
11	Ayudante	Fraider Gomez	✓		" "
12	Ayudante	Robert Jimenez	✓		" "
13	Ayudante	Pedro Gonzalez	✓		" "
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Juan Guillermo Guirra	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Martillo demoledor electrico		✓		
	Canguro		✓		
	Planta electrica		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Excavación Brecha	(2.2.1)	Cl So x Cr Sz	2,47	0,60	0,40		0,59	
2000652	Desmonte Adoquín	(2.1.7)	Cl So x Cr Sz	2,47	0,60		1,48		
2000652	Instalación cordón	(3.2.5)	Cl So x Cr Sz	2,47					
2000652	Concreto 21 MPa	(3.2.13)	Cl So x Cr Sz	2,47	0,20	0,25		0,12	
2000652	Suministro Base	(2.2.4)	Cl So x Cr Sz	10,40	3,30	0,20		6,86	
2000652	Pago Derechos RCD	(2.2.7)	Cl So x Cr Sz					33,08	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2024

10. ESQUEMAS

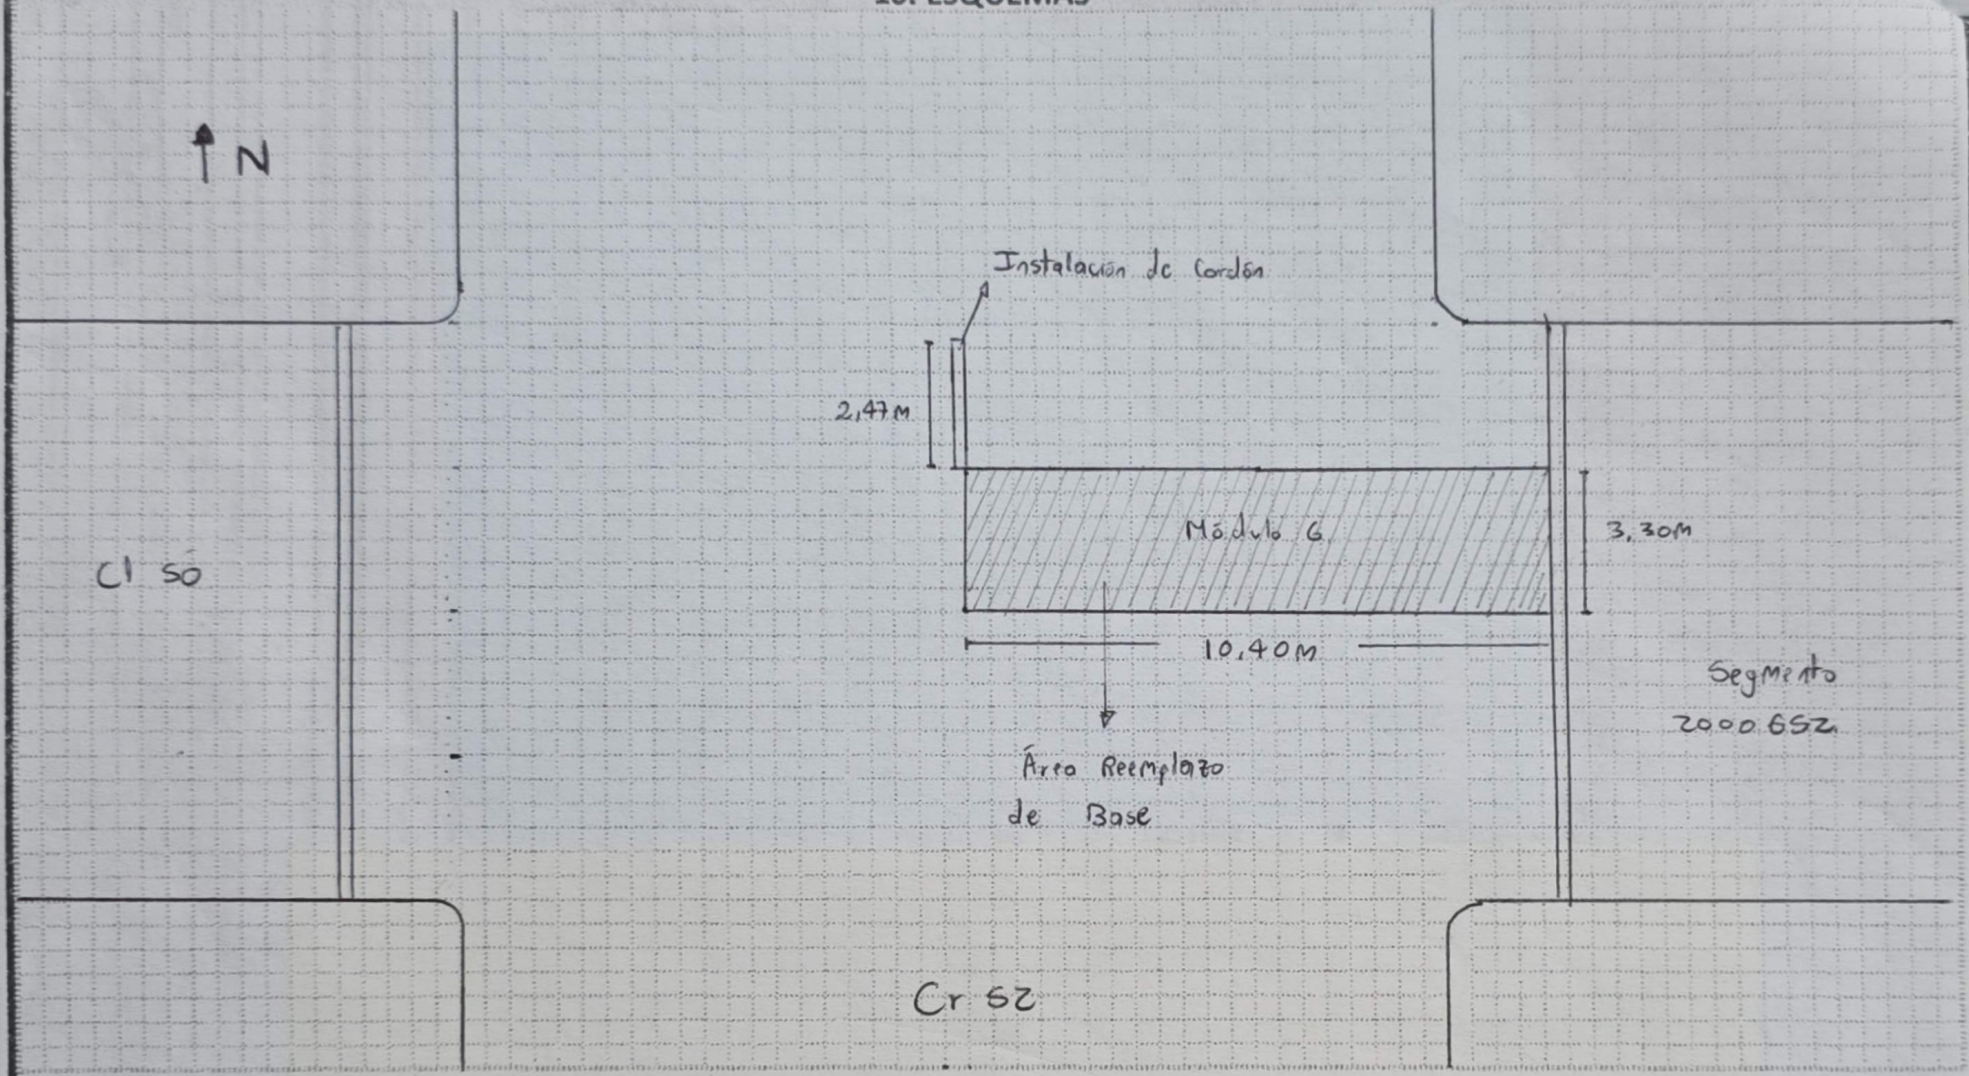

TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	6186 m^3 Reemplazo de base Granular
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52.

Powered by CamScanner

Somos Grandes Contribuyentes..

18556

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VERED
A
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0364655

Fecha 13/02/2026 07:22

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TLY806
Conductor: FRANCINI FERNANDEZ

Item: MBROS
Desc: Vial Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @
37.815,0
==========

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

==========
Gracias por su compra...

PBX: 604 444 1327 **Remisión:**

Nº 18556

Origen: Vialmed - Carabobo

Destino: Balsero

No. Recibo Cantera: 364655

Vehiculo Placa: TLY 806

Hora: | | AM/PM

Fecha: DD 13 | MM 02 | AAAA 26

Dimensiones:

Cubo: 9m

CÓDIGO	DETALLE	No. VIAJES	CUBO	TOTAL M3
	ARENA			
	TRITURADO			
	GRAVILLA			
	PIEDRA GAVION			
	PIEDRA FILTRO			
	MATERIAL EXCAVACIÓN		9m	
	AFIRMADO			
	BASE GRANULAR			
	SUB BASE GRANULAR			
	ARENILLA			
	LIMO			
	ACARREOS			
	ALQUILER POR HORA			
	DÍA DE TRABAJO COMPLETO			
	DÍA DE TRABAJO A MEDIO TIEMPO			

Recibe

Yeivid M

Entrega

Powered by CamScanner
