FECHA (D/M/A): 13-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	3,60M Instalación Cordón
ZONA	3
COMUNA	10 La Candelaria
BARRIO	La Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 P.M	
TERMINACIÓN: 5:00 A.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Comienza la jornada a las 8:00 P.M En el desarrollo de la misma se trabaja sobre el Modulo 8, en donde se hace instalación de 3,60 metros lineales de cordón, este está Ubicado transversalmente con el fin de brindar Confinamiento a los adoquines de se instalarán luego.
A la 1:00 A.M personal de la empresa INTEINSA realiza prueba de densidad en la base reemplazada en el modulo 6. Se toman 3 muestras con resultados de: 93,8% ; 97,9 % y 97,9 %. lo anterior siendo inferior al 98% requerido. Por lo cual se exige al contratista escarificar parcialmente y re compactar dicha superficie. Por ende no se realiza instalación de Adoquín.
Por otro lado se observa que en los Modulos 3 y 4 persiste el desgaste y fragmentación en las piezas de adoquin instaladas (Pertenecientes al lote sometido a pruebas de resistencia). Por lo cual dichos Modulos quedarán en observación.
Se da Fin a la jornada a las 5:00 A.M.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Daniel Sánchez
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA
FIRMA	
NOMBRE: Daniel Acuña G	
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	
	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	
NOMBRE:	
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Omar Cárdenas (oficial)	✓		" "
8	Ayudante	Emerson Cordoba	✓		" "
9	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		" "
10	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		" "
11	Ayudante	Fraider Gómez	✓		" "
12	Ayudante	Robert Jimenez	✓		" "
13	Ayudante	Pedro Gonzalez	✓		" "
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Juan Guillermo Gaviria	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Planta eléctrica		✓		
	Martillo Demoledor Eléctrico		✓		
	Soldadora		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Demolte Adoquín	(2.1.7)	Cl 50 x Cr 52.	3,60	0,50		1,80		
2000652	Excavación	(2.2.1)	cl 50 x Cr 52	3,60	0,50	0,40		0,72	
2000652	Inst. Cordon	(3.2.5)	Cl 50 x Cr 52	3,60					
2000652	Concreto 21Mpa	(3.2.13)	Cl 50 x Cr 52	3,60	0,20	0,25		0,18	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-02-2026

10. ESQUEMAS

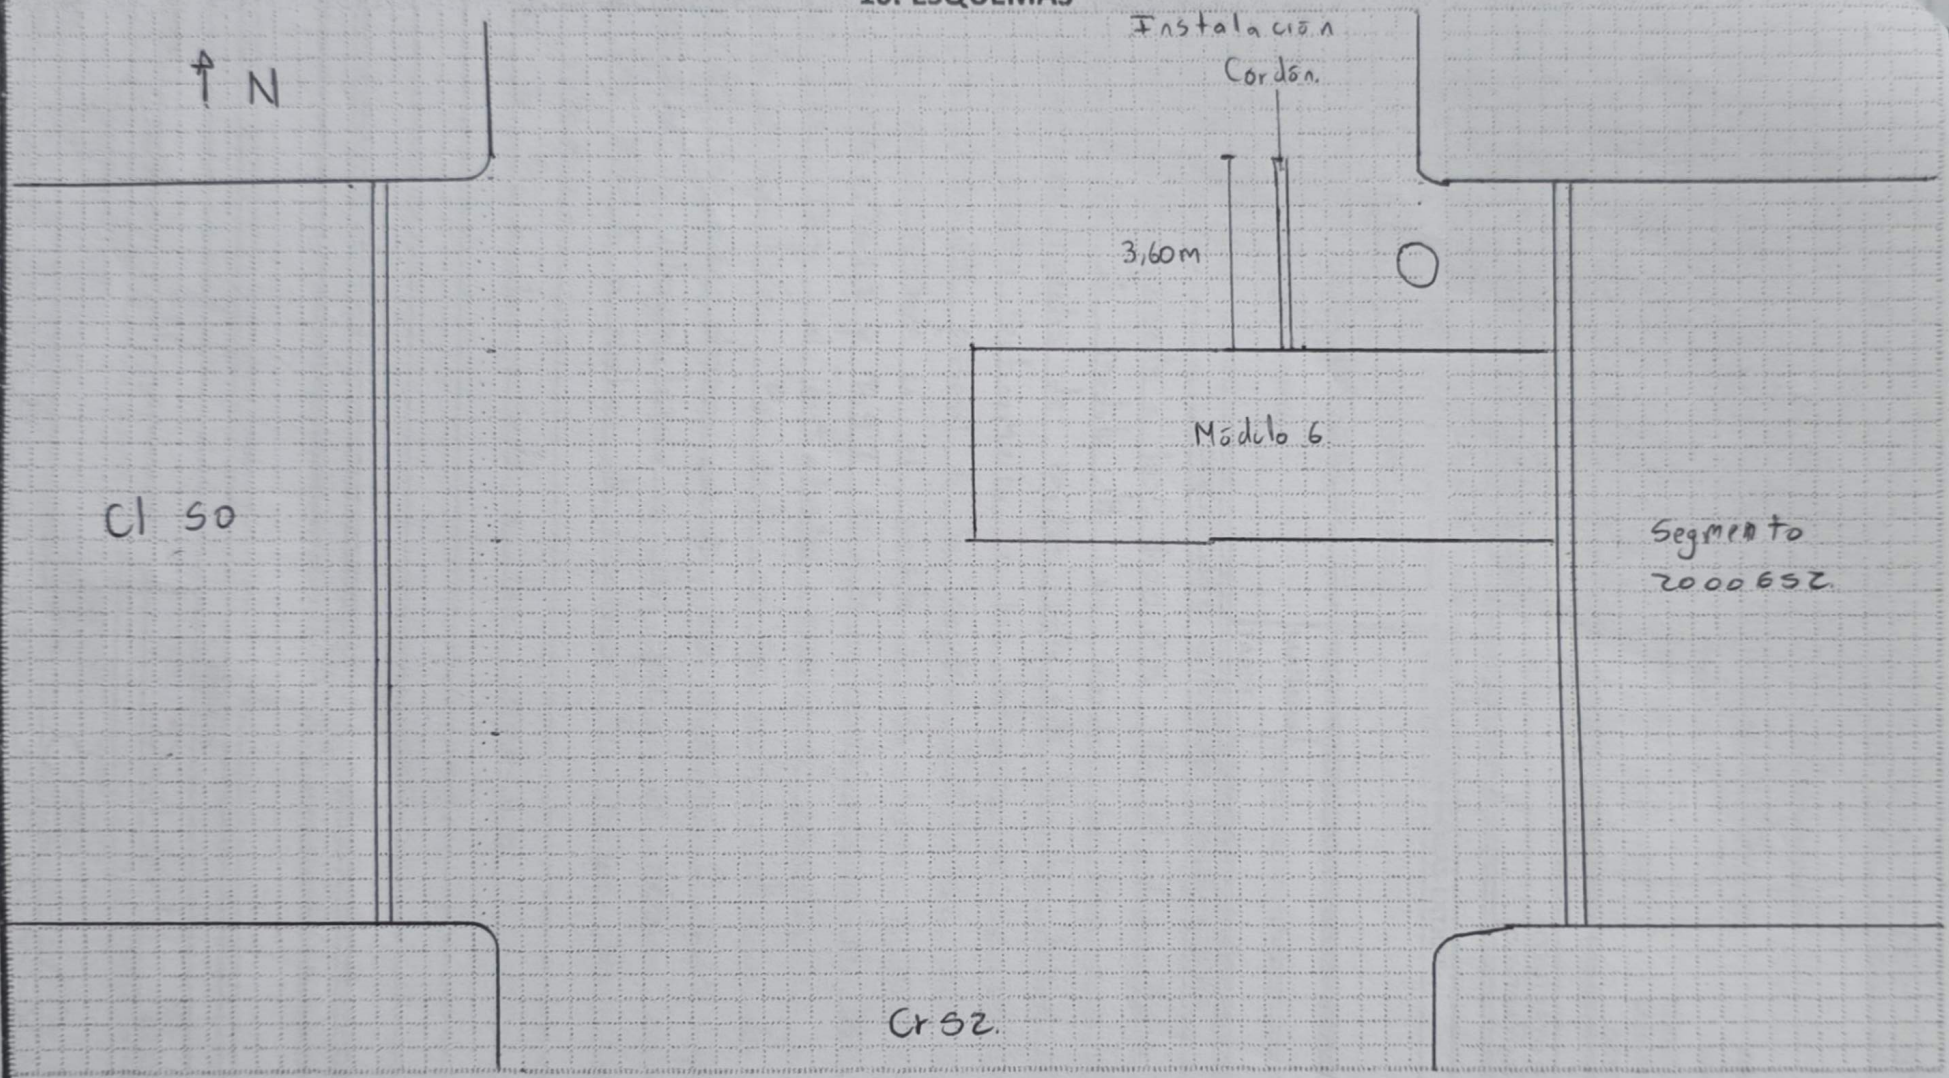

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	3,60 M Instalación Cordón
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	cl 50 x Cr 52

Powered by CamScanner
