FECHA (D/M/A): 17-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	obras complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	68,34 m² Desmonte Adoquín
ZONA	3
COMUNA	10 La Candelaria
BARRIO	La Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 P.M	
TERMINACIÓN: 6:00 A.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Inician las labores a las 8:00 p.m realizando el desmonte de adoquín antiguo en los Módulos 7 y 8. (Algunos tramos de este ya habían sido retirados para la instalación de la cordonería. En total se realiza desmonte de 68,34 m².

En adición a lo anterior se hace realce de viga de confinamiento contigua al módulo 7, con el fin de contrarrestar el estancamiento de agua generado allí, para esto se demuele parcialmente la viga y se instala concreto de 28 Mpa. con su respectivo aditivo adherente de concreto y acelerante.

En el transcurso de la jornada se presentan lluvias (2:30 A.M a 4:00 A.M) estas retrasan las actividades anteriormente descritas.

Al finalizar la jornada se hace cargue de volqueta con RCD correspondiente a los adoquines desmontados

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Omar Cárdenas (oficial)	✓		" "
8	Ayudante	Emerson Córdoba	✓		" "
9	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		" "
10	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		" "
11	Ayudante	Frairder Gomez	✓		" "
12	Ayudante	Robert Jimenez	✓		" "
13	Ayudante	Pedro Gonzalez	✓		" "
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Enestevana Bello	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Planta eléctrica		✓		
	Martillo demoledor eléctrico		✓		
	Pulidora		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000652	Demolición Viga	(2.1.6)	Cl 50 x Cr 52	0,20	3,10	0,15		0,09	
2000652	Concreto 28Mpa Viga	(2.4.2)	Cl 50 x Cr 52	0,20	3,10	0,15		0,09	
2000652	Aditivo Acelerante	(2.4.3)	Cl 50 x Cr 52	0,20	3,10	0,15		0,09	
2000652	Desmonte Adoquín	(2.1.7)	Cl 50 x Cr 52	20,40	3,35		68,34		
2000652	Pago Derechos RCD	(2.2.7)	Cl 50 x Cr 52	20,40	3,35	0,08		5,47	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-02-2026

10. ESQUEMAS

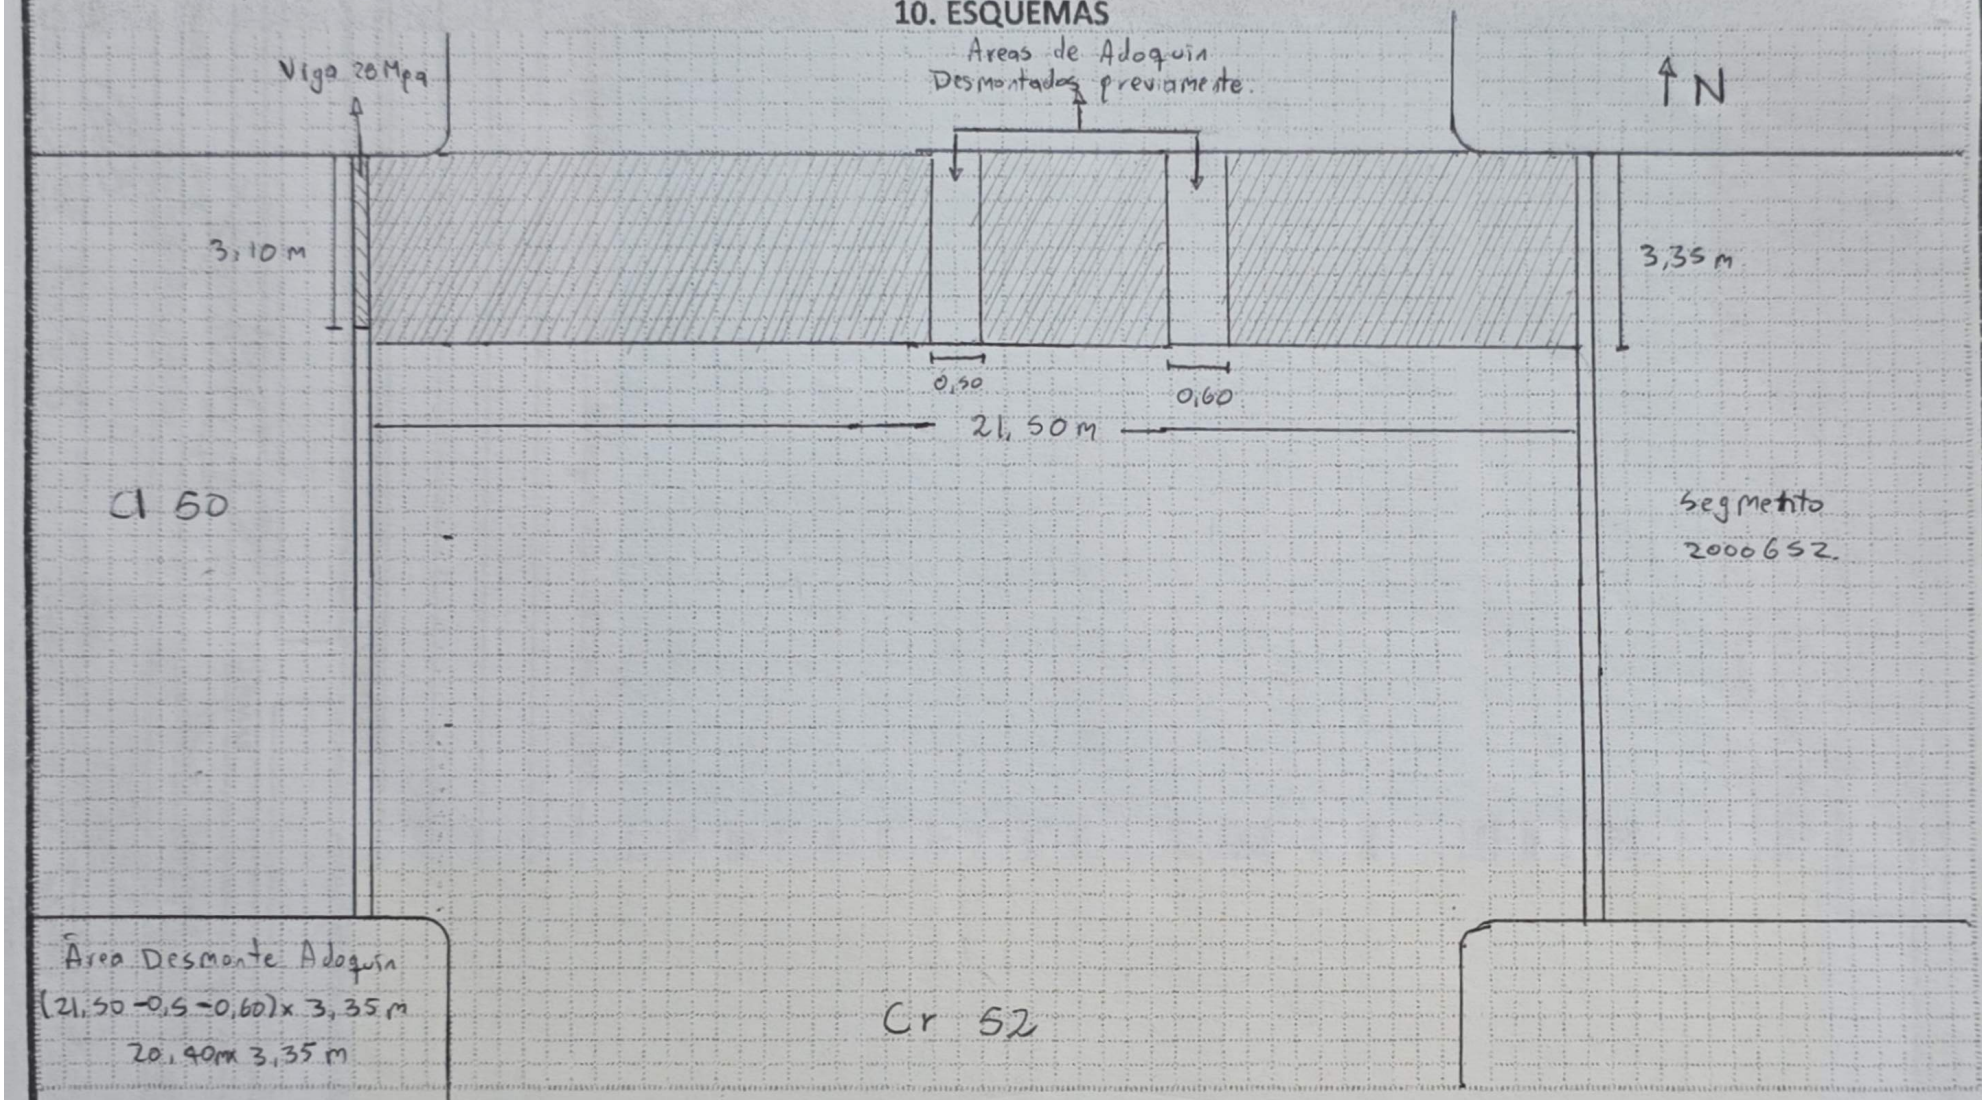

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10.
RANGO:		CANTIDAD:	68,34 m^2 Desmonte Adoquín
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	cl 50 x Cr 52

Powered by CamScanner

Somos Grandes Contribuyentes..

18566

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0365381

Fecha 17/02/2026 06:59

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Direccion: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TAM275
Conductor: WILIAM HERRERA

Item: MBROS
Desc: Vial Med 2025
Cantid 1 Und.: 1viaje @ 37.815,0

==========

Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00
Forma de pago

==========

Gracias por su compra...

PBX: 604 444 1327

Remisión: Nº 18566

Origen: Vialmed - Belen

Destino: Balsdero

No. Recibo Cantera: 61678 - 9779

Hora: | | | AM/PM

Fecha: DD 17 | MM 02 | AAAA 26

Vehiculo Placa: TAM 275

Dimensiones: 365381

Cubo: 9m3

CÓDIGO	DETALLE	No. VIAJES	CUBO	TOTAL M3
	ARENA			
	TRITURADO			
	GRAVILLA			
	PIEDRA GAVION			
	PIEDRA FILTRO			
X	MATERIAL EXCAVACIÓN		9m3	
	AFIRMADO			
	BASE GRANULAR			
	SUB BASE GRANULAR			
	ARENILLA			
	LIMO			
	ACARREOS			
	ALQUILER POR HORA			
	DÍA DE TRABAJO COMPLETO			
	DÍA DE TRABAJO A MEDIO TIEMPO			

Willam — Recibe

Yesid H — Entrega

Powered by CamScanner
