FECHA (D/M/A): 26 - 02 - 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	0,29 M³ Concreto 28 Mpa.
ZONA	03
COMUNA	10 La Candelaria
BARRIO	La Candelaria
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 A.M.	
TERMINACIÓN: 6:00 A.M.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA
	TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se solicita punto ecológico para el manejo de Residuos en este frente de Obra. Jorge Nunsilve

Se dan inicio a las actividades a las 8:00 p.m.

se hace intervención sobre el paso peatonal de la Cr 52 (Carabobo).

Se hace demolición de tramo de adoquín en mal estado, en este proceso se encuentra tubería de red eléctrica superficial, por lo cual se decide realizar el reemplazo en concreto de 28 Mpa, en conjunto con el tramo adedano a la caja de telecomunicaciones. En total se hacen 0,29 M³ de demolición y 0,29 M³ de suministro de concreto de 28 Mpa con su respectivo acelerante.

En adición a lo anterior se hace garantía de parte de adoquín afectado en los modulos 3 y 4. (17,15 M²). Lo anterior debido al hundimiento presentado en estas áreas y el desgaste prematuro del adoquín.

5. VISITANTES

Jorge Nunsilve

6. FIRMAS

NOMBRE:	Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña C.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26 - 02 - 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Omar Cárdenas (oficial)	✓		" "
8	Ayudante	Yeizman Mosquera	✓		" "
9	Ayudante	Emerson Córdoba	✓		" "
10	Ayudante	Stiven Anzola	✓		" "
11	Ayudante	Pedro Gonzalez	✓		" "
12	Ayudante	Fredy Alvarez	✓		" "
13	Ayudante	Alex Martinez	✓		" "
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Enestevana Bello	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual		✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Planta eléctrica		✓		
	Pulidora		✓		
	Canguro		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000 652		2.1.6	Cl 50 x Cr 52	0,60	0,60	0,15		0,05	
2000 652	Demolición		Cl 50 x Cr 52	0,80	0,25	0,15		0,03	
2000 652			Cl 50 x Cr 52.	5,35	0,40	0,10		0,21	
2000 652		2.4.2	Cl 50 x Cr 52	0,60	0,60	0,15		0,05	
2000 652	Concreto 28 MPa		Cl 50 x Cr 52	0,80	0,25	0,15		0,03	
2000 652			Cl 50 x Cr 52	5,35	0,40	0,10		0,21	
2000 652.	Acelerante	2.4.3	Cl 50 x Cr 52.					0,29	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-2026

10. ESQUEMAS

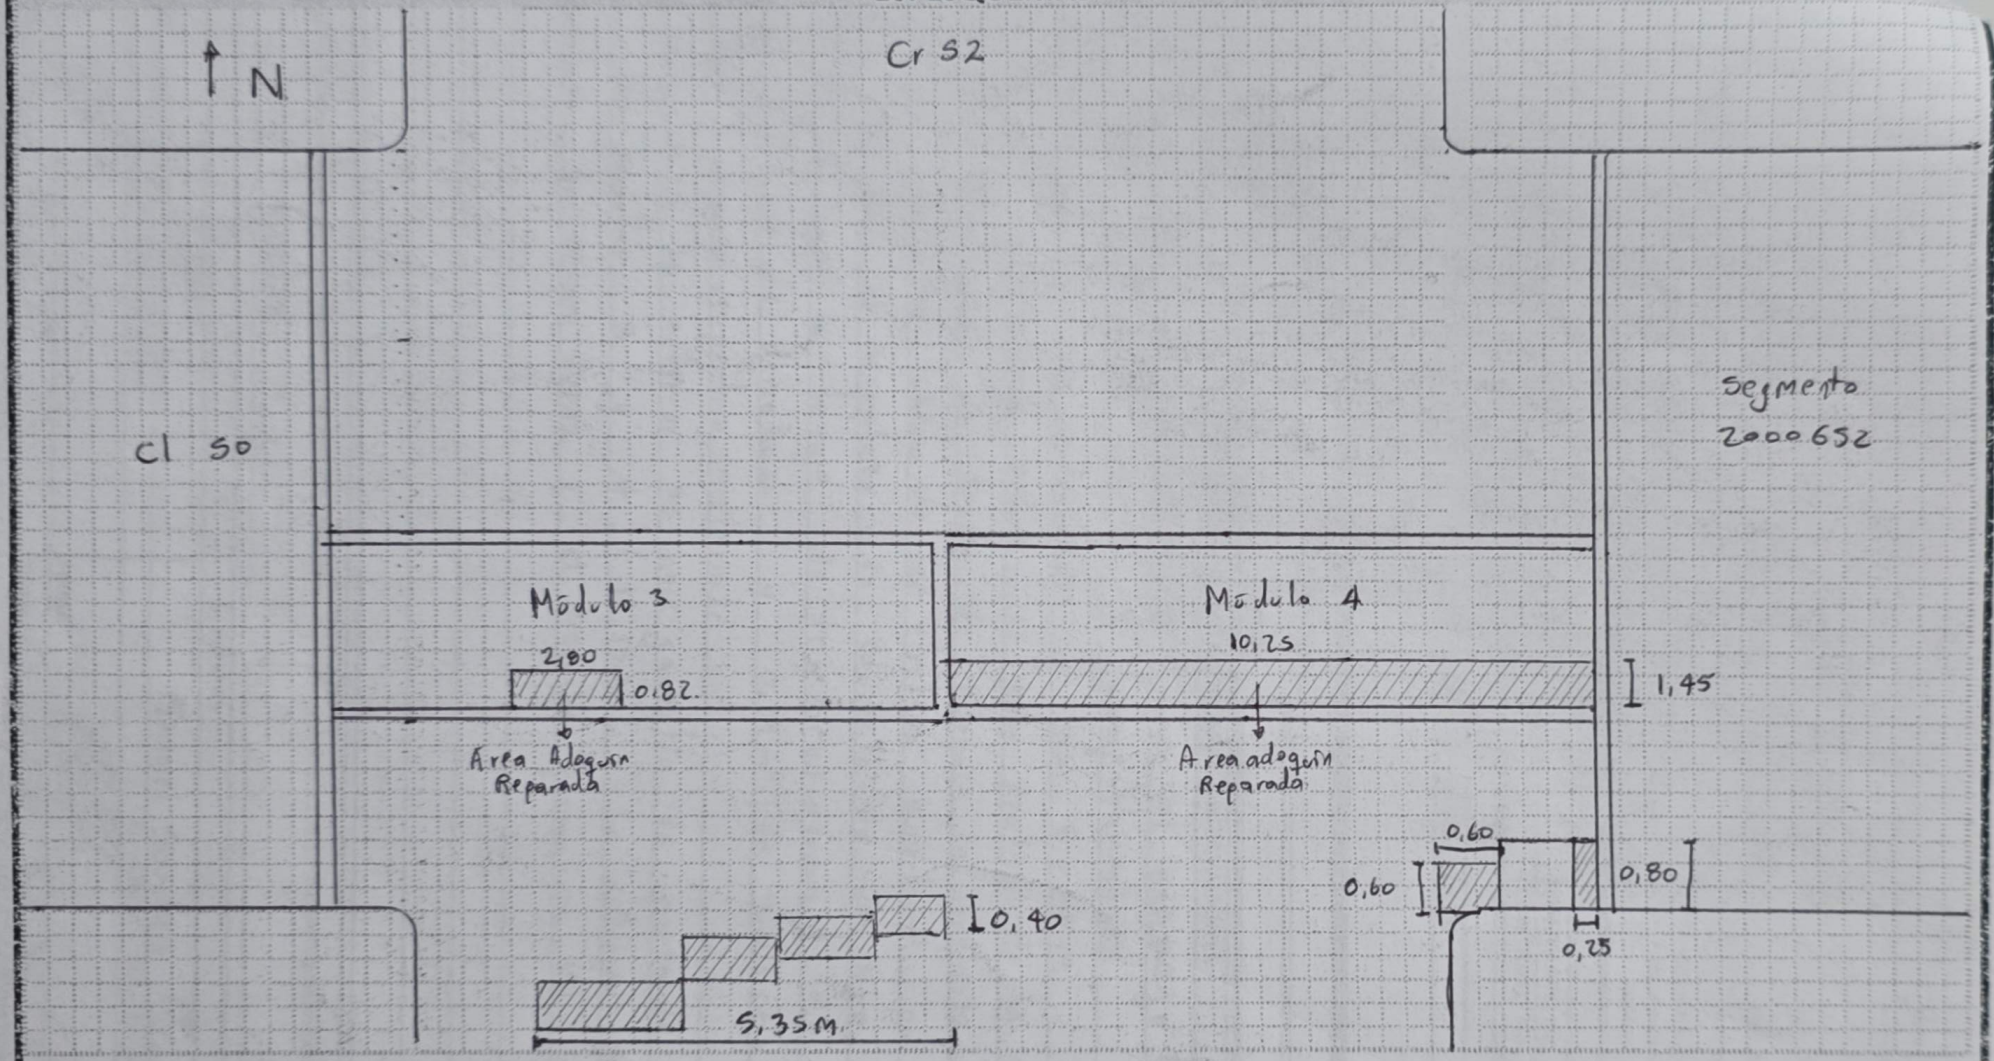

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	0,29 m^3 Concreto 28 Mpa
BARRIO	La Candelaria	DIRECCIÓN	Cl 50 x Cr 52

Powered by CamScanner
