FECHA (D/M/A): 09-02-2026

# BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): | Pavimentación |
| RANGO: | Masivo |
| CANTIDAD: | 60.51 m³ / 145.22 TN |
| ZONA | 3 |
| COMUNA | 10 La Candelaria |
| BARRIO | 1012 Parque Socorro |
| FRENTE DE TRABAJO: | 15 |

## 2. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | CONTRATO No. 4600105052 DE 2025 |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | CONTRATO No. 4600105322 DE 2025 |

| | |
|---|---|
| HORARIO DE LABORES: | JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: |
| INICIO: 8:00 pm | Jornada nocturna |
| TERMINACIÓN: 5:00 am | |

## 3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

| | |
|---|---|
| MAÑANA | Seco |
| NOCHO TARDE | Seco |

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Se realiza corte trasversal con cortadora de pavimento
- Inicia demolición pavimento existente con fresadora.
- Se realiza limpieza de las áreas intervenidas
- Irrigación con emulsión asfáltica
- Aplicación mezcla de alto módulo MAM-25
- Se realiza vibrocompactación mezcla MAM-25
- Chequeo temperatura mezcla asfáltica MAM-25 150°C
- Se realiza sellado con compactador de planas
- Se realiza rampa entre el pavimento construido y el existente, se realiza fresado y aplicación mezcla MAM-25
- Topografía toma secciones de las áreas intervenidas
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retirado la señalización colocada.
- Se solicita al contratista la reparación de la señalización afectada

## 5. VISITANTES

| | |
|---|---|
| Kelly Faeo. | Simón montoya |

## 6. FIRMAS

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Luis Daniel de la Rosa Vitabal | James S Taborda |
| Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: Luis Alfonso Restrepo | NOMBRE: Juan J. Bonilla |
| Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-02-2026

## 7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

| No | CARGO | NOMBRE COMPLETO | ASISTENCIA Si | ASISTENCIA No | EMPRESA DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnólogo/Ingeniero | Luis Daniel de la Rosa | X | | Consorcio Vial MED 2025 Palmichal |
| 2 | Encargado | Jhon Anderson Mamol Pedroza | X | | |
| 3 | Liguero | Sebastian Vélez Colorado | X | | |
| 4 | Rastrillero | Juan Duno Gómez Castro | X | | |
| 5 | Rastrillero | Orlando Bocanegra Lozano | X | | |
| 6 | Ayudante | | | | |
| 7 | Ayudante | Alexander Ossa García | X | | |
| 8 | Ayudante | Edgar León Mafla Paramillo | X | | |
| 9 | Ayudante | Jhojan Esteban Moncho López | X | | |
| 10 | Ayudante | José de Jesus Murillo Espinal | X | | |
| 11 | Ayudante | Oscar Guzman Valencia | X | | |
| 12 | Ayudante | Wilman Eliseo Pino Hormiletol | X | | |
| 13 | Ayudante | Ismailler de Jesus Avila Ramez | X | | |
| 14 | Ayudante | | | | |
| 15 | Ayudante | | | | |
| 16 | Operador Rodillo manual | | | | |
| 17 | Operador compresor | Jesus Florez | X | | |
| 18 | Operador fresadora | Freddy Gómez | X | | |
| 19 | Operador finisher | Jorge Hugo Arias | X | | |
| 20 | Operador Retroexcavadora | | | | |
| 21 | Operador Vibrocompactador | Rolando Mesa | X | | |
| 22 | Operador Compactador llantas | Alvaro Sulas | X | | |
| 23 | Operador Cortador Asfalto | | | | |
| 24 | Operador Equipo Imprimación | | | | |
| 25 | Operador Mini cargador | Andres Rodas | X | | |
| 26 | Operador Barredora | | | | |
| 27 | Conductor Carrotanque | Edwin Enciso | X | | |
| 28 | Conductor Camión | | | | |
| 29 | Conductor Volqueta(s) | Alexander Fuentes Rios | X | | |
| | | Derwing Babiros Urrego | X | | |
| | | Elkin Hurtado Londoño | X | | |
| | | Francisco Carvajal Gallego | X | | |
| | | Roberto Rendon Aristizabal | X | | |
| | | Cesar Quintana Alcalde | X | | |

## 8. MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO) | OPERACIÓN Si | OPERACIÓN No | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodillo manual | | | | |
| 2 | Compresor | Ingersoll rand - 185 | X | | |
| 3 | Fresadora | Wirtgen - W150 CF | X | | |
| 4 | Finisher | Dinapac atlas copco SD 500 | X | | |
| 5 | Retroexcavadora | | | | |
| 6 | Vibrocompactador | Atlas copco dinapac | X | | |
| 7 | Compactador llantas | Dinapac - cpc 140 | X | | |
| 8 | Cortador Asfalto | | | | |
| 9 | Equipo Imprimación | Hino 500 fc - WLX0998 | X | | |
| 10 | Placa vibratoria | Facom fc 30 | X | | |
| 11 | Soplador | | | | |
| 12 | Mini cargador | Hyundai - Hsl 850 - 7A | X | | |
| 13 | Barredora | | | | |
| 14 | Carrotanque | Chevrolet - Kodiak TRP 186 | X | | |
| 15 | Camión | Chevrolet - TNQ 677 | X | | |
| 16 | Volqueta(s) | SNZ 331 - TRF 398 - TRK 374 | X | | |
| | | TRF 301 - TRF 427 - STZ 403 | X | | |
| | Un baño móvil | SPE | X | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-02-2026

## 9. CALCULO DE CANTIDADES

| SEGMENTO | CONSECUTIVO HUECOS MED | FIGURA No. | DIRECCIÓN | DIMENSIONES L (m) | A (m) | e (m) | Area (m2) | Vol (m3) | Ton (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000066 | MAM-25 | 1 | CR 62 CR 52 CR 52+200 | 160.08 | 3.52 | 0.09 | 563.48 | 50.71 | 121.71 |
| 1000066 | MAM-25 | 2 | CR 62 CR 52 CR 52+200 | 160.09 | 1.53 | 0.04 | 244.94 | 9.80 | 23.51 |
| 1000066 | Fresado | | CR 62 CR 52 CR 52+200 | 160.08 | 3.52 | 0.17 | 563.48 | 95.79 | |
| 1000066 | Fresado | | CR 62 CR 52 CR 52+200 | 160.09 | 1.53 | 0.04 | 244.94 | 9.80 | |
| 1000066 | Topografía | | CR 62 CR 52 CR 52+200 | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | 145.22 |

### MEZCLA ASFALTICA

| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | CANT (TON) | ACUM (TON) | TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 535321 | SNZ331 | 24.12 | 24.12 | 170 |
| 535322 | TRF398 | 24.02 | 48.14 | 169 |
| 535323 | TRK324 | 24.25 | 72.39 | 167 |
| 535324 | TRE301 | 24.31 | 96.70 | 168 |
| 535325 | TRF427 | 24.27 | 120.97 | 166 |
| 535326 | STZ403 | 24.25 | 145.22 | 167 |


### BOTADA DE ESCOMBROS

| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | TIPO (DOBLE/SENCILLA) | No VIAJES | SITIO DISPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 34381 | TRK323 | Doble | 1 | Acopio lago |
| 34382 | TRF304 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34383 | SNZ328 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34384 | TRE713 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34385 | SNZ330 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34386 | TRF394 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34387 | TRK323 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34388 | TRF304 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34389 | SNZ328 | Doble | 1 | Acopio la 30 |
| 34390 | TRE713 | Doble | 1 | Pavimentar-escombro |

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 04-02-2026

## 9. ESQUEMAS

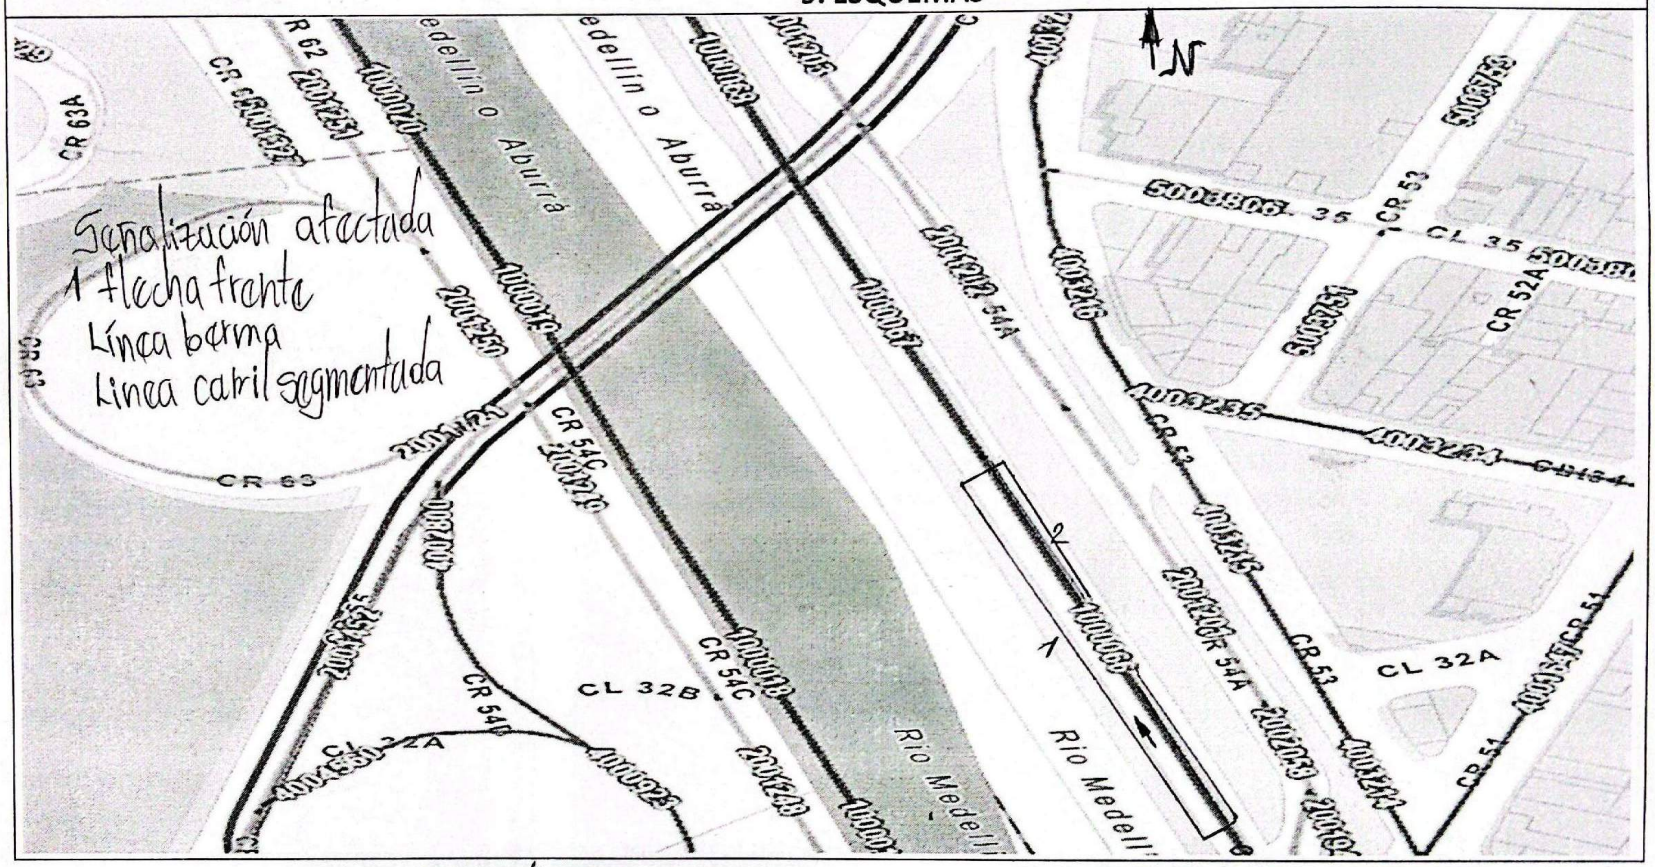


| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN: | Pavimentación | CUADRILLA: | 15 |
| RANGO: | Masivo | CANTIDAD: | 60.51 m³ / 145.22 TN |
| BARRIO | Perpetuo socorro | DIRECCION: | CR 62 CR 52 CR 52 # 200 |

Powered by CamScanner

James S Taborda

20260209 22:00

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535321
PLACA: SNZ331
CONDUCTOR: Yobany Alexander Zapata Rios

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,12 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 ( M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025 )
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.030,00
PESO BRUTO:36.150,00

ENTRADA: 09 feb 2026 -m10:12 p.
SALIDA: 09 feb 2026 -m 10:13 p.
TEMPERATURA:170,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Yobany Z.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - ANDERSSON MARMOL

| N° | Responda Verdadero o Falso a las preguntas de los temas dados en la inducción o reinducción | V | F |
|---|---|---|---|
| 5. | Los valores de la empresa son 7 | | |
| 6. | El Sistema de SST se encarga de la seguridad, bienestar y cuidado de cada uno de los trabajadores de la empresa | x | |
| | | | x |

James S Taborda

20260209 22:14

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535322
PLACA: TRF398
CONDUCTOR: Darwing Ramirez Urrego

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,02 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 ( M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025 )
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.540,00
PESO BRUTO:35.560,00

ENTRADA: 09 feb 2026 -m10:17 p.
SALIDA: 09 feb 2026 -m 10:17 p.
TEMPERATURA:169,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jhon Marmol

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - ANDERSSON MARMOL

James S Taborda

20260209 22:21

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535323
PLACA: TRK324
CONDUCTOR: ELKIN DE JESUS HURTADO LONDO
...

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,25 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 ( M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025 )
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.710,00
PESO BRUTO:35.960,00

ENTRADA: 09 feb 2026 -m10:20 p.
SALIDA: 09 feb 2026 -m 10:20 p.
TEMPERATURA:167,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - ANDERSSON MARMOL

Powered by CamScanner

Jamos S Taborda

20260209 22:29

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535324
PLACA: TRF301
CONDUCTOR: Francisco Javier Carvajal Gallego

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,31 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 ( M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025 )
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.560,00
PESO BRUTO:35.870,00

ENTRADA: 09 feb 2026 -m10:40 p.
SALIDA: 09 feb 2026 -m 10:40 p.
TEMPERATURA:148,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - ANDERSSON MARMOL

Luis Cadavid

Jamos S Taborda

20260209 22:42

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535325
PLACA: TRF427
CONDUCTOR: Roberto Jairo Rendon Aristizabal

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,27 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 ( M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025 )
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.630,00
PESO BRUTO:35.900,00

ENTRADA: 09 feb 2026 -m10:45 p.
SALIDA: 09 feb 2026 -m 10:45 p.
TEMPERATURA:166,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - ANDERSSON MARMOL

Luis Cadavid

Jamos S Taborda

20260209 22:47

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535326
PLACA: SIZ403
CONDUCTOR: Jose Alberto Quintana Alvarez

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,25 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 ( M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025 )
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.060,00
PESO BRUTO:36.310,00

ENTRADA: 09 feb 2026 -m10:57 p.
SALIDA: 09 feb 2026 -m 10:57 p.
TEMPERATURA:167,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - ANDERSSON MARMOL

Luis Cadavid

Powered by CamScanner

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34381 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26 M.V. mede | Acopio La 30 | TRK 823 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV-Regional | | 14 m³ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN |
| BASE | | ARENILLA | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN |
| ARENA | | ASFALTO | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilman | | |

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34382 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-M-V-medellin | Acopio La 30 | TRF 304 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV- Regional | | 14 m³ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN |
| BASE | | ARENILLA | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN |
| ARENA | | ASFALTO | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilman | | |

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34383 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-M-V-med | Acopio La 30 | SNZ 928 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV Regional | | 14 m³ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN |
| BASE | | ARENILLA | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN |
| ARENA | | ASFALTO | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilman | | |

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34384 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-M-V-med | Acopio La 30 | TRE 773 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV-regional | | 14 m³ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN |
| BASE | | ARENILLA | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN |
| ARENA | | ASFALTO | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilman | | |

Powered by CamScanner

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34385 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-m-V-med | La Acopio 30 | SNZ 330 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV-Regional | | 14 mts |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN | |
| BASE | | ARENILLA | | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN | |
| ARENA | | ASFALTO | | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| Wilman | | Jaca Sora |

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34386 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-m-V-med | La Acopio 30 | TRF 394 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV-Regional | | 14 mts |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN | |
| BASE | | ARENILLA | | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN | |
| ARENA | | ASFALTO | | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilman | | Yesson Cao |

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34387 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-m-V-med | La Acopio 30 | TRK 323 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV-Regional | | 14 mts |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN | |
| BASE | | ARENILLA | | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN | |
| ARENA | | ASFALTO | | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilman | | |

Jamos S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

| Nº | FECHA (DD MM AA) |
|---|---|
| 34388 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-m-V-m | La Acopio 30 | TRF 304 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV Regional | | 14 mts |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | Nº REMISIÓN | |
| BASE | | ARENILLA | | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | | |
| TRITURADO | | ACPM | | CANTIDAD X REMISIÓN | 1 |
| ARENA | | ASFALTO | | | |
| OTRO: Fresado | | MAQUINAS | | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilman | | |

Powered by CamScanner

James S Taborda

| pavimentar | REGISTRO TRANSPORTE | Nº | FECHA DD MM AA |
|---|---|---|---|
| | | 34389 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-M-V-med | La Acopio 39 | SNZ 328 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV-Regional | | 14 m3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | | **Nº REMISIÓN** |
| BASE | | ARENILLA | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | |
| TRITURADO | | ACPM | | **CANTIDAD X REMISIÓN** |
| ARENA | | ASFALTO | | |
| OTRO: Lodo | | MAQUINAS | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilmar | | |

Mi último día de labores será el 24 Noviembre 2025, entendiendo que debo dejar la

James S Taborda

| pavimentar | REGISTRO TRANSPORTE | Nº | FECHA DD MM AA |
|---|---|---|---|
| | | 34390 | 09 02 26 |

| CC ORIGEN | CC DESTINO | PLACA |
|---|---|---|
| 25-26-M-V-med | Planta Adriana | TRE 723 |
| **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** | **CANTIDAD** |
| AV-Regional | | 7 m3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBBASE | | ESCOMBROS | X | **Nº REMISIÓN** |
| BASE | | ARENILLA | | |
| CRUDO | | MEZCLA | | |
| TRITURADO | | ACPM | | **CANTIDAD X REMISIÓN** |
| ARENA | | ASFALTO | | |
| OTRO: | | MAQUINAS | | |

| DESPACHA | RECIBE | CONDUCTOR |
|---|---|---|
| wilmar | | |

on cédula de ciudadanía
que actualmente
l equipo y todo el
a oportunidad de
les, asociados a una nueva
rrollo.

Powered by CamScanner
