FECHA (D/M/A): 02/02/2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalización
RANGO:	—
CANTIDAD:	

ZONA	4	6	6
COMUNA	11	16	16
BARRIO	Lourdes	Belen	Juan Pablo II

FRENTE DE TRABAJO: 20 16

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 8:00 PM
TERMINACIÓN: 5:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA:
TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Cuadrilla #20 y #16 llegan al lugar de Lourdes para realizar actividad plasticos en frio, se comienza con instalacion de señalizaciones y cerramiento por carriles para garantizar paso vehicular y se trabajan los 2 cuadros a la vez, y al secar se paran, quedando dos Battias de color Azules faltando, se trasladan a la 80 a la Altura de la Bomba con 30A a realizar Giro en semaforo flechas- Linea - cebra el paso, Trasladandose por ultimo a la el 30 con 66 para terminar jornada, instalando señalizacion se realiza parte del RAE Linea Berma Amarilla Bicicletas y linea Gaviao en doble ruta.
Actividad terminada a las 5:00 AM

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Luisa María	FIRMA: Cristian D. Cano A
NOMBRE: Luisa María Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A) 02/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	/		
2	Encargado	Manuela Ramirez	/		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Maira Mesa	/		
7	Ayudante	Juan camilo Arboleda	/		
8	Ayudante	Dayana Ortiz	/		
9	Ayudante	Jhon Arles	/		
10	Ayudante	Yeiny Yuliana	/		
11	Ayudante	Andres Lopera	/		
12	Ayudante	Juan David suarez	/		
13	Ayudante	Diego Londoño	/		
14	Ayudante	Julian Valencia	/		
15	Ayudante	Cristian Rodriguez	/		
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan Montoya	/		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Jyy 370			
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Cuadrilla #20 #16 Plastico En frio

FECHA (D/M/A): 02/02/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
5000792	4.1.5		DG 75 TV 39CA/39B	—	32 m	32m	Linea paso peatonal 0.40
5000792	4.1.1		" "	2	1.2 m^2	2.4 m^2	flechas de frente
5000792	4.1.1		" "	1	2.2 m^2	2.2 m^2	flecha frente y G.P.O
5000792	4.1.1		" "	1	2.1 m^2	2.1 m^2	Prohibido Parquear Contram
5000792	4.1.3		" "	—	21.86m	21.86m	Linea eje de 0.12
5000792	4.1.3		" "	—	18 m	18 m	Linea Celda Parker 0.12
5000792	4.1.3		" "	—	34.13m	34.13 m	Linea Borde Isla 0.12
2002101	4.1.5		CL 30 CR 66B	—	46.84 m	46.84 m	RAB 0.40.
2002101	4.1.3		" "	—	3.67 m	3.67 m	Linea de eje Amarilla 0.12
2002101	4.1.5		" "	—	3.60m	3.60 m	Dados Ciclo Ruta 0.40
2002101	4.1.3		" "	—	1.67 m	1.67 m	Linea Gavion ciclo Ruta 0.12
2002101	4.1.1		" "	1	0.31 m^3	0.31 m^2	Bordeta ciclo Ruta
5000793	4.1.1		DG 75 TV 39CV/39D	2	1.2 m^2	2.4 m^2	flechas de frente
5000793	4.1.1		" "	2	2.2 m^2	4.4 m^2	flecha frente y G.P.O
5000793	4.1.1		" "	2	3.36 m^2	6.72 m^2	Velocidad 30 km/H.
5000793	4.1.3		" "	—	19.07m	19.07m	Linea de eje 0.12
5009263	4.1.5		AV. BO CL 30A	—	6.4 m	6.4 m	DADOS CEDA PASO 0.40
5009263	4.1.1		" "	2	1.43 m^2	2.86 m^2	Triangulo ceda el paso
5009263	4.1.1		" "	2	1.5 m^2	3.0 m^2	flecha doble G.P.O
5009263	4.1.3		" "	—	34.25m	34.25m	Linea Borde Achurado 0.12
							(Linea Achurado Inter 0.40)
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):


10. ESQUEMAS

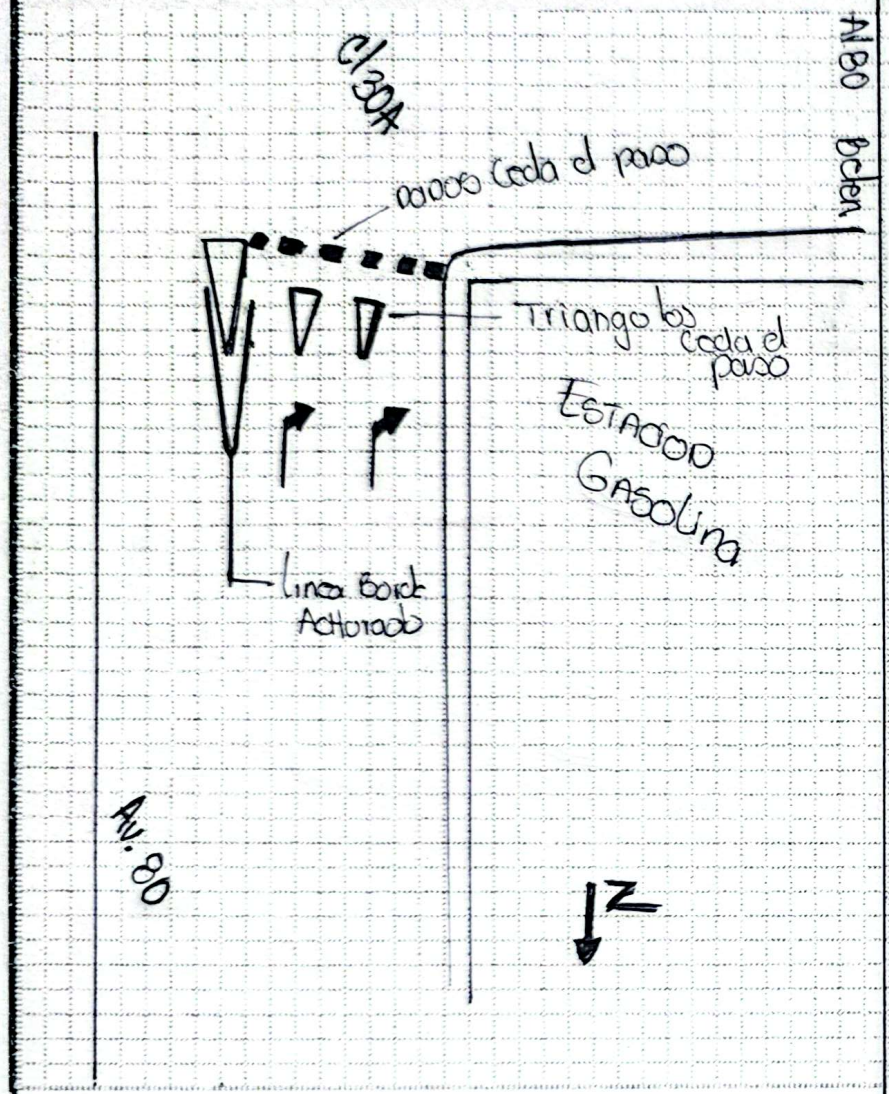

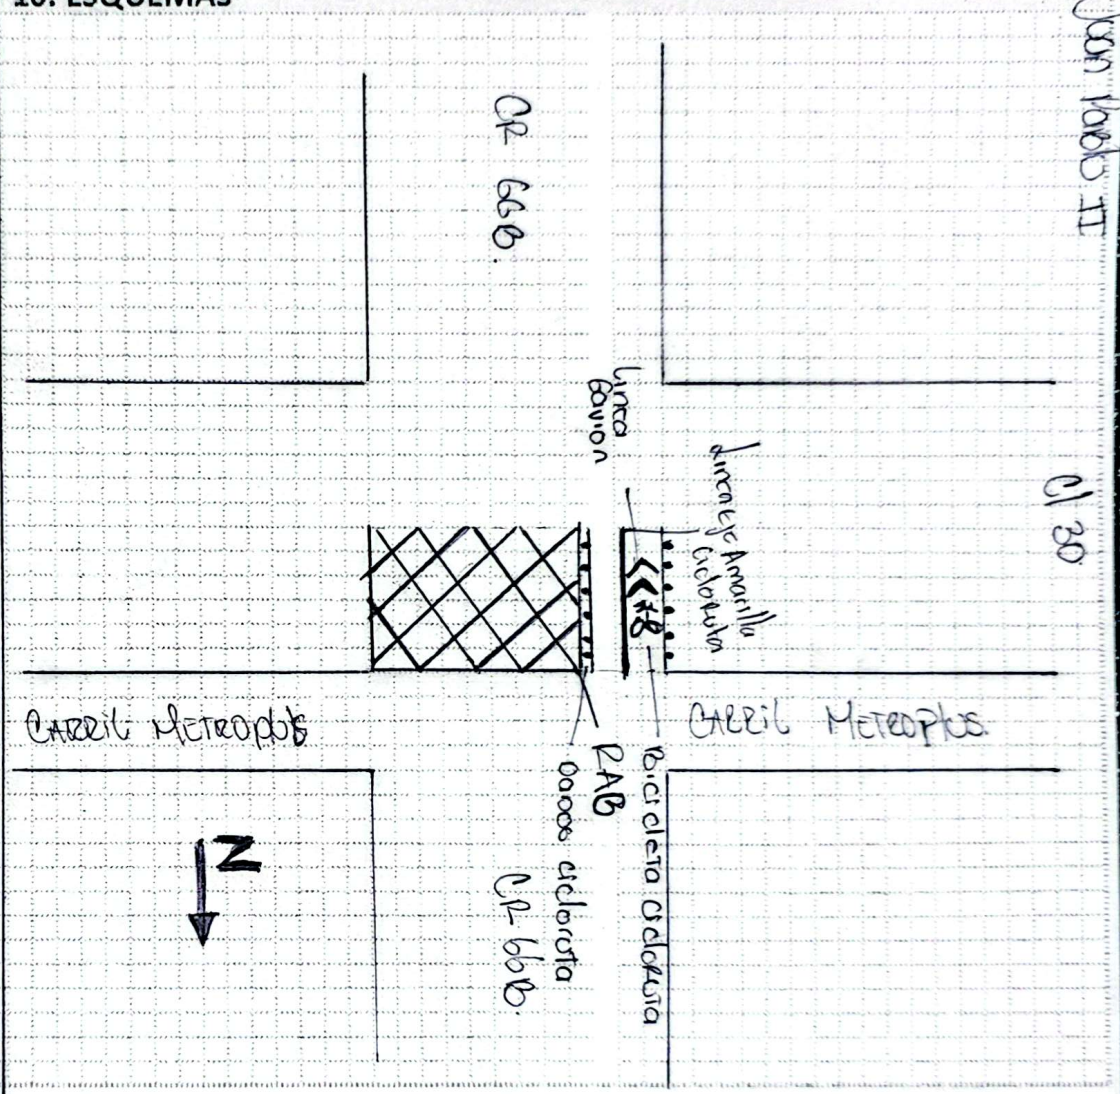

TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	Juan pablo II / BELEN	DIRECCIÓN	cl 30 CR 66B / AV. 80 cl 30A.

Powered by CamScanner

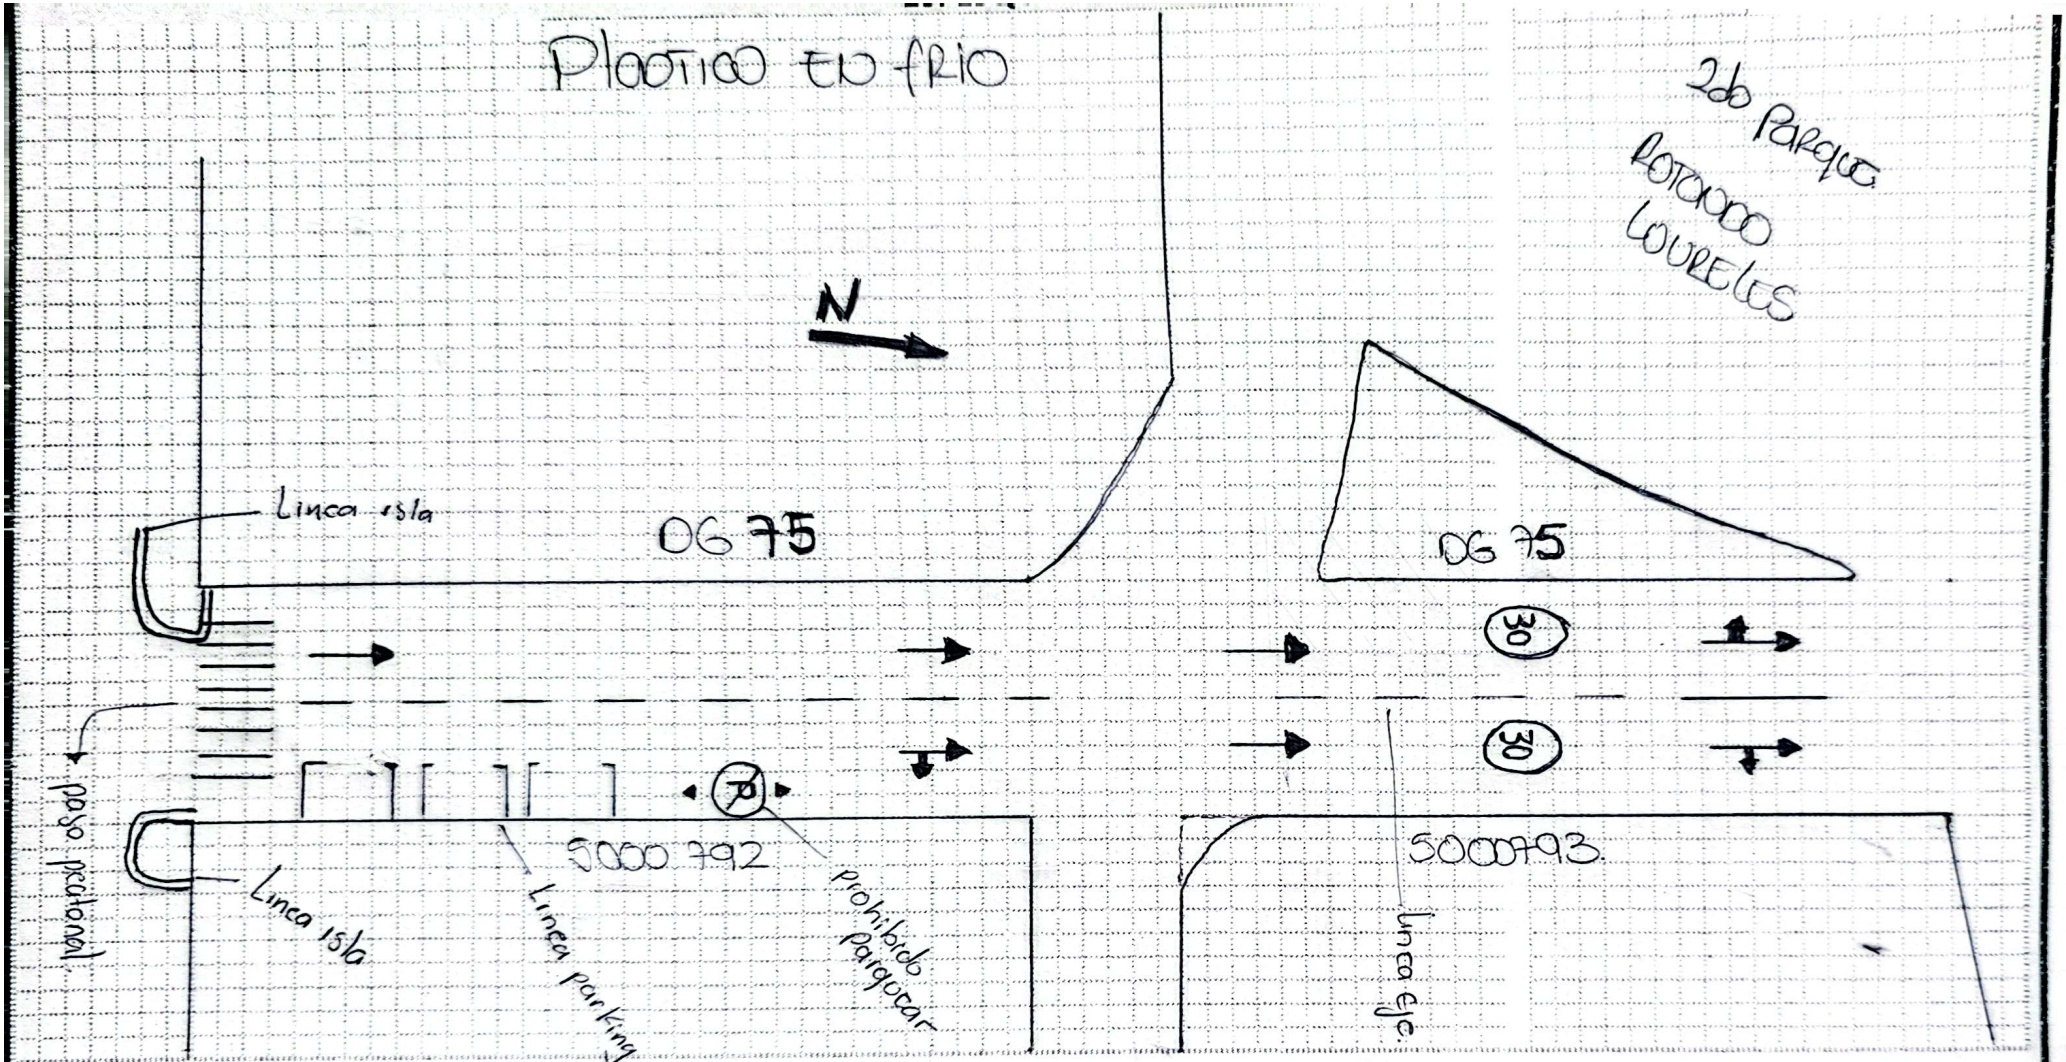

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Señalización	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	Laureles	DIRECCIÓN	DG 75 Tv 39 CA / 39 CB / 39 D.

Powered by CamScanner
