FECHA (D/M/A): 04/02/2026.

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	SEÑALIZACIÓN
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	6
COMUNA	14.
BARRIO	(TODOS LOS) ASTORGA
FRENTE DE TRABAJO:	20.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 PM.	\ \ \ \
TERMINACIÓN: 5:30 AM.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Cuadrilla #20 H16 Retoman Actividades de Aplicación de Plastico EN FRIO EN zona del poblado Entre cl 9 y Cl 10 por el parque, se trabaja con lineas con Bermas-flecha0 - Eje - RAB.
Se instalan señalizaciones y cerramiento por carriles Garantizando el paso vehicular, y ya tarde se Trabaja el RAB por partes para Garantizar el cruce Actividad terminada a las 5:30 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	NOMBRE: Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Ana María Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04/02/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/ingeniero	Luisa Bermudez	/		
2	Encargado	Manuela Ramirez	/		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Maira Mesa	/		
7	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	/		
8	Ayudante	Dayana Ortiz	/		
9	Ayudante	Jhon Arles	/		
10	Ayudante	Yeiny Yuliana	/		
11	Ayudante	Andres Lopera	/		
12	Ayudante	Juan David Suarez	/		
13	Ayudante	Diego Londoño	/		
14	Ayudante	Julian Valencia	/		
15	Ayudante	Cristian Rodriguez	/		
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan Montoya	/		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JYY 370			
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Cuadrilla #20 #16. Plastico en frio

FECHA (D/M/A): 04/02/2026.


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2001033	4.1.5		CR 43A Cl 9C 10.	—	69,6 m	69,6m	Linea Paso Peatonal 0,40.
2001033	4.1.5		" "	—	9,5 m	9,5 m	Linea Detencion 0,40.
2001033	4.1.3		" "	—	6,58m	6.53m	Linea Division Carril 0,12
2001032	4.1.5		" "	—	101,68m	101,68m	Linea Paso Peatonal 0,40.
2001032	4.1.1		" "	5.	1,2 m^2	6.0 m^2	flecha de frente
2001032	4.1.1		" "	1	2,2 m^2	2,2 m^2	flecha frente y Giro
2001032	4.1.3		" "	—	55,36m	55,36m	Linea Division Carril 0,12
2001032	4.1.5		" "	—	128,7 m	128,7 m	Linea Paso Peatonal 0,40
2001032	4.1.5		" "	—	9,43 m	9,43 m	Linea Detencion 0,40.
2001032	4.1.3		" "	—	52,27 m	52,27 m	Linea de Borde Der 0,12
2001033	4.1.5		" "	—	52,2 m	52,2 m	Linea Paso Peatonal 0,40
	4.1.5		" "	—	378,72m	378,72m	RAB 0,40
2001032	4.1.3		" "	—	52,27 m	52,27 m	Linea Borde 120 Amari 0,12
RAB TIENE		2001033 - 2001032 - 2001285 - 2000905.					
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04/02/2026

10. ESQUEMAS

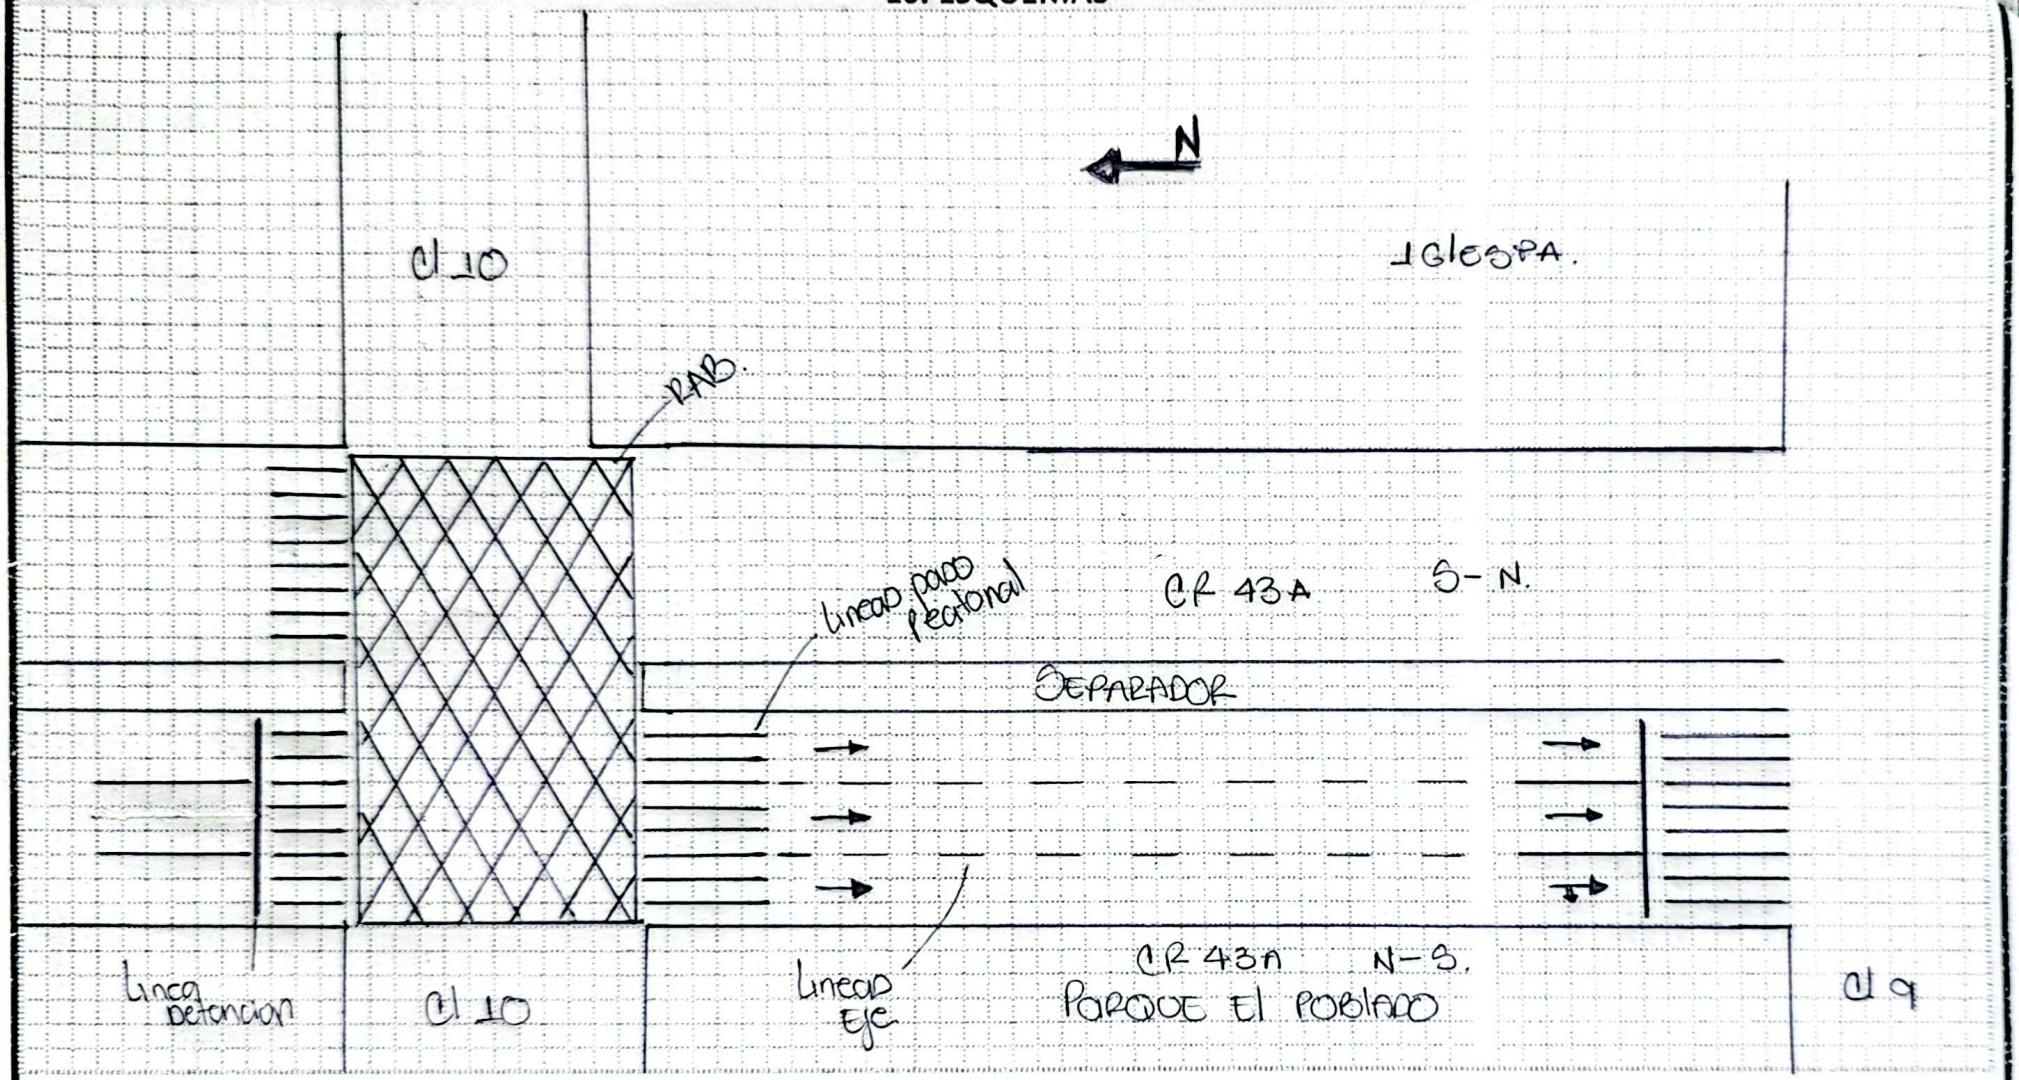

TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20-16.
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	TODOS NO	DIRECCIÓN	CR 43A Cl 9 Cl 10

Powered by CamScanner
