FECHA (D/M/A): 17 - Feb - 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Manuos Rango 4

RANGO: 4 CANTIDAD: 50-06

ZONA: 03

COMUNA: 09

BARRIO: Nva Flores

FRENTE DE TRABAJO: C-21

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIoN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7 am.

TERMINACIÓN: 4 pm.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soco

TARDE: Soco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

5008120 Y 5008122 - Se trabaja en estos segmentos sobre la márgen izquierda, adicionalmente se completa área de ayer que se había dejado con fresado, sobre la cra 26 con cll 48 se deja zona en primera capa. Se verifican espesores sueltos, temperaturas de compactación, geometría y espesores, temperaturas 144.3, 143.4 143, 140.8, 143.5, espesor suelto 12.5cm. Se presentó incidente durante actividades para daño aurso correspersal bancolombia. Observación: despues de demoler con fresadora se encontró una estructura con material regular o malo que se observa fatigado y se quiebra o convierte en polvo al compactar. Se realizaron remplazos puntuales, ya que toda el área presentó esta estructura y con bolas de roca de hasta 3" Visita Social en obra, se acordó la reposicion de daños cra25 y cll 48., se realizan visita de residente del consorcio vial med.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Mateo Zapata Hernandez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Luis Alejandro Castro Rega
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

NOMBRE: Michael Londoño
Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-02-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Mateo Zapata	x		Consorcio Vial mad
2	Encargado	Angel mosquera	x		G y P
3	Liguero	Jaime Grisales	x		G y P
4	Rastrillero	Emilio bonilla	x		G y P
5	Rastrillero	Luis miguel Suarez	x		G y P
6	Ayudante	Julio moreno	x		G y P
7	Ayudante	Andres Gonzalez	x		G y P
8	Ayudante	Arley agudelo	x		G y P
9	Ayudante	Luis Angel	x		G y P
10	Ayudante	Carlos Mosquera	x		G y P
11	Ayudante	Evangelina moreno	x		Consorcio vial mad
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Daimler Solorzano	x		G y P
17	Operador compresor	Edar Vsuga	x		G y P
18	Operador fresadora	Diego botanero	x		G y P
19	Operador finisher	Alejandro fuentes	x		G y P
20	Operador Retroexcavadora				G y P
21	Operador Vibrocompactador	Rafael Sanchez	x		G y P
22	Operador Compactador llantas	Edwin barrera.	x		G y P
23	Operador Cortador Asfalto				G y P
24	Operador Equipo Imprimación				G y P
25	Operador Mini cargador	Gustavo ahumada	x		G y P
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan londoño	x		G y P
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo orango	x		G y P
		Guido Reyo	x		G y P
		Luis zapata	x		G y P
		Jorge holguin	x		G y P
		William mazo	x		G y P
	55	Jhon zapata	x		G y P

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Doosan. Kaeser M50	x		
3	Fresadora	Wirtgen W100	x		
4	Finisher	CAT AD 800 D	x		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Tandem 2018 HAMM	x		
7	Compactador llantas	HAMM 2019 HP-28	x		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Caa boy	x		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora	New Holand E 218-2021	x		
14	Carrotanque				
15	Camión	Mitsubishi fuso	x		
16	Volqueta(s)				
		5 doble troque	x		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-02-26

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5008120	1	2	CR26 CL148+27	7.4	5.6333	.1046	416.86	43.604	102.468
5008122	1	1	CL148 CR25 CR26	18.1	3.41	.1046	61.72	6.46	15,171
TOTALES							478.59	50.06	117.64

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236472	SMX568	23.03		148°
236473	TAP993	24.12		144.5
236474	WDX703	23.00		142.3
236475	SNN501	24.13		145.8
236476	TRL738	23.36	117.64	


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26035	SNN301	D	1	La 30
26036	TRL738	D	1	La 30
26033	TAP943	D	1	La 30
26034	WDX703	D	1	La 30
26037	SMX568	D	1	Broco8cl)

Powered by CamScanner


FECHA (D/M/A): 17-02-26

10. ESQUEMAS

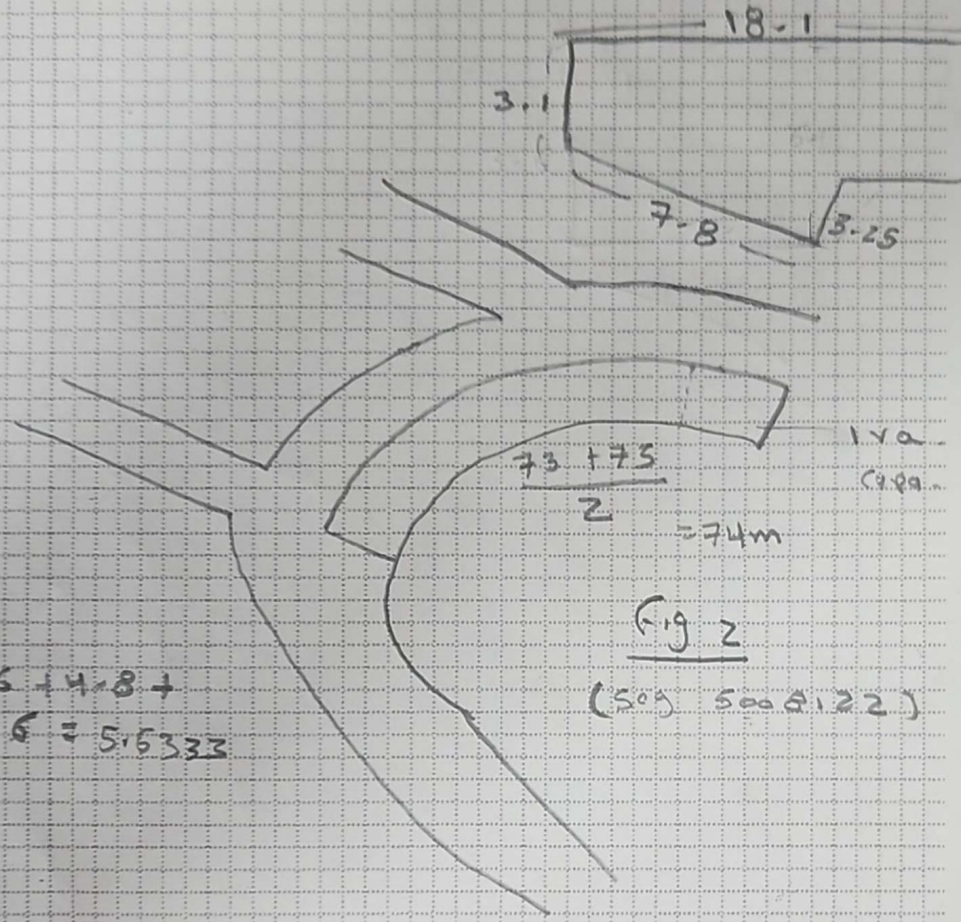

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Masivos Rango 4	FRENTE	C 21
RANGO:	4	CANTIDAD:	CR 26 - CL 48 +27 CL 48 - CR 25 - CR 26
BARRIO	mina flores	DIRECCIÓN	50.06 m3

Powered by CamScanner

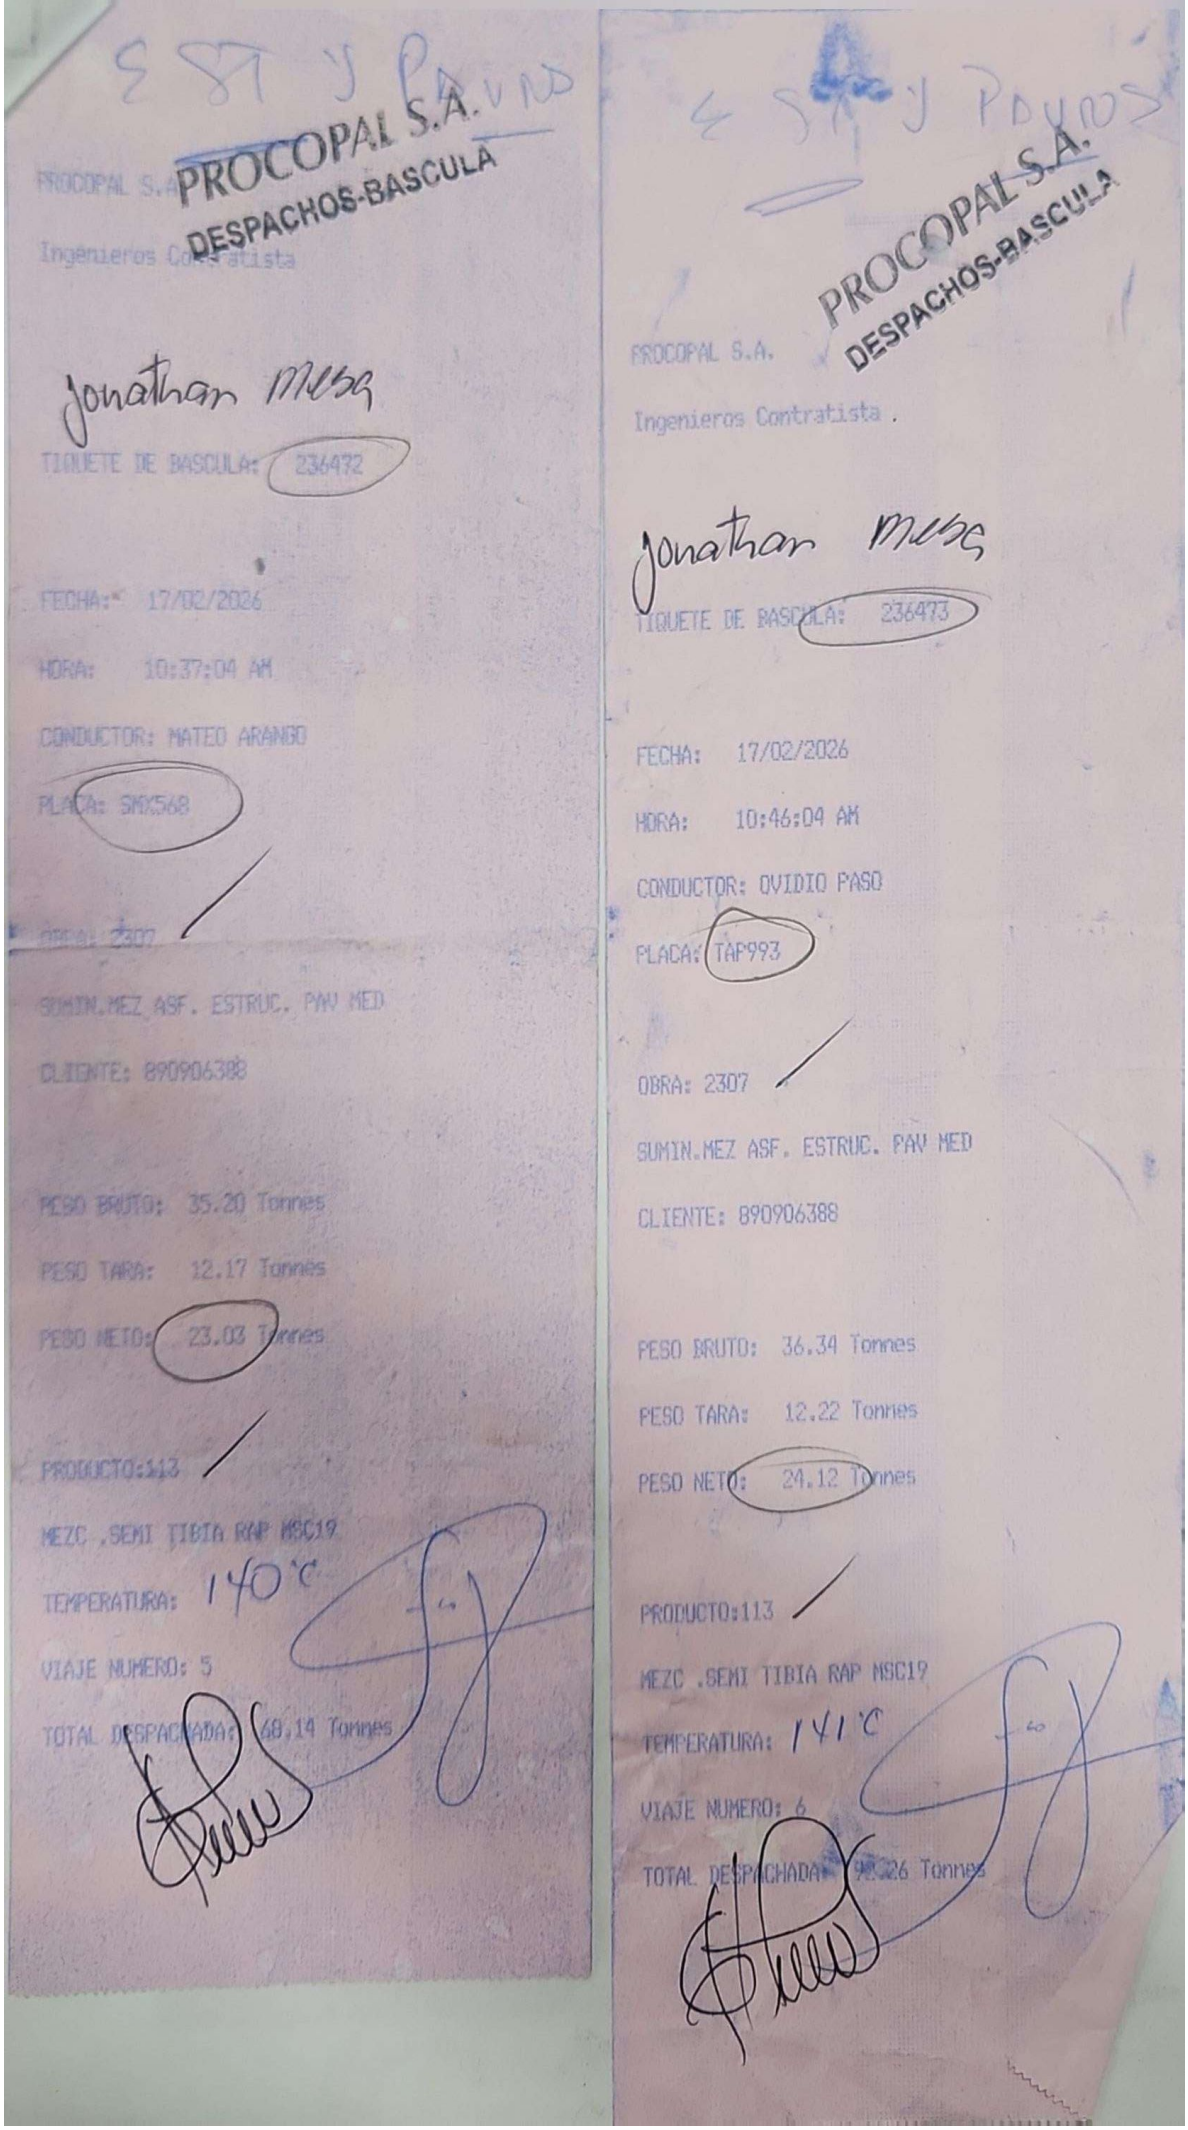

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratista

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236472

FECHA: 17/02/2026

HORA: 10:37:04 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SMX568

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.20 Tonnes

PESO TARA: 12.17 Tonnes

PESO NETO: 23.03 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 68.14 Tonnes

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratista .

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236473

FECHA: 17/02/2026

HORA: 10:46:04 AM

CONDUCTOR: OVIDIO PASO

PLACA: TAP993

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 36.34 Tonnes

PESO TARA: 12.22 Tonnes

PESO NETO: 24.12 Tonnes

PRODUCTO:113


MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 98.26 Tonnes

Powered by CamScanner

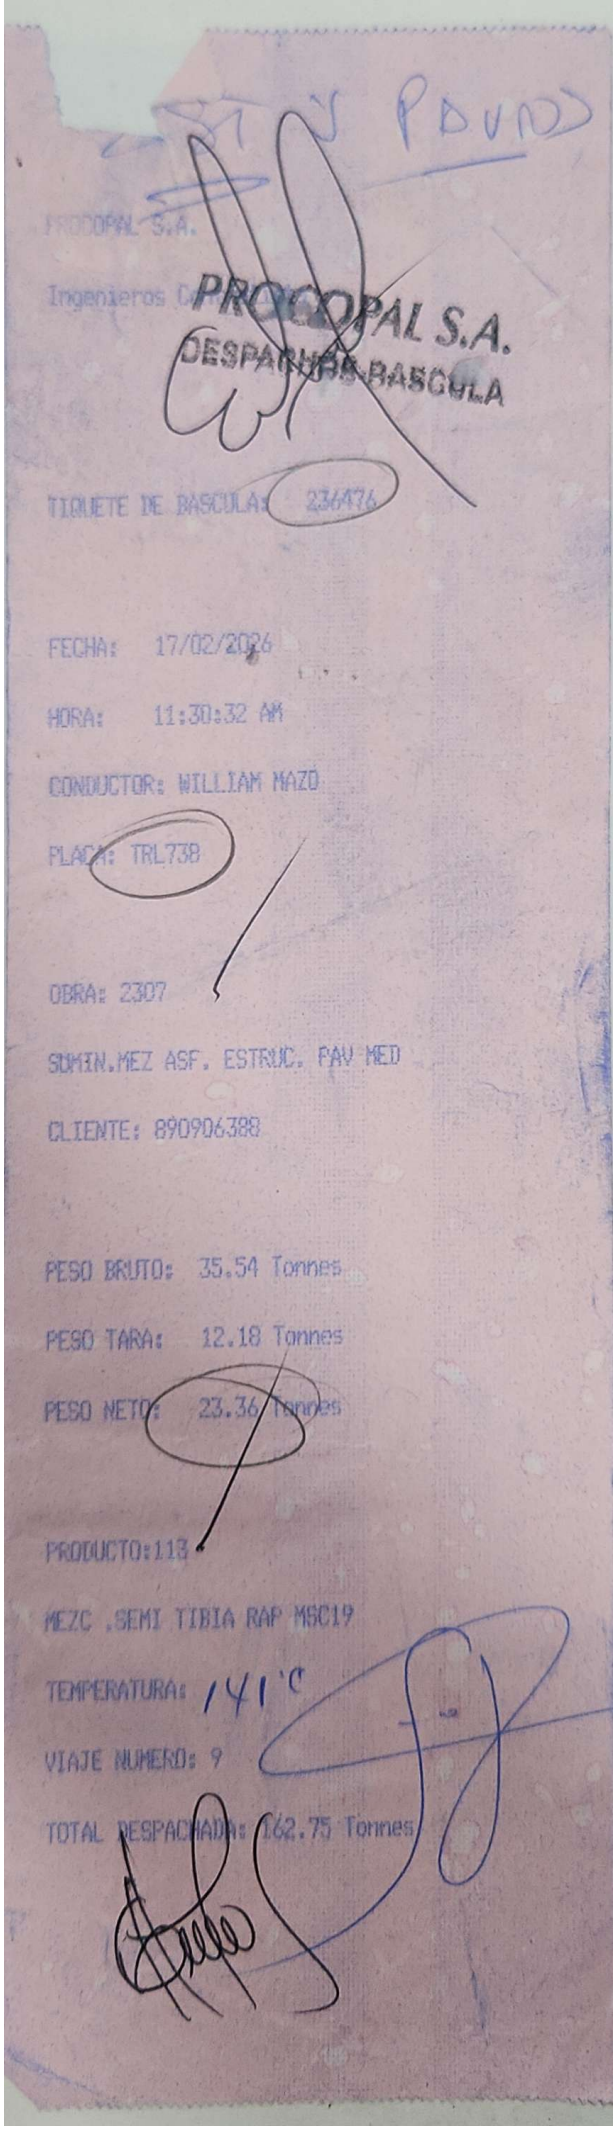

PROCOPAL S.A.

Ingenieros C...

PROCOPAL S.A.
DESPACHO-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236476

FECHA: 17/02/2026

HORA: 11:30:32 AM

CONDUCTOR: WILLIAM MAZO

PLACA: TRL738

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.54 Tonnes

PESO TARA: 12.18 Tonnes

PESO NETO: 23.36 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 9

TOTAL DESPACHADA: 162.75 Tonnes

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 26037

PROVEEDOR: Virtual 2025. Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Ercombio

17 febrero 26

PLACA No: SMX568 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.

NIT. 890.906.388-9

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26035

PROVEEDOR: Vialvid 2025 Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

17 Febrero 26

PLACA No: SRN501 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: SCA

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guena

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26036

PROVEEDOR: Vialvid 2025 Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

17 Febrero 26

PLACA No: TRL738 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: Samuel M

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guena

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26033

PROVEEDOR: Virtued 2025 Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

PLACA No: TAP 113 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: SCAN

17 febrero 26

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26034

PROVEEDOR: Virtued 2025 Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

PLACA No: WDX 703 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: SCAN

17 febrero 26

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
