FECHA (D/M/A): 18-02-26

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Masivos Rango 4
RANGO: 4	CANTIDAD: 50.05 m³
ZONA: 03	FRENTE DE TRABAJO: C21
COMUNA: 09	
BARRIO: Nueva Floresta	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 6:30 am	Retros por voladera (Cavba varada).
TERMINACIÓN: 6:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Seco
	TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

NOTA: Durante la actividad de fresado se evidencia una socavón en la vía de 1,60 m de profundidad, se evidencia fuga de acueducto y se reporta a EPM con radicado No. 5983354. Direccion:
El mismo día se tiene visita del supervisor de EPM. la cuadrilla llega en horas de la tarde, excava y nos informa que no es daño de acueducto, por ende, lo pasan para el área de alcantarillado.
Se deja la zona señalizada con balizas, malla, cinta peligro, letreros informativos y dos teleras cubriendo la zona de la socavacion.
Se deja un área aproximada de 16 m² sin pavimentar. En dicha área se evidencian varias socavaciones.
- En cuanto al daño del letrero de bancolombia y la banca ubicada en la: . la dueña manifesta que ella misma se encarga de organizarlos, no se genera PQRS. Datos de la propietaria: Madeleni Chaverra Celular: 3022888765 Madeleni. Las actividades de pavimentacion se completaron de manera exitosa, se controla temperatura Bromo a compactaciones, 138-7, 144-5, 147-1, 145-3, 139-9. adecuado control en las demoliciones, cargue y retiro del material.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Madeleni Zapata Zapata	Michael Londoño
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro Lopez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Mateo zapata			Consorcio Vial mad.
2	Encargado	Angel mosquera.			C y P
3	Liguero	Jaime Grisales			C y P
4	Rastrillero	Emilio banitas			C y P
5	Rastrillero	Luis miguel Suarez			C y P
6	Ayudante	Julio moreno			C y P
7	Ayudante	Andres Gonzales			C y P
8	Ayudante	Arley agudelo			C y P
9	Ayudante	Luis Angel			C y P
10	Ayudante	Carlos mosquera			C y P
11	Ayudante	Evangelina moreno	X		Consorcio vial mad
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Daimler Solorzano	X		C y P.
17	Operador compresor	Evar Usuga	X		C y P
18	Operador fresadora	Diego botero Cor	X		C y P
19	Operador finisher	Alejandro Fuentes	X		C y P
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Rafael Sanchez	X		C y P
22	Operador Compactador llantas	Edwin herrera	X		C y P.
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador	Gustavo ahumada	X		C y P
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan Londoño	X		C y P
29	Conductor Volqueta(s)	Ovidio Raso	X		C y P
	"	Jorge Holguin	X		C y P
	"	Jhonatan hoyos	X		C y P
	"	Luis zapata	X		C y P
	SST	Jhon zapata	X		C y P.

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Dacson M30	✓		
3	Fresadora	Wirtgen W100	✓		
4	Finisher	CAT AD 800	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Tambor 2018-Ham	✓		
7	Compactador llantas	Hamm 2019 - HI 28	X		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Leo boy	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora	New Holand.	X		
14	Carrotanque				
15	Camión	Mitsubishi Fuso 2016	X		
16	Volqueta(s)				
		5 doble troque.	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-26

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Área (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5008122	—	1	C1148 CR25 CR26	77.04	5.64	.103	434.51	44.75	105.17
5008120	—	2	CR26 C1148 C1148+27	9.61	5.55	.103	51.41	5.30	12.44
TOTALES							485.92	50.05	117.61

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236507	TMP993	23.23		138.4
236508	SRW301	24.10		134.8
236509	EQX167	23.14		144.2
236498	WDX703	24.08		144.8
236510	TRL738	23.06	117.61	130.8


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26038	EQX167	D	1	La 30
26040	TRL738	D	1	Procopal
25851	TMP993	D	1	La 30
25852	SRW601	D	1	Procopal
26041	26041) WDX703	D	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-02-26

10. ESQUEMAS

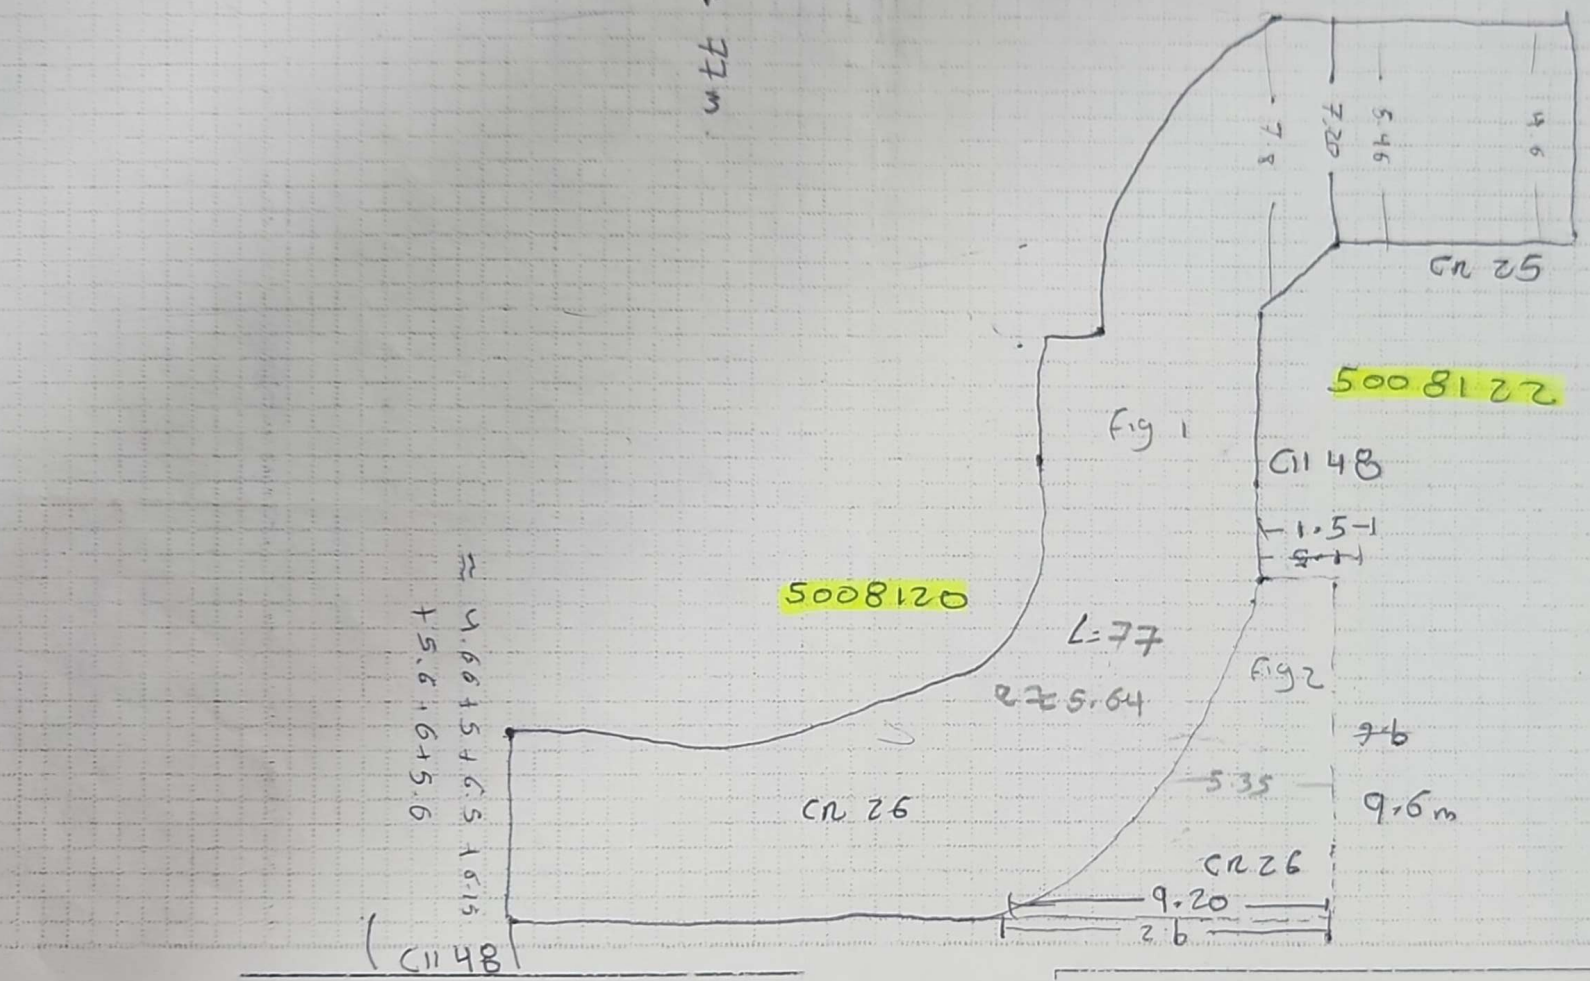

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantos M4	FRENTE	C 21
RANGO:	4	CANTIDAD:	50.05 m³
BARRIO	miva flores	DIRECCIÓN	Cl 48 - Cr 25 - Cr 26. Cr 26 Cl 48 Cl 48 + 27

Powered by CamScanner

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Ingenieros Contratista

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236507

FECHA: 18/02/2026

HORA: 10:52:24 AM

CONDUCTOR: OVIDIO PASO

PLACA: TAP993

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.41 Tonnes

PESO TARA: 12.18 Tonnes

PESO NETO: 23.23 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 87.81 Tonnes

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Ingenieros Contratista

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236508

FECHA: 18/02/2026

HORA: 11:31:51 AM

CONDUCTOR: JORGE HOLGUIN

PLACA: SRN501

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.70 Tonnes

PESO TARA: 11.60 Tonnes

PESO NETO: 24.10 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 7

TOTAL DESPACHADA: 111.91 Tonnes

Powered by CamScanner

EST Y PUTOS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Constructores

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236510

FECHA: 18/02/2026

HORA: 2:25:02 PM

CONDUCTOR: WILLIAM MAZO

PLACA: TRL738

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.35 Tonnes

PESO TARA: 12.29 Tonnes

PESO NETO: 23.06 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142 C°

VIAJE NUMERO: 9

TOTAL DESPACHADA: 150.11 Tonnes

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26038**

PROVEEDOR: Viatued 2025 Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

PLACA No: EOX 167 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio Ta 30

RECIBIDO POR: [signature]

18 Febrero 26

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26040**

PROVEEDOR: Viatued 2025. Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

PLACA No: TPL 738 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Proicpal

18 FEB 2026

RECIBIDO POR: [signature]

18 Febrero 26

PROCIPAL S.A.S

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 26041

PROVEEDOR: Viaued 2025 Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Elcombor

18 febrero 26

PLACA No: WDX-703 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Procopal

PROCOPAL S.A.

NIT. 890.906.388-0

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Cuetra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25851

PROVEEDOR: VIAL MEJ FLT

VALE POR UN VIAJE: Frecado

12/2/26

PLACA No: IAP993 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: la 30

RECIBIDO POR: SCAT

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25852

PROVEEDOR: VIAL MEJ FLT

VALE POR UN VIAJE: Frecado

12/2/26

PLACA No: SRN501 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: la 30

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

EST y Pavos

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236509

FECHA: 18/02/2026

HORA: 11:35:02 AM

CONDUCTOR: JHONATAN HERNAN

PLACA: ERX167

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.59 Tonnes

PESO TARA: 12.45 Tonnes

PESO NETO: 23.14 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 8

TOTAL DESPACHADA: 135.05 Tonnes

EST y Pavos

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236498

FECHA: 18/02/2026

HORA: 9:36:25 AM

CONDUCTOR: LUIS ZAPATA

PLACA: WDX703

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 34.11 Tonnes

PESO TARA: 10.03 Tonnes

PESO NETO: 24.08 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 64.58 Tonnes

Powered by CamScanner
