FECHA (D/M/A): 19-02-26

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):

RANGO: 4 | CANTIDAD: 46.99

ZONA: 03

COMUNA: 09

BARRIO: Nueva Flores

FRENTE DE TRABAJO: C21

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 6:30 am.

TERMINACIÓN: 4:30 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

TARDE: Seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inician actividades 6:30 am con la complementación de la señalización del punto a trabajar y sus aproximaciones, se realiza proceso de fresado y demolición, cargue y retiro de escombros y fresado, se realiza limpieza al área a intervenir y se analiza remanente y estructura del pavimento se encuentra canto rodado quebrado y suelo con mucho polvo el cual aumenta al paso de vehículos. se completa la imprimación y se inicia proceso de pavimentación se verifica espesor sin compactar 12.5cm y temperaturas de aplicación para compactar.: 144, 141.3, 139.8, 143.5, 144.3, se presentan problemas con la plancha de finisher y se interviene para garantizar el espesor compacto.- se gestionó permiso para cierre de acceso al tramo que se va a ejecutar el día de mañana

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Mateo Zapata Gallego
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Luis Alejandro Ortiz Rojas
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Michael Londoño
Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Mateo Zapata.	X		Consorcio Vial Mat
2	Encargado	Angel mosquera	X		G4S
3	Liguero	Jaime Grisales	X		G4S
4	Rastrillero	Emilio benitez	X		G4S
5	Rastrillero	Luis miguel Suarez	X		G4S
6	Ayudante	Julio moreno	X		G4S
7	Ayudante	Andres Gonzalez	X		G4S
8	Ayudante	Arley agudelo.	X		G4S
9	Ayudante	Luis Angel.	X		G4S
10	Ayudante	Carlos mosquera	X		G4S.
11	Ayudante	Evangelina moreno	X		Consorcio Vial Mat
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Daimler Solorzano	X		G4S
17	Operador compresor	Edier usuga	X		G4S
18	Operador fresadora	Diego betancur.	X		G4S
19	Operador finisher	Alejandro fuentes	X		G4S
20	Operador Retroexcavadora				G4S
21	Operador Vibrocompactador	Rafael Sanchez	X		G4S
22	Operador Compactador llantas	Edwin bamora.	X		G4S
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador	Gustavo alumada.	X		G4S
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan londoño	X		G4S
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango	X		G4S
		Luis Zapata	X		G4S
		Ovidio Paso	X		G4S
		Jorge holguin.	X		G4S
		Jhonatan Hernan	X		G4S

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	KAESER M 50	X		
3	Fresadora	wirtgen w 100	X		
4	Finisher	CAT MD B00D	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Tandem 2018 - Hamm	X		
7	Compactador llantas	Hamm 2019 - HW 78.	X		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Cea hoy	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora	new Holand	X		
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)	mitshishi foso 2016	X		
		5 doble Trague	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-26

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5008109	—	—	CR 26 CL 48 127 C49	92	4.8647	.105	447.56	46.99	110.436
TOTALES							447.56	46.99	110.43

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236536	SMX568	23.02		144	26042	TAP993	D	1	La 30
236537	WOX703	21.16		141.3	26044	SRW501	D	1	La 30
236541	TAP993	22.05		139.8	26045	EQX167	D	1	La 30.
236542	SRW501	22.09		143.5	26047	WOX703	D	1	Procopal
236543	EQX167	22.12	110.44	144.3					
236543									

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

10. ESQUEMAS

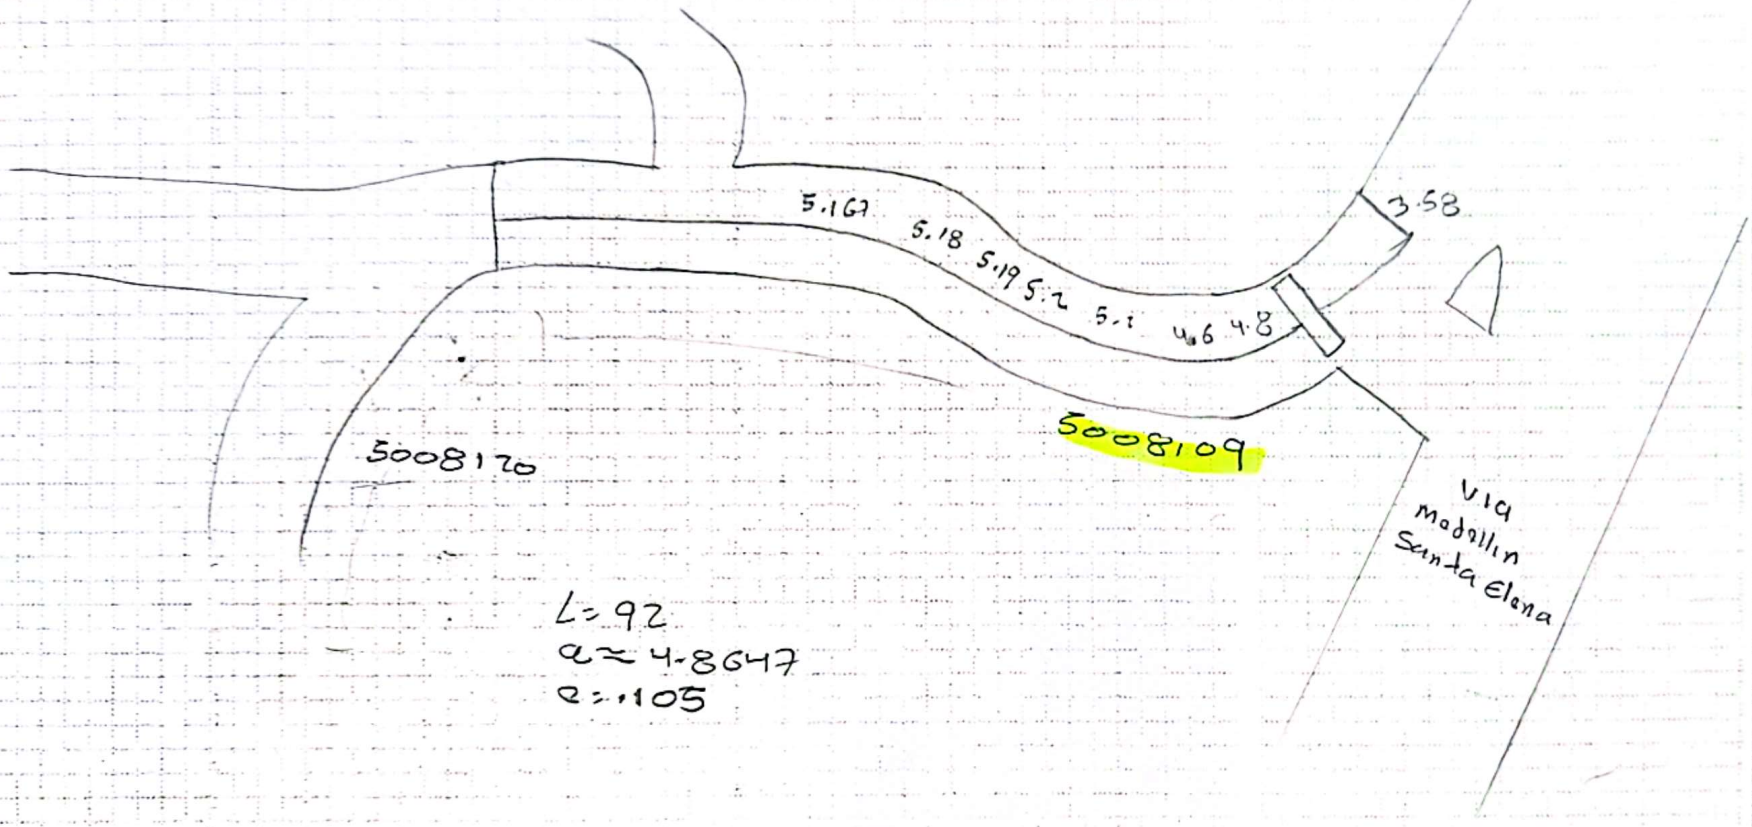

= 46.99 m³ — 110.43 Ton.

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Masivos Rango 4	FRENTE	C 21
RANGO:	4	CANTIDAD:	46.99 m³
BARRIO	mina flores	DIRECCIÓN	Cra 26 - Cl 48 + 27 Cl 49.

Powered by CamScanner

EST Y POUND

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236536

FECHA: 19/02/2026

HORA: 8:58:26 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SMX568

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.14 Tonnes

PESO TARA: 12.12 Tonnes

PESO NETO: 23.02 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 63.18 Tonnes

EST Y POUND

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236537

FECHA: 19/02/2026

HORA: 9:08:38 AM

CONDUCTOR: LUIS ZAPATA

PLACA: WDX703

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 31.16 Tonnes

PESO TARA: 10.00 Tonnes

PESO NETO: 21.16 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 84.34 Tonnes

Powered by CamScanner

EST Y PAVIS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratista

jonathan mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236541

FECHA: 19/02/2026

HORA: 9:45:35 AM

CONDUCTOR: OVIDIO PASO

PLACA: TAP993

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 34.21 Tonnes

PESO TARA: 12.16 Tonnes

PESO NETO: 22.05 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 7

TOTAL DESPACHADA: 104.39 Tonnes

EST Y PAVIS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratista

jonathan mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236542

FECHA: 19/02/2026

HORA: 10:43:02 AM

CONDUCTOR: JORGE HOLGUIN

PLACA: SRN501

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 33.60 Tonnes

PESO TARA: 11.51 Tonnes

PESO NETO: 22.09 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 8

TOTAL DESPACHADA: 128.48 Tonnes

Powered by CamScanner

EST Y PAVIMS

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A
DESPACHOS-B...

Ingenieros Contratista

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236543

FECHA: 19/02/2026

HORA: 11:29:14 AM

CONDUCTOR: JHONATAN HERNAN

PLACA: EQX167

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 34.42 Tonnes

PESO TARA: 12.30 Tonnes

PESO NETO: 22.12 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 143°C

VIAJE NUMERO: 9

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26042

PROVEEDOR: Vialmed 2025 frente 21

VALE POR UN VIAJE: Pagado

PLACA No: TAP 173 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: Jonathan

11 febrero 26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26044

PROVEEDOR: Vialmed 2025 frente 21

VALE POR UN VIAJE: Pagado

PLACA No: SRN 901 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: DSCAS

19 febrero 26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26045

PROVEEDOR: Vialved 2025 frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

PLACA No: EBX 167 CAPACIDAD: 15 M3

19 febrero 26

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: OSCAR

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26047

PROVEEDOR: Vialved 2025 frente 21

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: WDX703 CAPACIDAD: 15 M3

19 febrero 26

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.

NIT. 890.906.306-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
