FECHA (D/M/A): 25-02-26	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Hasivos		
RANGO:	4	CANTIDAD:	36.22 m³

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	06	FRENTE DE TRABAJO:	C21
COMUNA	16		
BARRIO	Balan.		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO:	~~6:30 am~~ 5:30 AM	
TERMINACIÓN:	4 Pm.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Seco
	TARDE	Seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia con actividad de traslado de maquinaria y Equipo hacia cra 78 entre cl 30A y 29, se instala la señalización de obra segun pmt, se realizó proceso de fresado y demoliciones cargue y retiro del material hacia sitios de acopio o botadero autorizado. Se presentó novidad con obra sobre cl 78 y cl 30 margen izquierdo, realizan excavación para conexión de acometida y lleno compactado al cual no se verifica en cuanto a densidades, tambien frente al edficio se encontró una zona blanda y un pacho de exploración con daño en alcantarillado, se deja cuadro sin pavimentar, se deja en seguimiento el área que se observo con zona blanda. Se verifica temperatura de descarga y compactación del pavimento 138.8, 140.2, 144.3, 139.5.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Marco Tulio Mahecha Sarmiento	Michael Londoño.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alexander Castro Rojas	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-02-26.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Mateo zapata	✓		
2	Encargado	Angel mosquera	✓		
3	Liguero	Jaime Gonsales	✓		
4	Rastrillero	Emilio bonilla	✓		
5	Rastrillero	Luis miguel Suarez	✓		
6	Ayudante	Julio moreno	✓		
7	Ayudante	Andres Gonzalez	✓		
8	Ayudante	Arley Agudelo	✓		
9	Ayudante	Luis Angel	✓		
10	Ayudante	Carlos mosquera	✓		
11	Ayudante	Evangelina moreno	✓		
12	Ayudante	Luz andrea Villamil	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante	Luvier Vera lopez	✓		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Daimler Solorzano	✓		
17	Operador compresor	Ever Usuga.	✓		
18	Operador fresadora	Diego Botancur.	✓		
19	Operador finisher	Alejandro Fuentes	✓		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Rafael Sanchez	✓		
22	Operador Compactador llantas	Edwin barrera.	✓		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador	Gustavo ahumada	✓		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan landaño	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Luis zapata	✓		
	//	Andres Alvarez	✓		
	//	Jorge holguin	✓		
	//	ovidio Rasc	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Kaeser M 50			
3	Fresadora	Wirtgen W100			
4	Finisher	CAT AP 800D			
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Tandem 7818 Hamm			
7	Compactador llantas	HAMM 2019 HP 28			
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Log boy			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora	New Holand.			
14	Carrotanque				
15	Camión	Mitshi Sh. fuso 2016			
16	Volqueta(s)	4 doble troque			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25-02-26

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001246		1	Cr 78 Cl 30 Cl 30A	66.96	4.67	0,1003	312.70	31.36	73.71
5001132		2	Cr 78 Cl 29 Cl 30	12.75	3.8	0,1003	48.45	4.86	11.42
TOTALES							361.153	36.22	85.13

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236 653	TAB993	22.01		138.8
236 658	SRN501	21.09		140.2
236 659	WDX703	21.01		144.3
236 660	SNX167	21.03	85.14	139.5


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25226	SRN501	D	1	Vc la 30
25227	WDX703	D	1	Vc la 30
25228	SWX167	D	1	Vc la 30
25229	TAB993	D	1	Guacopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25 -02- 26

10. ESQUEMAS

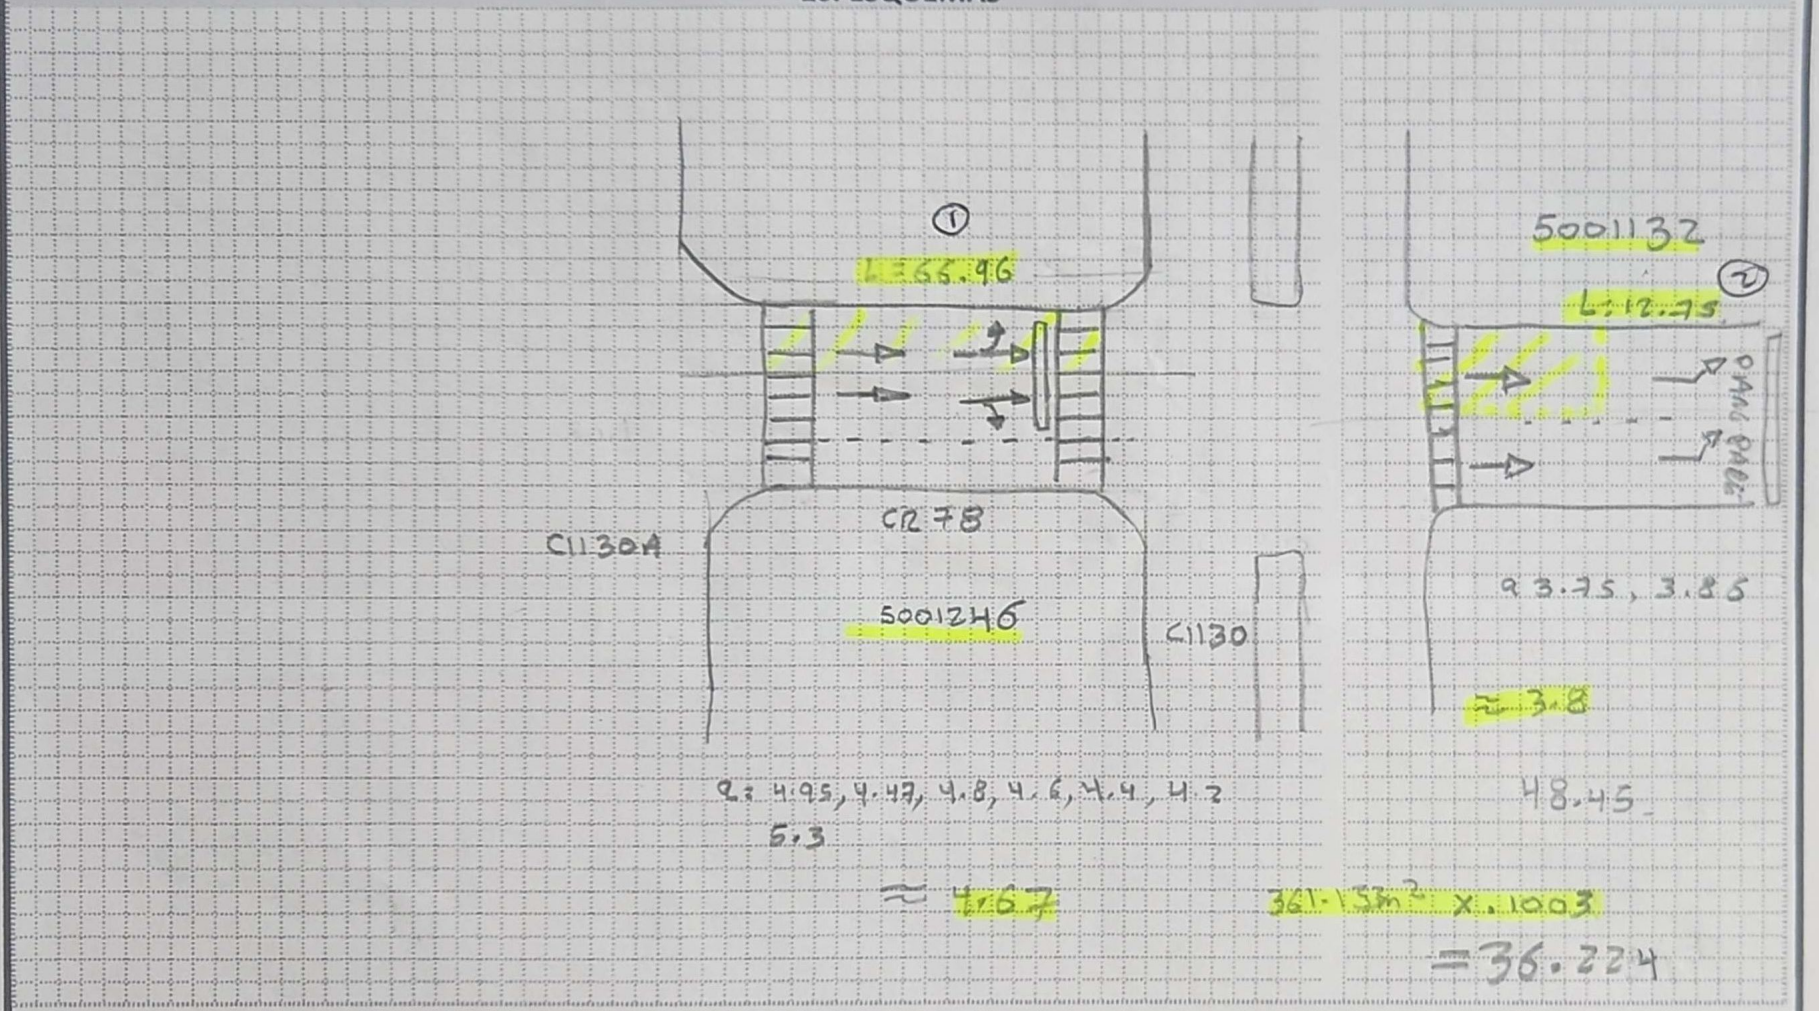

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Masivos	FRENTE	C 21
RANGO:	4	CANTIDAD:	36.224 m3
BARRIO	Comuna 16 Belen	DIRECCIÓN	CR 78 ENTRE CL 29 Y 30A

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236653

FECHA: 25/02/2026

HORA: 9:44:49 AM

CONDUCTOR: OVIDIO PASO

PLACA: TAP993

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 34.19 Tonnes

PESO TARA: 12.18 Tonnes

PESO NETO: 22.01 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 67.15 Tonnes

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236658

FECHA: 25/02/2026

HORA: 10:32:14 AM

CONDUCTOR: JORGE HOLGUIN

PLACA: SRN501

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.60 Tonnes

PESO TARA: 11.51 Tonnes

PESO NETO: 21.09 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 88.24 Tonnes

Powered by CamScanner

Est y Pavds

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236659

FECHA: 25/02/2026

HORA: 10:40:02 AM

CONDUCTOR: LUIS ZAPATA

PLACA: WDX703

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 30.97 Tonnes

PESO TARA: 9.96 Tonnes

PESO NETO: 21.01 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 7

TOTAL DESPACHADA: 109.25 Tonnes

Est y Pavds.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236660

FECHA: 25/02/2026

HORA: 11:00:53 AM

CONDUCTOR: ANDRES ALVAREZ

PLACA: SNX167

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 33.32 Tonnes

PESO TARA: 12.29 Tonnes

PESO NETO: 21.03 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 143°C

VIAJE NUMERO: 8

TOTAL DESPACHADA: 130.28 Tonnes

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25226

PROVEEDOR: VIALMES F21

VALE POR UN VIAJE: Freselo

25-02-26

PLACA No: SRV 850 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: la 30

RECIBIDO POR: Oscar

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25227

PROVEEDOR: Vialmed 2025. Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Triturado

25. Febrero 26

PLACA No: WOX 403 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25228

PROVEEDOR: Virtud 2025 frente 2

VALE POR UN VIAJE: Fresado

25-02-26

PLACA No: SNX167 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio 30

RECIBIDO POR: Sam AP

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25229

PROVEEDOR: Virtud 2025 frente 2

VALE POR UN VIAJE: Escombro

25 febrero 26

PLACA No: TNP 913 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio 30 Procopal.

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
