FECHA (D/M/A): 26-02-2026.	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):			
RANGO:	4	CANTIDAD:	38.61
ZONA	06	FRENTE DE TRABAJO:	C21
COMUNA	16		
BARRIO	Belen		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7 am	
TERMINACIÓN: 3PM.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Continuan actividades sobre CRA 78 entre CII 29 y 30A, se trabaja hoy sobre la margen derecha en dirección del flujo, se inician demoliciones y fresado, se debe esperar para iniciar la imprimación debido a actividad de excavación por parte de obra vecina para la instalación de acometida despues de esto se procede con la imprimación y pavimentación, se deja observación que la obra que realizo el trabajo no verifico densidades y se ejecuta el lleno con cargador. Se procede con aplicación y compactación, se verifica temperatura previo a compactar: 140.2, 145.2, 144.8. 145.1, 139.8. Se aborda parte de fresado para terminar capa de lleno en brecha de la obra vecina, en el extremo del parqueadero dicha obra continua con excavaciones y queda el borde del pavimento sin apoyo durante estos trabajos.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Michael londoño. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro Roque Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Juan J. Bonn J. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Mateo Zapata	/		
2	Encargado	Angel mosquera	/		
3	Liguero	Jaime Gonsales	/		
4	Rastrillero	Emilio bonta	/		
5	Rastrillero	Luis miguel Suarez	/		
6	Ayudante	Julio moreno	/		
7	Ayudante	Andres Gonzalez	/		
8	Ayudante	Aviet agudelo	/		
9	Ayudante	Luis Angel	/		
10	Ayudante	Carlos mosquera	/		
11	Ayudante Transito	Evangelina moreno	/		
12	Ayudante Transito	Luz Andrea Villami.	/		
13	Ayudante				
14	Ayudante Tornillo	Lucian Vera Lopez.	/		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Daimler Solorzano	/		
17	Operador compresor	Cesar Usuga	/		
18	Operador fresadora	Diego botanclur			
19	Operador finisher	Alejandro Cuenta	/		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Rafael Sanchez	/		
22	Operador Compactador llantas	Edwin Barrera.	/		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador	Gustavo alemada	/		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan londoño	/		
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Alvarez	/		
		Luis Zapata	/		
		Jorge holguin	/		
		Ovidio Paso	/		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Kaeser M50	/		
3	Fresadora	Wirtgen W100	/		
4	Finisher	CAT AN 800D	/		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Tandan 2018 Hamm	/		
7	Compactador llantas	Hamm 2019 HP 28	/		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Coo bot	/		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora	new Holand.	/		
14	Carrotanque				
15	Camión	Kenworth. Eso 2016	/		
16	Volqueta(s)	4 doble troque	/		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-26

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001246	—	1	CL78 CL30&30A	68.96	4.23	.10	283.74	28.32	66.56
5001132	/	2	CL78 CL29 CL30	21.29	4.83	.10	102.83	10.28	24.17
TOTALES							386.07	38.61	90.73

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236680	TAB993	23.06			25230	SNW501	D	1	Aclaza
236686	SNW501	23.43			25231	WDX703	D	1	Aclaza
236687	WDX703	22.11			25232	SWX167	D	1	Aclaza
236688	SWX167	22.13	90.73		25234	TAB993	D	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-02-26

10. ESQUEMAS

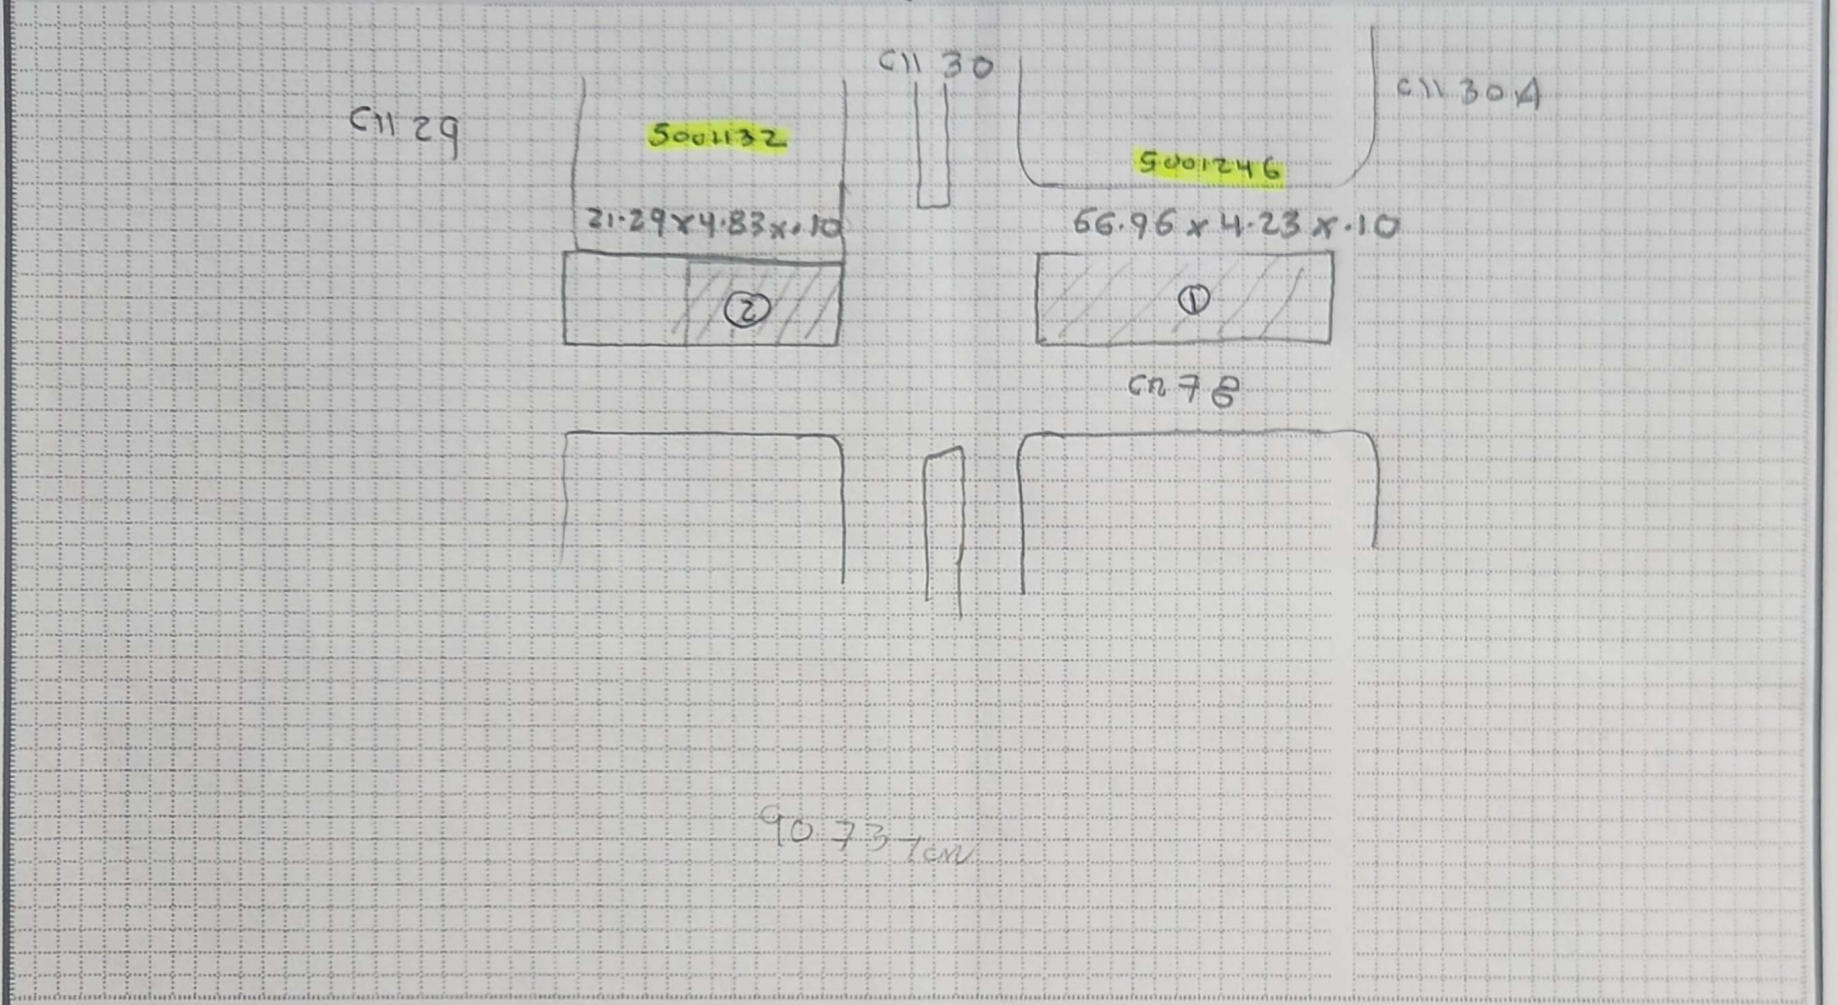

TIPO DE INTERVENCIÓN:	masivos	FRENTE	C 21
RANGO:	4	CANTIDAD:	cant 38.61 m3
BARRIO	Belon	DIRECCIÓN	Cr 78 Cl 30 Cl 30A Cr 78 Cl 29 Cl 30

Powered by CamScanner

EST J PAVD

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

Jonathan Meza

TIQUETE DE BASCULA: 236680

FECHA: 26/02/2026

HORA: 9:23:12 AM

CONDUCTOR: OVIDIO PASO

PLACA: TAP993

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 35.23 Tonnes

PESO TARA: 12.17 Tonnes

PESO NETO: 23.06 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 68.21 Tonnes

Marco Zapata

EST J PAVD

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Ingenieros Contratista

Jonathan Meza

TIQUETE DE BASCULA: 236686

FECHA: 26/02/2026

HORA: 10:17:35 AM

CONDUCTOR: JORGE HOLGUIN

PLACA: SRN501

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 34.92 Tonnes

PESO TARA: 11.49 Tonnes

PESO NETO: 23.43 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 91.64 Tonnes

Marco Zapata

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contr

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236687

FECHA: 26/02/2026

HORA: 10:26:42 AM

CONDUCTOR: LUIS ZAPATA

PLACA: WDX703

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.10 Tonnes

PESO TARA: 9.99 Tonnes

PESO NETO: 22.11 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 7

TOTAL DESPACHADA: 117.75 Tonnes

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contr

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236688

FECHA: 26/02/2026

HORA: 11:17:52 AM

CONDUCTOR: ANDRES ALVAREZ

PLACA: SNX167

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 34.44 Tonnes

PESO TARA: 12.31 Tonnes

PESO NETO: 22.13 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 8

TOTAL DESPACHADA: 135.88 Tonnes

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25230

PROVEEDOR: Vialvid 2025 · Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

26 febrero 26

PLACA No: SRN 561 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: Samd Ruiz

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25231

PROVEEDOR: Vialvid 2025 · Frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

26 febrero 26

PLACA No: WDX 703 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio la 30

RECIBIDO POR: Samd Ruiz

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guerra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25232

PROVEEDOR: Vialvid 2025 frente 21

VALE POR UN VIAJE: Fresado

26 febrero 26

PLACA No: SNX167 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Acopio, la 30

RECIBIDO POR: [signature]

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Guena

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25234

PROVEEDOR: VIAL MET 21

VALE POR UN VIAJE: FRESADO

26-01-26

PLACA No: TAP923 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: [illegible]

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

[signature]

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
