FECHA (D/M/A): 07-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento de cárcamos

RANGO:

CANTIDAD:

ZONA: 3

COMUNA: 10

BARRIO: Alpujarra / Centro Admvo.

FRENTE DE TRABAJO: 22

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 5:10 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

NOCHE: Seco

~~MAÑANA~~ Mañana

TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

* Señalización y cierre del área a intervenir (continua cerrado parte del carril izquierdo de la calzada norte, fue habilitado el carril izquierdo de la calzada sur y cerrado el carril derecho de la misma calzada)
* Identificación y demolición de áreas en malestado de los cárcamos #6 CN y #6, ~~#0C~~S #1, #OCS.
* Vaciado de concreto 28 MPa en cárcamo #6 CN
* Se realizaron trabajos de soldadura en los cárcamos 640 CS., cárcamos 0, 1, 2, 4, 5, 6 CN.
* Se espero que el concreto diera punto y se procedo a realizar pulido con el fin de dejar un acabado rugoso

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA

[illegible]
Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: David Duque B.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero		Y		
2	Encargado		X		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante		Y		
7	Ayudante		V		
8	Ayudante		X		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión		X		
29	Conductor Volqueta(s)				
			X		
			X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión		X		
16	Volqueta(s)				
			X		
			X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

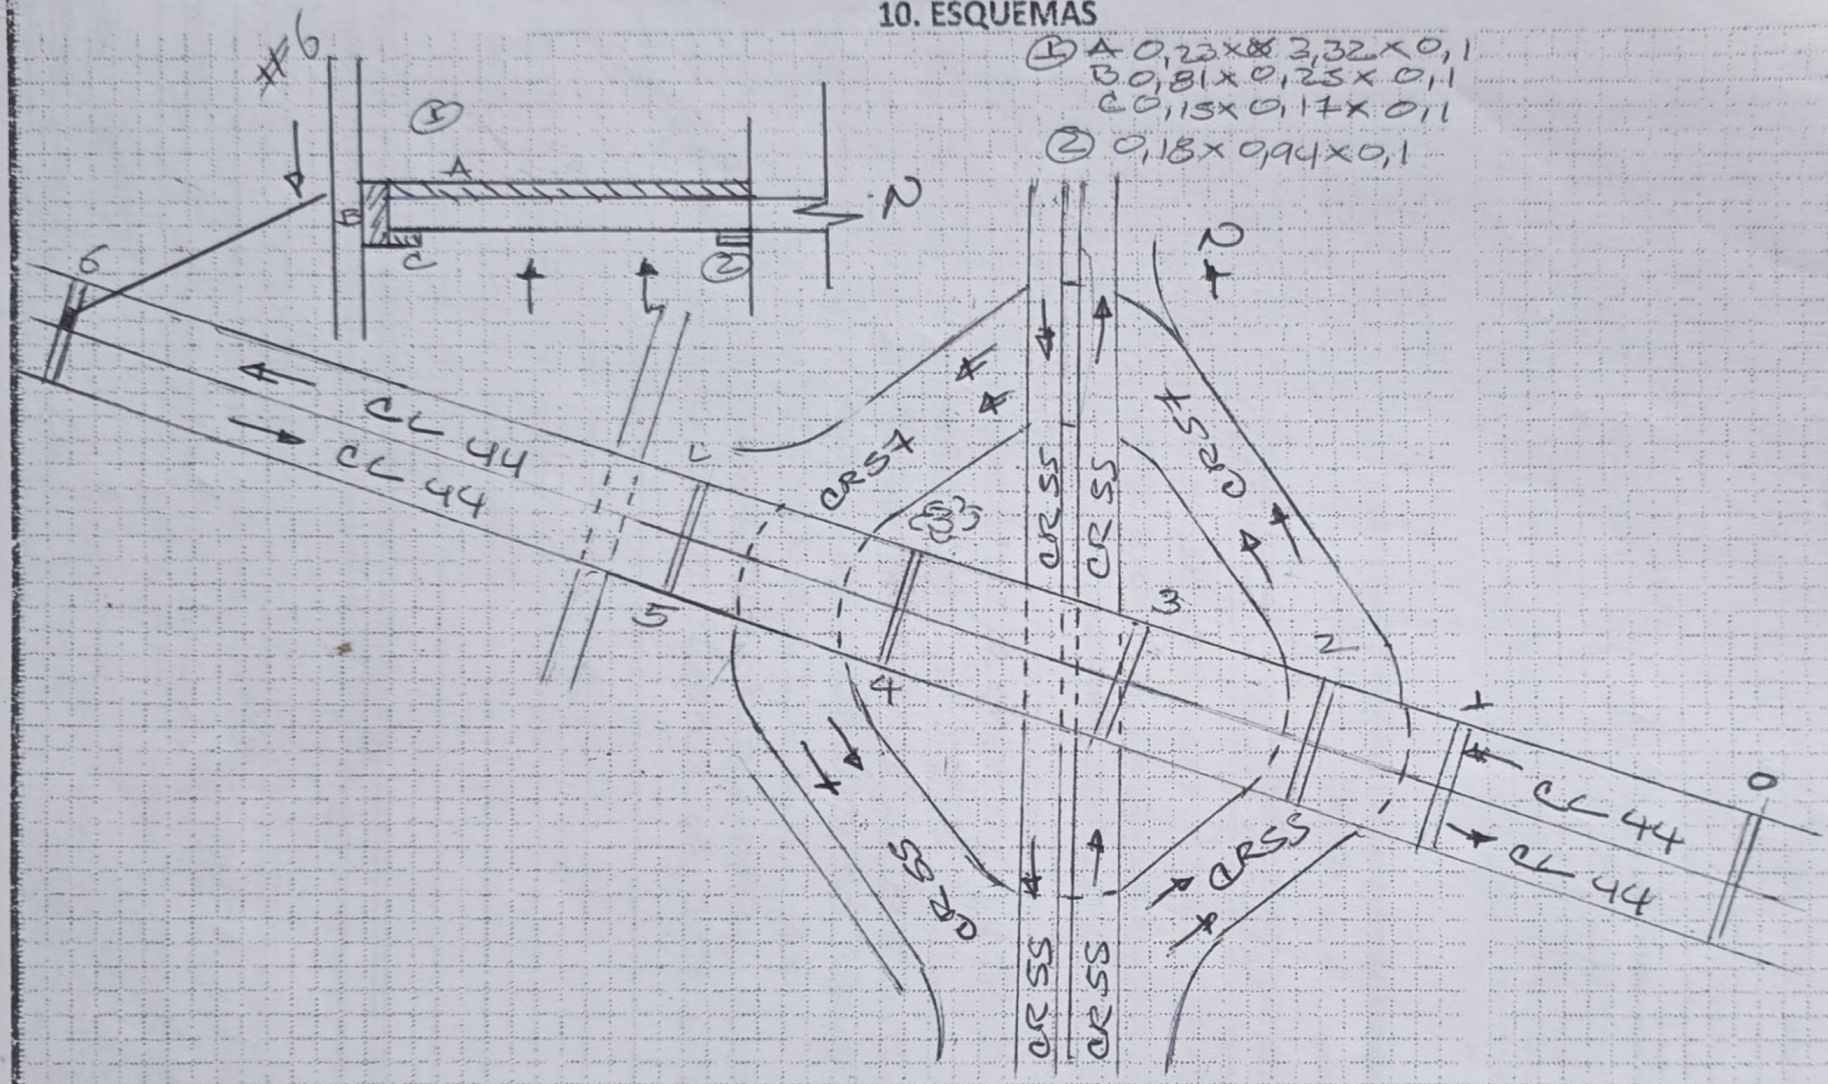
SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000770	6	1A	La Alpujarra CL44CRSS	0,23	3,32	0,10		0,08	Demolición 3.1.2002
" "	6	1B	" "	0,81	0,25	0,10		0,02	Demolición 3.1.2002
2000770	6	1C	La Alpujarra CL44CRSS	0,15	0,17	0,10		0,00255	Demolición 3.1.2002
" "	6	2	" "	0,18	0,94	0,10		0,02	" "
2000770	6	1A	La Alpujarra CL44CRSS	0,23	3,32	0,10		0,08	Concreto 28 MPa 3.2.10
" "	6	1B	" "	0,81	0,25	0,10		0,02	" "
2000770	6	1C	La Alpujarra CL44CRSS	0,15	0,17	0,10		0,00255	Concreto 28 MPa 3.2.10
" "	6	2	" "	0,18	0,94	0,10		0,02	" "
2000770	6	1A	La Alpujarra CL44CRSS	0,23	3,32	0,10		0,08	Aditivo 2.4.3
" "	6	1B	" "	0,81	0,25	0,10		0,02	Aditivo 2.4.3
2000770	6	1C	La Alpujarra CL44CRSS	0,15	0,17	0,10		0,00255	" "
" "	6	2	" "	0,18	0,94	0,10		0,02	Aditivo 2.4.3
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-02-2026

10. ESQUEMAS


#6
1
A
B
C
2
N
6
CL 44
CL 44
CRS7
CRS5
CRS5
CRS5
