FECHA (D/M/A): 20-02-2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango A 4.
RANGO: 04	CANTIDAD: 115,21 M^3 Mdas MSC-19 RAP TIBIA
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 23.
COMUNA: 10; Iv Candelaria.	
BARRIO: 1018; Villa Nueva	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 am. TERMINACIÓN: 6:00 pm.	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: (2horas) Movimiento de equipo; actividad de demolicion; limpieza; aplicacion tenho.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Fav; despejado.
TARDE	Fav, despejado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicar de manera Correcta las Condiciones que impacte el PMT para intervenciones viales segun el Caso. Si se presentan novedades informar a especialista encargado del Tema.
- Por instrucción de especialista PMT (Interventoria y Contratista) se hace cierre total y desvio de via.
- Se solicita al Contratista usar de manera Correcta los EPP durante jornada laboral y segun el tipo de riesgo. Tambien la Correcta instalacion de Camilla; botiquin; extintor; malla etc.
- Se solicita al Contratista Ambientar Correctamente el baño movil; punto ecologico; kit antiderrame. Elementos quimicos; Herramientas; proteger Sumideros; zonas verdes. de lo Contrario limpiar.
: Señalizacion; demarcacion; demolicion; limpieza; imprimacion; aplicacion mezcla; acordado; Compactacion orden y aseo. / Mezcla asfaltica proveniente de PAVIMENTAR / Sellado RAPIDO LA 30 / Cilindros PAVIMENTAR.
- Patologias: fatiga; desgaste; envejecimiento; fisuras en bloque; abultamientos; perdida Carpeta. Grietas / Tipo de mezcla MSC-19 RAP TIBIA / Temperatura
- Recuperar Señalizacion vial como se muestra en la figura TEXTO PARE; (2) FLECHA FRENTE; (2) FLECHA SOLO ~~FRENTE~~ GIRO; CANALIZACION SEGMENTADA AMARILLA; (2) CEBRA PEATONAL.
- Mantenimiento al baño movil por parte de Empresa gestion del servicio.
- Se solicita al Contratista reimprimar las zonas pvd donde circulan las volquetas con el fin de garantizar adherencia en la nueva Carpeta asfaltica.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Ana Zapata Vega	Paola Monroy Pelaez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	*Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR*
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro B	NOMBRE: Ing Catalina Ochoa
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	*Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR*

FECHA (D/M/A): 20.02.2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULO
1	Tecnólogo/Ingeniero	Anu Zapata.	X		E.P.
2	Encargado	Fabian Moreno	X		
3	Liguero	Edison Jimenez.	X		
4	Rastrillero	Miguel Perea.	X		
5	Rastrillero	Jose Rufino.	X		
6	Ayudante	Nicolas Guiyano	X		
7	Ayudante	Dino Cuadrado	X		
8	Ayudante	Freddy Polo	X		
9	Ayudante	Elson Mosquera	X		
10	Ayudante	Dino Cuadrado	X		
11	Ayudante	Yeison Gutierrez.	X		
12	Ayudante	Eduardo Unbe.	X		
13	Ayudante	Diego Caballos	X		
14	Ayudante	Mayerly Burgos	X		
15	Ayudante	Carlos Aguirre			
16	Operador Rodillo manual	Yuoshin Guiyano	X		
17	Operador compresor	Jose Cardoba.	X		
18	Operador fresadora	Omar Guiyano	X		
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora	Luis Alzate.	X		Principal. E.P.
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Edison Jimenez.	X		
25	Operador Mini cargador	Luis Lopez.	X		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan Jairo Muñoz	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
		Freddy Herrera.	X		
		Edson Velazquez.	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Mikasa 685	X		EPP
2	Compresor	Atlas Copco XAS-98	X		
3	Fresadora	Wirtgen W-100	X		
4	Finisher	Caterpillar AP800D	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Ingersoll rand DA77SA.	X		Principal. EPP
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Lee boy L210	X		
10	Placa vibratoria	Honda GX200.	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador	New Holland L318.	X		
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton ITT.651.	X		
16	Volqueta(s)	International; Volkswagen; Freightliner.	X		
		Hermanito menor.	X		

FECHA (D/M/A): 20 02.2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	(kg)
5007632	N.A	1	CL 57A CR48 Y CD49.	65,93	7,65	0,083	504,36	41,86	100,89
		2	" " " " "	3,20	1,47	0,08	4,16	0,36	0,88
		3	" " " " "	3,10	1,90	0,08	6,65	0,53	1,28
		4	" " " " "	3,60	2,20	0,08	7,92	0,63	1,53
		5	" " " " "	2,30	1,60	0,08	3,68	0,29	0,71
		6	" " " " "	2,40	2,20	0,08	5,04	0,40	0,97
4002673		7A	CL 62 CR 47 Y CR 48	8,40	4,10	0,08	34,44	2,76	6,64
4002673		7B	" " " " "	4,0	3,00	0,08.	12,00	0,96	2,31
TOTALES							578,65.	47,81	115,21

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
536140	TRL740	23,05	23,05	144°
536141	TJ2679	23,04	46,09	147°
536142	WPT376	23,01	69,10	145°
536143	ESP092	23,09	92,19	147°
536144	TJ2678	23,02	115,21.	146°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25931	WPT376.	Doble.	1	A. la 30
25932	ESP092.	Doble.	1	A. la 30
25933	TJ2678.	Doble.	1	A. la 30
25934	TRL740.	Doble.	1	Pavimental.

FECHA (D/M/A): 20-02-2026.

10. ESQUEMAS

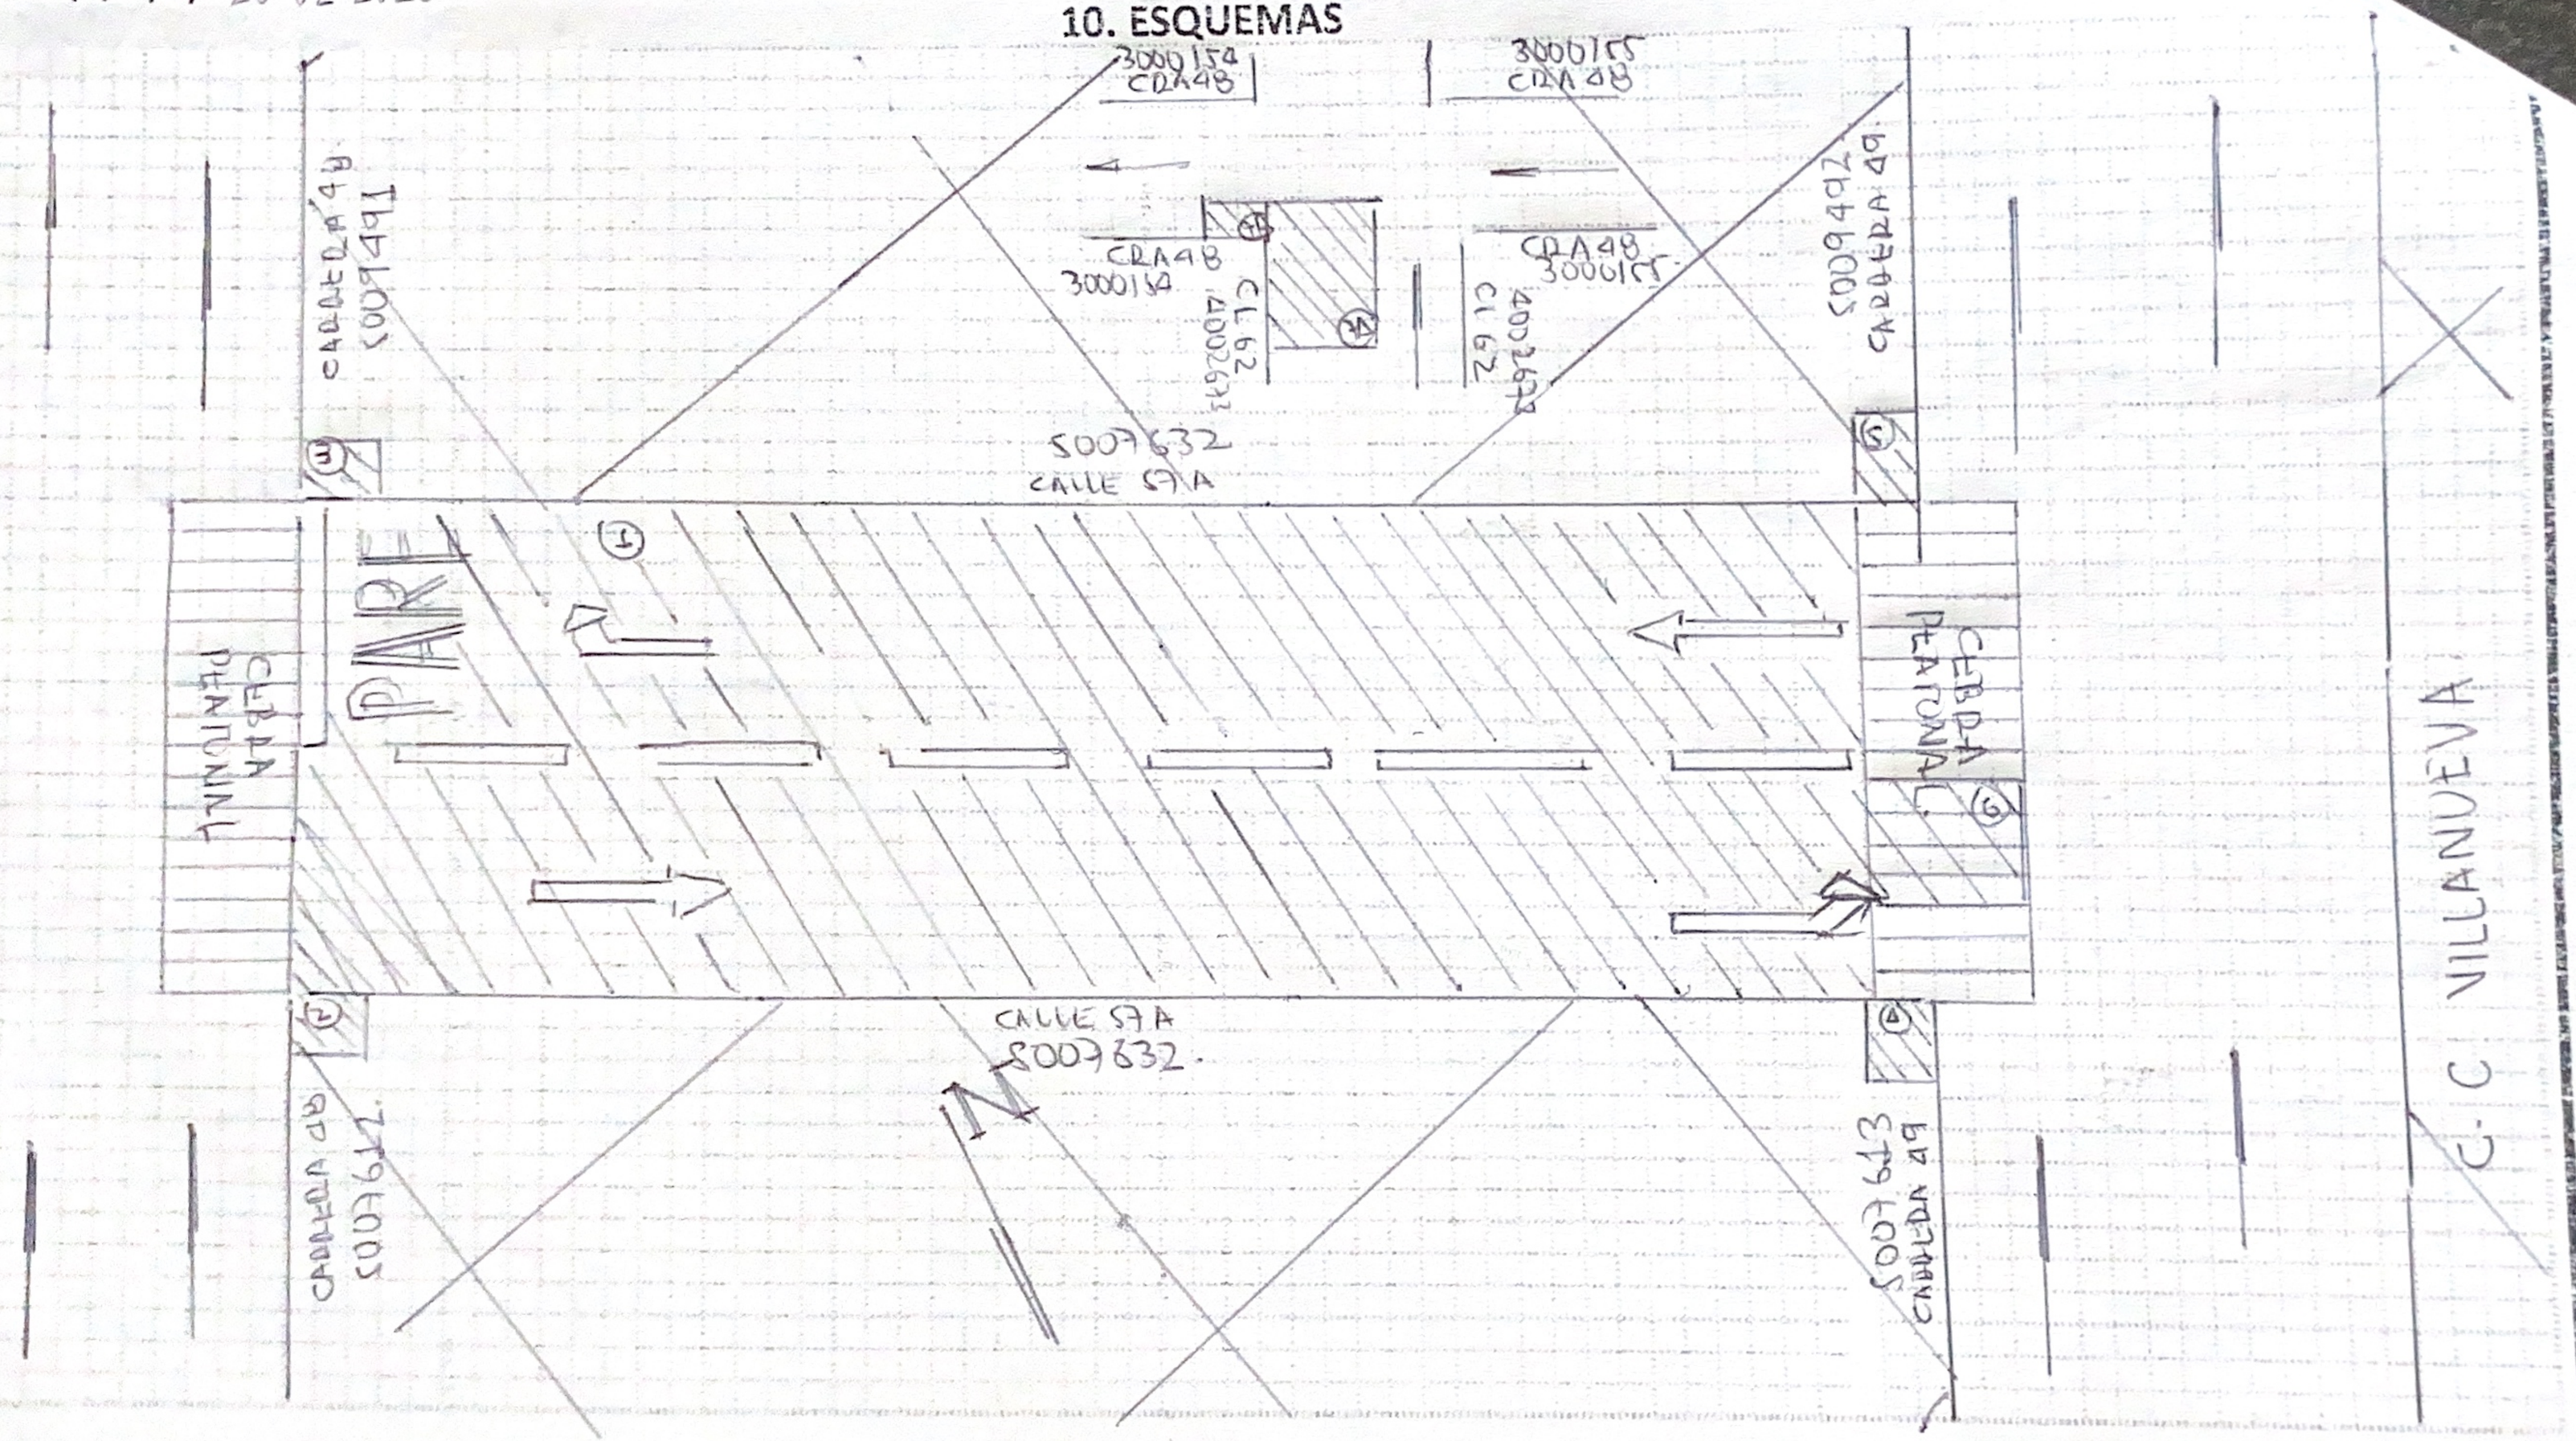

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Rango #4.	FRENTE	23.
RANGO:	04	CANTIDAD:	115,21 m^3 toneladas MSC-19 RAP TIBIA.
BARRIO	1018; Villa nueva.	DIRECCIÓN	CL 57A CR 48 Y CR 49.

20260220 10:10

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536143
PLACA: ESP092
CONDUCTOR: ANDRES FELIPE LONDOÑO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,09 Ton

Ana M Zapata 20-02-26

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.740,00
PESO BRUTO:34.830,00

ENTRADA: 20 feb 2026 - 10:52 a.
SALIDA: 20 feb 2026 - 10:5[illegible]
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Felipe L

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260220 10:05

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536142
PLACA: WFT378
CONDUCTOR: JHON JAIRO MARTINEZ

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,01 Ton

Ana M Zapata 20-02-26.

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.910,00
PESO BRUTO:34.920,00

ENTRADA: 20 feb 2026 - 10:0[illegible]
SALIDA: 20 feb 2026 - 10:0[illegible]
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

JAIRO

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260220 09:44

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536141
PLACA: TJZ679
CONDUCTOR: WILSON ORTIZ

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,04 Ton

Ana M Zapata 20-02-26.

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.310,00
PESO BRUTO:35.350,00

ENTRADA: 20 feb 2026 - 10:0[illegible]
SALIDA: 20 feb 2026 - 10:04 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

1121[illegible]369

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260220 09

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536140
PLACA: TRL710
CONDUCTOR: GIOVANY ESTRADA

20-02-26.

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,05 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.130,00
PESO BRUTO:35.180,00

ENTRADA: 20 feb 2026 - 09:[illegible]
SALIDA: 20 feb 2026 - 09:37 a.
TEMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Giovany Estrada

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260220 10:53
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536144
PLACA: TJZ67B
CONDUCTOR: DORIAN AGUDELO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfáltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,02 Ton

Ana M. Zapata
20-02-26

CLIENTE:900293322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V0000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.150,00
PESO BRUTO:35.170,00

ENTRADA: 20 feb 2026 - 11:24 a
SALIDA: 20 feb 2026 - 11:24 a
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

20-02-26

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25933

PROVEEDOR: Vialmed 2025 Frente 23.
VALE POR UN VIAJE: Fiorato
PLACA No: TJZ679 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Acopio 30
RECIBIDO POR:

20-02-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25931

PROVEEDOR: P23 Pistoia Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fiesado
PLACA No: WPT376 CAPACIDAD: 16 M3
DESTINO: Acopio 30
RECIBIDO POR:

20-2-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

"(...) De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
1. Artículo 2 de la ley 1150 de 200

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26106

PROVEEDOR: Vialmed 2025 Frente 23
VALE POR UN VIAJE: Fiorato
PLACA No: TJZ740 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Pavimentos
RECIBIDO POR:

20-02-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25932

PROVEEDOR: Vialmed 2025 Frente 23
VALE POR UN VIAJE: Fiorato
PLACA No: EIP092 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Acopio 30
RECIBIDO POR:

20-02-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
