FECHA (D/M/A): 23-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango # 4 Nocturno.
RANGO: 04	CANTIDAD: 105,16 m3 Toneladas MSC-19 RAP. MBIA
ZONA: 03	FRENTE DE TRABAJO: 23.
COMUNA: 10; La Candelaria.	
BARRIO: 1072; Perpetuo Socorro.	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 pm.	JORNADA NOCTURNA
TERMINACIÓN: 5:00 am.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Humedo; despejado.

TARDE: Humedo; despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicarle manera Correcta todas las Condiciones que imparte el PMT para intervenciones viales nocturnas y segun el Caso. (Informacion virtual; armamento con elementos y reflectivos auxiliares transito; flacheros; aislamiento de zonas a intervenir). Se Evidencia postura de 10 flacheros.
- Se solicita al Contratista usar de manera Correcta los EPP durante la Jornada laboral y el tipo de riesgo. Se hace entre de EPP o empleados. Tambien la Correcta instalacion de Camilla; botiquin y extintor.
- Se solicita al Contratista proteger Zonas verdes; Sumideros y demas del material sobrante producto por el proceso Constructivo. Tambien la instalacion del Baño movil; punto Ecologico; Herramientas; elementos quimicos. Tambien la reparacion de fugas de mangera de agua utilizada para abastecamiento de equipos a utilizar / Mantenimiento al baño movil de la Cadrilla por parte de empresa gestora.
- Se solicita al Contratista aplicar de manera Correcta las especificaciones tecnicas dadas por Interventoria del proceso a ejecutar / Mezcla proveniente de PAVIMENTAP / fuerte dispositivo en ACOPIO LA30 / Suministro PAVIMENTAP
- Tipo de Mezcla asfaltica MSC-19 RAP MBIA / Temperatura en aplicacion (137°C). Optima.
- Localizacion, demarcacion; demolicion; limpieza; imprimacion; aplicacion; acabado; Compactacion; Union y otro. / Base granular: Permanente en buen estado y base firme; Compacta.
- Patologias: desgaste Superficial - descascaramientos; agrietamientos; fracturas en bloque. Grietas.
- Recuperar finalizacion vial como se instalo en figura CELDAS MOTO; PROHIBIDO PARQUEO

5. VISITANTES

Diana Higuita. – Interventoria.
Juan Jose Belmudez – Interventoria.

6. FIRMAS

NOMBRE: Ana Zapata	Paula Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Cadio R.	NOMBRE: Natalia Ochoa
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 23-02-2026.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Ana Zapata.	X		E T
2	Encargado	Fabian Moreno.	X		
3	Liguero	Edison Jimenez.	X		
4	Rastrillero	Migel Pena.	X		
5	Rastrillero	Jose Rufino.	X		
6	Ayudante	Dino, Cogollo	X		
7	Ayudante	Nicolas Cuño	X		
8	Ayudante	Eduardo Pupo.	X		
9	Ayudante	Diego Ceballos	X		
10	Ayudante	Maicony Burgos	X		
11	Ayudante	Jhedy Polo	X		
12	Ayudante	Yerson Gutierrez.	X		
13	Ayudante	Elson Mosquera.	X		
14	Ayudante	Carlos Aguirre.	X		
15	Ayudante	Bernardo Guitarrd.	X		
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Faustino Cuñano	X		
18	Operador fresadora	Jose Cordoba.	X		
19	Operador finisher	Omar Cuñano	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Diego. Meneses.	X		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Edison Jimenez.	X		
25	Operador Mini cargador	Richard Patino	X		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhon Jairo Munoz.	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
		Leidy Herrera.	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	MIKASA GBS.	X		E T
2	Compresor	Atlas Copco XAS-98.	X		
3	Fresadora	Wirtgen W-300	X		
4	Finisher	Caterpillar AP800D	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Homm, 75 HP	X		
7	Compactador llantas	Ingersoll rand SA77DA	X		Prowpac.
8	Cortador Asfalto				E T
9	Equipo Imprimación	Tee boy L250.	X		
10	Placa vibratoria	Honda GX 200.	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador	New Holland L318.	X		
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton, FU 65.	X		
16	Volqueta(s)	International Freightliner, Volkswagen	X		
		Hemami-cnh menor.	X		

FECHA (D/M/A): 23 02-2026.


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	To... (kg)
4001484	N.A	1	CL4T CL34+180 Y CL36	44,0	5,75	0,086	253,0	21,76	52,44
4001483	N.A	2.	CL4C CL34 Y CL 34+180	40,0	5,75	0,086	230,0	19,78	47,67
4001483	N.A	3	" " " "	12,0	1,74	0,10	20,88	2,09	5,03
TOTALES							503,88.	43,63	105,14.

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
3861	ESP092	26,01	26,01	147°	26107	SMX 56B	Doble.	1	A. la 30
3862	WPT376	27,03	53,04.	148°	26108	SX4 151	Doble.	1	A. la 30
3863	SZT164	26,05	79,09.	147°	26109	SMX 56B	Doble.	1	A. la 30
3864	TJZ67B	26,07	105,16.	146°	26110	SX4 151	Doble.	1	A. la 30
					26111.	ESP 092.	Doble.	1	Pavimental.

FECHA (D/M/A): 23-02-2026

10. ESQUEMAS

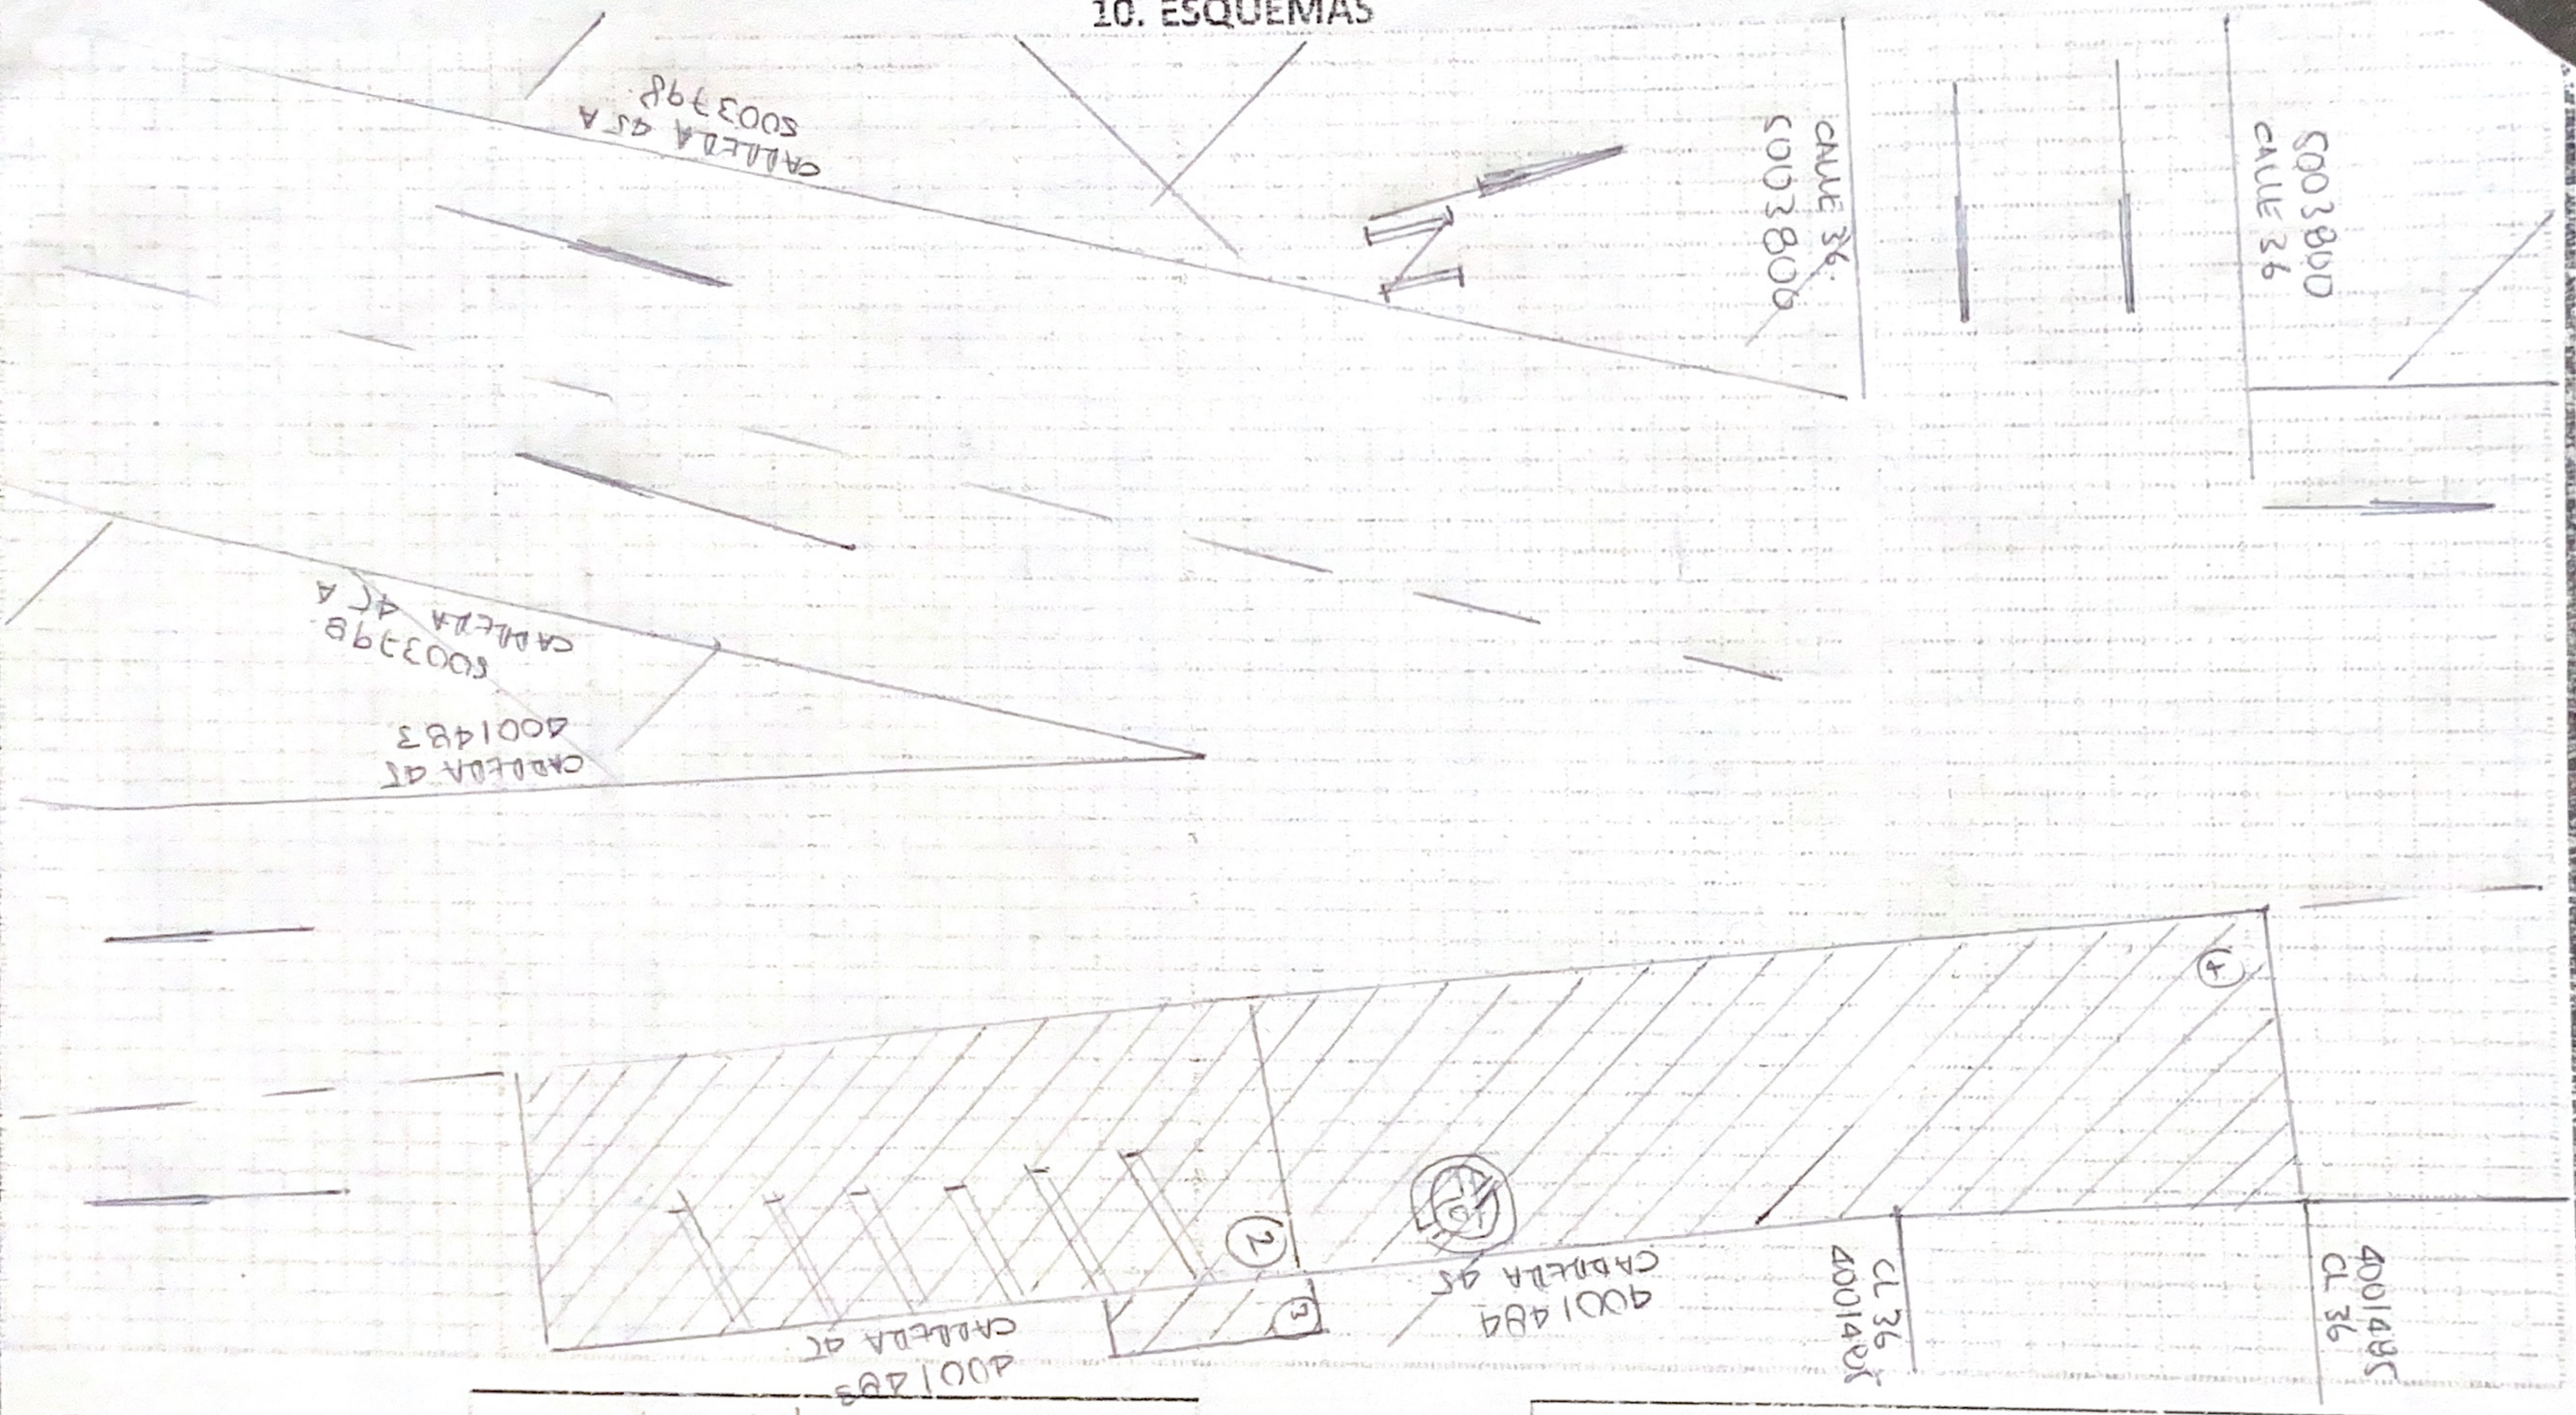

TIPO DE INTERVENCION:	Rango #4. Nocturno.	FRENTE	23.
RANGO:	04.	CANTIDAD:	105,16. m^3 luminarias NSC-19 LED 170W
BARRIO	1012; Perpetuo Socorro.	DIRECCIÓN	CR 4J CL 34 Y CL 36.

pavimentar
ingeniería al futuro
NIT 800.040.014 - 6

REMISIÓN PROVISIONAL DE MATERIALES

PROVISIONAL BASCULA | **Nº PB-** 3863

CALLE 103 No. 46 - 65 ANCON NORTE
PBX: 274 64 04 / FAX: 467 41 00
e-mail: pavimentar@pavimentarsa.com
www.pavimentarsa.com
COPACABANA - ANTIOQUIA - COLOMBIA

CANTIDAD (PESO KG)	C.C.:	OBRA:
NETO: 26.050 Kg		
pavimentar NIT. 800.040.014-6 DESPACHO PLANTA ASTEC PAVIMENTAR	CLIENTE: Estructuras y Pavimentos	
	CONTRATISTA:	
	FRENTE: Sum 2149	
	CÓDIGO	MATERIAL
		MSC 19 Tibia + Rap

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA:	CARPA PARA VOLCO:		CONDUCTOR:		
SZT 164	LLANTAS LIMPIAS:		DUEÑO:	FECHA: 23-02-2026	TEMP: 147°C
DESPACHADOR		HORA RECIBO OBRA	RECIBIDOR		HORA SALIDA OBRA
					20:50

pavimentar
ingeniería al futuro
NIT 800.040.014 - 6

REMISIÓN PROVISIONAL DE MATERIALES

PROVISIONAL BASCULA | **Nº PB-** 3864

CALLE 103 No. 46 - 65 ANCON NORTE
PBX: 274 64 04 / FAX: 467 41 00
e-mail: pavimentar@pavimentarsa.com
www.pavimentarsa.com
COPACABANA - ANTIOQUIA - COLOMBIA

CANTIDAD (PESO KG)	C.C.:	OBRA:
NETO: 26.070 Kg		
pavimentar NIT. 800.040.014-6 DESPACHO PLANTA ASTEC PAVIMENTAR	CLIENTE: Estructuras y Pavimentos	
	CONTRATISTA:	
	FRENTE: Sum 2149	
	CÓDIGO	MATERIAL
		MSC 19 Tibia + Rap

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA:	CARPA PARA VOLCO:		CONDUCTOR:		
TJZ 678	LLANTAS LIMPIAS:		DUEÑO:	FECHA: 23-02-2026	TEMP: 146°C
DESPACHADOR		HORA RECIBO OBRA	RECIBIDOR		HORA SALIDA OBRA
					21:00

pavimentar
ingeniería al futuro
NIT 800.040.014 - 6

REMISIÓN PROVISIONAL DE MATERIALES

PROVISIONAL BASCULA

Nº PB- 3861

CALLE 103 No. 46 - 65 ANCON
PBX: 274 64 04 / FAX: 467 41
e-mail: pavimentar@pavimentarsa.
www.pavimentarsa.com
COPACABANA - ANTIOQUIA - COLOMBIA

CANTIDAD (PESO KG)

NETO: 26.010 Kg

C.C.:

OBRA:

CLIENTE: Estructuras y Pavimentos

CONTRATISTA:

FRENTE: Sum 2149

CÓDIGO	MATERIAL
	MSC-19 Tibia + RAP

pavimentar
NIT. 800.040.014-6

DESPACHO PLANTA ASTEC PAVIMENTAR

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA:	CARPA PARA VOLCO:		CONDUCTOR: Felipe		
ESP 092	LLANTAS LIMPIAS:		DUEÑO:	FECHA: 23-02-2026	TEMP: 147°C

DESPACHADOR	HORA RECIBO OBRA	RECIBIDOR	HORA SALIDA OBRA
			20:40

pavimentar
ingeniería al futuro
NIT 800.040.014 - 6

REMISIÓN PROVISIONAL DE MATERIALES

PROVISIONAL BASCULA

Nº PB- 3862

CALLE 103 No. 46 - 65 ANCON NORTE
PBX: 274 64 04 / FAX: 467 41 00
e-mail: pavimentar@pavimentarsa.com
www.pavimentarsa.com
COPACABANA - ANTIOQUIA - COLOMBIA

CANTIDAD (PESO KG)

NETO: 27.030 Kg

C.C.:

OBRA:

CLIENTE: Estructuras y Pavimentos

CONTRATISTA:

FRENTE: Sum 2149

CÓDIGO	MATERIAL
	MSC-19 Tibia + RAP

pavimentar
NIT. 800.040.014-6

DESPACHO PLANTA ASTEC PAVIMENTAR

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA:	CARPA PARA VOLCO:		CONDUCTOR: JOHN SPIRO		
WPT 376	LLANTAS LIMPIAS:		DUEÑO:	FECHA: 23-02-2026	TEMP: 148°F

DESPACHADOR	HORA RECIBO OBRA	RECIBIDOR	HORA SALIDA OBRA
			20:45

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26109

PROVEEDOR: P23 Pavimentos Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fiesacho
PLACA No: SMX568 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Acopio la 30
RECIBIDO POR:

23-2-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26107

PROVEEDOR: VialMed 2025 Frente 23
VALE POR UN VIAJE: Fiesado
PLACA No: SMX569 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Acopio la 30
RECIBIDO POR:

23-02-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26110

PROVEEDOR: VialMed 2025 Frente 23.
VALE POR UN VIAJE: Fiesado
PLACA No: SXY151 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Acopio la 30
RECIBIDO POR:

23-02-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26108

PROVEEDOR: VialMed 2025 Frente 23
VALE POR UN VIAJE: Fiesado
PLACA No: SXY151 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Acopio la 30
RECIBIDO POR:

23-02-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Para todos los efectos la fecha será aquella que certifique a través de la PLATAFORMA www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, antes de la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

#2058

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26111**

PROVEEDOR: Vialmat 2025 Frente 23

VALE POR UN VIAJE: Fromboy

23-02-26

PLACA No: FSP042 CAPACIDAD: 15 M3

DESTINO: Pavimentar.

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
