

Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES FISICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL**	**195 días?**	**vie 7/02/25**	**dom 3/08/25**
2	1	**PRELIMINARES**	**168 día**	**vie 7/02/25**	**mié 9/07/25**
3	1,1	M.O Desmonte de mobiliarios en los espacios a intervenir zona planeación donde se encuentra actualmente el archivo , desmonte de (reja metalica 9m2 por el lado de la plaza de mercado, modulos de trabajo, puertas , estantes, ect.), incluye acarreo interno	6 días	vie 4/07/25	mié 9/07/25
4	1,1,1	M.O Desmonte de mobiliarios en los espacios a intervenir en segundo nivel, mostrador y escritorios, desmonte de (modulos de trabajo, puertas, ventanas, estantes, ect.), incluye acarreo interno, cargue y transporte de mobiliarios hasta lugar de acopio	6 días	vie 4/07/25	mié 9/07/25
5	1,2	M.O Desmonte de teja existente, incluye acarreo interno y transporte hasta lugar de acopio, no incluye disposición final del material	5 días	lun 2/06/25	vie 6/06/25
6	1,3	M.O Demolición muros drywall, incluye disposición de residuos	3 días	sáb 22/02/25	mar 25/02/25
7	1,4	M.O Demolicion muros mampostería (ladrillo 0,10*0,20*0,40), incluye disposición de residuos	8 días	mar 25/02/25	mar 4/03/25
8	1,5	M.O Demolición de piso duro de cualquier resistencia con espesor hasta de 12 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, taladro demoledor	5 días	mar 4/03/25	sáb 8/03/25
9	1,6	M.O Demolicion enchape baño. Incluye adecuaciones y botada de desperdicios	5 días	vie 7/02/25	mar 11/02/25
10	2	**OBRA GRIS**	**108 día**	**vie 14/03/25**	**vie 20/06/25**
11	2,1	Suministro y construcción de Revoque liso 1:5 E=2 cm sobre paredes Incluye preparación de la superficie a revocar, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	8 días	mié 19/03/25	jue 27/03/25
12	2,2	Construcción de piso en concreto 21Mpa color natural, espesor de 0,10 m, Incluye incluye malla electrosoldada XX 106 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	9 días	lun 19/05/25	mar 27/05/25
13	2,3	Construcción de acabado para piso en concreto endurecedor neutro tipo Sikafloor 3 Quartz Sika o equivalente, para interiores, superficie acabada con allanadora. Incluye tratamiento de juntas de dilatación en Sikarod o equivalente y Sello en Sikaflex 1-A d	3 días	mié 28/05/25	vie 30/05/25
14	2,3,1	Construcción de viga dintel en concreto 21 Mpa , sección 0,15 m * 0,20 m con refuerzo longitudinal en varilla corruga No 4 y refuerzo transversal con estribos No 3, no incluye revestimiento. Incluye encofrado y todos los elementos para su correcta instala	3 días	vie 30/05/25	lun 2/06/25
15	2,5	Construcción de mampostería en ladrillo rayado (0,15*0,20*0,40). Incluye dovelas y todos los elementos para su correcta instalacion	6 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25

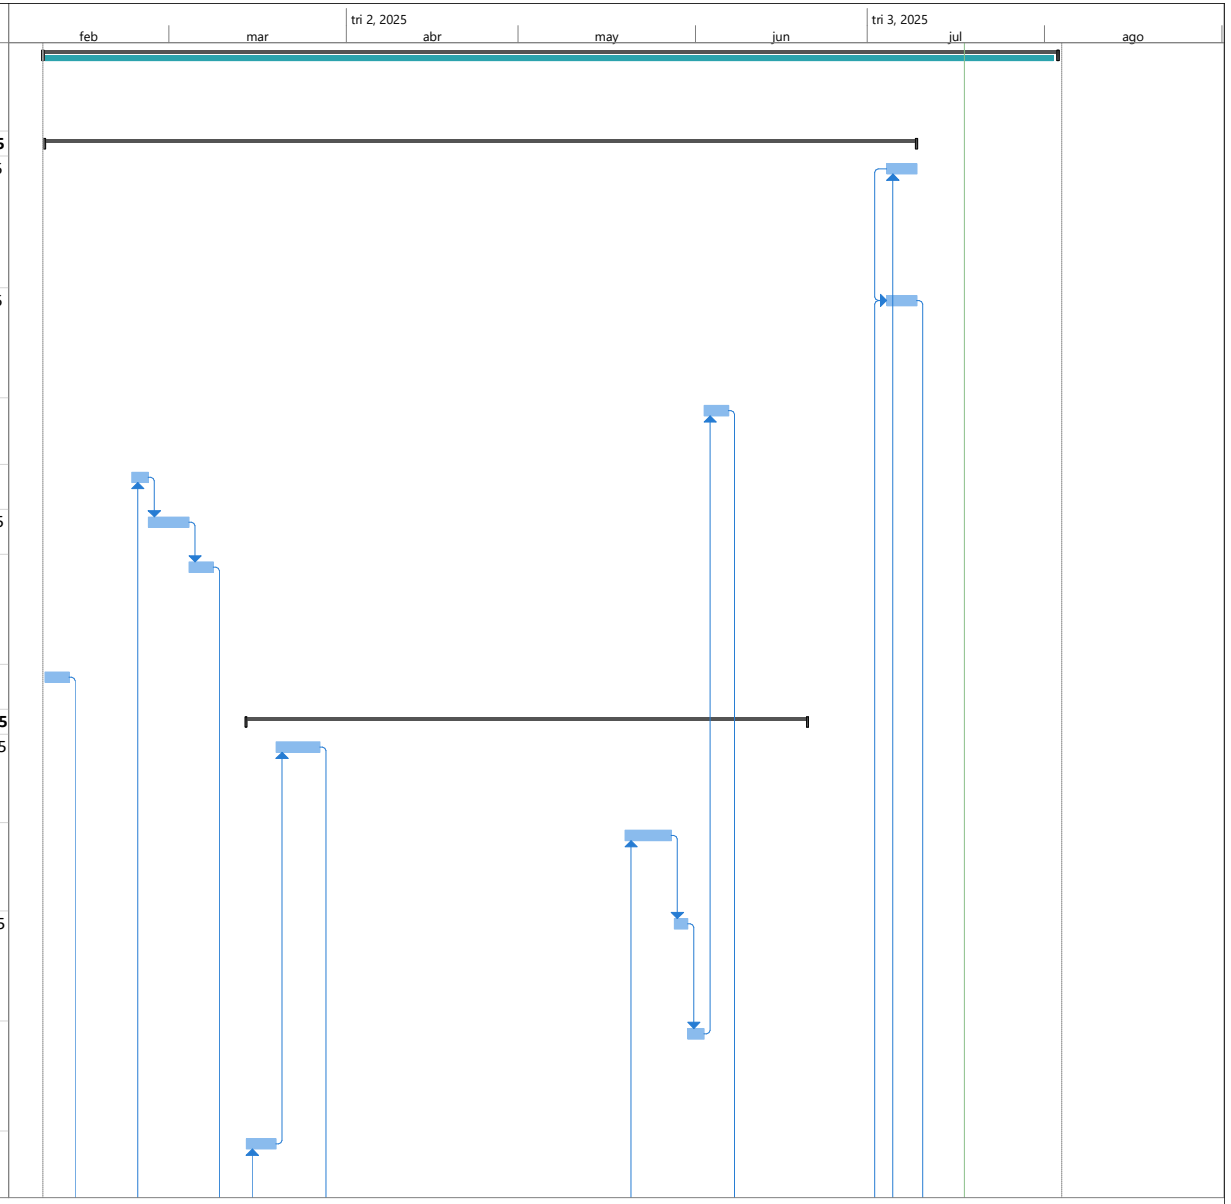

Proyecto: Proyecto2 LUIS FERN
Fecha: vie 18/07/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
16	2,5,1	Construcción de dovelas para jambas de vanos de ventanas con grouting 21 Mpa , con refuerzo longitudinal en varilla corruga No 4 , incluye perforación en piso mas anclaje epoxico, no incluye revestimiento. Incluye todos los elementos para su correcta inst	3 días	sáb 14/06/25	lun 16/06/25
17	2,6	Construcción de escaleras de acceso en concreto para planeación.	4 días	mar 17/06/25	vie 20/06/25
18	3	**OBRA BLANCA**	**189 día**	**mar 11/02/2**	**sáb 2/08/25**
19	3,1	Suministro e instalación muro en drywall con placas en yeso de 2 (dos) caras, con espesor de aprox de 9 cm (ancho de perfil mas espesor de la placa). Incluye estructura metalica para armado y soporte.	9 días	mié 9/07/25	jue 17/07/25
20	3,3	Suministro y aplicación de Pintura vinilica tipo 1 sobre muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea.	13 días	lun 21/07/25	sáb 2/08/25
21	3,5	Desmonte e instalacion de vidrios (los vidrios son existentes, se retiraran y se reinstalaran)	4 días	vie 4/07/25	lun 7/07/25
22	3,6	Suministro e instalación enchape de piso / pared para baños tipo Egeo Blanco Cara Única 20.5x20.5 o similar. Incluye todos los elementos para su correcta instalación	6 días	mar 11/02/25	dom 16/02/25
23	3,7	Suministro e instalación de piso XPF H20, 1225X235X8M,mas 1,5mm de aislante acústico adherido, trafico 43AC5, biselado en 4 lados.Ref Roble Suizo o similar. Incluye todos los elementos para su correcta instalación	5 días	lun 21/07/25	sáb 26/07/25
24	4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**	**48 días**	**dom 6/04/25**	**lun 19/05/25**
25	4,2	Suministro e instalación de teja traslúcida ref. Tejaluz clase 7. Conformada por poliéster reforzado con fibra de vidrio e: 1.2 mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	2 días	mié 7/05/25	jue 8/05/25
26	4,5	suministro, transporte e instalacion de tubería PTS de 120 mm x 60 mm calibre 2.5 mm en acero A36 para la estructura principal, y de 80 mm x 40 mm calibre 1.5 mm en acero A36 para correas y apoyos. Se garantiza el uso de acero A36 conforme a las normas AS	20 días	mié 9/04/25	dom 27/04/25
27	4,7	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	4 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25
28	4,8	Suministro, transporte y colocación de CANOA EN U en lamina galvanizada calibre 22, desarrollo 0.60 m., incluye:boquilla, escuadras, soldadura, pintura anticorrosiva, dos manos a base de aceite, y soportes a la estructura.	6 días	jue 1/05/25	mié 7/05/25
29	4,9	placa base de anclaje incluye 4 anclajes de fijacion epoxica en barra de 3/8"	4 días	dom 6/04/25	mié 9/04/25
30	5	**CARPINTERIA DE METALICA / ALUMINIO- CARPINTERIA DE MADERA - MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS**	**170 días**	**lun 17/02/25**	**lun 21/07/25**

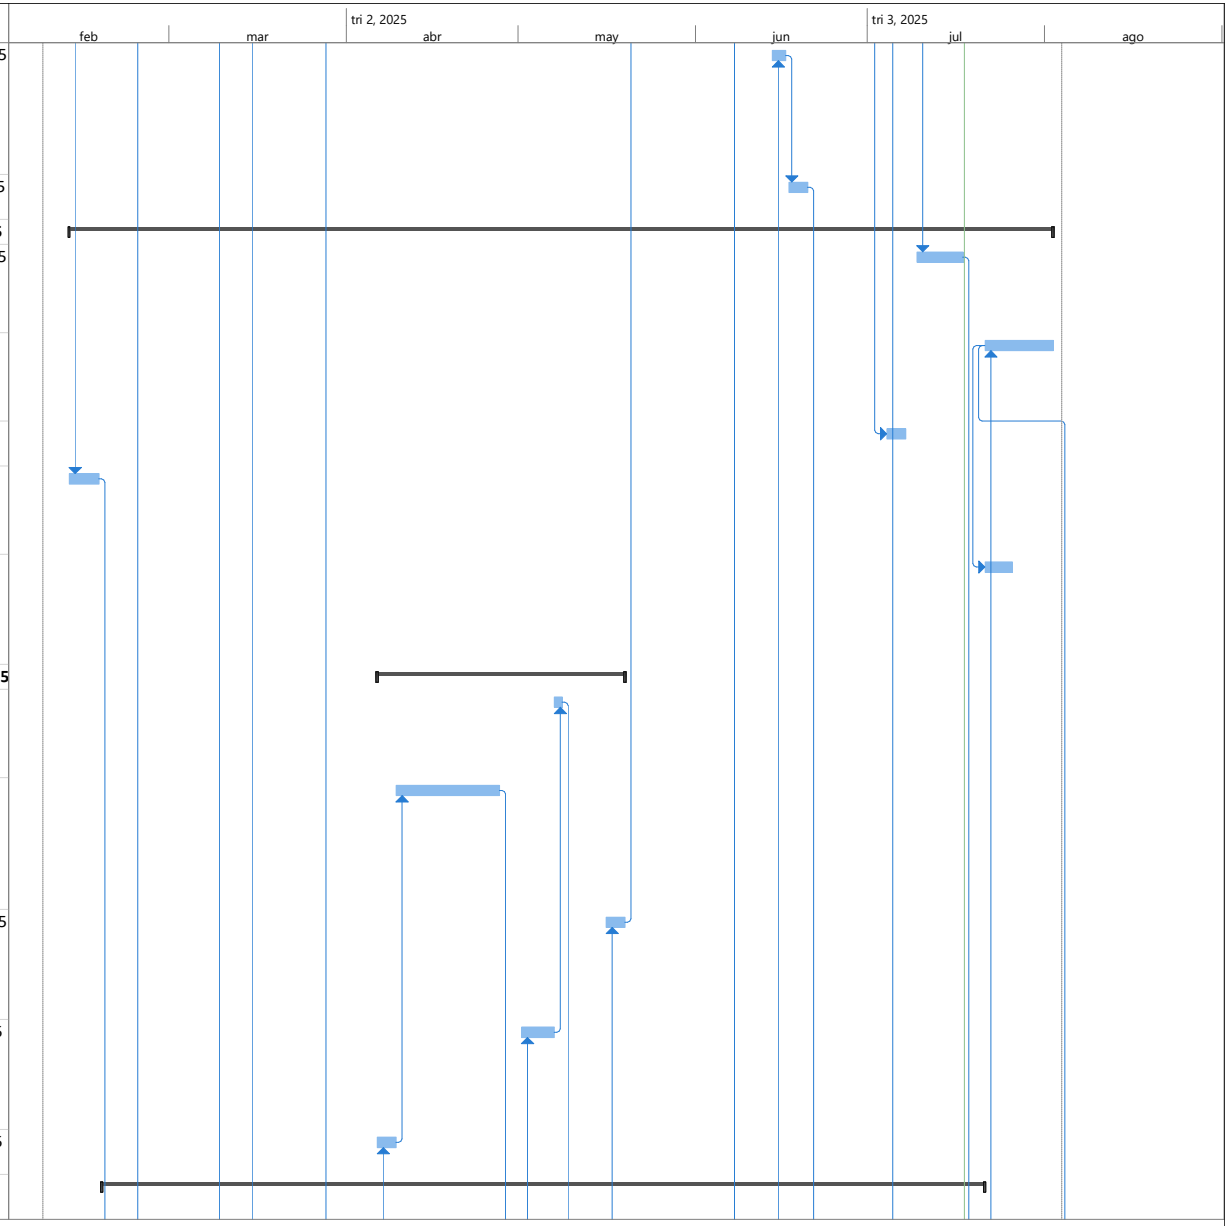

Proyecto: Proyecto2 LUIS FERN
Fecha: vie 18/07/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
31	5,1	Mantenimiento de estructura metalica hasta 3,5m de cubierta existente, incluye aplicación de pintura anticorrosiva negro mate, revisión y ajuste de fijaciones. Incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamien	8 días	sáb 7/06/25	sáb 14/06/25
32	5,3	Suministro e instalación puerta vidriera en Aluminio Monumental Ref. 70-38 en laminado 4mm+4mm, (2,7m * 0,9m). Incluye todos los elementos para su correcta instalación y uso.	4 días	jue 17/07/25	lun 21/07/25
33	5,4	Suministro e instalación ventana proyectante en Aluminio Monumental Ref. 70-38 en laminado 4mm+4mm,0,65m * 0,55m). Incluye todos los elementos para su correcta instalación y uso.	2 días	lun 17/02/25	mar 18/02/25
34	5,5	Suministro e instalación puerta corrediza, marco y ala en melamina, ref. castaño Pelikano, marco de 12 cm de ancho con tapaluz de 4 cm, bisagras negras y cerradura tipo palanca negra ref. 598 marca Bonuit. Incluye todos los elementos para su correcta inst	4 días	jue 17/07/25	lun 21/07/25
35	5,6	Suministro e instalación puerta batiente un ala, marco y ala en melamina, ref. castaño de Pelikano, marco de 12 cm de ancho con tapaluz de 4 cm, bisagras negras y cerradura tipo palanca negra ref. 598 marca Bonuit. (2,7m *1,2m). Incluye todos los elemento	4 días	jue 17/07/25	lun 21/07/25
36	5,7	Suministro e instalación puerta batiente un ala, marco y ala en melamina, ref. castaño de Pelikano, marco de 12 cm de ancho con tapaluz de 4 cm, bisagras negras y cerradura tipo palanca negra ref. 598 marca Bonuit. (2,1m * 0,8 ó 0,9m). Incluye todos los e	4 días	jue 17/07/25	lun 21/07/25
37	5,8	Suministro e instalación combo sanitario para baño,sanitario, lavamanos en concreto PAPUA 05 en concreto o similar incluye grifería y accesorios,incluye brida flexible, no incluye salidas hidrosanitarias	4 días	mar 18/02/25	sáb 22/02/25
38	6	**RED ELÉCTRICA**	**15 días**	**vie 20/06/25**	**vie 4/07/25**
39	6,1	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable blando 3No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Por ducto o canaleta. Incluye conectores, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. Incluye todos los accesorios y	15 días	vie 20/06/25	vie 4/07/25
40	6,2	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, Incluye toma tipo Levinton, la tapa, cajas 4"x4"con tapa suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curva	15 días	vie 20/06/25	vie 4/07/25
41	6,3	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo de iluminación tipo Levinton por ducto pvc. Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4"con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC,	15 días	vie 20/06/25	vie 4/07/25

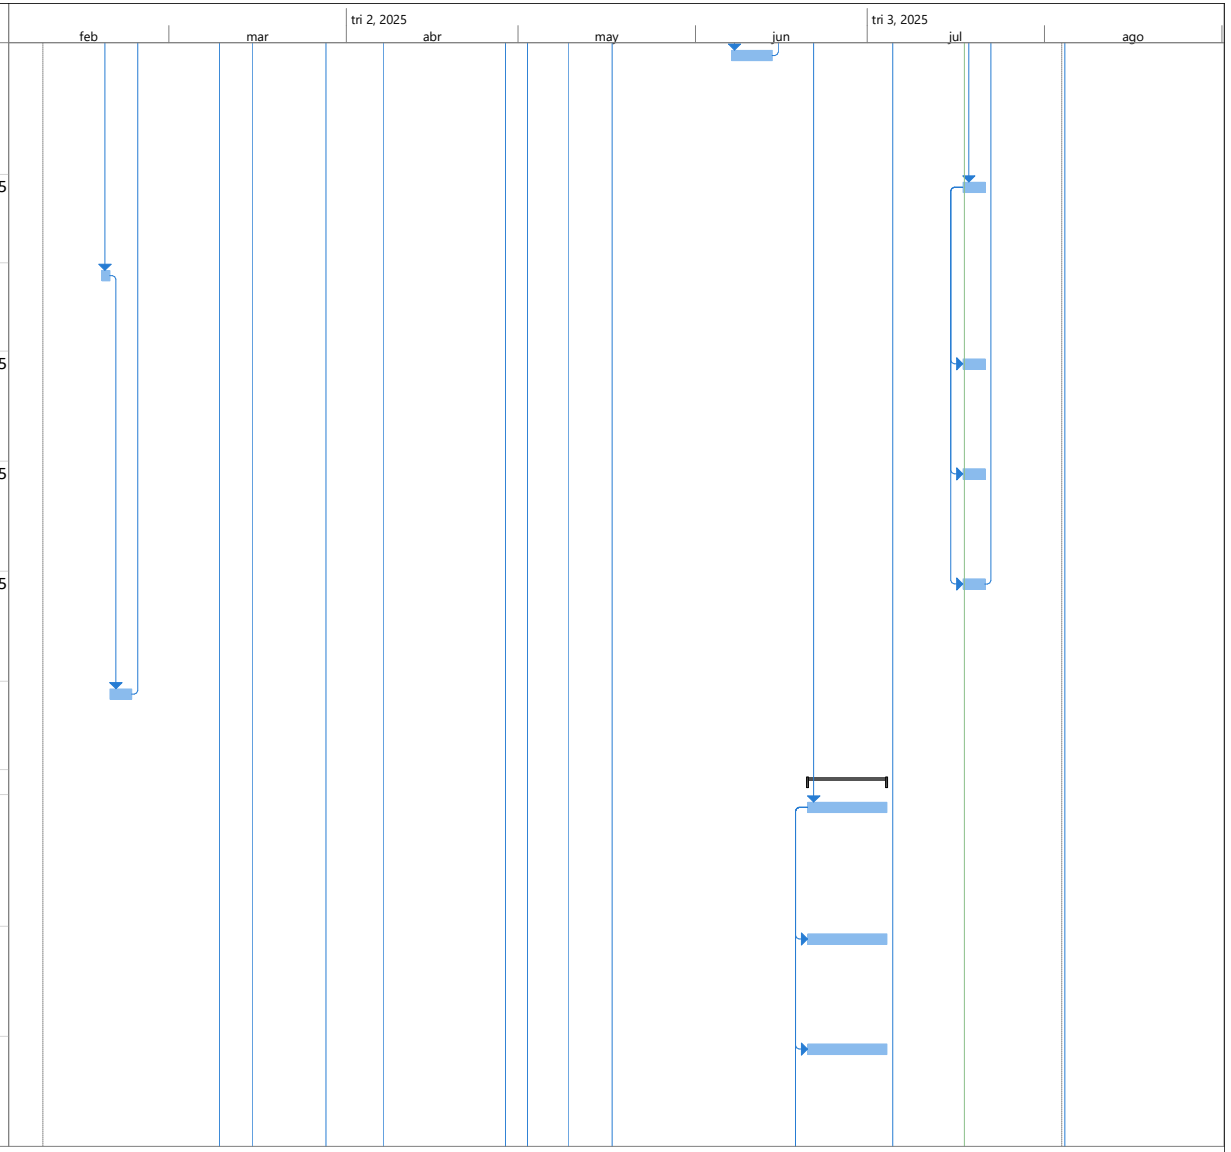

Proyecto: Proyecto2 LUIS FERN
Fecha: vie 18/07/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
42	6,4	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor doble conmutable de iluminación. TIPO LEV referencia ref 5224 por ducto pvc. Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4"con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG	15 días	vie 20/06/25	vie 4/07/25
43	6,5	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para iluminación en cielo o pared. por ducto pvc. Incluye tapa, cajas 4"x4"con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme,	15 días	vie 20/06/25	vie 4/07/25
44	6,6	Suministro e instalación Luminaria Lineal Led 40w 120cm suspendida o similar, incluye 1,5 m de guaya + cable encauchetado 3*14. Incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	15 días	vie 20/06/25	vie 4/07/25
45	6,7	Suministro e instalación luminaria suspendida ref BAMBA II 15W o similar, incluye 1,5 m de guaya + cable encauchetado 3*14. Incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	15 días	vie 20/06/25	vie 4/07/25
46	OE	**OBRAS EXTRAS**	**75 días**	**dom 9/03/25**	**vie 16/05/25**
47	OE 01	Reubicacion de condensador de aire acondicionado sobre la cubierta	2 días	vie 4/04/25	dom 6/04/25
48	OE 02	Construccion de muro ático en estructura metalica, con lamina de soporte y de nivelacion de 1,5 mm sobre esta se instala placa de fibrocemento superboart de 8 mm, estucado y pintado según recomendación y cortagotera en lamina metalica, Incluye todo lo nec	9 días	jue 27/03/25	vie 4/04/25
49	OE 03	Suministro e Instalación Teja TERMOACUSTICA UPVC 2,5 MM, incluye todo lo necesario para realizar trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecución	8 días	jue 8/05/25	vie 16/05/25
50	OE 04	Desmontaje de Torre de Telecomunicaciones de 21m en Altura, Incluyendo Retiro de Antena, vientos, anclajes, Equipos Eléctricos, cajas metalicas de forma manual, incluye retiro de tornillos, instalacion de poleas para descenso.	4 días	lun 28/04/25	jue 1/05/25
51	OE 05	Desmonte, recoleccion y disposición de adoquin existente de forma manual, incluye personal para cargue y descargue manual hasta sitio autorizado por la administracion. No incluye transporte	6 días	dom 9/03/25	vie 14/03/25
52		**PMA**	**194 días**	**vie 7/02/25**	**sáb 2/08/25**
53		Plan de manejo ambiental	194 días	vie 7/02/25	sáb 2/08/25
54		FIN	0 días	dom 3/08/25	dom 3/08/25

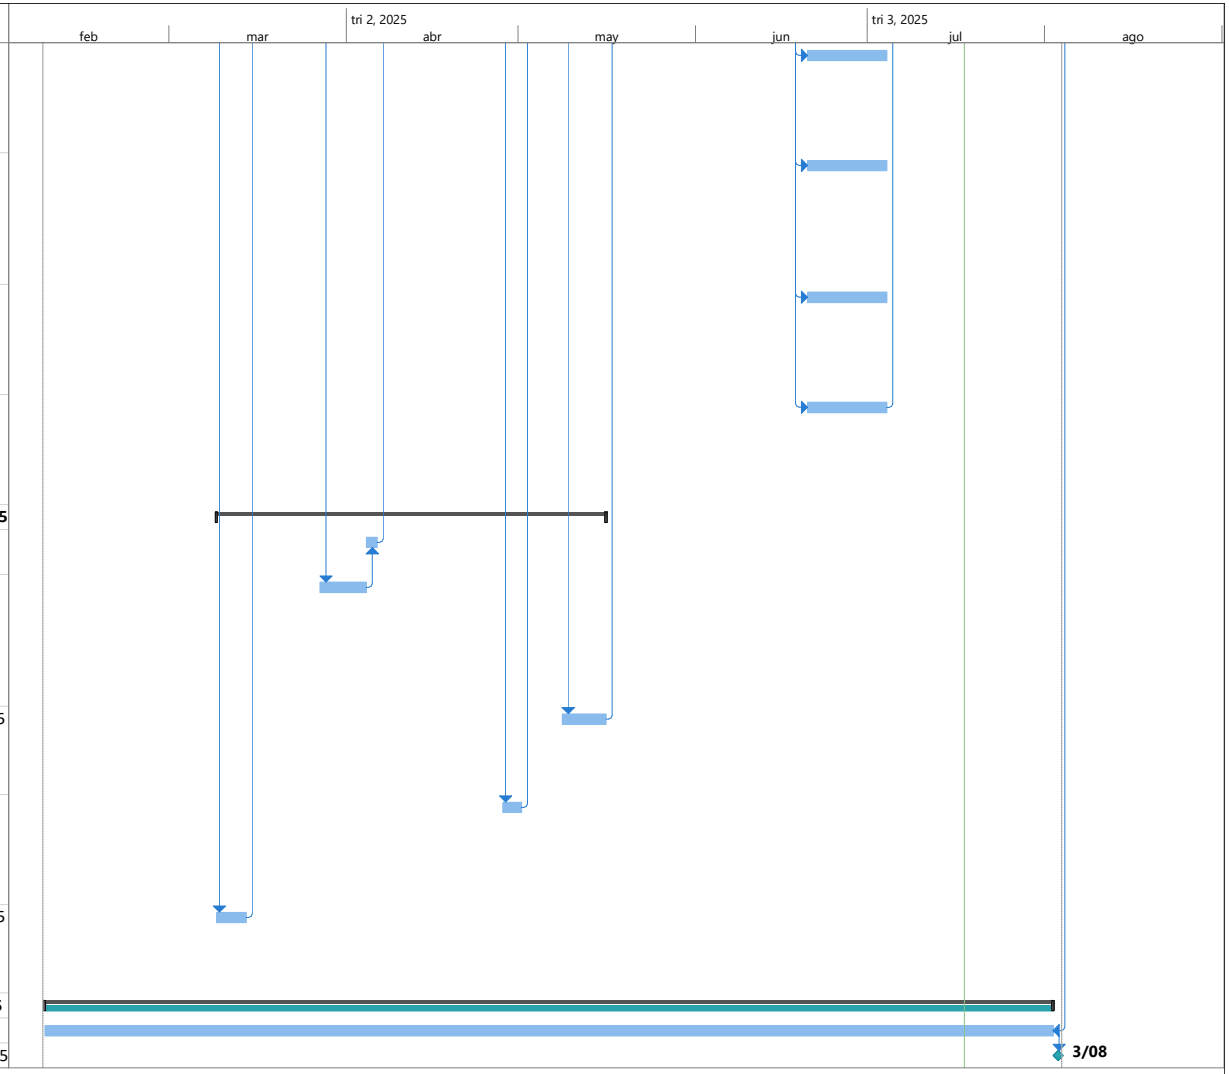

Proyecto: Proyecto2 LUIS FERN
Fecha: vie 18/07/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
