ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO No. 117 DE 2026

Tipo	Prestación de Servicios			Informe No. 2
	Suministros	X		
	Obra			
	Otro		Cuál?	

Fecha de perfeccionamiento	20 DE FEBRERO DE 2026
Contratista	MARIA ELENA OBANDO MORALES
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA
Clase de adjudicación	DIRECTA
CODIGO SUIFT TERRITORIO	202600000002870
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2026
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
Valor Inicial	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CT ($49.000.000)
forma de pago	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1) PAGO ANTICIPADO: Se realizará un pago inicial equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previa aprobación de la garantía única y la expedición del acta de inicio. Este valor tiene como fin garantizar la disponibilidad inmediata de combustible para la maquinaria amarilla. 2) PAGOS MENSUALES: El saldo restante se pagará mediante pagos mensuales vencidos, previa presentación de la factura electrónica, planilla de despacho de combustible con firma de los operarios de la maquinaria y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor, de los cuales se descontará el porcentaje de amortización correspondiente, informe de actividades, entradas y salidas de almacén, acta de recibo por parte del profesional encargado de suministros.
Interventor y/o Supervisor	SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO
Descripción del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. SECTPR:
Supervisor	ROMARIO ALEJANDRO SALAMANCA QUINAYAS
No. CDP	2026000084

No. Registro Presupuestal	**2026000185**
Rubro Presupuestal	RUBRO: 2.3.2.02.01.003.
Descripción del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. SECTPR: 24-TRANSPORTE.
Producto	2402112-VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas por el contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas que requería el Municipio de San Agustín referente al contrato de suministro de combustible 117 de 2026, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA. Teniendo en cuenta el informe del supervisor quien realiza el seguimiento técnico y administrativo, a continuación, relacionamos las actividades ejecutadas por el contratista de suministro.

2. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado en la zona urbana del Municipio de San Agustín, Huila.

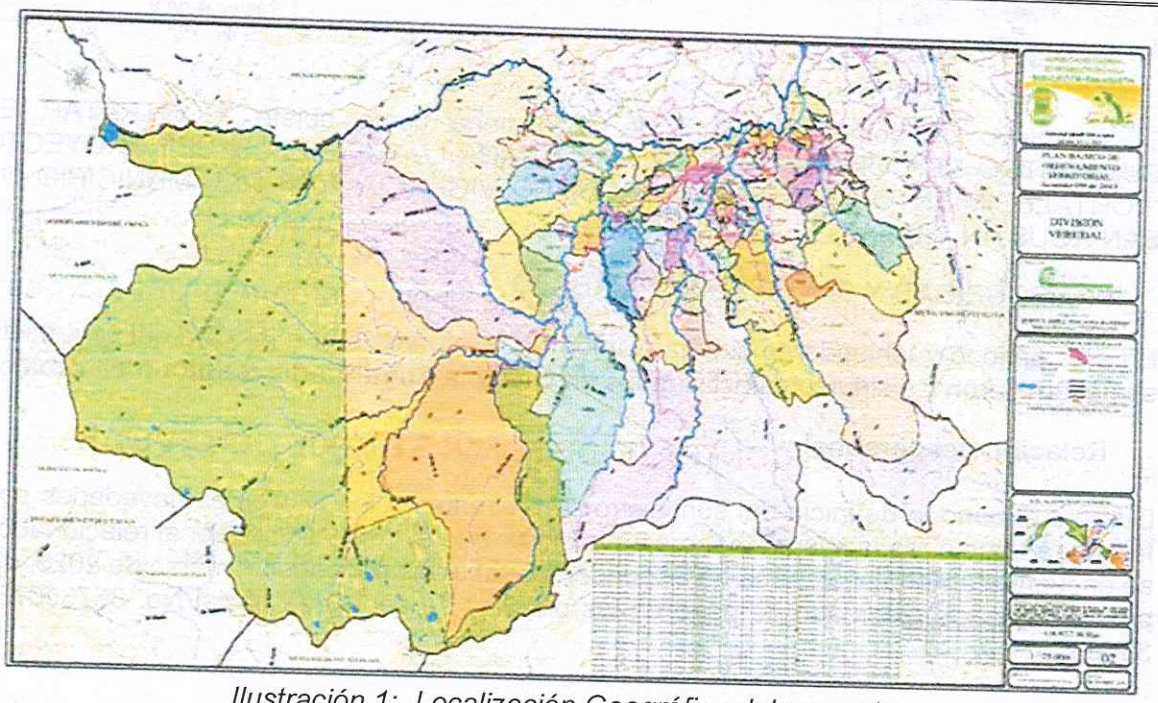


Ilustración 1: Localización Geográfica del proyecto.

3. AVANCE FISICO DE LAS INTERVENCIONES:

Teniendo en cuenta el informe de interventoría a continuación se relaciona el avance físico de contrato de suministro de combustible es al **41.65% de avance**

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES

El MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, suscribió el contrato suministros de combustible 117 de 2026 con MARIA ELENA OBANDO MORALES N o. DE CEDULA 26.567.078 de San Agustín, Huila; cuyo objeto es : "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA"., el cual ejerce el seguimiento y control al contrato de suministro en mención.

4.1 ESTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:

SUSPENDIDA ( )
EN EJECUCION (X)
TERMINADA ( )

El suministro de combustible 117 de 2026 tiene como objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA".

4.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este periodo y teniendo en cuenta el informe de interventoría e informe del contratista, se desarrollaron las siguientes actividades en cuanto a **Seguridad y Salud en el trabajo:**

Relación del personal

Durante el periodo de inicio del suministro se presentaron las siguientes novedades por frente de trabajo, de la misma manera se informar que el 100% del personal relacionado, se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad, durante los periodos de marzo de 2026, de acuerdo con lo presentado de pago en las planillas de seguridad social No. 36735073, 36665507.

5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM.

Teniendo en cuenta el informe del contratista y seguimiento de la supervisión, en este periodo se desarrollaron actividades de suministro como:

MUNICIPIO MAQUINARIA 2026

FECHA	N DE FACTURA	N DE ORDEN	VEHICULO	PLACA	GALONES	PRECIO	VALOR
9/04/2026	PESU-472073	37313	RETRO	3071	20,000	11670	233.400
9/04/2026	PESU-472077	37314	VOLQUETA	OZI-972	10,000	11670	116.700
10/04/2026	PESU-472692	37315	VOLQUETA	OZI-972	30,000	11670	350.100
10/04/2026	PESU-472672	37316	RETRO	3724	30,000	11670	350.100
10/04/2026	PESU-472691	37317	VOLQUETA	OZI-981	30,000	11670	350.100
11/04/2026	PESU-473400	37318	RETRO	3071	20,000	11670	233.400
14/04/2026	PESU-475810	37319	RETRO	3071	25,000	11670	291.750
14/04/2026	PESU-475806	37320	RETRO	3724	30,000	11670	350.100
14/04/2026	PESU-475807	37321	VOLQUETA	OZI-974	23,000	11670	268.410
14/04/2026	PESU-475815	37322	RETRO	3071	21,000	11670	245.070
14/04/2026	PESU-476036	37323	VOLQUETA	OJZ-099	15,000	11670	175.050
15/04/2026	PESU-476357	37329	RETRO	3071	20,000	11670	233.400
15/04/2026	PESU-476359	37328	VOLQUETA	OZI-972	30,000	11670	350.100

15/04/2026	PESU-476358	37327	VOLQUETA	OJZ-099	20,000	11670	233.400
15/04/2026	PESU-476356	37326	VOLQUETA	OZI-981	17,000	11670	198.390
15/04/2026	PESU-476352	37325	RETRO	3724	10,000	11670	116.700
15/04/2026	PESU-476355	37324	VOLQUETA	OZI-974	11,000	11670	128.370
20/04/2026	PEMA-690090	37330	VOLQUETA	OZI-981	15,000	11670	175.050
20/04/2026	PEMA-690093	37331	VOLQUETA	OZI-972	13,000	11670	151.710
20/04/2026	PEMA-690091	37332	RETRO	3071	20,000	11670	233.400
21/04/2026	PESU-480502	37336	VOLQUETA	OJZ-099	15,000	11670	175.050
21/04/2026	PESU-480503	37335	RETRO	3071	13,000	11670	151.710
21/04/2026	PESU-480504	37334	RETRO	3724	30,000	11670	350.100
21/04/2026	PESU-480506	37333	VOLQUETA	OZI-974	17,000	11670	198.390
	TOTAL:				485,000		5.659.950

6. LUGARES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

VEREDA EL CARMEN





CENTRO POBLADO LOS CAUCHOS





VEREDA EL BARNIZ





VEREDA ALTO SEVILLA








VEREDA ALTO MURALLA





7. CERTIFICACIONES DE LOS MEJORAMIENTOS DE VIAS TERCIARIAS

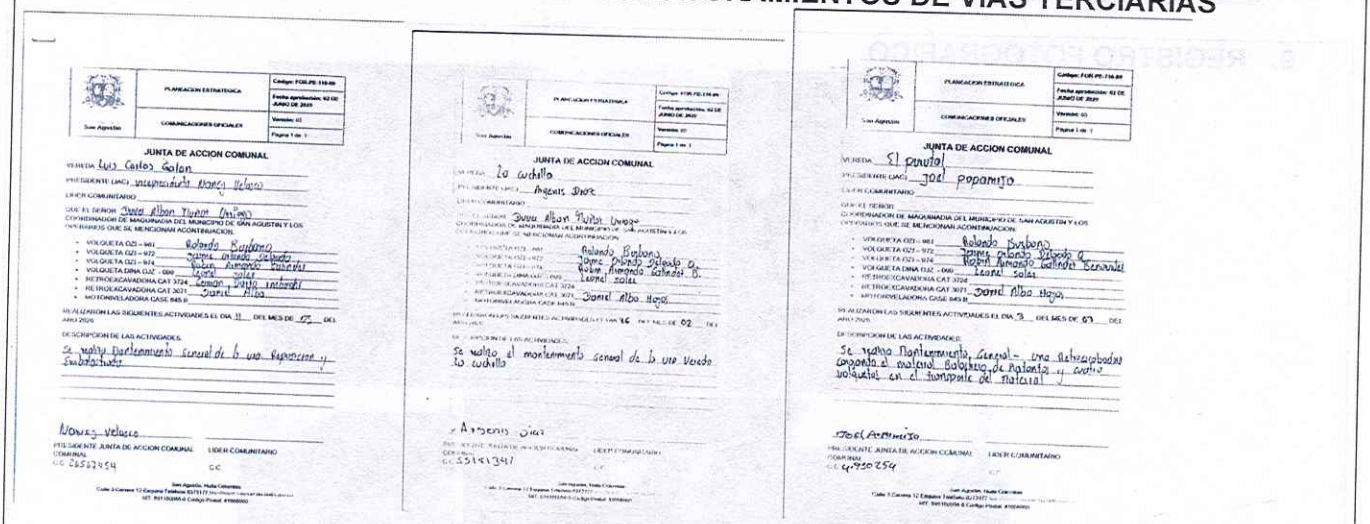



JUNTA DE ACCION COMUNAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL

8. REGISTRO SUMISTRO

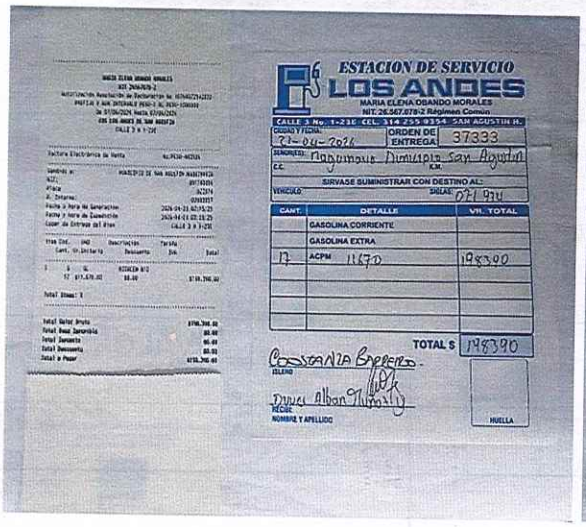

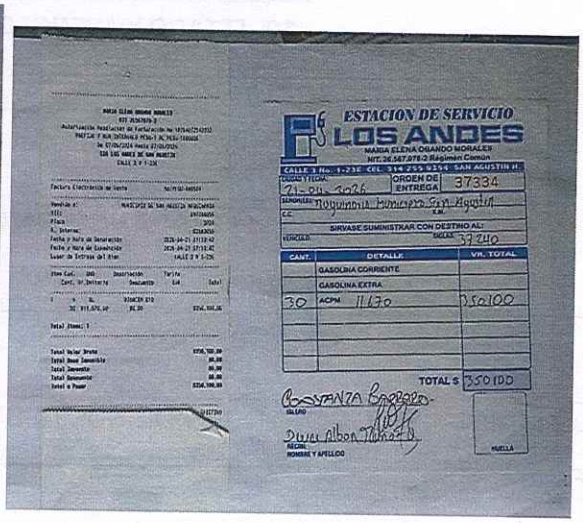

9. REGISTRO FOTOGRAFICO






10. ESTADO Y AVENCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS

FECHA DE INICIO:	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	19 DE JULIO DE 2026

11. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 49.000.000
ANTICIPO	$ 14.700.000
VALOR ACTA PARCIAL Nº 01	$ 14.750.892
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 01 (30,01%)	$ 4.440.018
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 01	$ 10.310.874
VALOR ACTA PARCIAL Nº 02	$ 5.659.950

AMORTIZACION ACTA PARCIAL Nº 02 (30%)	$ 1.332.006
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 02	$ 4.327.944
SALDO POR EJECUTAR	$ 19.661.182

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Estado Financiero del Contrato:

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR

3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor del contrato CERTIFICO que el contratista SI(x) NO cumplió a cabalidad con las obligaciones y el objeto del contrato No.117 de 2026, en el periodo indicado, por lo tanto, SI(x) NO__ se autoriza la realización del pago.

Justificar por qué no fue recibido a satisfacción:

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
Describir suscritamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

4.PAGO A REALIZAR

TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Desde el día 09 de abril al 21 de abril de 2026	$ 4.327.944

Observaciones: N/A

Fecha de Elaboración: 28 de abril de 2026

Firma:

Nombre: ROMARIO ALEJANDRO SALAMANCA QUINAYAS
Cargo: secretario de Planeación y Desarrollo Económico
Supervisor contrato 117 de 2026
