COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

												HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION			21/11/2025			VALOR	$		39.403.924.637
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.														
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025			HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:				Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.1.1	DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos.		FORMULA:					UNIDAD	día	FRENTE DE OBRA	16		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
FRENTE DE OBRA N°16									
CL 30 CR 65 + 384 CR 66B	15	Parque Juan Pablo II	1/12/2025	1,00				1,00	
CR 69B CL 26B + 41 CL 26B + 241	15	Parque Juan Pablo II	2/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	3/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	10	Perpetuo socorro	9/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	10	Perpetuo socorro	10/12/2025	1,00				1,00	
									5,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	5,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	39,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	44,00
TOTAL POR EJECUTAR	26,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		21/11/2025			VALOR	$	39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025				ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	1.2.1.1	DESCRIPCION	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno		FORMULA:				UNIDAD		FRENTE DE OBRA	2	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°2											
1A	164863	CR 39 CL 55 - 23	10	Boston	1/12/2025	1,87	1,60	0,12	0,36	0,86	
1B		CR 39 CL 55 - 23	10	Boston	1/12/2025	2,12	1,63	0,12	0,41	1,00	
2	155068	CL 56 CR 39 - 8	10	Boston	1/12/2025	8,30	0,80	0,13	0,86	2,07	
3	164864	CL 56A CR 39 - 02	10	Boston	1/12/2025	4,90	0,80	0,10	0,39	0,94	
1	164911	CL 56A CR 39 - 86	10	Boston	2/12/2025	3,90	1,40	0,05	0,27	0,66	
2A	164912	CL 56A CR 39 - 63	10	Boston	2/12/2025	1,72	1,10	0,12	0,23	0,54	
2B		CL 56A CR 39 - 63	10	Boston	2/12/2025	1,70	1,50	0,12	0,31	0,73	
3A	160729	CL 57 CR 38 - 71	10	Boston	2/12/2025	1,76	2,30	0,12	0,49	1,17	
3B		CL 57 CR 38 - 71	10	Boston	2/12/2025	1,40	1,52	0,12	0,26	0,61	
4	159895	CL 57 CR 38 - 57	10	Boston	2/12/2025	5,62	0,70	0,12	0,47	1,13	
1	164954	CR 39 CL 56 - 49	10	Boston	3/12/2025	2,90	1,17	0,13	0,44	1,06	
2	164955	CL 57 CL 38 - 65	10	Boston	3/12/2025	2,65	0,97	0,12	0,31	0,74	
3	164956	CL 57 CR 38 - 49	10	Boston	3/12/2025	2,55	0,86	0,12	0,26	0,63	
4A	160729	CL 57 CR 38 - 71	10	Boston	3/12/2025	1,76	2,30	0,04	0,16	0,39	
4B		CL 57 CR 38 - 71	10	Boston	3/12/2025	1,40	1,52	0,04	0,09	0,20	
5	159790	CR 39 CL 59A - 78	10	Los Angeles	3/12/2025	6,20	1,20	0,10	0,74	1,79	
1A	165036	CR 23 CL 10B -120	14	Altos del Poblado	4/12/2025	1,65	1,91	0,13	0,41	0,96	
1B		CR 23 CL 10B -120	14	Altos del Poblado	4/12/2025	1,00	1,30	0,13	0,17	0,41	
2A	165037	CR 23 CL 10B -120 + 2M	14	Altos del Poblado	4/12/2025	0,65	0,80	0,10	0,05	0,12	
2B		CR 23 CL 10B -120 +2M	14	Altos del Poblado	4/12/2025	1,70	1,55	0,10	0,26	0,63	
3	165038	CR 23 CL 10B -88	14	Altos del Poblado	4/12/2025	1,48	0,80	0,10	0,12	0,28	
4A	164008	CR 25 CL 2 SUR	14	Los Naranjos	4/12/2025	1,35	2,10	0,10	0,28	0,68	
4B		CR 25 CL 2 SUR	14	Los Naranjos	4/12/2025	1,90	1,60	0,10	0,30	0,73	
5	163001	CL 2SUR CR 2	14	Los Naranjos	4/12/2025	1,20	1,30	0,10	0,16	0,37	
6	164934	CR 43C CL 6SUR - 33	14	La Aguacatala	4/12/2025	1,03	1,86	0,12	0,23	0,55	
7	165039	CR 43C CL 6SUR - 33 + 12M	14	La Aguacatala	4/12/2025	0,80	0,80	0,05	0,03	0,08	
1A	165058	CL 10 CR 27 - 243	14	Las Lomas No.2	5/12/2025	6,15	1,80	0,16	1,77	4,25	
1B		CL 10 CR 27 - 243	14	Las Lomas No.2	5/12/2025	1,05	1,10	0,16	0,18	0,44	
2	165059	CL 10 CR 30 - 230	14	Las Lomas No.1	5/12/2025	0,80	0,60	0,05	0,02	0,06	
3	156931	CL 10 CR 30A - 237	14	Las Lomas No.1	5/12/2025	0,90	0,80	0,04	0,03	0,07	
1	165096	CR 29 CL 1 - 09	14	El Tesoro	9/12/2025	1,65	1,35	0,15	0,33	0,80	
2	165097	CR 29 CL 1 - 09 + 25M	14	El Tesoro	9/12/2025	2,10	2,30	0,10	0,48	1,16	
3	165098	CR 29 CL 1 - 81	14	El Tesoro	9/12/2025	1,70	1,31	0,17	0,38	0,91	
4	165099	CR 29 CL 1 - 187	14	El Tesoro	9/12/2025	0,55	0,80	0,05	0,02	0,05	
5	165100	CR 29 CL 1 - 203	14	El Tesoro	9/12/2025	4,60	0,50	0,08	0,18	0,44	
6A	165101	CR 23 CL 10B - 91	14	Altos del Poblado	9/12/2025	3,20	2,40	0,07	0,54	1,29	
6B		CR 23 CL 10B - 91	14	Altos del Poblado	9/12/2025	0,80	1,25	0,07	0,07	0,17	
1	165152	CR 29 CL 1 - 81 +1M	14	El Tesoro	10/12/2025	1,00	1,70	0,11	0,19	0,45	
2	165153	CR 29 CL 1 - 131	14	El Tesoro	10/12/2025	2,60	0,95	0,12	0,30	0,71	
3A	165153	CR 29 CL 1 - 131 +2M	14	El Tesoro	10/12/2025	1,10	1,50	0,11	0,18	0,44	
3B		CR 29 CL 1 - 131 +2M	14	El Tesoro	10/12/2025	1,70	1,75	0,11	0,33	0,79	
4	165155	CR 29 CL 1 - 141	14	El Tesoro	10/12/2025	5,95	0,90	0,11	0,59	1,41	
5A	165157	CR 29 CL 1 - 142	14	El Tesoro	10/12/2025	1,20	1,23	0,11	0,16	0,39	
5B		CR 29 CL 1 - 142	14	El Tesoro	10/12/2025	2,35	0,98	0,11	0,25	0,61	
											33,79

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	33,79
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	33,79
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	516,58
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	550,37
TOTAL POR EJECUTAR	53,85

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		21/11/2025			VALOR	$	39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA		10/12/2025			ACTA N°	6	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377						SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:					UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	3,4,6,7,8,9,11,13,14	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°3											
1	164888	CR 153B CL 70 - 285	60	El Uvito	01/12/2025	20,57	3,40	0,06	4,20	10,07	
1	164888 (Segunda capa)	CR 153B CL 70 - 285	60	El Uvito	02/12/2025	21,03	3,40	0,07	5,01	12,01	
1A	164838 (Segunda capa)	CL 70 CR 152A - 117+5m	60	El Uvito	03/12/2025	5,10	1,70	0,05	0,43	1,04	
1B		CL 70 CR 152A - 117+5m	60	El Uvito	03/12/2025	1,50	1,40	0,05	0,11	0,25	
2	164838 (Tercer parte)	CL 70 CR 152A - 117+5m	60	El Uvito	03/12/2025	2,60	1,72	0,12	0,54	1,29	
3	164942	CL 70 CR 152A - 245	60	El Uvito	03/12/2025	2,70	1,62	0,12	0,52	1,26	
4	164941	CL 70 CR 152A - 229+15m	60	El Uvito	03/12/2025	5,08	1,80	0,12	1,10	2,63	
5	164940	CL 70 CR 152A - 175	60	El Uvito	03/12/2025	3,60	1,67	0,12	0,72	1,73	
6	164943	CL 70 CR 152A - 304	60	El Uvito	03/12/2025	3,45	1,90	0,12	0,79	1,89	
1A	165065	CR 152 CL 70	60	El Uvito	04/12/2025	2,69	1,44	0,12	0,46	1,12	
1B		CR 152 CL 70	60	El Uvito	04/12/2025	3,50	2,38	0,10	0,83	1,98	
2	165064	CR 152 CL 67 - 300	60	El Uvito	04/12/2025	1,98	1,91	0,11	0,42	1,00	
3	165063	CR 152 CL 67 - 300+50m	60	El Uvito	04/12/2025	2,49	2,13	0,11	0,58	1,40	
4	165066	CR 152 CL 67 - 300+60m	60	El Uvito	04/12/2025	5,17	3,66	0,10	1,89	4,54	
1	165067	CL 70 CR 152A	60	El Uvito	05/12/2025	11,25	1,10	0,11	1,36	3,27	
2	165068	CL 70 CR 151 - 24	60	El Uvito	05/12/2025	2,02	1,30	0,12	0,32	0,76	
3	165069	CR 152 CL 67 - 300+120m	60	El Uvito	05/12/2025	3,34	1,55	0,12	0,62	1,49	
4	165070	CR 152 CL 67 - 300+20m	60	El Uvito	05/12/2025	7,10	2,40	0,11	1,87	4,50	
1	165138	CL 62D CR 108BB - 31	60	AE Pajarito	09/12/2025	3,80	1,70	0,14	0,90	2,17	
2	165137	CL 62D CR 108BB - 55	60	AE Pajarito	09/12/2025	2,70	1,60	0,14	0,60	1,45	
3	165136	CL 62D CR 108BB - 85	60	AE Pajarito	09/12/2025	1,52	1,57	0,16	0,38	0,92	
4A	164135	CL 62D CR 108BB - 85+5m	60	AE Pajarito	09/12/2025	4,87	1,35	0,14	0,92	2,21	
4B		CL 62D CR 108BB - 85+5m	60	AE Pajarito	09/12/2025	3,35	1,71	0,14	0,80	1,92	
5	164132	CL 62D CR 110 - 73	7	Santa Margarita	09/12/2025	1,50	1,30	0,14	0,27	0,66	
6	164134	CL 62D CR 110 - 73+5m	7	Santa Margarita	09/12/2025	4,25	1,93	0,14	1,15	2,76	
1A	164145	CL 62D CR 108BB - 53	60	Área expansión de Pajarito	10/12/2025	8,50	1,45	0,14	1,73	4,14	
1B		CL 62D CR 108BB - 53	60	Área expansión de Pajarito	10/12/2025	2,20	2,01	0,14	0,62	1,49	
2	165144	CL 62D CR 108BB - 65	60	Área expansión de Pajarito	10/12/2025	1,30	1,50	0,11	0,21	0,51	
3	165140	CL 62D CR 110 - 73+10m	7	Las Margaritas	10/12/2025	3,20	0,80	0,11	0,28	0,68	
4	165141	CL 62D CR 110 - 77	7	Las Margaritas	10/12/2025	2,93	0,98	0,11	0,32	0,76	
5	165143	CL 62D CR 110 - 77+2m	7	Las Margaritas	10/12/2025	1,10	1,30	0,14	0,20	0,48	
6	161035	CL 62D CR 110 - 77+50m	7	Las Margaritas	10/12/2025	2,30	2,40	0,14	0,77	1,85	
7	165142	CL 62D CR 110 - 77+100m	7	Las Margaritas	10/12/2025	5,05	1,41	0,13	0,93	2,22	
											76,45

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025			VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025					ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:					UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA		3,4,6,7,8,9,11,13,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACION					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°4											
1	153522	CL 88B CR 67-20	5	Alfonso López	1/12/2025	7,85	3,06	0,12	2,88	6,92	
2	164852	CL 88B CR 66-44	5	Alfonso López	1/12/2025	3,76	2,86	0,13	1,40	3,36	
3	157086	CL 88B CR 66-14	5	Alfonso López	1/12/2025	1,41	1,51	0,14	0,30	0,72	
1A	151616	CL 88C CR 65-30	5	Alfonso López	2/12/2025	2,74	2,61	0,10	0,72	1,72	
1B		CL 88C CR 65-30	5	Alfonso López	2/12/2025	1,31	0,86	0,10	0,11	0,27	
2	164899	CL 88C CR 65-10	5	Alfonso López	2/12/2025	2,17	2,17	0,11	0,52	1,24	
3A	164900	CL 88C CR 65-05	5	Alfonso López	2/12/2025	2,78	2,30	0,11	0,70	1,69	
3B		CL 88C CR 65-05	5	Alfonso López	2/12/2025	4,60	2,20	0,11	1,11	2,67	
4	164901	CR 65 CL 85A-07	5	Alfonso López	2/12/2025	1,66	1,01	0,11	0,18	0,44	
5	164903	CR 67A CL 82-07	5	Alfonso López	2/12/2025	1,94	1,46	0,13	0,37	0,88	
6	164904	CR 65A CL 88C-04	5	Alfonso López	2/12/2025	2,66	1,13	0,16	0,48	1,15	
1	164939	CR 55 CL 47A Sur -56	80	San Antonio de prado	3/12/2025	3,77	1,48	0,24	1,34	3,21	
2	164976	CR 55 CL 48 Sur	80	San Antonio de prado	3/12/2025	1,32	1,62	0,15	0,32	0,77	
3	164978	CR 55 CL 47 Sur-39	80	San Antonio de prado	3/12/2025	3,77	1,76	0,24	1,59	3,82	
4	164977	CR 55 CL 47 Sur-10	80	San Antonio de prado	3/12/2025	2,47	1,96	0,20	0,97	2,32	
1A	147695	CR 69A CL 71B-76	5	Alfonzo Lopez	4/12/2025	1,98	2,12	0,11	0,46	1,11	
1B		CR 69A CL 71B-76	5	Alfonzo Lopez	4/12/2025	16,67	1,35	0,11	2,48	5,91	
2	164986	CR 69A CL 71B-74	5	Alfonzo Lopez	4/12/2025	6,53	1,39	0,18	1,63	3,92	
3	164985	CR 72 CL 91A-35	5	Alfonzo Lopez	4/12/2025	2,35	1,23	0,16	0,46	1,11	
1A	165029	CR 76 CL 50-17	11	Cuarta Brigada	5/12/2025	3,77	1,64	0,12	0,74	1,78	
1B		CR 76 CL 50-17	11	Cuarta Brigada	5/12/2025	2,63	2,32	0,12	0,73	1,76	
2A	165030	CR 76 CL 51-05	11	Cuarta Brigada	5/12/2025	3,30	1,43	0,13	0,59	1,42	
2B		CR 76 CL 51-05	11	Cuarta Brigada	5/12/2025	1,40	1,91	0,13	0,33	0,80	
3A	165031	CR 76 CL 51-22	11	Cuarta Brigada	5/12/2025	2,10	3,35	0,12	0,84	2,03	
3B		CR 76 CL 51-22	11	Cuarta Brigada	5/12/2025	2,88	2,35	0,12	0,81	1,95	
4	165032	CL 53 CR 76A-10	11	Cuarta Brigada	5/12/2025	1,00	1,00	0,15	0,15	0,36	
1	162043	CR 77C CL 51-29	11	Los Colores	9/12/2025	0,94	3,11	0,13	0,38	0,91	
2	165093	CL 51 CR 77C-37	11	Los Colores	9/12/2025	3,82	1,57	0,15	0,90	2,16	
3	165094	CL 51 CR 78A-67	11	Los Colores	9/12/2025	0,75	3,70	0,13	0,36	0,87	
4A	165092	CR 78B CL 51A-33	11	Los Colores	9/12/2025	4,68	3,36	0,15	2,36	5,66	
4B		CR 78B CL 51A-33	11	Los Colores	9/12/2025	1,92	2,21	0,15	0,64	1,53	
5	161230	CL 53 CR 76A-42	11	Los Colores	9/12/2025	1,35	1,50	0,14	0,28	0,68	
6	161996	CL 53 CR 76A-40	11	Los Colores	9/12/2025	1,50	1,10	0,06	0,10	0,24	
1	165128	CR 76 CL 51-40	11	Cuarta Brigada	10/12/2025	1,90	1,67	0,09	0,29	0,69	
2	165127	CR 76 CL 51-80	11	Cuarta Brigada	10/12/2025	4,70	2,42	0,09	1,02	2,46	
3A	165129	CR 52 CL 74-6	11	Cuarta Brigada	10/12/2025	4,60	4,88	0,12	2,69	6,47	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	3,4,6,7,8,9,11,13,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






	LOCALIZACION					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
3B		CR 52 CL 74-6	11	Cuarta Brigada	10/12/2025	2,47	2,00	0,12	0,59	1,42	
											76,42
		FRENTE DE OBRA N°6									
1A	154866	CL 44E CR 8B -7	9	Bomboná No.2	01/12/2025	2,45	3,90	0,11	1,05	2,52	
1B		CL 44E CR 8B -7	9	Bomboná No.2	01/12/2025	10,50	2,70	0,11	3,12	7,48	
1A	165006	CR 11C CL 45A	9	Bomboná No.2	02/12/2025	3,45	3,70	0,12	1,53	3,68	
1B		CR 11C CL 45A	9	Bomboná No.2	02/12/2025	4,43	5,75	0,12	3,06	7,34	
1	165002	CR 15 CL 46	9	Bomboná No.2	03/12/2025	4,60	1,85	0,15	1,28	3,08	
2	165003	CR 15 CL 46	9	Bomboná No.2	03/12/2025	2,07	2,10	0,15	0,65	1,56	
3	165004	CL 46 14 C 86	9	Bomboná No.2	03/12/2025	1,70	2,10	0,14	0,50	1,20	
4	165005	CL 46 14 C 74	9	Bomboná No.2	03/12/2025	6,15	2,53	0,14	2,18	5,23	
1	165008	CL 46 14 C 22	9	Bomboná No.2	04/12/2025	4,65	0,90	0,14	0,59	1,41	
2	165009	CL 46 CR 14 A	9	Bomboná No.2	04/12/2025	2,70	1,43	0,14	0,54	1,30	
3A	165010	CL 46 CR 14 A+1	9	Bomboná No.2	04/12/2025	1,40	4,65	0,14	0,91	2,19	
3B		CL 46 CR 14 A+1	9	Bomboná No.2	04/12/2025	4,50	1,70	0,14	1,07	2,57	
4	165011	CR 14 A 45 CC 12	9	Bomboná No.2	04/12/2025	10,16	1,33	0,14	1,89	4,54	
1	165108	CL 44 D CR 8 A	9	Bomboná No.2	05/12/2025	6,30	2,70	0,12	2,04	4,90	
2A	165109	CL 44 D CR 8 A + 2	9	Bomboná No.2	05/12/2025	1,35	2,35	0,12	0,38	0,91	
2B		CL 44 D CR 8 A + 2	9	Bomboná No.2	05/12/2025	2,05	4,20	0,12	1,03	2,48	
3	165110	CL 44 D CR 8 A + 3	9	Bomboná No.2	05/12/2025	3,20	4,10	0,12	1,57	3,78	
1A	165111	CR 9 CL 52-53	9	Las Estancias	09/12/2025	2,30	1,24	0,12	0,34	0,82	
1B		CR 9 CL 52-53	9	Las Estancias	09/12/2025	5,65	1,78	0,12	1,21	2,90	
2A	162787	CR 9 CL 55-69	9	Las Estancias	09/12/2025	1,95	2,22	0,13	0,56	1,35	
2B		CR 9 CL 55-69	9	Las Estancias	09/12/2025	2,96	1,00	0,13	0,38	0,92	
3A	165112	CR 9 CL 52-83	9	Las Estancias	09/12/2025	1,00	1,12	0,13	0,15	0,35	
3B		CR 9 CL 52-83	9	Las Estancias	09/12/2025	2,60	1,00	0,13	0,34	0,81	
4A	165114	CR 9 CL 53-07	9	Las Estancias	09/12/2025	1,30	1,20	0,13	0,20	0,49	
4B		CR 9 CL 53-07	9	Las Estancias	09/12/2025	1,40	3,23	0,13	0,59	1,41	
5	165115	CR 9 CL 53-24	9	Las Estancias	09/12/2025	2,08	1,95	0,13	0,53	1,27	
6	165116	CR 9 CL 53-49	9	Las Estancias	09/12/2025	1,63	1,45	0,13	0,31	0,74	
1A	165166	CR 8 A 52-49	9	Las Estancias	10/12/2025	7,60	1,46	0,13	1,44	3,46	
1B		CR 8 A 52-49	9	Las Estancias	10/12/2025	1,45	1,65	0,14	0,33	0,80	
2	163017	CR 8 A 53-15	9	Las Estancias	10/12/2025	4,33	1,30	0,14	0,79	1,89	
3A	165168	CL 54 CR 8A	9	Las Estancias	10/12/2025	4,80	2,20	0,14	1,48	3,55	
3B		CL 54 CR 8A	9	Las Estancias	10/12/2025	2,32	1,85	0,14	0,60	1,44	
											78,35
		FRENTE DE OBRA N°7									

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$	39.403.924.837	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:		UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	3,4,6,7,8,9,11,13,14		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



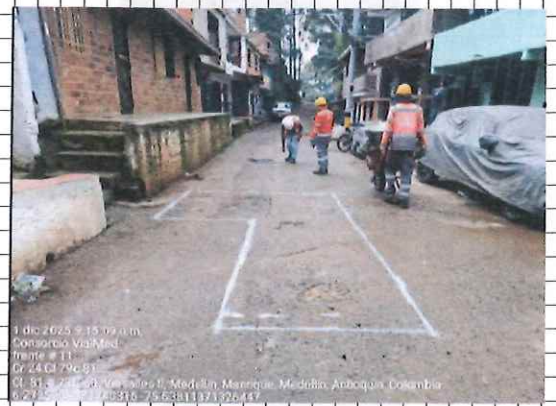

	LOCALIZACION					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
1A	164962	CL 103D CR 64A-45	5	Belalcázar	01/12/2025	3,00	1,10	0,15	0,50	1,19	
1B		CL 103D CR 64A-45	5	Belalcázar	01/12/2025	2,84	3,60	0,15	1,53	3,68	
2	164963	CL 103D CR 64A-25	5	Belalcázar	01/12/2025	5,56	2,28	0,16	2,03	4,87	
3	164964	CL 103D CR 64A-08	5	Belalcázar	01/12/2025	3,52	1,70	0,16	0,96	2,30	
1	164965	CL 102 CR 64-120	5	Belalcázar	02/12/2025	4,32	2,40	0,16	1,66	3,98	
2	164967	CL 102 CR 64-119	5	Belalcázar	02/12/2025	6,12	1,76	0,17	1,79	4,29	
3	164968	CL 102 CR 64-114	5	Belalcázar	02/12/2025	5,87	1,66	0,16	1,56	3,74	
1	164969	CL 102 CR 64-95	5	Belalcázar	03/12/2025	6,10	3,00	0,13	2,38	5,71	
2	164970	CL 102 CR 64-89	5	Belalcázar	03/12/2025	2,80	2,10	0,13	0,76	1,83	
3	164971	CL 102 CR 64-75	5	Belalcázar	03/12/2025	1,20	1,20	0,10	0,15	0,35	
4A	164972	CL 102 CR 64-70	5	Belalcázar	03/12/2025	2,70	2,10	0,14	0,79	1,91	
4B		CL 102 CR 64-70	5	Belalcázar	03/12/2025	3,67	1,85	0,14	0,95	2,28	
1	165079	CL 103 CR 64-30	5	Belalcazar	04/12/2025	6,30	2,28	0,20	2,80	6,72	
2A	165080	CL 103 CR 64-14	5	Belalcazar	04/12/2025	3,52	0,89	0,20	0,63	1,50	
2B		CL 103 CR 64-14	5	Belalcazar	04/12/2025	1,94	1,86	0,20	0,72	1,73	
3	165081	CL 103 CR 64-07	5	Belalcazar	04/12/2025	2,84	1,79	0,17	0,88	2,12	
1	165082	CL 102 CR 64-26	5	Belalcazar	05/12/2025	4,50	3,70	0,15	2,50	5,99	
2	165083	CL 102 CR 64-11	5	Belalcazar	05/12/2025	4,45	3,20	0,14	1,99	4,78	
3	165084	CL 102 CR 64-07	5	Belalcazar	05/12/2025	3,91	1,58	0,08	0,52	1,25	
1	151062	CR 63C CL 103D	5	Belalcazar	09/12/2025	2,60	3,30	0,11	0,94	2,27	
2A	151374	CR 63C CL 103D - 37	5	Belalcazar	09/12/2025	12,00	2,26	0,11	2,98	7,16	
2B		CR 63C CL 103D - 37	5	Belalcazar	09/12/2025	4,50	2,20	0,11	1,09	2,61	
1	165148	CL 27A CR 80-122	16	La Palma	10/12/2025	6,30	1,83	0,13	1,50	3,60	
2	165149	CL 27A CR 80-94	16	La Palma	10/12/2025	10,40	1,80	0,13	2,43	5,84	
3	165150	CL 27A CR 80-72	16	La Palma	10/12/2025	1,40	1,80	0,10	0,25	0,60	
											82,30
		FRENTE DE OBRA N°8									
1A	164861	CL 80 CR 50B-07	4	Brasilia	01/12/2025	3,10	2,52	0,13	1,02	2,44	
1B		CL 80 CR 50B-07	4	Brasilia	01/12/2025	1,10	1,00	0,13	0,14	0,34	
2A	164800	CL 80 CR 50B	4	Brasilia	01/12/2025	4,61	2,68	0,12	1,48	3,56	
2B		CL 80 CR 50B	4	Brasilia	01/12/2025	4,82	3,80	0,13	2,38	5,71	
1A	162566	CR 50A CL 106-70	2	Andalucía	02/12/2025	2,24	2,14	0,11	0,53	1,27	
1B		CR 50A CL 106-70	2	Andalucía	02/12/2025	3,20	1,80	0,11	0,63	1,52	
2	163187	CR 50A CL 106-77	2	Andalucía	02/12/2025	2,88	2,30	0,11	0,73	1,75	
3	158634	CR 50A CL 106-83	2	Andalucía	02/12/2025	5,80	3,30	0,12	2,30	5,51	
4	164913	CR 50A CL 106-93	2	Andalucía	02/12/2025	3,00	1,20	0,12	0,43	1,04	
1	163959	CR 50A CL 82	4	Brasilia	03/12/2025	3,80	3,40	0,12	1,55	3,72	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$ 39.403.924.837				
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	3,4,6,7,8,9,11,13,14		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



	LOCALIZACION					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
1A	156768	CL 34A CR 84A - 228	80	El Salado	09/12/2025	10,50	3,40	0,13	4,50	10,80	
1B		CL 34A CR 84A - 228	80	El Salado	09/12/2025	1,80	2,22	0,13	0,51	1,22	
											22,05
	FRENTE DE OBRA N°14										
1	164853	CR 80E CL 40 - 10	11	Lorena	01/12/2025	3,75	2,50	0,14	1,31	3,15	
2	164854	CR 80E CL 40 - 09	11	Lorena	01/12/2025	2,20	1,15	0,15	0,38	0,91	
3	164855	CR 80E CL 40 - 15	11	Lorena	01/12/2025	2,30	1,50	0,15	0,52	1,24	
4	164856	CR 80E CL 40 - 34	11	Lorena	01/12/2025	2,20	2,80	0,15	0,92	2,22	
5	164857	CR 80E CL 40 - 73	11	Lorena	01/12/2025	3,10	1,70	0,15	0,79	1,90	
6	164859	CR 80E CL 40 - 92	11	Lorena	01/12/2025	1,60	1,20	0,14	0,27	0,65	
7	164860	CR 80E CL 40 - 124	11	Lorena	01/12/2025	2,60	2,26	0,14	0,82	1,97	
1	164907	CR 81B CL 48B-12	12	Calasanz	02/12/2025	3,13	3,46	0,13	1,41	3,39	
2	164908	CR 81B CL 48B-24	12	Calasanz	02/12/2025	1,95	3,68	0,13	0,93	2,24	
3	164909	CR 81B CL 48B-26	12	Calasanz	02/12/2025	3,12	2,05	0,13	0,83	2,00	
4	164910	CR 81B CL 48B-56	12	Calasanz	02/12/2025	4,30	3,40	0,13	1,87	4,49	
1	164935	CR 79 CL 47 102	11	Velódromo	03/12/2025	2,80	1,92	0,14	0,75	1,81	
2	164936	CR 79 CL 47 96	11	Velódromo	03/12/2025	2,45	2,43	0,14	0,83	2,00	
3	164937	CR 79 CL 47 92	11	Velódromo	03/12/2025	5,75	2,55	0,14	2,05	4,93	
4A	164938	CR 79 CL 47 94	11	Velódromo	03/12/2025	2,70	2,75	0,14	1,04	2,49	
4B		CR 79 CL 47 76	11	Velódromo	03/12/2025	1,95	1,25	0,14	0,34	0,82	
1	164975	CR 89 DB CR 30 AB 59	16	Violetas	04/12/2025	16,80	2,80	0,05	2,35	5,64	
2	92554	CR 89 DB CR 30 AB 30	16	Violetas	04/12/2025	16,00	2,80	0,05	2,24	5,38	
1	165053	CR 89 DB CR 30 AB 11	16	Violetas	05/12/2025	8,50	2,80	0,05	1,19	2,86	
2	165054	Cl 30 AB CR 89 DA	16	Violetas	05/12/2025	23,50	2,90	0,05	3,41	8,18	
1	156304	Cl 30 AB CR 89 DA 34	16	Violetas	09/12/2025	31,70	2,90	0,05	4,60	11,03	
1	156304 (Segunda parte)	Cl 30 AB CR 89 DA 54	16	Las Violetas	10/12/2025	10,00	3,26	0,05	1,47	3,52	
2	165171	CR 89D CL30-43	16	Las Violetas	10/12/2025	20,00	3,40	0,05	3,16	7,57	
											80,38


ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Angel Saldarriaga Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	647,15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	647,15
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	7506,83
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8153,98
TOTAL POR EJECUTAR	1386,02

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025	ACTA Nº		6	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.2.2	DESCRIPCION	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	15,21	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

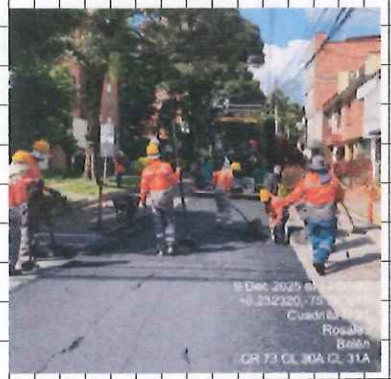

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°16										
1	CL 58 CR 31 Y CR 32	8	Enciso	09/12/2025	97,23	5,00	0,10	486,15	48,62	
2	CL 58 CR 31 Y CR 32	8	Enciso	10/12/2025	54,65	6,00	0,10	327,90	32,79	
3	CL 58 CR 32 Y CR 35	8	Enciso	10/12/2025	30,01	5,00	0,10	150,05	15,01	
										96,42
FRENTE DE OBRA N°21										
1A	CR 73 CL 30A CL 30C	16	Belen	09/12/2025	93,27	3,45	0,10	321,78	33,47	
1B	CR 73 CL 30A CL 30C	16	Belen	09/12/2025	17,11	4,55	0,10	77,85	8,10	
1	CR 73 CL 30A CL 30C	16	Belén	10/12/2025	104,04	3,51	0,10	365,18	37,98	
2	CR 73 CL 30C CL 31A	16	Belén	10/12/2025	30,00	3,50	0,10	105,00	10,59	
										90,14

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	186,56
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	186,56
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3140,15
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3326,71
TOTAL POR EJECUTAR	1373,19

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		21/11/2025		VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			1/12/2025			HASTA	10/12/2025		ACTA N°		6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:			Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.2.1	DESCRIPCION			Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	13

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°13										
1	CR 43D CL 11-02	14	Manila	01/12/2025	14,00	9,00	0,15	126,00	18,44	
2	CR 43D CL 11-02	14	Manila	01/12/2025	3,75	0,90	0,10	3,38	0,34	
1	CR 36B CL 5 CL 5B	14	La Florida	02/12/2025	8,10	6,00	0,13	48,60	6,32	
2A	CR 36B CL 5 CL 5B	14	La Florida	02/12/2025	21,50	3,00	0,12	64,50	7,83	
2B	CR 36B CL 5 CL 5B	14	La Florida	02/12/2025	1,50	4,10	0,08	6,15	0,49	
2C	CR 36B CL 5 CL 5B	14	La Florida	02/12/2025	8,60	6,00	0,08	51,60	4,13	
1A	CR 36B CL 5 CL 5B	14	La Florida	03/12/2025	1,50	4,10	0,06	6,15	0,37	
1B	CR 36B CL 5 CL 5B	14	La Florida	03/12/2025	8,60	6,00	0,06	51,60	3,10	
2A	CL 5B CR 36B CR 36B +	14	La Florida	03/12/2025	7,20	7,30	0,13	52,56	6,83	
2B	CL 5B CR 36B CR 36B +	14	La Florida	03/12/2025	5,30	2,70	0,13	14,31	1,86	
2C	CL 5B CR 36B CR 36B +	14	La Florida	03/12/2025	7,00	4,10	0,13	28,70	3,61	
1A	CL 5A CR 39 TV 5D	14	La Florida	04/12/2025	4,84	3,40	0,17	16,46	2,80	
1B	CL 5A CR 39 TV 5D	14	La Florida	04/12/2025	2,54	1,85	0,17	4,70	0,80	
1C	CL 5A CR 39 TV 5D	14	La Florida	04/12/2025	25,50	3,45	0,17	87,98	15,17	
1	CL 14 VÍA VEREDA BARCINO + 4151 VIA VEREDA BARCINO + 4351	Corregimiento de San	El Astillero	10/12/2025	50,20	2,60	0,10	130,52	12,77	
										84,86

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	84,86
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	84,86
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1262,57
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1347,43
TOTAL POR EJECUTAR	552,57

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$	39.403.924.837	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.1.3	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	FORMULA:		UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	5		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°5											
1	164906	CL 46 CR 45-25	10	Barrio Colon	01/12/2025	11,53	1,30	0,16	2,40	5,76	
2	164897	CR 46 CL 46 +9.00m	10	Barrio Colon	01/12/2025	2,50	1,15	0,14	0,40	0,97	
3	164898	CR 46 CL 46 +23.00m	10	Barrio Colon	01/12/2025	1,70	1,00	0,14	0,24	0,57	
4	141124	CL 47 CR 45-87	10	Barrio Colon	01/12/2025	2,80	3,00	0,14	1,18	2,82	
1	164949	CR 53 CL 30A +22.00m	16	Cerro Nutibara	02/12/2025	4,40	2,00	0,16	1,41	3,38	
2A	164952	CR 53 CL 30A +8.00m	16	Cerro Nutibara	02/12/2025	2,40	4,08	0,14	1,37	3,29	
2B		CR 53 CL 30A +8.00m	16	Cerro Nutibara	02/12/2025	2,85	2,10	0,14	0,84	2,01	
3	164948	CR 52 CL 30 +18.00m	15	Tenche	02/12/2025	1,60	7,30	0,05	0,58	1,40	
1	164990	CL 47 CR 46 +62.00m	10	Barrio Colon	03/12/2025	6,30	1,60	0,13	1,31	3,14	
2	163377	CL 47 CR 46 +41.00m	10	Barrio Colon	03/12/2025	7,50	1,60	0,13	1,56	3,74	
3	151660	CL 47 CR 46 +26.00m	10	Barrio Colon	03/12/2025	7,92	1,30	0,13	1,34	3,21	
1	164991	CL 47 CR 46 +46.00m	10	Barrio Colon	04/12/2025	6,95	1,80	0,16	1,94	4,65	
2	165015	CL 47 CR 46 +31.00m	10	Barrio Colon	04/12/2025	6,30	1,75	0,15	1,65	3,97	
3	165016	CL 47 CR 46 +17.00m	10	Barrio Colon	04/12/2025	3,35	1,20	0,15	0,60	1,45	
1	164758	CR 65 CL 93-11 -8.00	5	Castilla	05/12/2025	3,90	3,65	0,24	3,42	8,20	
2	164168	CR 65 CL 93-15	5	Castilla	05/12/2025	3,10	1,60	0,16	0,79	1,90	
1	165013	CR 32 CL 16 +9.00m	9	La Asomadera No.2	09/12/2025	2,10	5,85	0,19	2,27	5,45	
2	165102	CR 32 CL 16 +8.00m	9	La Asomadera No.2	09/12/2025	2,40	4,51	0,18	1,95	4,68	
1	165077	CR 52 CL 14	15	Santa Fe	10/12/2025	6,07	4,50	0,16	4,23	10,16	
											70,75

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	70,75
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	70,75
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1234,91
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1305,66
TOTAL POR EJECUTAR	-28,38

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$	39.403.924.837	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025	ACTA Nº	6				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	1.2.2.3	DESCRIPCION	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	17,21		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



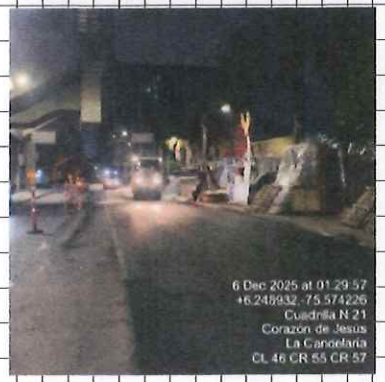

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°17										
1A	CR 28 CL 110 CL 110A	1	La avanzada	09/12/2025	32,00	5,31	0,10	169,92	17,77	
1B	CR 28 CL 109 CL 110	1	La avanzada	09/12/2025	21,00	3,32	0,10	69,72	6,97	
1B	CR 28 CL 109 CL 110	1	La avanzada	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1A	CR 28 CL 109 CL 110	1	La avanzada	10/12/2025	19,00	4,30	0,11	81,70	8,59	
1B	CR 28 CL 109 CL 110	1	La avanzada	10/12/2025	21,00	5,70	0,11	119,70	12,75	
1C	CR 28 CL 109 CL 110	1	La avanzada	10/12/2025	43,00	5,90	0,08	253,70	19,03	
2	CR 28 CL 109 CL 110	1	La avanzada	10/12/2025	10,00	2,30	0,10	23,00	2,30	
										67,41
FRENTE DE OBRA N°21										
1	CR 55 INIPUE CL 44 FINPUE CL 44	10	Alpujarra	01/12/2025	1,90	3,82	0,10	7,26	0,73	
2	CR 55 INIPUE CL 44 FINPUE CL 44	10	Alpujarra	01/12/2025	2,90	3,82	0,10	11,08	1,11	
3	CR 55 INIPUE CL 44 FINPUE CL 44	10	Alpujarra	01/12/2025	113,91	3,60	0,10	410,08	42,65	
1	CR 55 INIPUE CL 44 FINPUE CL 44	10	Alpujarra	02/12/2025	73,25	3,82	0,10	279,82	26,58	
2A	CR 55 CL 42C INIPUE CL 44	10	Alpujarra	02/12/2025	54,60	3,82	0,10	208,57	19,81	
2B	CR 55 CL 42C INIPUE CL 44	10	Alpujarra	02/12/2025	24,64	2,50	0,05	61,60	3,08	
1A	CL 46 CR 56 CR 57	10	Corazón de Jesús	03/12/2025	5,39	8,74	0,11	47,11	4,95	
1B	CL 46 CR 56 CR 57	10	Corazón de Jesús	03/12/2025	65,40	5,08	0,10	332,23	34,55	
1	CL 46 CR 55 CR 56	10	Guayaquil	04/12/2025	40,00	5,00	0,10	200,00	20,80	
1	CL 46 CR 56 CR 57	10	Corazón de Jesús	05/12/2025	70,81	5,08	0,08	359,71	29,86	
2	CL 46 CR 55 CR 56	10	Guayaquil	05/12/2025	47,05	5,02	0,08	236,19	19,60	
										203,72

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	271,13
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	271,13
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1714,13
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1985,26
TOTAL POR EJECUTAR	-29,10

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$ 39.403.924.837		
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025	ACTA Nº	6		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.3.4	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capitulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polimeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°16										
1	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	10	Perpetuo socorro	9/12/2025	72,46	3,69	0,22	267,38	58,82	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
										58,82

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoria

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	58,82
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	58,82
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1561,51
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1620,33
TOTAL POR EJECUTAR	1699,67

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$	39.403.924.837	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025	ACTA N°	6				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	1.3.6	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°16										
1	CL 30 CR 65 + 384 CR 66B	15	Parque Juan Pablo II	01/12/2025	122,69	6,50	0,08	797,49	63,80	
2	CL 30 CR 65 + 193 CR 65 + 384	15	Parque Juan Pablo II	01/12/2025	80,15	6,50	0,08	520,98	41,68	
1	CR 69B CL 26B + 41 CL 26B + 241	15	Parque Juan Pablo II	02/12/2025	16,43	7,67	0,10	126,02	12,60	
1	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	03/12/2025	73,55	3,51	0,10	258,16	25,82	
2	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	03/12/2025	21,56	3,51	0,10	75,68	7,57	
1	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	04/12/2025	73,50	3,55	0,10	260,93	26,09	
2	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	04/12/2025	12,55	3,55	0,10	44,55	4,46	
1	CL 37 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo socorro	05/12/2025	77,00	6,64	0,10	511,28	51,13	
2	CL 37 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo socorro	05/12/2025	7,16	3,18	0,10	22,63	2,26	
										235,41

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	235,41
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	235,41
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1593,44
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1828,85
TOTAL POR EJECUTAR	376,15

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$ 39,403,924,837		
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025	ACTA N°	6		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.3.7	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	15		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
	FRENTE DE OBRA N°15										
	1	CL 58 CR 31 Y CR 32	8	Enciso	10/12/2025	5,00	2,00	0,08	10,00	0,80	
											0,80

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Salamanca Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	0,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,80
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	28,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	28,80
TOTAL POR EJECUTAR	70,20

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$ 39.403.924.837		
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025	ACTA N°	6				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	1.4.2	DESCRIPCION	Fresado de vias con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches BRÁcora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°16										
Fresado	CR 69B CL 28B + 41 CL 26B + 241	15	Parque Juan Pablo II	02/12/2025	16,43	7,67	0,10	126,02	12,60	
Fresado	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	03/12/2025	73,55	3,51	0,10	258,16	25,82	
Fresado	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	03/12/2025	21,56	3,51	0,10	75,68	7,57	
Fresado	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	04/12/2025	73,50	3,55	0,10	260,93	26,09	
Fresado	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	04/12/2025	12,55	3,55	0,10	44,55	4,46	
Fresado	CL 37 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo socorro	05/12/2025	77,00	6,64	0,10	511,28	51,13	
Fresado	CL 37 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo socorro	05/12/2025	7,16	3,16	0,10	22,63	2,26	
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	10	Perpetuo socorro	09/12/2025	72,46	3,69	0,35	267,38	93,58	
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	10	Perpetuo socorro	10/12/2025	72,46	3,69	0,24	267,38	64,17	
										287,68

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	287,68
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	287,68
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3349,08
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3636,76
TOTAL POR EJECUTAR	-286,76

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025			VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025				HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,21

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad







LOCALIZACION					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°2										
CR 39 CL 55 - 23	10	Boston	01/12/2025	Procopal				2,71	2,71	
CL 56A CR 39 - 66	10	Boston	02/12/2025	Procopal				2,69	2,69	
CR 39 CL 56 - 49	10	Boston	03/12/2025	Procopal				2,07	2,07	
CR 23 CL 108 -120	14	Altos del Poblado	04/12/2025	Procopal				2,68	2,68	
CL 10 CR 27 - 243	14	Las Lomas No 2	05/12/2025	Procopal				2,68	2,68	
CR 29 CL 1 - 09	14	El Tesoro	09/12/2025	Procopal				2,68	2,68	
CR 29 CL 1 - 81 +1M	14	El Tesoro	10/12/2025	Procopal				2,07	2,07	
										18,78
FRENTE DE OBRA N°3										
CR 153B CL 70 - 285	60	El Uvito	01/12/2025	Procopal				5,61	5,61	
CR 153B CL 70 - 285	60	El Uvito	02/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CL 70 CR 152A - 117+5m	60	El Uvito	03/12/2025	Procopal				5,62	5,62	
CR 152 CL 70	60	El Uvito	04/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CL 70 CR 152A	60	El Uvito	05/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
CL 62D CR 108BB - 31	60	AE Pajarito	09/12/2025	Procopal				6,70	6,70	
CL 62D CR 108BB - 53	60	Área expansión de Pajarito	10/12/2025	Procopal				6,75	6,75	
										42,50
FRENTE DE OBRA N°4										
CL 88B CR 67-20	5	Alfonso López	01/12/2025	Procopal				6,11	6,11	
CL 88C CR 65-30	5	Alfonso López	02/12/2025	Procopal				5,59	5,59	
CR 55 CL 47A Sur -56	80	San Antonio de prado	03/12/2025	Procopal				5,62	5,62	
CR 69A CL 71B-76	5	Alfonso Lopez	04/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 76 CL 50-17	11	Cuarta Brigada	12/05/2025	Procopal				5,61	5,61	
CR 77C CL 51-29	11	Los Colores	09/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 76 CL 51-40	11	Cuarta Brigada	10/12/2025	Procopal				6,13	6,13	
										42,44
FRENTE DE OBRA N°5										
CL 46 CR 45-25	10	Barrio Colon	01/12/2025	Procopal				5,62	5,62	
CR 53 CL 30A +22.00m	16	Cerro Nutibara	02/12/2025	Procopal				5,60	5,60	
CL 47 CR 46 +62.00m	10	Barrio Colon	03/12/2025	Procopal				5,61	5,61	
CL 47 CR 46 +46.00m	10	Barrio Colon	04/12/2025	Procopal				5,59	5,59	
CR 65 CL 93-11 -8.00	5	Castilla	05/12/2025	Procopal				5,61	5,61	
CR 32 CL 16 +0.00m	9	La Asomadera No.2	09/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
CR 52 CL 14	15	Santa Fe	10/12/2025	Procopal				5,65	5,65	
										39,24
FRENTE DE OBRA N°6										
CL 44E CR 8B -7	9	Bomboná No 2	01/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CR 11C CL 45A	9	Bomboná No 2	02/12/2025	Procopal				6,12	6,12	
CR 15 CL 46	9	Bomboná No 2	03/12/2025	Procopal				6,15	6,15	
CL 46 14 C 22	9	Bomboná No 2	04/12/2025	Procopal				6,67	6,67	
CL 44 D CR 8 A	9	Bomboná No 2	05/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 9 CL 52-53	9	Las Estancias	09/12/2025	Procopal				6,14	6,14	
CR 8 A 52-49	9	Las Estancias	10/12/2025	Procopal				6,19	6,19	
										43,53
FRENTE DE OBRA N°7										
CL 103D CR 64A-45	5	Belalcázar	01/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CL 102 CR 64-120	5	Belalcázar	02/12/2025	Procopal				6,67	6,67	
CL 102 CR 64-95	5	Belalcázar	03/12/2025	Procopal				6,71	6,71	
CL 103 CR 64-30	5	Belalcazar	04/12/2025	Procopal				6,71	6,71	
CL 102 CR 64-26	5	Belalcazar	05/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CR 63C CL 103D	5	Belalcazar	09/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CL 27A CR 80-122	16	La Palma	10/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
										45,73
FRENTE DE OBRA N°8										
CL 80 CR 50B-07	4	Brasilia	01/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 50A CL 106-70	2	Andalucia	02/12/2025	Procopal				6,16	6,16	
CR 50A CL 82	4	Brasilia	03/12/2025	Procopal				6,67	6,67	
CR 37 CL50-72	10	Boston	04/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CR 40 CL 64-40	8	El Pinal	05/12/2025	Procopal				6,69	6,68	
CR 40 CL 65-24	8	Villa Hermosa	09/12/2025	Procopal				6,70	6,70	
CR 51 CL 68	4	San Pedro	10/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
										40,27

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025			VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025					HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,21

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°9										
CL 56A CR 25-44	8	El Pinal	01/12/2025	Procopal				6,11	6,11	
CR 25 CL 56A-07	8	El Pinal	02/12/2025	Procopal				6,13	6,13	
CR 25 CL 56A-25	8	El Pinal	03/12/2025	Procopal				6,11	6,11	
CL 56A CR 25AA-07	8	El Pinal	04/12/2025	Procopal				6,17	6,17	
CL 56A CR 25B-23	8	El Pinal	05/12/2025	Procopal				6,12	6,12	
CR 24 CL 56C-84	8	El Pinal	09/12/2025	Procopal				6,11	6,11	
CR 24 CL 56C-78	8	El Pinal	10/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
										42,33
FRENTE DE OBRA N°11										
CR 24 CL 79C-97	3	La Cruz	01/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CR 24 CL 75C-17	3	La Cruz	02/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CR 36C CL 79B-27	3	Santa Ines	03/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CR 41 CL 82-53	3	Campo Valdés No 2	04/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CR 31 CL 71-74	3	Versalles No 1	05/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CL 71A CR 33-04	3	Versalles No 1	09/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CL 71C CR 32-101	3	Versalles No 1	10/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
										40,12
FRENTE DE OBRA N°13										
CL 10 CR 21 - 47	14	El Tesoro	5/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CL 34A CR 84A - 228	80	El Salado	9/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
										12,25
FRENTE DE OBRA N°14										
CR 80E CL 40 - 10	11	Lorena	1/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 81B CL 48B-12	12	Calasanz	2/12/2025	Procopal				6,72	6,72	
CR 79 CL 47 102	11	Velódromo	3/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 89 DB CR 30 AB 59	16	Violetas	4/12/2025	Procopal				6,12	6,12	
CR 89 DB CR 30 AB 11	16	Violetas	5/12/2025	Procopal				6,13	6,13	
CI 30 AB CR 89 DA 34	16	Violetas	9/12/2025	Procopal				6,13	6,13	
CI 30 AB CR 89 DA 54	16	Las Violetas	10/12/2025	Procopal				6,16	6,16	
										44,64

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Salamanca Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	417,83
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	417,83
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	6691,91
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7109,74
TOTAL POR EJECUTAR	710,26

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025			VALOR	$	39.403.924.837	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025			HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.5.3	DESCRIPCION	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	FORMULA:				UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	14		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad	Id Baches Bitácora	LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	FRENTE DE OBRA N°14										
	Realces	Cl 30 AB CR 89 DA	16	Violetas	5/12/2025	2,00				2,00	
	Realce	Cl 30 AB CR 89 DA 54	16	Violetas	9/12/2025	1,00				1,00	
											3,00

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	12,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	15,00
TOTAL POR EJECUTAR	35,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

												HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION			21/11/2025			VALOR	$	39.403.924.837	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.														
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025				HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	3.1.3	DESCRIPCION	Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante.	FORMULA:				UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	16				

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°16									
CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	3/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	4/12/2025	1,00				1,00	
CL 37 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo socorro	5/12/2025	2,00				2,00	
									4,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoria

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	4,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	59,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	63,00
TOTAL POR EJECUTAR	287,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025		ACTA N°		6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	4.1.1	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	20

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 53 CR 47 Y CR 49	8	Sucre	3/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 53 CR 47 Y CR 49	8	Sucre	3/12/2025	1,00	1,20		1,20	1,20	
CL 53 CR 46 Y CR 47	8	Sucre	3/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 53 CR 46 Y CR 47	8	Sucre	3/12/2025	2,00	2,20		4,40	4,40	
CR 47 CL 50 Y CL 52	8	Sucre	3/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 47 CL 50 Y CL 52	8	Sucre	3/12/2025	1,00	1,62		1,62		
CL 5 SUR CR 35 CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	1,00	1,50		1,50	1,50	
CL 5 SUR CR 35 CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 5 SUR CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	2,00	2,10		4,20	4,20	
CL 5 SUR CR 37 CR 38	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
									22,90

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	22,90
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	22,90
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	212,23
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	235,13
TOTAL POR EJECUTAR	8374,87

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025	ACTA N°	6				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	4.1.2	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	20		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	10	Prado	5/12/2025	4,00	1,20		4,80	4,80	
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	10	Prado	5/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 45A CR 55 Y 57	10	GUAYAQUIL	9/12/2025	3,00	1,50		4,50	4,50	
CL 58 -# 31-06	8	ENCISO	9/12/2025	1,00	10,40		10,40	10,40	
CL 58 -# 31-06	8	ENCISO	9/12/2025	1,00	1,20		1,20	1,20	
CR 31 CL 58	8	ENCISO	9/12/2025	1,00	2,10		2,10	2,10	
									25,20

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	25,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	25,20
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	781,54
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	806,74
TOTAL POR EJECUTAR	7803,26

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025		ACTA N°		6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	4.1.3	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frio con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	20

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 53 CR 47 Y CR 49	8	Sucre	3/12/2025	13,00				13,00	
CL 53 CR 46 Y CR 47	8	Sucre	3/12/2025	36,94				36,94	
CR 47 CL 50 Y CL 52	8	Sucre	3/12/2025	15,00				15,00	
CR 47 CL 50 Y CL 52	8	Sucre	3/12/2025	10,50				10,50	
CL 5 SUR CR 35 CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	70,22				70,22	
CL 5 SUR CR 35 CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	15,00				15,00	
CL 5 SUR CR 35 CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	52,21				52,21	
CL 5 SUR CR 35 CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	77,61				77,61	
CL 5 SUR CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	10,45				10,45	
CL 5 SUR CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	16,51				16,51	
CL 5 SUR CR 37 CR 38	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	41,27				41,27	
									358,71

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	358,71
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	358,71
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	439,65
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	798,36
TOTAL POR EJECUTAR	11501,64

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025		ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	4.1.4	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	20

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	10	Prado	5/12/2025	85,54				85,54	
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	10	Prado	5/12/2025	45,34				45,34	
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	8	AV.ORIENTAL	9/12/2025	7,34				7,34	
CL 45A CR 55 Y 57	10	GUAYAQUIL	9/12/2025	33,70				33,70	
CR 31 CL 58	8	ENCISO	9/12/2025	6,52				6,52	
									178,44

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	178,44
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	178,44
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	7576,90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7755,34
TOTAL POR EJECUTAR	4544,66

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025	ACTA Nº	6				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	4.1.5	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	20

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA Nº20									
CL 53 CR 47 Y CR 49	8	Sucre	3/12/2025	32,31				32,31	
CL 53 CR 47 Y CR 49	8	Sucre	3/12/2025	5,70				5,70	
CL 53 CR 46 Y CR 47	8	Sucre	3/12/2025	6,42				6,42	
CL 53 CR 46 Y CR 47	8	Sucre	3/12/2025	45,21				45,21	
CL 53 CR 47	8	Sucre	3/12/2025	28,42				28,42	
CR 47 CL 50 Y CL 52	8	Sucre	3/12/2025	47,80				47,80	
CR 47 CL 50 Y CL 52	8	Sucre	3/12/2025	9,60				9,60	
CR 47 CL 50 Y CL 52	8	Sucre	3/12/2025	52,80				52,80	
CL 5 SUR CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	5,06				5,06	
CL 5 SUR CR 37	14	LOMA LOS GONZALES	10/12/2025	5,00				5,00	
									238,32

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoria

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	238,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	238,32
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	670,72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	809,04
TOTAL POR EJECUTAR	8184,96

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025			VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025			ACTA N°		6	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:				Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	4.1.6	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	FORMULA:				UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA		20	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	10	Prado	5/12/2025	136,13				136,13	
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	10	Prado	5/12/2025	13,10				13,10	
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	10	Prado	5/12/2025	64,00				64,00	
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	8	AV.ORIENTAL	9/12/2025	17,74				17,74	
CL 58 ENTRE 48 Y 50 OCC-ORI	8	AV.ORIENTAL	9/12/2025	18,20				18,20	
CL 45A CR 55 Y 57	10	GUAYAQUIL	9/12/2025	49,20				49,20	
CL 45A CR 55 Y 57	10	GUAYAQUIL	9/12/2025	10,25				10,25	
CR 31 CL 58	8	ENCISO	9/12/2025	6,03				6,03	
									314,65

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	314,65
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	314,65
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3141,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3456,11
TOTAL POR EJECUTAR	5537,89

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$ 39.403.924.837		
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025			HASTA	10/12/2025			ACTA N°	6
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	O.E.01	DESCRIPCION	Realce de cámara D:1.0m. Con mortero de reparación SikaQuick 2500. Incluye suministro, transporte y colocación de mortero cementoso, aro y tapa. Según diseño y especificación de E.P.M. Norma nueva. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su respectivo ítem.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	12

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°12									
CR 43A CL 7 CL 7D	14	La florida	25/11/2025	2,00				2,00	
CR 43A CL 7 CL 7D	14	La florida	26/11/2025	2,00				2,00	
CR 43A CL 7D CL 8	14	El Poblado	27/11/2025	3,00				3,00	
CR 43A CL 7D CL 8	14	El Poblado	28/11/2025	1,00				1,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
									8,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	8,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	8,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8,00
TOTAL POR EJECUTAR	112,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025			VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025			ACTA N°		6	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona					
ITEM	O.E.02	DESCRIPCION	Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Con mortero de reparación SikaQuick 2500, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente.	FORMULA:			UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	12			

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°12									
CR 43A CL 7 CL 7D	14	La Florida	13/11/2025	1,00				1,00	
CR 43A CL 7 CL 7D	14	La Florida	14/11/2025	2,00				2,00	
CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	14	Santa María de los Angeles	14/11/2025	2,00				2,00	
CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	14	Santa María de los Angeles	18/11/2025	4,00				4,00	
CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	14	Santa María de los Angeles	18/11/2025	4,00				4,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
									13,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	13,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	13,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	13,00
TOTAL POR EJECUTAR	27,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025	ACTA N°		6	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	O.E.02	DESCRIPCION	Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Con mortero de reparación SikaQuick 2500, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	12

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°12									
CR 43A CL 7 CL 7D	14	La Florida	13/11/2025	1,00				1,00	
CR 43A CL 7 CL 7D	14	La Florida	14/11/2025	2,00				2,00	
CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	14	Santa Maria de los Angeles	14/11/2025	2,00				2,00	
CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	14	Santa Maria de los Angeles	18/11/2025	4,00				4,00	
CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	14	Santa Maria de los Angeles	18/11/2025	4,00				4,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
									13,00

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	13,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	13,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	13,00
TOTAL POR EJECUTAR	27,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$ 39.403.924.837		
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/12/2025	HASTA	10/12/2025	ACTA Nº	6				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	O.E.03	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de señalización vertical tipo SP - Preventivas y/o SR - Reglamentariade 0,60 x 0,60 m, según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes. Incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes.. Incluye el transporte e instalación de estructura tipo pedestal (Profundidad 0.8m. Y D=0.3m.) en tuberia de 2".	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	9

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°9									
CL 76 CR 80-431	7	Villa Flora	8/09/2025	6,00				6,00	
CL 113 CR 75-10	5	Florencia	9/09/2025	3,00				3,00	
								0,00	
								0,00	
									9,00

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	9,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	9,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	9,00
TOTAL POR EJECUTAR	51,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025	ACTA N°		6	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	O.E.04	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalacion de hito delineador vial flexible naranja (tubo señalizacion) tg tornillos compuesto retrorreflectivo flexible tipo III de 0,20 m de ancho x 0,75 m de altura.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	1

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°1									
CR 128 CL 63	60	Cabecera Urbana San Cristóbal	29/08/2025	12,00				12,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
									12,00

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	12,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	12,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	12,00
TOTAL POR EJECUTAR	18,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	VALOR	$		39.403.924.837
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/12/2025		HASTA	10/12/2025	ACTA N°		6	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	O.E.07	DESCRIPCION	Suministro, transporte y Riego de emulsión asfáltica.	FORMULA:	UNIDAD	gal	FRENTE DE OBRA	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
				250,00				250,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
									250,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	250,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	250,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	250,00
TOTAL POR EJECUTAR	500,00

Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.	
Fecha de realizacion del presupuesto	26/02/2024
Plazo en meses de la Obra	4
Numero de Frentes simultáneos	21(16 comunas-5 corregimientos)

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL					ACTA No. 5		ACTA DE MODIFICACIÓN N°3 BALANCE +/-			ACTA No. 6		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	01-nov.-25	30-nov.-25	BALANCE +/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS		01-dic.-25	31-dic.-25				
GESTIÓN AMBIENTAL					CANT	V/TOTAL	CANT	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
Manejo de residuos sólidos															
Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y especiales)	Juego	30,00	$ 177.257,00	$ 5.317.710		$ 0		32,00	$ 5.672.224		$ 0	32,00	$ 5.672.224	0,00	$ 0
Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Tres recipientes: no aprovechables, aprovechables y orgánicos aprovechables) *	Juego		$ 569.254,00	$ 0		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 703,00	$ 1.546.600		$ 0		2300,00	$ 1.616.900		$ 0	2.300,00	$ 1.616.900	0,00	$ 0
Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 717,00	$ 1.577.400		$ 0		2300,00	$ 1.649.100		$ 0	2.300,00	$ 1.649.100	0,00	$ 0
Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 646,00	$ 1.421.200		$ 0		2300,00	$ 1.485.800		$ 0	2.300,00	$ 1.485.800	0,00	$ 0
Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	1500,00	$ 1.091,00	$ 1.636.500		$ 0		1500,00	$ 1.636.500		$ 0	1.500,00	$ 1.636.500	0,00	$ 0
Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	kg	2100,00	$ 5.302,00	$ 11.134.200	450,00	$ 2.385.900		822,00	$ 4.358.244		$ 0	821,72	$ 4.356.759	0,28	$ 1.485
Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	21,00	$ 52.141,00	$ 1.094.961	0,00	$ 0		5,00	$ 260.705		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 260.705
Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	30,00	$ 63.810,00	$ 1.914.300		$ 0		30,00	$ 1.914.300		$ 0	30,00	$ 1.914.300	0,00	$ 0
Bascula colgante industrial digital capacidad maxima 300 Kg *	un	21,00	$ 88.537,00	$ 1.859.277		$ 0		2,00	$ 177.074		$ 0	2,00	$ 177.074	0,00	$ 0
Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios *	Global	63,00	$ 12.624,00	$ 795.312		$ 0		76,00	$ 959.424		$ 0	76,00	$ 959.424	0,00	$ 0
Subtotal Manejo de residuos sólidos				$ 28.297.460		$ 2.385.900			$ 19.730.271		$ 0		$ 19.468.081		$ 262.190
Maquinaria, vehículos y equipo en obra															
Lona banner, 13 onzas para vehiculo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con doblez repisado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, Impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	58,00	$ 36.820,00	$ 2.135.560		$ 0		128,00	$ 4.712.960		$ 0	98,00	$ 3.608.360	30,00	$ 1.104.600
Desplazamiento de áreas transversales para recorridos a frentes de obra.	un		$ 13.000.000,00	$ 0	1,00	$ 13.000.000		4,00	$ 52.000.000			4,00	$ 52.000.000	0,00	$ 0
Subtotal Maquinaria, vehículos y equipo en obra				$ 2.135.560		$ 13.000.000			$ 56.712.960		$ 0		$ 55.608.360		$ 1.104.600
Manejo de sustancias químicas															
Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	21,00	$ 263.357,00	$ 5.530.497		$ 0		22,00	$ 5.793.854		$ 0	22,00	$ 5.793.854	0,00	$ 0
Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas *	un	21,00	$ 448.698,00	$ 9.426.858		$ 0		21,00	$ 9.426.858		$ 0	21,00	$ 9.426.858	0,00	$ 0
SEÑALIZACION UN 30X12. EN ADHESIVO REFLECTIVO Nota: UN 1203. El paquete esta conformado por 4 adhesivos	un		$ 14.875,00	$ 0		$ 0		270,00	$ 4.016.250		$ 0	189,00	$ 2.811.375	81,00	$ 1.204.875
SEÑALIZACION ROMBO. EN ADHESIVO REFLECTIVO: SUSTANCIAS VARIAS - 15 LÍQUIDO INFLAMABLE - 15 GAS INFLAMABLE. El paquete esta conformado por 3 adhesivo	un		$ 9.520,00	$ 0		$ 0		120,00	$ 1.142.400		$ 0	63,00	$ 599.760	57,00	$ 542.640
Subtotal Manejo de sustancias químicas				$ 14.957.355		$ 0			$ 20.379.362		$ 0		$ 18.631.847		$ 1.747.515
Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción															
Teleres 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	42,00	$ 21.040,00	$ 883.680		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	2100,00	$ 8.732,00	$ 18.337.200		$ 0		2150,00	$ 18.773.800		$ 0	2.150,00	$ 18.773.800	0,00	$ 0
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	200,00	$ 39.228,00	$ 7.845.600		$ 0		92,00	$ 3.608.976		$ 0	88,00	$ 3.452.064	4,00	$ 156.912
Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	un	150,00	$ 28.201,00	$ 4.230.150		$ 0		150,00	$ 4.230.150		$ 0	150,00	$ 4.230.150	0,00	$ 0
Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	63,00	$ 12.624,00	$ 795.312	6,00	$ 75.744	1	89,00	$ 1.123.536		$ 0	89,00	$ 1.123.536	0,00	$ 0
Subtotal Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción				$ 32.091.942		$ 75.744			$ 27.736.462		$ 0		$ 27.579.550		$ 156.912
Control de emisiones atmosféricas															
Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	1050,00	$ 9.927,00	$ 10.423.350		$ 0		200,00	$ 1.985.400		$ 0	200,00	$ 1.985.400	0,00	$ 0
Montaje medidor de agua (Incluye llave hidrante)	un	0,00	$ 1.300.000,00	$ 0		$ 0		21,00	$ 27.300.000		$ 0	21,00	$ 27.300.000	0,00	$ 0
Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico	un	2,00	$ 92.221,00	$ 184.442		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Protector auditivo de inserción - desechable (uso de la comunidad)	un	12000,00	$ 1.623,00	$ 19.476.000		$ 0		4000,00	$ 6.492.000		$ 0	4.000,00	$ 6.492.000	0,00	$ 0
Subtotal Control de emisiones atmosféricas				$ 30.083.792		$ 0			$ 35.777.400		$ 0		$ 35.777.400		$ 0
Protección del suelo															
Plastilona de 650 gr de 2 x2 para la protección del suelo durante el proceso de aplicación de mezcla asfáltica.	un	30,00	$ 80.478,00	$ 2.414.340		$ 0		44,00	$ 3.541.032		$ 0	44,00	$ 3.541.032	0,00	$ 0
Subtotal Protección del suelo				$ 2.414.340		$ 0			$ 3.541.032		$ 0		$ 3.541.032		$ 0
Manejo de campamento e instalaciones temporales															
Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	Global	63,00	$ 12.624,00	$ 795.312		$ 0		108,00	$ 1.338.144		$ 0	100,00	$ 1.262.400	6,00	$ 75.744
Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra *	un	370,00	$ 28.201,00	$ 10.434.370		$ 0		370,00	$ 10.434.370		$ 0	370,00	$ 10.434.370	0,00	$ 0
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	200,00	$ 39.228,00	$ 7.845.600	4,00	$ 156.912	4	54,00	$ 2.118.312		$ 0	54,00	$ 2.118.312	0,00	$ 0
Tela mixta y multisombra por 2 metro de ancho.	m	500,00	$ 1.679,00	$ 839.500		$ 0		100,00	$ 167.900		$ 0	100,00	$ 167.900	0,00	$ 0
Tela cerramiento color verde polipropileno de 2,10 m de ancho.	m	300,00	$ 3.679,00	$ 1.103.700		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Subtotal Manejo de campamento e instalaciones temporales				$ 21.018.482		$ 156.912			$ 14.058.726		$ 0		$ 13.982.982		$ 75.744
Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos															
Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	m	2100,00	$ 2.020,00	$ 4.242.000	100,00	$ 202.000		1000,00	$ 2.020.000		$ 0	1.000,00	$ 2.020.000	0,00	$ 0
Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona rural)	mes	25,00	$ 993.566,00	$ 24.839.150	1,50	$ 1.490.349		17,00	$ 16.890.622		$ 0	5,87	$ 5.828.921	11,13	$ 11.061.701
Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	99,00	$ 725.227,00	$ 71.797.473	31,00	$ 22.482.037	-2	117,00	$ 84.851.559		$ 0	77,53	$ 56.229.267	39,47	$ 28.622.292
Subtotal Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos				$ 100.878.623		$ 24.174.386			$ 103.762.181		$ 0		$ 64.078.187		$ 39.683.994
Gestión de la fauna y la flora															
Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	m	1000,00	$ 2.020,00	$ 2.020.000		$ 0		100,00	$ 202.000		$ 0	100,00	$ 202.000	0,00	$ 0
Estación en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	70,00	$ 10.457,00	$ 731.990		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Subtotal Gestión de la fauna y la flora				$ 2.751.990		$ 0			$ 202.000		$ 0		$ 202.000		$ 0
Plan de Manejo de Tránsito															
Señalización y Desvíos															
Señales informativa. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	42,00	$ 174.675,00	$ 7.336.350	0,00	$ 0		100,00	$ 17.467.500		$ 0	65,00	$ 11.353.875	35,00	$ 6.113.625
Señales reglamentarias. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	42,00	$ 173.348,00	$ 7.280.616	0,00	$ 0		120,00	$ 20.801.760		$ 0	63,00	$ 10.920.924	57,00	$ 9.880.836
Señales preventivas. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vias secundarias. 60x60 *	un	126,00	$ 174.675,00	$ 22.009.050	0,00	$ 0		252,00	$ 44.018.100		$ 0	128,00	$ 22.358.400	124,00	$ 21.659.700
Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	42,00	$ 42.080,00	$ 1.767.360	0,00	$ 0		103,00	$ 4.334.240		$ 0	45,00	$ 1.893.600	58,00	$ 2.440.640
Malefin (2,0 x 1,0 m) *	un	42,00	$ 289.274,00	$ 12.149.508	0,00	$ 0		84,00	$ 24.299.016		$ 0	48,00	$ 13.885.152	36,00	$ 10.413.864
Balizas (1,4 m) *	un	350,00	$ 28.201,00	$ 9.870.350	0,00	$ 0		500,00	$ 14.100.500		$ 0	350,00	$ 9.870.350	150,00	$ 4.230.150
Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	210,00	$ 54.922,00	$ 11.533.620	0,00	$ 0		270,00	$ 14.828.940		$ 0	210,00	$ 11.533.620	60,00	$ 3.295.320
Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	50,00	$ 213.041,00	$ 10.652.050	10,00	$ 2.130.410		60,00	$ 12.782.460		$ 0	60,00	$ 12.782.460	0,00	$ 0

Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.	
Fecha de realizacion del presupuesto	26/02/2024
Plazo en meses de la Obra	4
Numero de Frentes simultáneos	21(16 comunas-5 corregimientos)

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL					ACTA No. 5		ACTA DE MODIFICACIÓN N°3 BALANCE +/-			ACTA No. 6		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	01-nov.-25	30-nov.-25	BALANCE +/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS		01-dic.-25	31-dic.-25				
GESTIÓN AMBIENTAL					CANT	V/TOTAL	CANT	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	50,00	$ 39.228,00	$ 1.961.400		$ 0		50,00	$ 1.961.400		$ 0	50,00	$ 1.961.400	0,00	$ 0
Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	2100,00	$ 1.640,00	$ 3.864.000	2.100,00	$ 3.864.000		4200,00	$ 7.728.000		$ 0	4.200,00	$ 7.728.000	0,00	$ 0
Telares 1,35m x 0,90 m	un	84,00	$ 21.040,00	$ 1.767.360		$ 0		84,00	$ 1.767.360		$ 0	84,00	$ 1.767.360	0,00	$ 0
Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	42,00	$ 233.558,00	$ 9.809.436		$ 0		42,00	$ 9.809.436	$ 0	$ 0	42,00	$ 9.809.436	0,00	$ 0
Flasher	un		$ 63.152,07		62,00	$ 3.915.428		203,00	$ 12.819.870			62,00	$ 3.915.428	141,00	$ 8.904.442
Subtotal Señalización y Desvíos				$ 100.001.100		$ 9.909.838			$ 186.718.682		$ 0		$ 119.780.005		$ 66.938.677
Subprograma de seguridad y salud en el trabajo															
Extintor multiproposito 20 Lb (Incluye recarga en caso de necesitarse)*	un	21,00	$ 49.802,00	$ 1.045.842		$ 0		21,00	$ 1.045.842		$ 0	21,00	$ 1.045.842	0,00	$ 0
Silvato brigadista	un	21,00	$ 8.680,00	$ 182.280		$ 0		21,00	$ 182.280		$ 0	21,00	$ 182.280	0,00	$ 0
Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés *	un	21,00	$ 145.919,00	$ 3.064.299		$ 0		21,00	$ 3.064.299		$ 0	21,00	$ 3.064.299	0,00	$ 0
Botiquín primeros auxilios (en lona) TIPO A	un	21,00	$ 174.085,00	$ 3.655.785		$ 0		21,00	$ 3.655.785		$ 0	21,00	$ 3.655.785	0,00	$ 0
Subtotal Subprograma de seguridad y salud en el trabajo				$ 7.948.206		$ 0			$ 7.948.206		$ 0		$ 7.948.206		$ 0
Personal para brigada Ambiental y Apoyo de PMT															
Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental y Apoyo en la implementación del PMT	hr	24192,00	$ 9.486,00	$ 229.485.312	3.604,00	$ 34.187.544	-135,04	13607,80	$ 129.083.608		$ 0	11.552,93	$ 109.591.125	2.054,87	$ 19.492.483
Subtotal Personal para brigada Ambiental y Apoyo de PMT				$ 229.485.312		$ 34.187.544			$ 129.083.608		$ 0		$ 109.591.125		$ 19.492.483
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL				$ 572.064.162		$ 83.890.324			$ 605.650.780		$ 0		$ 476.188.776		$ 129.462.014
Programa de información y comunicación a la comunidad															
Impresión de volantes tamaño media carta 21,59cm x 14cm, tintas:4x0, material propalcote 115	un	3.000	$ 174	$ 522.000		$ 0		3000,00	$ 522.000		$ 0	3.000,00	$ 522.000	0,00	$ 0
Cartelera informativa (corcho con marco de madera y banner en adhesivo full color.) 120x80 (incluye diseño y producción).	un	35	$ 172.528	$ 6.038.480		$ 0		15,00	$ 2.587.920		$ 0	15,00	$ 2.587.920	0,00	$ 0
Buzón de sugerencias 24cm de Ancho 16cm de Alto por 15c de fondo, Material en Acrilico, Impresión Adhesivo en inkjet.	un	35	$ 126.461	$ 4.426.135		$ 0		15,00	$ 1.896.915		$ 0	15,00	$ 1.896.915	0,00	$ 0
Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) Incluye producción y diseño).unidades adicionales por reposición, robo, durabilidad	un	48	$ 413.667	$ 19.865.616		$ 0		48,00	$ 19.865.616		$ 0	48,00	$ 19.865.616	0,00	$ 0
Imantado para vehículos Foto Vinilo impreso a 720 Dpi 0,5x0,3 - (Según manual de obra).	un	42	$ 68.980	$ 2.897.160		$ 0		10,00	$ 689.600		$ 0	10,00	$ 689.600	0,00	$ 0
Subtotal Programa de información y comunicación a la comunidad				$ 33.749.391		$ 0			$ 25.662.251		$ 0		$ 25.662.251		$ 0
Programa de participación comunitaria															
Logistica reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ silleteria + auditorio para 20 personas)	un	21	$ 45.972	$ 965.412	1,00	$ 45.972		2,00	$ 91.944		$ 0	1,00	$ 45.972	1,00	$ 45.972
Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio, avance y finalización para 20 personas por reunion/ 42 reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes caracteristicas: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	420	$ 8.616	$ 3.618.720	60,00	$ 516.960		100,00	$ 861.600		$ 0	60,00	$ 516.960	40,00	$ 344.640
Logistica reuniones Comité Ciudadano de Obra (incluye video beam+ silleteria para 10 personas)	un	21	$ 45.972	$ 965.412		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Refrigerios para reuniones con CCO / 10 personas por CCO/ 21reuniones de CCO) Refrigerio básico empacado con las siguientes caracteristicas: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	210	$ 8.616	$ 1.809.360		$ 0		178,00	$ 1.533.648		$ 0	0,00	$ 0	178,00	$ 1.533.648
Subtotal Subtotal Programa de información y comunicación a la comunidad				$ 7.358.904		$ 562.932			$ 2.487.192		$ 0		$ 562.932		$ 1.924.260
Programa de formación y capacitación															
Logistica para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller, + video beam)	un	21	$ 150.000	$ 3.150.000	1,00	$ 150.000		1,00	$ 150.000		$ 0	1,00	$ 150.000	0,00	$ 0
Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 10 personas por taller/ 21 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes caracteristicas: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	210	$ 8.190	$ 1.719.900	44,00	$ 360.360		60,00	$ 491.400		$ 0	44,00	$ 360.360	16,00	$ 131.040
Subtotal Programa de formación y capacitación				$ 4.869.900		$ 510.360			$ 641.400		$ 0		$ 510.360		$ 131.040
Programa de Sostenibilidad y calidad de la obra															
Actividades de sostenibilidad y apropiación de obras /(logistica de la actividad asociada de acuerdo al objeto de contrato).	un	21	$ 420.000	$ 8.820.000	3,00	$ 1.260.000		4,00	$ 1.680.000		$ 0	3,00	$ 1.260.000	1,00	$ 420.000
Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 21 actividades /20 personas por actividad Refrigerio básico empacado con las siguientes caracteristicas: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	420	$ 8.616	$ 3.618.720	360,00	$ 3.101.760	298	538,00	$ 4.635.408		$ 0	538,00	$ 4.635.408	0,00	$ 0
Subtotal Programa de Sostenibilidad y calidad de la obra				$ 12.438.720		$ 4.361.760			$ 6.315.408		$ 0		$ 5.895.408		$ 420.000
Plan de divulgación (Plan de Manejo de Tránsito (PMT)															
Video institucional de un minuto de duración. Formato 1920x1080 pixeles full HD,incluye producción y edición	un	3	$ 1.578.000	$ 4.734.000		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Impresión de volantes. Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115**	un	12000	$ 131	$ 1.572.000		$ 0		0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Instalación de pasacalle con las siguientes características: Lona impresa full color Tamaño: 90 cms de alto x 9 mts de ancho con 5 palos, uno en cada lateral y 3 distribuidos en la longitud. Incluye: Producción, instalación y desinstalación.	un	20	$ 276.426	$ 5.528.520		$ 0		6,00	$ 1.658.556		$ 0	6,00	$ 1.658.556	0,00	$ 0
Subtotal Plan de divulgación (Plan de Manejo de Tránsito (PMT)				$ 11.834.520		$ 0			$ 1.658.556		$ 0		$ 1.658.556		$ 0
TOTAL GESTIÓN SOCIAL				$ 70.261.435		$ 6.435.052			$ 36.664.807		$ 0		$ 34.189.507		$ 2.475.300
TOTAL GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL				$ 642.315.597		$ 89.325.376			$ 642.315.597		$ 0		$ 510.378.283		$ 131.937.314

Natalia Calderón Vásquez
Directora de Obra Consorcio Vialmed 2025

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoria Consorcio Med Urbano
20005377

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	**GESTIÓN**			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	Daniela Restrepo		30	11	2025
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	Raquel Vanessa Vargas Builes - Jorge Luis Monsalve Montiel.	**CONTRATO OBRA No.**	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	**UNIDAD:** un	Manejo de residuos sólidos		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Del 1 al 30 de noviembre	20 frentes de obra	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	1500	$ 5.302	450	$ 2.385.900	
			TOTAL		**450,00**	**$ 2.385.900**	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: DANIELA RESTREPO
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: VANESSA VARGAS BUILES - JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	**GESTIÓN**		**DIA**	**MES**	**AÑO**
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**		30	11	2025
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	Daniela Restrepo					
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	Raquel Vanessa Vargas Builes - Jorge Luis Monsalve Montiel.	**CONTRATO OBRA No.**		4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Desplazamiento de áreas transversales para recorridos a frentes de obra.	**UNIDAD:**	un	Maquinaria, vehículos y equipo en obra		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Del 1 al 30 de noviembre	19 frentes de obra	Desplazamiento de áreas transversales para recorridos a frentes de obra.	4	$ 13.000.000	1,00	$ 13.000.000	
Observaciones:			**TOTAL**		**1,00**	**$ 13.000.000**	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: DANIELA RESTREPO
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: VANESSA VARGAS BUILES - JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	**GESTIÓN**			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	Daniela Restrepo		30	11	2025
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	Raquel Vanessa Vargas Builes - Jorge Luis Monsalve Montiel.	**CONTRATO OBRA No.**	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	**UNIDAD:** un	Manejo de campamento e instalaciones temporales		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Del 1 al 30 noviembre	20 frentes de obra	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	106	$ 12.624	6	$ 75.744	 
			TOTAL		**6,00**	**$ 75.744**	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: DANIELA RESTREPO
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: VANESSA VARGAS BUILES - JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	**GESTIÓN**			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	Daniela Restrepo		30	11	2025
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	Raquel Vanessa Vargas Builes - Jorge Luis Monsalve Montiel.	**CONTRATO OBRA No.**	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	**UNIDAD:** un	Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Del 1 al 30 noviembre	19 frentes de obra	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	50	$ 39.228	4	$ 156.912	
			TOTAL		**4,00**	**$ 156.912**	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: DANIELA RESTREPO
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL


FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: VANESSA VARGAS BUILES - JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación


OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	**GESTIÓN**			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	Daniela Restrepo		30	11	2025
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	Raquel Vanessa Vargas Builes - Jorge Luis Monsalve Montiel.	**CONTRATO OBRA No.**	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Alquiler de baño estandar con 3 limpieza por semana (Zona rural)	**UNIDAD:** un	Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos		

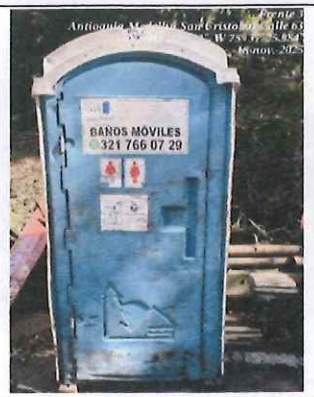FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Del 1 al 30 de noviembre	1 frente de obra.	Alquiler de baño estandar con 3 limpieza por semana (Zona rural)	15	$ 993.566	1,50	$ 1.490.349	
			TOTAL		**1,50**	**$ 1.490.349**	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: DANIELA RESTREPO
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: VANESSA VARGAS BUILES - JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

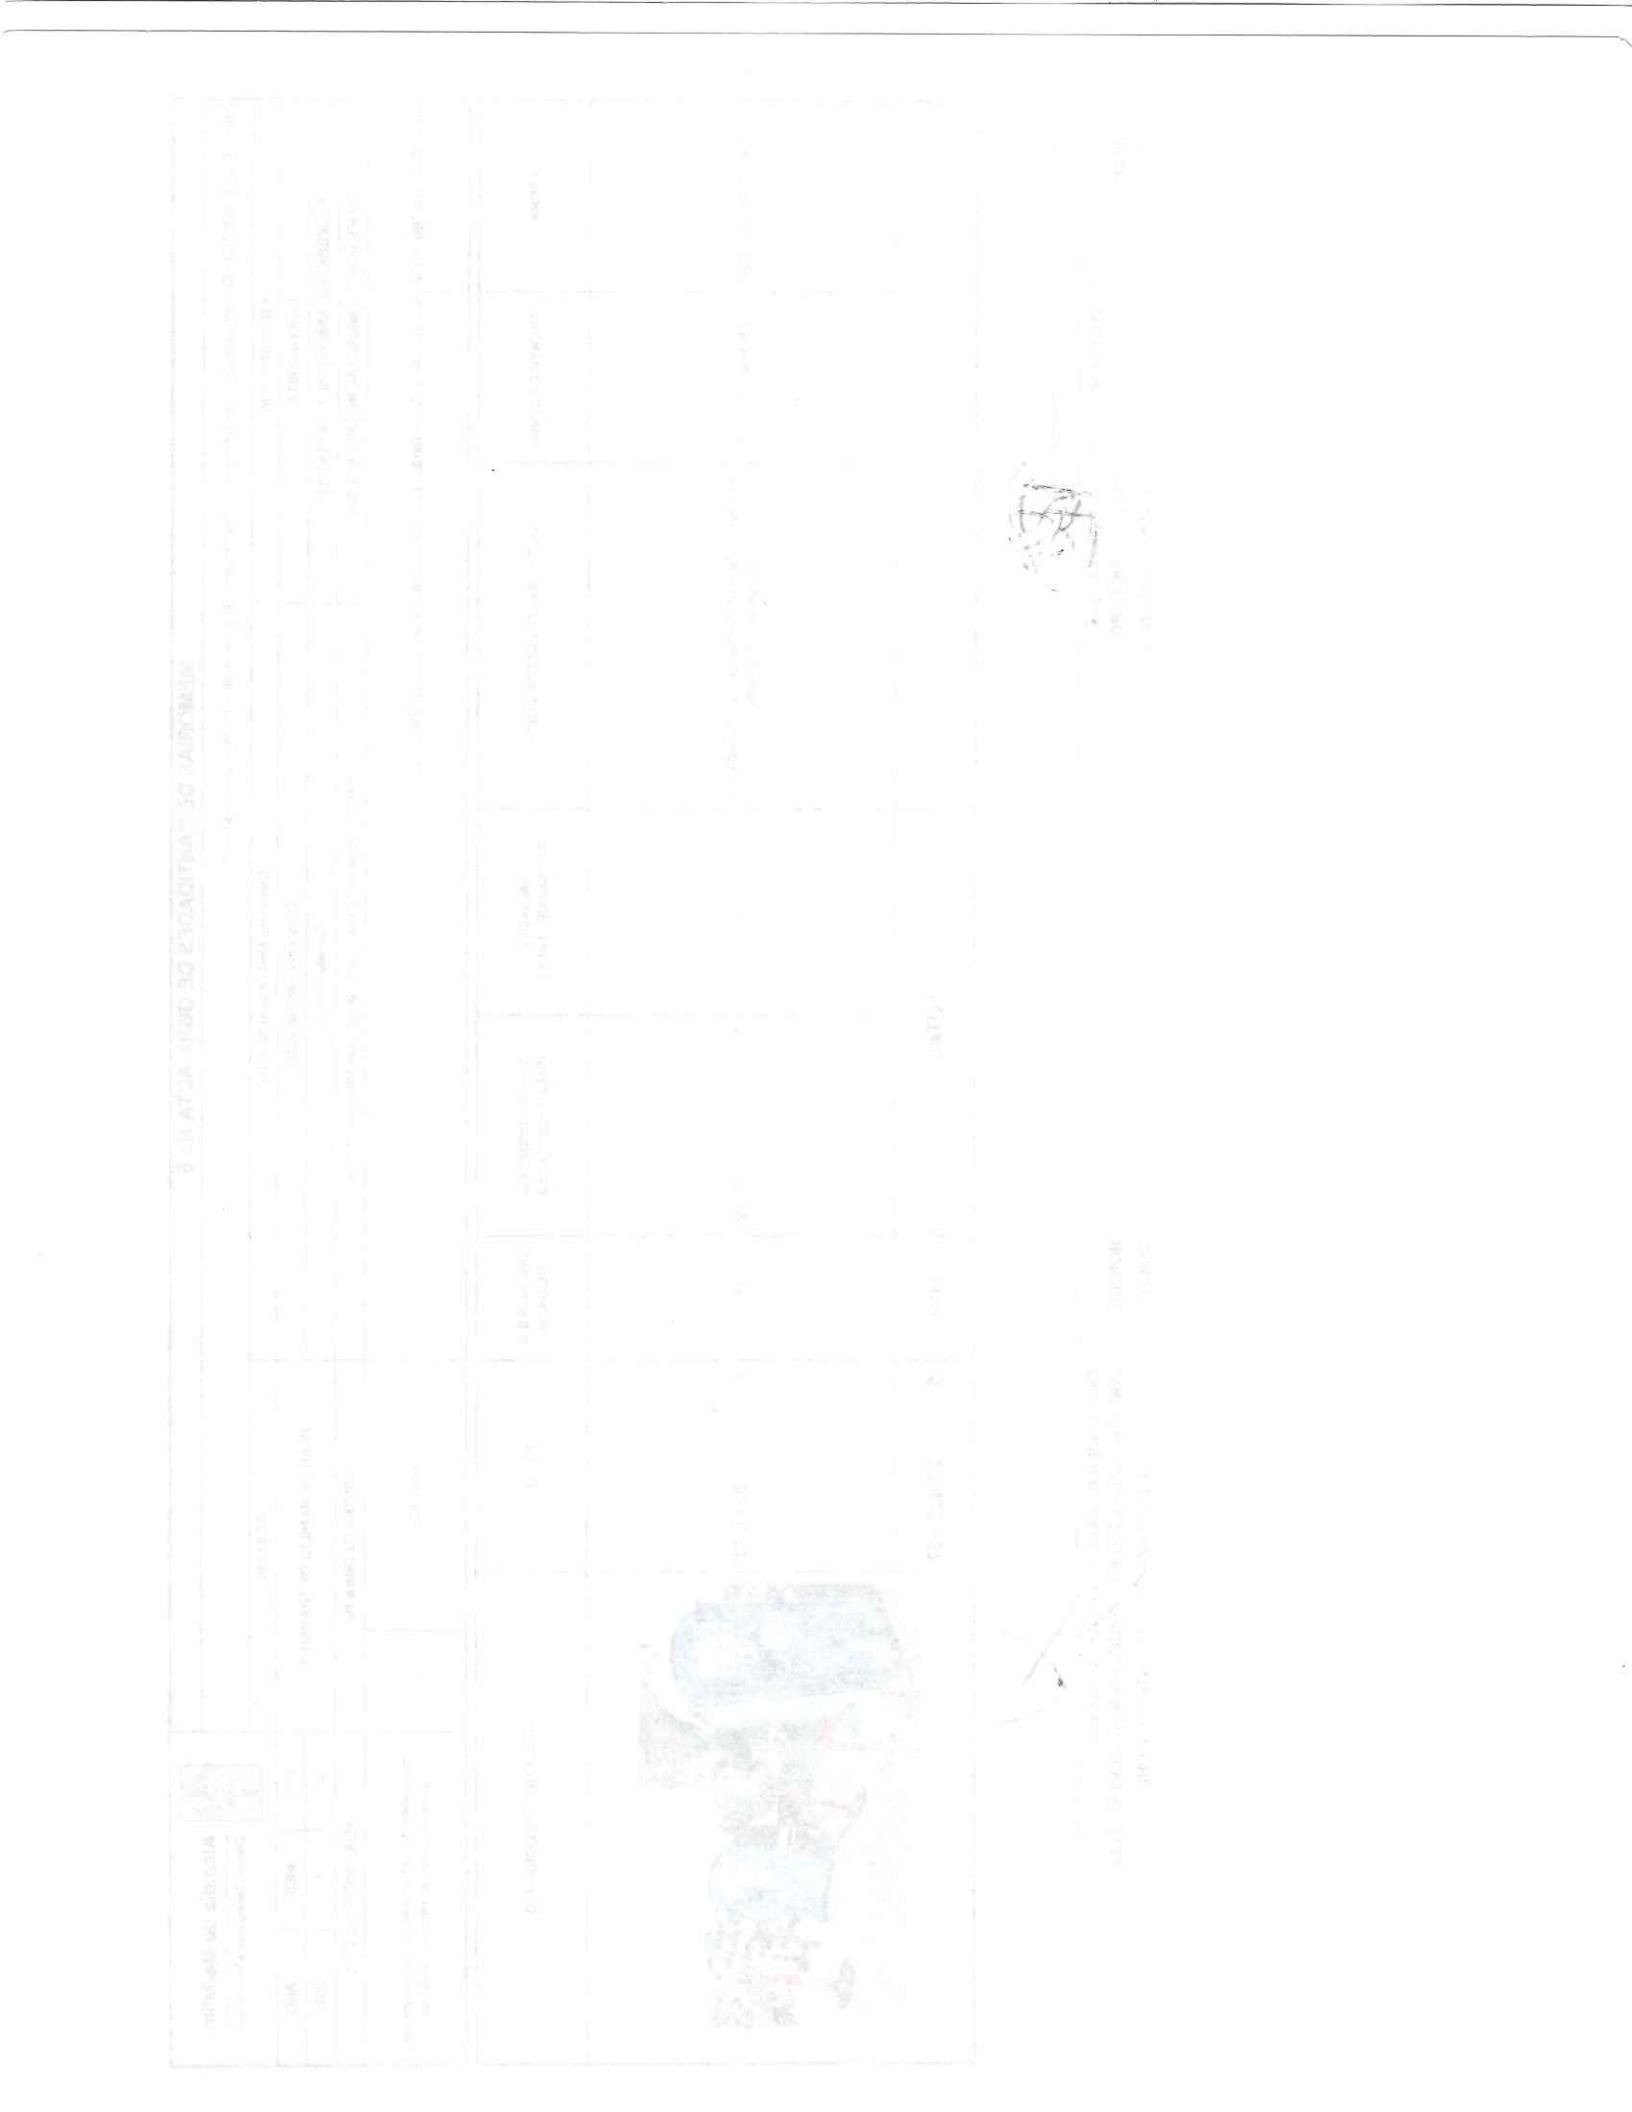

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	**GESTIÓN**			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	Daniela Restrepo		30	11	2025
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	Raquel Vanessa Vargas Builes - Jorge Luis Monsalve Montiel.	**CONTRATO OBRA No.**	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	**UNIDAD:** un	Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Del 1 al 30 de noviembre	20 frentes de obra	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	1000	$ 2.020	100	$ 202.000	
			TOTAL		**100,00**	**$ 202.000**	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: DANIELA RESTREPO
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: VANESSA VARGAS BUILES - JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	**GESTIÓN**			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	Daniela Restrepo		30	11	2025
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	Raquel Vanessa Vargas Builes - Jorge Luis Monsalve Montiel.	**CONTRATO OBRA No.**	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental y Apoyo en la implementación del PMT	**UNIDAD:** un	Personal para brigada Ambiental y Apoyo de PMT		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Del 1 al 30 de noviembre	Frente 1 al 20	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental		$ 9.486	0,0	$ -	
Del 1 al 30 de noviembre	Frente 1 al 20	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental y Apoyo en la implementación del PMT		$ 9.486	3604,0	$ 34.187.544	
Se hace el cobro del personal a Corte 24 de agosto de 2025. El personal de apoyo fue: 1045420278ENESTEBANA BELLO VELASQUEZ 1002488066YANETH ORTIZ MANJARRES 79681977HECTOR DE JESUS ARRIETA REDONDO 4925682GERALDO CHIRINOS 43553135RUTH MERY AGUIRRE LOPEZ 1020402479DIANA JIMENA GALVIS CAICEDO 1020439288NATALIA ANDREA JIMENEZ GUERRA 43553681PAOLA NOHEMI AGUIRRE LOPEZ 1017208034LEIDY JOHANA USUGA USUGA 42783825LEIDIANA PONCE 1128443316LEIDY VIVIANA ZAPATA VELEZ				**TOTAL**		$ -	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: DANIELA RESTREPO
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Sebastian Posada O.
CARGO: PROFESIONAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: VANESSA VARGAS BUILES - JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: YULANIS SIERRA
CARGO: PROFESIONAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO INTERVENTORÍA

HORARIO PERSONAL

N°1	OBRA	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
1	CONSORCIO VIALMED 2025	1.045.420.278	ENESTEBANA BELLO VELASQUEZ	AUXILIAR VIAL
2	CONSORCIO VIALMED 2025	1.002.488.066	YANETH ORTIZ MANJARRES	AUXILIAR VIAL
3	CONSORCIO VIALMED 2025	79.681.977	HECTOR DE JESUS ARRIETA REDONDO	AUXILIAR VIAL
4	CONSORCIO VIALMED 2025	4.925.682	GERALDO CHIRINOS	AUXILIAR VIAL
5	CONSORCIO VIALMED 2025	43.553.135	RUTH MERY AGUIRRE LOPEZ	AUXILIAR VIAL
6	CONSORCIO VIALMED 2025	1.020.402.479	DIANA JIMENA GALVIS CAICEDO	AUXILIAR VIAL
7	CONSORCIO VIALMED 2025	43.553.681	PAOLA NOHEMI AGUIRRE LOPEZ	AUXILIAR VIAL
8	CONSORCIO VIALMED 2025	1.017.208.034	LEIDY JOHANA USUGA USUGA	AUXILIAR VIAL
9	CONSORCIO VIALMED 2025	42.783.825	LEIDIANA PONCE	AUXILIAR VIAL
10	CONSORCIO VIALMED 2025	1.128.443.316	LEIDY VIVIANA ZAPATA VELEZ	AUXILIAR VIAL
11	CONSORCIO VIALMED 2025	1,001,610,190	MARICELLY RINCON	AUXILIAR VIAL
12	CONSORCIO VIALMED 2025	21.590.352	ANA AGUIRRE	AUXILIAR VIAL
13	CONSORCIO VIALMED 2025	43.588.827	LUZ ANDREA VILLAMIL	AUXILIAR VIAL
14	CONSORCIO VIALMED 2025	1.077.439.947	ANGELA BEATRIZ GONZALES	AUXILIAR VIAL
15	CONSORCIO VIALMED 2025	1.013.460.771	JULIANA ANDREA DIAS ASPRILLA	AUXILIAR VIAL
16	CONSORCIO VIALMED 2025	1.000.085.608	ANLLELY CONTRERAS	AUXILIAR VIAL
17	CONSORCIO VIALMED 2025	1.042.092.241	DEISI YURANI HENAO	AUXILIAR VIAL
18	CONSORCIO VIALMED 2025	1.035.869.424	MARIA JOHANA SANABRIA	AUXILIAR VIAL
19	CONSORCIO VIALMED 2025	1.023.625.267	VALERIA CALDERON	AUXILIAR VIAL
20	CONSORCIO VIALMED 2025	1.001.738.349	LAURA MELISA HERNANDEZ	AUXILIAR VIAL
21	CONSORCIO VIALMED 2025	1.000.884.469	YEIDI ESTEFANI VELEZ	AUXILIAR VIAL
22	CONSORCIO VIALMED 2025	1.000.884.469	JOHAN ANDRES SANCHES 7 DE OCTUBRE	AUXILIAR VIAL
23	CONSORCIO VIALMED 2025	1.000.884.469	JONATAN HERNANDEZ	AUXILIAR VIAL

1/10/2025	31,00
2/10/2025	-
3/10/2025	-
4/10/2025	187,00
5/10/2025	148,50
6/10/2025	158,50
7/10/2025	160,50
8/10/2025	136,50
9/10/2025	12,00
10/10/2025	169,50
11/10/2025	171,00
12/10/2025	172,00
13/10/2025	188,00
14/10/2025	178,50
15/10/2025	71,50
16/10/2025	64,75
17/10/2025	23,00
18/10/2025	194,00
19/10/2025	169,00
20/10/2025	169,50
21/10/2025	166,50
22/10/2025	34,00
23/10/2025	-
24/10/2025	176,00
25/10/2025	173,00
26/10/2025	179,25
27/10/2025	174,50
28/10/2025	177,00
29/10/2025	119,00
30/10/2025	-
	3.604,00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	GESTIÓN			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	DIA	MES	AÑO
PROFESIONAL PMT CONTRATISTA	Sebastian Posada García		30	11	2025
PROFESIONAL PMT INTERVENTORIA	Yulanis Mariet Sierra Bolaño	CONTRATO OBRA No.	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 1,50m de ancho *	UNIDAD:	un	BARRICADAS	

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1 al 31 agosto de 2025	Frente 1 al 6	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 1,50m de ancho *	50	$ 213.041	10	$ 2.130.410	 
			TOTAL		10,00	$ 2.130.410	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Sebastián Posada García
CARGO: Profesional PMT

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: Yulanis Mariet Sierra Bolaño
CARGO: Profesional PMT

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	GESTIÓN			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	DIA	MES	AÑO
PROFESIONAL PMT CONTRATISTA	Sebastian Posada García		30	11	2025
PROFESIONAL PMT INTERVENTORIA	Yulanis Mariet Sierra Bolaño	CONTRATO OBRA No.	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	UNIDAD:	m	MALLA	

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1 al 31 agosto de 2025	Frente 1 al 18	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	2100	$ 1.840	2.100	$ 3.864.000	
			TOTAL		2100,00	$ 3.864.000	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Sebastián Posada García
CARGO: Profesional PMT

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: Yulanis Mariet Sierra Bolaño
CARGO: Profesional PMT

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	GESTIÓN			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	DIA	MES	AÑO
PROFESIONAL PMT CONTRATISTA	Sebastian Posada García		30	11	2025
PROFESIONAL PMT INTERVENTORIA	Yulanis Mariet Sierra Bolaño	CONTRATO OBRA No.	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Flasher luminoso grande	UNIDAD: un	FLASHER		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1 al 30 de noviembre de 2025	Frente 1 al 21	Flasher luminoso grande		$ 63.152	62	$ 3.915.428	
			TOTAL		62,00	$ 3.915.428	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA

NOMBRE: Sebastián Posada García

CARGO: Profesional PMT

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE: Yulanis Mariet Sierra Bolaño

CARGO: Profesional PMT

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	GESTIÓN			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	AREA SOCIAL	DIA	MES	AÑO
PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	Asney Garcia-Jazmín Rodríguez		30	11	2025
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	Luisa Fernanda Restrepo-María Catalina Martínez Romero	CONTRATO OBRA No.	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Programa de participación comunitaria	UNIDAD:	un		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
13/11/2025	Sector Santo Domingo	Logística reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ silletería + auditorio para 20 personas)	21	$ 45.972	1	$ 45.972	 
13/11/2025	Sector Santo Domingo	Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio, avance y finalización para 20 personas por reunion/ 42 reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no	420	$ 8.616	60,00	$ 516.960	
			TOTAL			$ 562.932	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Asney García-Jazmín Rodríguez
CARGO: Profesional Social

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Restrepo-María Catalina Martínez
CARGO: Profesional Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	GESTIÓN			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	AREA SOCIAL	DIA	MES	AÑO
PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	Asney García-Jazmín Rodríguez		30	11	2025
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	Luisa Fernanda Restrepo-María Catalina Martínez Romero	CONTRATO OBRA No.	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Programa de formación y capacitación	UNIDAD:	un		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
noviembre 26 2025	sector enciso	Logística para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller, + video beam)	21	$ 150.000	1	$ 150.000	
noviembre 26 2025	sector enciso	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 10 personas por taller/ 21 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	210	$ 8.190	44,00	$ 360.360	
			TOTAL			$ 510.360	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Asney García-Jazmín Rodríguez
CARGO: Profesional Social

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Restrepo-María Catalina Martínez
CARGO: Profesional Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

INTERVENTORIA	Consorcio Med Urbano 20005377	GESTIÓN			
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	AREA SOCIAL	DIA	MES	AÑO
PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	Asney Garcia-Jazmín Rodríguez		30	11	2025
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	Luisa Fernanda Restrepo-María Catalina Martínez Romero	CONTRATO OBRA No.	4600105052 del 2025		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Programa de Sostenibilidad y calidad de la obra	UNIDAD:	un		

FECHA	FRENTE DE OBRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	UNIDADES PRESUPUESTALES	VALOR UNIDADES PRESUPUESTALES	UNIDADES A COBRAR	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
noviembre 26 2025	Sectores: Colinita-Enciso	Actividades de sostenibilidad y apropiación de obras /(logística de la actividad asociada de acuerdo al objeto de contrato).	21	$ 420.000	2	$ 840.000	
noviembre 26 2025		Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 21 actividades /20 personas por actividad Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawalano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	420	$ 8.616	240,00	$ 2.067.840	
25/10/2025	Sector Las Violetas	Actividades de sostenibilidad y apropiación de obras /(logística de la actividad asociada de acuerdo al objeto de contrato).	21	$ 420.000	1	$ 420.000	
25/10/2025		Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 21 actividades /20 personas por actividad Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawalano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	21	$ 8.616	124	$ 1.068.384	
			TOTAL			$ 4.396.224	

FIRMA LIDER DE AREA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Asney García-Jazmín Rodríguez
CARGO: Profesional Social

FIRMA LIDER DE AREA DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Restrepo-María Catalina Martínez
CARGO: Profesional Social
