COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026		VALOR	$	49.254.808.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025		ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	1.1.1	DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos.	FORMULA:	UNIDAD	dia	FRENTE DE OBRA	16,23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACION				DIMENSIONES					
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°16									
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	15/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	1,00				1,00	
CL 29 INIPUE CR 52 FINPUE CR 52	14	Barrio Colombia	17/12/2025	1,00				1,00	
CL 30 CR 43A+57 CR 43A+117	14	Barrio Colombia	18/12/2025	1,00				1,00	
									6,00
FRENTE DE OBRA N°23									
CR 53 CL 71 Y CL 75	4	Sevilla	15/12/2025	1,00				1,00	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	16/12/2025	1,00				1,00	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	17/12/2025	1,00				1,00	
CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	19/12/2025	1,00				1,00	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	22/12/2025	1,00				1,00	
									5,00


ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Baldamaga Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	11,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	11,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	44,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	55,00
TOTAL POR EJECUTAR	17,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA		31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	1.2.1.1	DESCRIPCION	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno		FORMULA:					UNIDAD		FRENTE DE OBRA	2

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

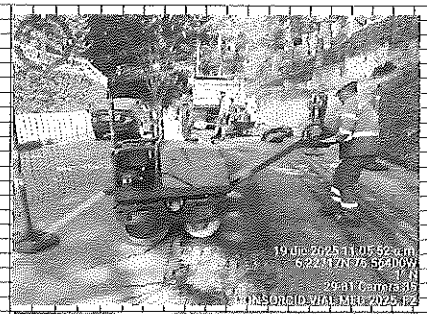



	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRG)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
		FRENTE DE OBRA N°2									
1	165195	CR 43A CL 31	10	Perpetuo Socorro	11/12/2025	2,60	1,70	0,14	0,62	1,49	
2	165196	CR 43A CL 30 - 91	10	Perpetuo Socorro	11/12/2025	0,75	0,55	0,08	0,03	0,08	
3	165197	CR 43A CL 30	10	Perpetuo Socorro	11/12/2025	1,40	1,95	0,13	0,35	0,85	
4A	165198	CR 43A CL 30 +30M	10	Perpetuo Socorro	11/12/2025	1,73	1,30	0,12	0,27	0,65	
4B		CR 43A CL 30 +30M	10	Perpetuo Socorro	11/12/2025	2,15	2,85	0,12	0,74	1,76	
1	165263	CR 30 CL 1A SUR - 30 +14M	14	Los Naranjos	12/12/2025	1,30	0,95	0,14	0,17	0,41	
2	165264	CR 30 CL 1A SUR - 30 +15M	14	Los Naranjos	12/12/2025	2,70	0,95	0,14	0,36	0,88	
3	165265	CL 1B SUR CR 30 - 41	14	Los Naranjos	12/12/2025	1,70	2,25	0,15	0,57	1,39	
4A	165266	CL 1B SUR CR 30 - 59	14	Los Naranjos	12/12/2025	3,00	1,85	0,10	0,56	1,33	
4B		CL 1B SUR CR 30 - 58	14	Los Naranjos	12/12/2025	2,85	1,25	0,10	0,36	0,86	
1	165306	CL 11A CR 31A - 44	14	Las Lomas No.1	15/12/2025	1,20	2,25	0,16	0,43	1,04	
2	165307	CL 11A CR 31A - 3	14	Las Lomas No.1	15/12/2025	4,10	0,90	0,15	0,55	1,33	
3	184312	CL 11A CR 31A - 4	14	Las Lomas No.1	15/12/2025	10,50	0,88	0,05	0,55	1,33	
4	165309	CR 27 CL 20SUR - 121	14	San Lucas	15/12/2025	2,60	1,85	0,13	0,48	1,15	
1	162614	CL 11 CR 30A-199	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	1,77	1,42	0,16	0,40	0,97	
2	163217	CL 11 CR 30A-107	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	2,68	1,22	0,21	0,69	1,65	
3	165341	CL 11 CR 30A - 118	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	0,68	1,67	0,05	0,06	0,14	
4	165340	CR 31A CL 11-15	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	1,42	1,04	0,19	0,28	0,67	
5	141102	CR 31A CL 11-27	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	1,95	3,46	0,06	0,41	0,98	
6	165342	CL 11 CR 30A - 110	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	0,48	0,46	0,05	0,01	0,03	
7	164957	CR 30 CL 10C-134	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	0,67	1,42	0,19	0,18	0,43	
1	158561	CR 37A CL 29 - 66	9	La Asomadera No.1	17/12/2025	2,20	1,70	0,10	0,37	0,90	
2A	165160	CR 37A CL 29 - 57	9	La Asomadera No.1	17/12/2025	1,60	1,65	0,10	0,26	0,63	
2B		CR 37A CL 29 - 57	9	La Asomadera No.1	17/12/2025	4,35	0,97	0,10	0,42	1,01	
3A	158557	CR 37A CL 29 - 49	9	La Asomadera No.1	17/12/2025	4,60	1,02	0,12	0,56	1,35	
3B		CR 37A CL 29 - 49	9	La Asomadera No.1	17/12/2025	1,80	1,71	0,12	0,37	0,89	
4	165378	CR 37A CL 29 - 60	9	La Asomadera No.1	17/12/2025	0,40	1,45	0,03	0,02	0,04	
1	165388	CR 43B CL 7 Sur - 24	14	La Aguacatala	18/12/2025	2,64	1,72	0,17	0,76	1,83	
2	165429	CR 43B CL 7 Sur - 6	14	La Aguacatala	18/12/2025	3,16	1,35	0,14	0,60	1,43	
3	184933	CR 43B CL 6 Sur - 26	14	La Aguacatala	18/12/2025	2,62	1,67	0,15	0,66	1,58	
1	158558	CR 37A CL 29 - 26	9	La Asomadera No.1	19/12/2025	2,15	0,70	0,17	0,26	0,61	
2	156466	CR 37A CL 29 - 30	9	La Asomadera No.1	19/12/2025	2,95	0,93	0,12	0,33	0,79	
3	165449	CR 37A CL 29 - 35	9	La Asomadera No.1	19/12/2025	1,10	1,40	0,19	0,29	0,70	
4	165450	CR 37A CL 29- 40	9	La Asomadera No.1	19/12/2025	3,90	1,15	0,19	0,85	2,05	
5	165451	CR 37A CL 29 - 72	9	La Asomadera No.1	19/12/2025	3,34	0,70	0,12	0,28	0,67	
1	165498	CL 29 CR 33-9	9	La Asomadera No.1	23/12/2025	1,90	1,12	0,20	0,43	1,02	
2	165499	CL 29 CR 33-7	9	La Asomadera No.1	23/12/2025	2,20	0,90	0,19	0,38	0,90	
3	165526	CR 33 CL 27A-24	9	La Asomadera No.1	23/12/2025	1,75	1,63	0,20	0,57	1,37	
4	165627	CR 33 CL 27A-22	9	La Asomadera No.1	23/12/2025	2,94	1,05	0,23	0,71	1,70	
5	157166	CR 33 CL 27A-91	9	La Asomadera No.1	23/12/2025	0,40	0,20	0,03	0,00	0,01	
											38,87

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ocuba Alzate
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Cabezón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	38,87
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	38,87
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	550,37
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	589,24
TOTAL POR EJECUTAR	14,98

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	HOJA N°		DE	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.							VALOR	$	49.254.906.046	
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:			UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,4,6,7,8,9,11,14	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Bache/ Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°2											
1	165486	CL 51 CR 45-57	10	La Candelaria	22/12/2025	3,40	1,00	0,04	0,14	0,33	
2	165091	CL 51 CR 45-59	10	La Candelaria	22/12/2025	1,20	0,60	0,05	0,05	0,12	
3	165490	CL 51 CR 45-61	10	La Candelaria	22/12/2025	1,50	1,00	0,05	0,08	0,18	
4	164384	CL 1AA CR 66-06	15	Cristo Rey	22/12/2025	5,31	6,72	0,11	3,93	9,42	
											10,05
FRENTE DE OBRA N°3											
1	134055	CL 66 CR 105 - 79	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	3,10	1,20	0,10	0,37	0,89	
2	165699	CL 66 CR 105 - 79+20m	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	3,20	1,10	0,10	0,35	0,84	
3	165701	CL 66 CR 105 - 79+120m	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	4,55	1,60	0,14	1,02	2,45	
4A	157847	CL 64 CR 103C - 178	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	1,85	2,10	0,14	0,54	1,31	
4B		CL 64 CR 103C - 178	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	2,65	0,63	0,14	0,35	0,83	
5	165227	CL 64 CR 103C - 178	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	1,95	1,10	0,14	0,30	0,72	
6	165228	CL 64 CR 104 - 27+10m	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	3,80	2,10	0,12	0,96	2,30	
7	165230	CL 64 CR 104 - 27+40m	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	1,00	1,00	0,12	0,12	0,29	
8	165229	CL 64 CR 104 - 27+50m	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	1,60	0,60	0,12	0,17	0,41	
1	165327	CL 64A CR 106 - 115	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	2,66	2,00	0,13	0,69	1,66	
2	165325	CL 64A CR 106 - 155+2m	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	2,10	2,00	0,13	0,55	1,31	
3A	165326	CL 64A CR 106 - 155	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	2,00	1,20	0,13	0,31	0,75	
3B		CL 64A CR 106 - 155	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	2,10	0,83	0,13	0,23	0,54	
4A	159749	CL 64 CR 117F	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	5,30	1,70	0,13	1,17	2,81	
4B		CL 64 CR 117F	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	1,30	1,70	0,13	0,29	0,69	
5	165324	CL 66 CR 105 - 79+120m	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	3,20	2,30	0,13	0,96	2,30	
1A	165328	CL 70 CR 125A - 245	60	El Uvito	15/12/2025	14,00	1,30	0,11	2,00	4,80	
1B		CL 70 CR 125A - 245	60	El Uvito	15/12/2025	5,45	1,98	0,11	1,19	2,85	
2	165329	CL 70 CR 125A - 536	60	El Uvito	15/12/2025	5,75	1,57	0,11	0,99	2,38	
1A	152308	CL 74 CR 150B - 02	60	El Llano	16/12/2025	2,25	1,38	0,13	0,40	0,97	
1B		CL 74 CR 150B - 02	60	El Llano	16/12/2025	0,80	1,98	0,12	0,19	0,46	
2	165401	CL 74 CR 150B - 02+3m	60	El Llano	16/12/2025	3,20	2,79	0,12	1,07	2,57	
3	165403	CR 151 CL 79 - 14	60	El Llano	16/12/2025	3,15	3,50	0,13	1,43	3,44	
4A	165402	CR 151 CL 79 - 14+10m	60	El Llano	16/12/2025	4,20	1,50	0,12	0,76	1,81	
4B		CR 151 CL 79 - 14+10m	60	El Llano	16/12/2025	1,20	2,30	0,12	0,33	0,79	
1	165404	CL 68 CR 149 - 29	60	Travesías	17/12/2025	8,50	2,38	0,12	1,79	4,31	
2A	165405	CL 68 CR 149 - 07	60	Travesías	17/12/2025	4,15	2,90	0,12	1,44	3,47	
2B		CL 68 CR 149 - 07	60	Travesías	17/12/2025	2,25	0,80	0,12	0,22	0,52	
3	154214	CL 68 CR 145	60	Travesías	17/12/2025	1,50	1,80	0,12	0,32	0,78	
4	165408	CL 68 CR 145+5m	60	Travesías	17/12/2025	1,90	1,70	0,12	0,39	0,93	
1A	165517	CL 73 CR 151 - 55+25m	60	La chucilla	18/12/2025	3,10	2,50	0,10	0,78	1,88	
1B		CL 73 CR 151 - 55+25m	60	La chucilla	18/12/2025	8,00	1,25	0,10	1,00	2,40	
2A	165519	CL 73 CR 151	60	La chucilla	18/12/2025	4,80	1,35	0,10	0,65	1,58	
2B		CL 73 CR 151	60	La chucilla	18/12/2025	7,30	2,10	0,10	1,53	3,68	
3	165518	CR 150B CL 73 - 128	60	La chucilla	18/12/2025	5,55	0,70	0,10	0,39	0,93	
4	165430	CR 150B CL 73 - 55+10m	60	La chucilla	18/12/2025	2,68	2,57	0,10	0,69	1,65	
1A	165520	CL 75A CR 158B - 88	60	El Llano	19/12/2025	6,40	2,30	0,12	1,77	4,24	
1B		CL 75A CR 158B - 88	60	El Llano	19/12/2025	4,10	2,00	0,12	0,98	2,36	
2A	165521	CL 75A CR 150B - 100	60	El Llano	19/12/2025	5,45	1,45	0,10	0,79	1,90	
2B		CL 75A CR 150B - 100	60	El Llano	19/12/2025	1,63	1,98	0,10	0,30	0,73	
3	165522	CL 75A CR 150C - 34	60	El Llano	19/12/2025	1,15	1,20	0,14	0,19	0,46	
4	165523	CL 75A CR 150B	60	El Llano	19/12/2025	1,35	0,80	0,14	0,15	0,36	
											72,31

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

												HOJA N°	DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026				VALOR	$ 49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025	HASTA		31/12/2025				ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.		FORMULA:					UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,4,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°4											
1	165190	CL 53 CR 78-78	11	Los Colores	11/12/2025	2,88	0,83	0,14	0,33	0,60	
2	165191	CL 53 CR 76-50	11	La Cuarta Brigada	11/12/2025	1,94	0,85	0,14	0,23	0,55	
3	165192	CL 53 CR 74-97	11	La Cuarta Brigada	11/12/2025	4,11	1,96	0,19	1,53	3,67	
4	165179	CR 73 CL 52-65	11	La Cuarta Brigada	11/12/2025	1,17	1,13	0,15	0,20	0,48	
5A	165173	CR 73 CL 52-44	11	La Cuarta Brigada	11/12/2025	3,78	3,83	0,15	2,16	5,16	
5B		CR 73 CL 52-44	11	La Cuarta Brigada	11/12/2025	1,65	0,83	0,15	0,16	0,37	
1	165242	CR 74 CL 60-23	7	San Germán	12/12/2025	7,40	3,48	0,13	3,33	7,99	
2	159121	CR 74 CL 60 - 25	7	San Germán	12/12/2025	5,71	2,28	0,13	1,69	4,06	
1A	165304	CR 74 CL 60 - 20	7	San Germán	15/12/2025	1,66	1,90	0,13	0,41	0,98	
1B		CR 74 CL 60 - 20	7	San Germán	15/12/2025	3,21	3,99	0,13	1,67	4,00	
2A	165303	CR 74 CL 60 - 24	7	San Germán	15/12/2025	3,16	3,51	0,11	1,22	2,93	
2B		CR 74 CL 60 - 24	7	San Germán	15/12/2025	1,81	1,81	0,11	0,36	0,86	
3	165310	CR 74 CL 60 - 28	7	San Germán	15/12/2025	2,61	1,41	0,11	0,40	0,97	
4	165309	CR 74 CL 60 - 30	7	San Germán	15/12/2025	4,61	1,91	0,11	0,97	2,32	
1A	163898	CL 73 CR 72 A-64	7	La Pilarica	16/12/2025	7,50	4,00	0,14	4,20	10,08	
1B		CL 73 CR 72 A-64	7	La Pilarica	16/12/2025	2,50	2,35	0,14	0,82	1,97	
1	164755	CL 73 CR 72 A	7	La Pilarica	17/12/2025	7,85	4,00	0,16	5,02	12,06	
1	165239	CL 73 CR 72 A 36	Robledo	La Pilarica	18/12/2025	6,05	4,05	0,11	2,70	6,47	
2	165434	CL 73 CR 73 A-18	Robledo	La Pilarica	18/12/2025	4,40	3,05	0,12	1,61	3,86	
3	165435	CL 73 CR 73 A-3	Robledo	La Pilarica	18/12/2025	1,91	3,20	0,12	0,73	1,76	
1A	164839	CL 73 CR 72 A 80	7	La Pilarica	19/12/2025	4,60	3,10	0,15	2,14	5,13	
1B		CL 73 CR 72 A 80	7	La Pilarica	19/12/2025	2,00	1,80	0,15	0,54	1,30	
2	165434 (Segunda capa)	CL 73 CR 73 A-18	7	La Pilarica	19/12/2025	4,40	3,10	0,06	0,82	1,98	
3	165448 (Segunda parte)	CR 25 A CL 56-12	8	El Pinal	19/12/2025	5,70	1,82	0,07	0,73	1,74	
											81,49
FRENTE DE OBRA N°6											
1A	165221	CL 52 CR 10-16	8	Las Estancias	11/12/2025	1,23	3,45	0,17	0,72	1,73	
1B		CL 52 CR 10-16	8	Las Estancias	11/12/2025	3,80	1,50	0,17	0,97	2,33	
2A	165222	CL 52 CR 10-16+1	8	Las Estancias	11/12/2025	4,66	1,43	0,16	1,07	2,66	
2B		CL 52 CR 10-16+1	8	Las Estancias	11/12/2025	1,60	1,58	0,16	0,48	1,16	
3A	165224	CL 52 CR 10-16+5	8	Las Estancias	11/12/2025	1,40	1,87	0,16	0,42	1,01	
3B		CL 52 CR 10-16+5	8	Las Estancias	11/12/2025	4,50	1,86	0,16	1,34	3,21	
1	165288	CL 52 CR 10 a	8	Las Estancias	12/12/2025	15,50	1,79	0,16	4,99	11,99	
1	165362	CL 52 CR 11-57	8	Las Estancias	15/12/2025	10,05	1,80	0,17	3,08	7,38	
2A	165363	CL 52 CR 11-63	8	Las Estancias	15/12/2025	2,13	1,30	0,17	0,47	1,13	
2B		CL 52 CR 11-63	8	Las Estancias	15/12/2025	2,70	1,80	0,16	0,78	1,87	
3	165364	CL 52 CR 11-75	8	Las Estancias	15/12/2025	2,95	1,45	0,16	0,68	1,64	
1	165365	CL 52 CL 9-41	8	Las Estancias	16/12/2025	1,47	1,98	0,16	0,52	1,26	
2A	165366	CL 52 CL 9-33	8	Las Estancias	16/12/2025	0,94	1,45	0,16	0,25	0,59	
2B		CL 52 CL 9-33	8	Las Estancias	16/12/2025	0,94	3,15	0,16	0,53	1,28	
3	165367	CL 52 CL 9-24	8	Las Estancias	16/12/2025	2,25	2,60	0,16	1,01	2,43	
4A	165368	CL 52 CL 9-18	8	Las Estancias	16/12/2025	4,15	1,72	0,16	1,25	3,08	
4B		CL 52 CL 9-18	8	Las Estancias	16/12/2025	7,14	1,10	0,16	1,41	3,39	
1	165472	CL 52 CR 12-60	8	Las Estancias	17/12/2025	6,35	1,69	0,16	1,92	4,61	
2A	165473	CL 52 CR12-56	8	Las Estancias	17/12/2025	3,64	1,03	0,16	0,60	1,44	
2B		CL 52 CR12-56	8	Las Estancias	17/12/2025	0,90	1,75	0,16	0,25	0,60	
3	165474	CL 52 CR12-60	8	Las Estancias	17/12/2025	7,60	1,80	0,16	2,28	5,48	
1	165475	CL 52 CR13-69	8	Las Estancias	18/12/2025	4,20	1,45	0,20	1,22	2,92	
2A	165476	CL 52 CR13-39	8	Las Estancias	18/12/2025	7,50	1,48	0,16	1,97	4,73	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025	HASTA		31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:						UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,4,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

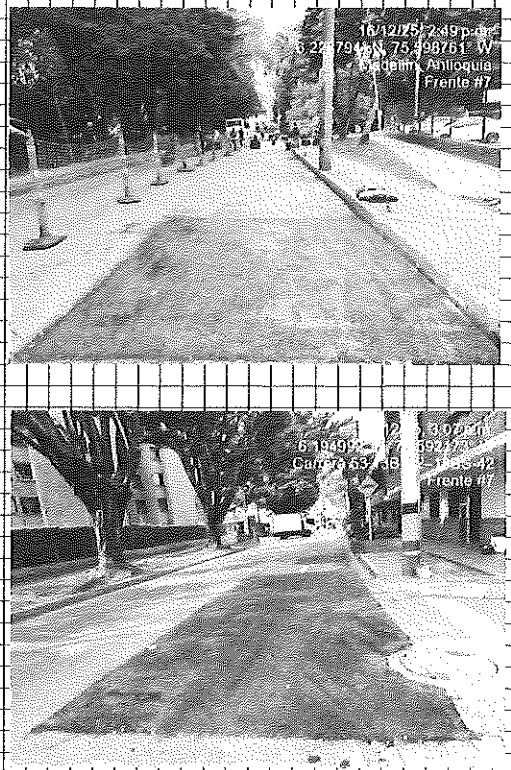

	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
2B		CL 52 CR13-39	8	Las Estancias	18/12/2025	1,50	2,30	0,18	0,62	1,49	
3	165477	CL 52 CR13-81	8	Las Estancias	18/12/2025	3,15	2,10	0,18	1,19	2,86	
1	165478	CL 52 CR 15A-14	8	Las Estancias	19/12/2025	7,10	3,92	0,18	5,01	12,02	
											84,17
	FRENTE DE OBRA N°7										
1	160795	CL 27A CR 80	16	La Palma	11/12/2025	3,60	1,90	0,11	0,79	1,91	
2A	150841	CL 27A CR 80-09	16	La Palma	11/12/2025	1,30	2,20	0,11	0,31	0,76	
2B		CL 27A CR 80- 09	16	La Palma	11/12/2025	3,60	3,30	0,11	1,38	3,31	
3	165178	CL 27A CR 80-11	16	La Palma	11/12/2025	9,50	2,20	0,10	2,09	5,02	
1	165256	CR 74 CL 27 - 88	16	Granada	12/12/2025	4,90	1,70	0,13	1,08	2,60	
2	165257	CR 74 CL 27 - 88	16	Granada	12/12/2025	1,10	1,40	0,10	0,15	0,37	
3A	165256	CR 74 CL 27 - 57	16	Granada	12/12/2025	1,73	1,90	0,10	0,33	0,79	
3B		CR 74 CL 27 - 57	16	Granada	12/12/2025	2,15	4,00	0,10	0,86	2,06	
4	165259	CR 74 CL 27 - 47	16	Granada	12/12/2025	3,70	3,20	0,12	1,42	3,41	
5	165260	CR 74 CL 27 - 19	16	Granada	12/12/2025	4,40	2,65	0,10	1,17	2,80	
1	165580	CR 64 B 104A 169+ 36	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	3,20	1,87	0,16	0,96	2,30	
2A	165579	CR 64 B 104A 180+ 43	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	2,24	1,97	0,17	0,75	1,80	
2B		CR 64 B 104A 180+ 43	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	3,02	1,50	0,17	0,77	1,85	
3A	165576	CR 64 B 104A 177+ 48	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	4,37	1,48	0,17	1,08	2,60	
3B		CR 64 B 104A 177+ 48	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	2,70	1,07	0,17	0,49	1,18	
4	165577	CR 64 B 104A 181+ 47	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	2,55	1,28	0,17	0,55	1,33	
5	165578	CR 64 B 104A 172+ 33	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	2,20	1,20	0,16	0,42	1,01	
1	165345	CL 27A CR 78A - 51	16	La Palma	18/12/2025	3,20	2,69	0,14	1,25	3,00	
2A	165346	CL 27A CR 78A - 32	16	La Palma	18/12/2025	2,60	2,10	0,14	0,85	2,05	
2B		CL 27A CR 78A - 32	16	La Palma	18/12/2025	1,50	1,10	0,14	0,23	0,55	
3	165347	CL 27A CR 78A - 20	16	La Palma	18/12/2025	5,70	3,50	0,14	2,69	6,46	
1	165386	CL 13C Sur CR 53	15	La Colina	17/12/2025	7,70	3,00	0,16	4,16	9,98	
2	165387	CL 13B Sur CR 53 - 33	15	La Colina	17/12/2025	2,80	1,75	0,18	0,88	2,12	
1	165632	CR 64 B 104A 208+ 158	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	5,90	1,50	0,13	1,15	2,76	
2A	165629	CR 64 B 104A 219+ 140	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	1,16	1,70	0,13	0,26	0,62	
2B		CR 64 B 104A 219+ 140	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	1,86	3,20	0,13	0,77	1,86	
3	165633	CR 64 B 104A 223+ 150	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	2,40	1,10	0,13	0,34	0,82	
4	165628	CR 64 B 104A 204+ 120	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	3,80	1,60	0,14	0,85	2,04	
5A	165631	CR 64 B 104A 218+ 103	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	4,70	1,50	0,14	0,99	2,37	
5B		CR 64 B 104A 218+ 103	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	1,70	1,00	0,14	0,24	0,57	
1A	165516	CR 75A CL 106B-40	6	Pedregal	19/12/2025	4,10	2,90	0,10	1,19	2,85	
1B		CR 75A CL 106B-40	6	Pedregal	19/12/2025	2,54	4,21	0,10	1,07	2,57	
1C		CR 75A CL 106B-40	6	Pedregal	19/12/2025	3,60	4,56	0,10	1,64	3,94	
											79,66

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA		31/12/2025			ACTA N°		6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:						UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,4,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
				FRENTE DE OBRA N°8							
1	165165	CR 51 CL 70A-15	4	San Pedro	11/12/2025	3,47	1,27	0,12	0,51	1,23	
2	165122	CL 70A CR 50A-84	4	San Pedro	11/12/2025	8,00	2,85	0,12	2,71	6,51	
3A	165183	CL 70A CR 50A-99	4	San Pedro	11/12/2025	1,98	1,95	0,10	0,39	0,93	
3B		CL 70A CR 50A-99	4	San Pedro	11/12/2025	1,21	1,72	0,10	0,21	0,50	
4	165185	CL 70A CR 50A 100	4	San Pedro	11/12/2025	3,30	3,60	0,10	1,19	2,85	
1A	156919	CR 45 CL 66-34	4	Manrique Central No.1	12/12/2025	5,16	4,09	0,22	4,64	11,14	
1B		CR 45 CL 66-34	4	Manrique Central No.1	12/12/2025	1,44	1,33	0,22	0,42	1,01	
1A	165286	CR 50A CL 70-14	4	San Pedro	15/12/2025	1,68	7,47	0,12	1,51	3,61	
1B		CR 50A CL 70-14	4	San Pedro	15/12/2025	1,32	2,34	0,12	0,37	0,89	
2	165314	CR 50A CL 70-18	4	San Pedro	15/12/2025	2,05	5,00	0,12	1,23	2,95	
3	165283	CR 50A CL 70-20	4	San Pedro	15/12/2025	2,70	3,05	0,12	0,99	2,37	
4	165282	CR 50A CL 70-30	4	San Pedro	15/12/2025	1,00	7,20	0,13	0,94	2,25	
1	143523	CR 50A CL 70-48	4	San Pedro	16/12/2025	1,78	3,30	0,10	0,59	1,41	
2	165339	CR 50A CL 70-39	4	San Pedro	16/12/2025	1,51	1,54	0,10	0,23	0,56	
3A	165316	CR 50A CL 70-48	4	San Pedro	16/12/2025	5,08	3,10	0,10	1,57	3,76	
3B		CR 50A CL 70-48	4	San Pedro	16/12/2025	2,24	2,38	0,10	0,53	1,28	
4	165319	CR 50A CL 70-58	4	San Pedro	16/12/2025	4,35	4,80	0,10	2,09	5,01	
1A	165355	CR 50A CL 106-90	2	La Francia	17/12/2025	3,27	4,22	0,10	1,38	3,31	
1B		CR 50A CL 106-90	2	La Francia	17/12/2025	1,25	2,90	0,10	0,36	0,87	
2	165525	CR 50A CL 106-92	2	La Francia	17/12/2025	1,60	0,88	0,10	0,14	0,34	
3A	165356	CR 50A CL 106-103	2	La Francia	17/12/2025	2,70	3,40	0,10	0,92	2,20	
3B		CR 50A CL 106-103	2	La Francia	17/12/2025	1,65	2,70	0,10	0,45	1,07	
4	165524	CR 50A CL 106-116	2	La Francia	17/12/2025	2,02	2,05	0,10	0,41	0,99	
5A	165377	CR 50A CL 106-136	2	La Francia	17/12/2025	1,27	2,32	0,10	0,29	0,71	
5B		CR 50A CL 106-136	2	La Francia	17/12/2025	1,28	1,95	0,10	0,25	0,60	
1A	162393	CR 50A CL 70-64	4	San Pedro	18/12/2025	10,67	4,90	0,08	4,18	10,04	
1B		CR 50A CL 70-64	4	San Pedro	18/12/2025	3,97	1,91	0,11	0,83	2,00	
1	152880	CL 27 CR 31-20	14	Colombia	19/12/2025	8,25	1,28	0,14	1,48	3,55	
2A	158535	CL 27 CR 31-14	14	Colombia	19/12/2025	8,18	1,54	0,14	1,76	4,23	
2B		CL 27 CR 31-14	14	Colombia	19/12/2025	2,34	1,43	0,14	0,47	1,12	
3	153878	CR 32 CL 27B-02	14	Colombia	19/12/2025	3,83	3,32	0,11	1,33	3,18	
											52,49
				FRENTE DE OBRA N°9							
1A	165188	CR 24 CL 56C-57	8	El Pinal	11/12/2025	8,25	1,78	0,14	2,03	4,88	
1B		CR 24 CL 56C-57	8	El Pinal	11/12/2025	0,90	1,08	0,14	0,13	0,32	
2	165107	CR 24 CL 56C-64	8	El Pinal	11/12/2025	2,60	1,84	0,13	0,62	1,49	
3	165186	CR 24 CL 56C-64 +5M	8	El Pinal	11/12/2025	1,70	1,85	0,13	0,41	0,98	
4A	165189	CR 24 CL 56C-50	8	El Pinal	11/12/2025	1,74	2,63	0,08	0,37	0,88	
4B		CR 24 CL 56C-50	8	El Pinal	11/12/2025	3,30	2,30	0,08	0,61	1,46	
1A	164995	CR 25B CL 56A-20	8	El Pinal	12/12/2025	11,18	2,30	0,17	4,37	10,49	
1B		CR 25B CL 56A-20	8	El Pinal	12/12/2025	0,84	1,54	0,17	0,22	0,53	
1A	165234	CR 24 CL 56C-16	8	El Pinal	15/12/2025	7,15	1,68	0,13	1,54	3,70	
1B		CR 24 CL 56C-16	8	El Pinal	15/12/2025	1,60	1,47	0,13	0,31	0,73	
2	165300	CR 24 CL 56C-25	8	El Pinal	15/12/2025	9,02	1,43	0,10	1,29	3,10	
3	165301	CR 24 CL 56BB-65	8	El Pinal	15/12/2025	3,20	3,30	0,08	0,84	2,03	
4A	165189 (Segunda capa)	CR 24 CL 56C-50	8	El Pinal	15/12/2025	1,74	2,68	0,05	0,23	0,56	
4B		CR 24 CL 56C-50	8	El Pinal	15/12/2025	3,30	2,30	0,05	0,38	0,91	
1A	162518	CR 24 CL 56C-04	8	El Pinal	16/12/2025	6,85	2,20	0,13	1,96	4,70	
1B		CR 24 CL 56C-04	8	El Pinal	16/12/2025	1,85	0,95	0,13	0,23	0,55	


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

												HOJA N°	DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026				VALOR	$ 49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA		31/12/2025			ACTA N° 6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:						UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,4,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

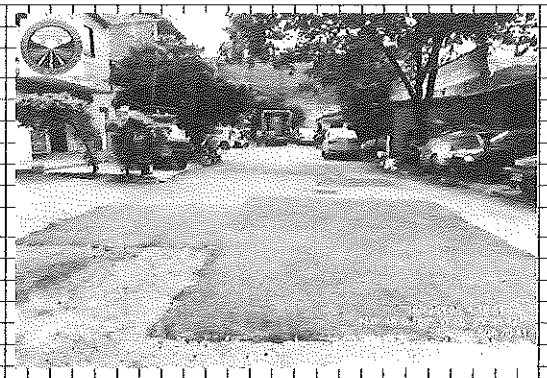



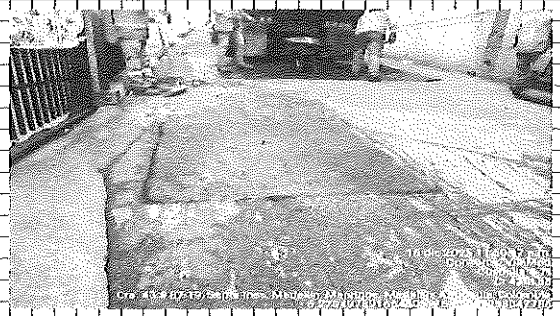

	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
2A	165343	CR 24 CL 56BB-47	8	El Pinal	16/12/2025	3,10	1,75	0,08	0,43	1,04	
2B		CR 24 CL 56BB-47	8	El Pinal	16/12/2025	5,45	2,48	0,08	1,08	2,60	
3	165301 (Segunda capa)	CR 24 CL 56BB-65	8	El Pinal	16/12/2025	3,20	3,30	0,05	0,53	1,27	
1A	157313	CR 23 CL 56BB-20	8	El Pinal	17/12/2025	2,25	2,35	0,11	0,58	1,40	
1B		CR 23 CL 56BB-20	8	El Pinal	17/12/2025	1,54	1,48	0,11	0,25	0,60	
2A	165352	CR 23 CL 56BB-26	8	El Pinal	17/12/2025	2,97	1,77	0,11	0,58	1,39	
2B		CR 23 CL 56BB-26	8	El Pinal	17/12/2025	1,45	1,88	0,11	0,30	0,72	
3	165350	CR 23 CL 56BB-30	8	El Pinal	17/12/2025	2,25	1,50	0,13	0,44	1,05	
4	165351	CR 23 CL 56BB-32	8	El Pinal	17/12/2025	0,65	1,35	0,12	1,08	2,59	
5A	165343 (Segunda capa)	CR 24 CL 56BB-47	8	El Pinal	17/12/2025	3,10	1,75	0,05	0,27	0,65	
5B		CR 24 CL 56BB-47	8	El Pinal	17/12/2025	5,45	2,48	0,05	0,68	1,62	
1A	165353	CL 56B CR 22A-08	8	La Libertad	16/12/2025	2,30	3,40	0,16	1,25	3,00	
1B		CL 56B CR 22A-08	8	La Libertad	16/12/2025	5,20	4,10	0,16	3,41	8,19	
2	165432	CL 56BB CR 21-128	8	La Libertad	16/12/2025	1,62	1,47	0,15	0,36	0,86	
1	165415	CR 25A CL 58-03	8	El Pinal	19/12/2025	5,20	2,08	0,16	1,73	4,16	
2A	165448	CR 25A CL 58-12	8	El Pinal	19/12/2025	5,69	1,80	0,11	1,12	2,70	
2B		CR 25A CL 58-12	8	El Pinal	19/12/2025	2,63	4,60	0,11	1,33	3,19	
												74,33
		FRENTE DE OBRA N°11										
1	161257	CR 35 CL 77-21	3	El Raizal	11/12/2025	6,30	1,60	0,11	1,25	2,99	
2	165240	CR 35 CL 77-24	3	El Raizal	11/12/2025	3,85	1,73	0,11	0,73	1,76	
3	165241	CR 35 CL 77-25	3	El Raizal	11/12/2025	2,40	1,45	0,11	0,38	0,92	
5	165243	CR 35 CL 77-31	3	El Raizal	11/12/2025	2,20	1,10	0,11	0,27	0,64	
6	165244	CR 35 CL 77-43	3	El Raizal	11/12/2025	3,20	4,00	0,12	1,54	3,69	
1	165276	CL 77 CR 35-29	3	El Raizal	12/12/2025	2,25	1,80	0,12	0,49	1,17	
2	165277	CL 77 CR 35-36	3	El Raizal	12/12/2025	5,10	1,80	0,14	1,29	3,08	
3	162445	CL 77 CR 35A-08	3	El Raizal	12/12/2025	3,15	2,00	0,14	0,88	2,12	
4	165278	CL 77 CR 35A-12	3	El Raizal	12/12/2025	2,60	1,30	0,13	0,44	1,05	
5	165279	CL 77 CR 35A-18	3	El Raizal	12/12/2025	2,60	1,17	0,12	0,37	0,88	
6A	165280	CL 77 CR 35A-24	3	El Raizal	12/12/2025	2,60	1,60	0,12	0,50	1,20	
6B		CL 77 CR 35A-24	3	El Raizal	12/12/2025	2,10	0,90	0,12	0,23	0,54	
1	165322	CR 43B CL 88-30	3	Las Granjas	15/12/2025	1,38	1,70	0,13	0,30	0,73	
2A	163592	CR 43B CL 88-18	3	Las Granjas	15/12/2025	3,10	2,10	0,13	0,85	2,03	
2B		CR 43B CL 88-18	3	Las Granjas	15/12/2025	1,80	1,25	0,12	0,27	0,65	
3A	163593	CR 43B CL 88-12	3	Las Granjas	15/12/2025	6,60	1,81	0,11	1,31	3,15	
3B		CR 43B CL 88-12	3	Las Granjas	15/12/2025	5,80	1,00	0,11	0,64	1,53	
4	165323	CR 43B CL 88-05	3	Las Granjas	15/12/2025	1,80	2,40	0,11	0,48	1,14	
5A	163594	CR 43B CL 88-03	3	Las Granjas	15/12/2025	1,40	2,55	0,10	0,36	0,86	
5B		CR 43B CL 88-03	3	Las Granjas	15/12/2025	2,30	1,70	0,10	0,39	0,94	
1	165379	CR 43 CL 87-87	3	Las Granjas	16/12/2025	2,60	1,70	0,13	0,44	1,06	
2	165380	CR 43 CL 87-77	3	Las Granjas	16/12/2025	3,60	1,90	0,13	0,89	2,13	
3	165381	CR 43 CL 87-51	3	Las Granjas	16/12/2025	4,60	1,90	0,12	1,09	2,63	
4	165382	CR 43 CL 87-43	3	Las Granjas	16/12/2025	3,30	1,40	0,12	0,55	1,33	
5	165383	CR 43 CL 87-35	3	Las Granjas	16/12/2025	4,30	1,45	0,10	0,62	1,50	
6	165384	CR 43 CL 87-31	3	Las Granjas	16/12/2025	4,60	1,70	0,12	0,98	2,35	
1	165396	CL 84 CR 48-49	4	Campo Valdés No.1	17/12/2025	3,30	1,30	0,12	0,51	1,24	
2A	165397	CL 84 CR 48-41	4	Campo Valdés No.1	17/12/2025	2,90	3,53	0,11	0,78	1,88	
2B		CL 84 CR 48-41	4	Campo Valdés No.1	17/12/2025	2,30	2,60	0,11	0,66	1,58	
3A	165398	CL 84 CR 48-27	4	Campo Valdés No.1	17/12/2025	4,50	3,60	0,11	1,68	4,51	
3B		CL 84 CR 48-27	4	Campo Valdés No.1	17/12/2025	1,50	2,10	0,11	0,35	0,83	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.048
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025	HASTA		31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada, Horario diurno.	FORMULA:						UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,4,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Bache Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	165400	CR 43 CL 87-13	3	Las Granjas	18/12/2025	1,50	1,40	0,14	0,31	0,75	
2A	163009	CR 43 CL 87-07	3	Las Granjas	18/12/2025	1,80	1,30	0,13	0,30	0,73	
2B		CR 43 CL 87-07	3	Las Granjas	18/12/2025	2,70	2,90	0,13	1,02	2,44	
3	165440	CR 43B CL 87-24	3	Las Granjas	18/12/2025	3,20	1,60	0,12	0,61	1,47	
4A	165441	CR 43B CL 87-38	3	Las Granjas	18/12/2025	5,50	1,30	0,13	0,93	2,23	
4B		CR 43B CL 87-38	3	Las Granjas	18/12/2025	3,20	1,00	0,13	0,42	1,00	
5	165443	CR 43B CL 88-01	3	Las Granjas	18/12/2025	2,40	3,00	0,14	1,01	2,42	
1	165533	CL 84 CR 47-51	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	2,80	2,02	0,11	0,62	1,49	
2	165534	CR 48 CL 83-69	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	3,60	1,40	0,11	0,55	1,33	
3	165535	CR 48 CL 83-58	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	1,60	1,60	0,11	0,35	0,86	
4	165536	CR 48 CL 83-55	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	1,90	2,70	0,12	0,62	1,48	
5A	165537	CR 48 CL 83-20	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	3,50	2,20	0,13	1,00	2,40	
5B		CR 48 CL 83-20	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	3,50	2,95	0,13	1,34	3,22	
6	165538	CR 48 CL 83-10	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	3,05	1,85	0,11	0,55	1,33	
											76,24
		FRENTE DE OBRA N°14									
1A	165204	CQ4 CR73 11	11	Bolivariana	11/12/2025	1,20	14,30	0,08	0,94	2,27	
1B		CQ4 CR73 11	11	Bolivariana	11/12/2025	1,20	6,80	0,05	0,41	0,98	
2A	165201	CQ3 CR73 07	11	Bolivariana	11/12/2025	1,20	15,00	0,05	0,90	2,16	
2B		CQ3 CR73 07	11	Bolivariana	11/12/2025	1,20	7,50	0,06	0,50	1,19	
3A	165202	CQ2 CR73 10	11	Bolivariana	11/12/2025	1,20	16,80	0,05	1,01	2,42	
3B		CQ2 CR73 10	11	Bolivariana	11/12/2025	1,20	9,40	0,04	0,45	1,08	
1	165213	CQ1 CR68 02	11	San Joaquín	12/12/2025	5,15	0,95	0,11	0,54	1,29	
2A	165214	CQ1 CR68 32	11	San Joaquín	12/12/2025	4,80	0,83	0,12	0,49	1,17	
2B		CQ1 CR68 32	11	San Joaquín	12/12/2025	4,25	1,84	0,12	0,99	2,37	
3	165215	CQ1 CR68 38	11	San Joaquín	12/12/2025	2,10	0,90	0,10	0,19	0,45	
4	165233	CQ1 CR68 60	11	San Joaquín	12/12/2025	2,80	0,85	0,11	0,27	0,65	
5	165218	CQ1 CR69 07	11	San Joaquín	12/12/2025	1,20	9,60	0,14	1,11	2,66	
6	165238	CQ1 CR74 44	11	San Joaquín	12/12/2025	0,70	7,50	0,11	0,58	1,39	
1	165284	CL49 CR81A 36	12	Calasanz	15/12/2025	4,64	2,40	0,13	1,45	3,47	
2A	165285	CL49 CR81A 34	12	Calasanz	15/12/2025	1,24	1,85	0,12	0,28	0,66	
2B		CL49 CR81A 34	12	Calasanz	15/12/2025	3,50	2,90	0,13	1,32	3,17	
3A	165311	CL49 CR81A 22	12	Calasanz	15/12/2025	4,40	2,05	0,13	1,17	2,81	
3B		CL49 CR81A 22	12	Calasanz	15/12/2025	0,94	0,40	0,05	0,02	0,05	
1	165311 (Segunda capa)	CL49 CR81A 22	12	Calasanz	16/12/2025	0,94	0,40	0,08	0,03	0,07	
2	165295	CR81 CL49F 16	12	Calasanz	16/12/2025	8,60	2,92	0,14	3,52	8,44	
3	165294	CR81 CL49F 05	12	Calasanz	16/12/2025	1,60	1,90	0,14	0,22	0,54	
4A	165321	CR81 CL49F 25	12	Calasanz	16/12/2025	4,30	1,85	0,14	0,99	2,38	
4B		CR81 CL49F 25	12	Calasanz	16/12/2025	1,50	1,60	0,08	0,14	0,35	
5	165333	CR81 CL49A 39	12	Calasanz	16/12/2025	1,50	1,20	0,08	0,11	0,26	
1	165169	CL49A CR81 15	12	Calasanz	17/12/2025	3,60	1,90	0,14	0,96	2,30	
2A	165170	CL49A CR81 33	12	Calasanz	17/12/2025	5,60	1,85	0,14	1,53	3,67	
2B		CL49A CR81 33	12	Calasanz	17/12/2025	2,35	2,30	0,14	0,76	1,82	
3	165354	CL49 CR81A 08	12	Calasanz	17/12/2025	2,80	2,10	0,14	0,82	1,98	
4	165337	CR81 CL49 57	12	Calasanz	17/12/2025	1,18	2,20	0,13	0,34	0,81	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°	DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.048	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION		Rango 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada. Horario diurno.				FORMULA:		UNIDAD	TON
FRENTE DE OBRA	2,3,4,6,7,8,9,11,14										

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACION						DIMENSIONES					
Id Bache Bitácora	Id (SIRC)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
5	165336	CR81 CL49 45	12	Calasanz	17/12/2025	2,65	1,15	0,13	0,31	0,74	
6A	165369	CR81 CL49A 31	12	Calasanz	17/12/2025	2,60	1,05	0,05	0,13	0,31	
6B		CR81 CL49A 31	12	Calasanz	17/12/2025	1,75	1,95	0,05	0,17	0,41	
1	165335	CR81 CL49 37	12	Calasanz	18/12/2025	5,50	2,80	0,14	2,16	5,17	
2	165390	CR81 CL49 28	12	Calasanz	18/12/2025	1,50	2,40	0,14	0,50	1,21	
3	165391	CR81 CL49 12	12	Calasanz	18/12/2025	3,70	0,80	0,14	0,41	0,99	
4	165357	CR81 CL49 09	12	Calasanz	18/12/2025	1,75	1,80	0,14	0,44	1,06	
5	165392	CR81 CL49 03	12	Calasanz	18/12/2025	2,00	1,20	0,14	0,32	0,78	
6	165433	CR81 CL49 31	12	Calasanz	18/12/2025	2,70	2,50	0,05	0,34	0,81	
1	167871	CR76 CL48C 84	12	Calasanz	19/12/2025	3,70	2,90	0,15	1,61	3,86	
2	165455	CR76 CL48A 130	12	Calasanz	19/12/2025	6,20	1,80	0,14	1,56	3,75	
3	165464	CR76 CL48A 122	12	Calasanz	19/12/2025	4,80	1,50	0,14	1,02	2,44	
											74,39


ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Correa Alvarez Residente de Interventoria	Carlos Andrés Angel Saldarriaga Director de Interventoria	

SUBTOTAL ESTA HOJA	634,13
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	634,13
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	6150,98
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6785,11
TOTAL POR EJECUTAR	751,89

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026		VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°		6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.3	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.		FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA		5

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

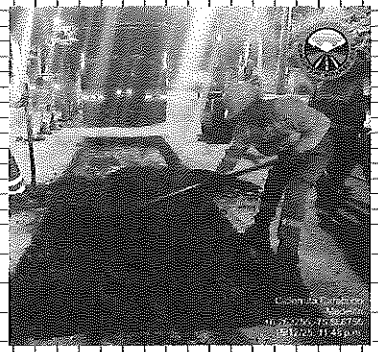

	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (BIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°5											
1	164592	CL 61 CR 51D-57	10	Jesús Nazareno	11/12/2025	7,65	1,13	0,12	1,04	2,49	
2	163112	CL 61 CR 51D-33	10	Jesús Nazareno	11/12/2025	3,90	1,45	0,12	0,68	1,63	
3A	147961	CL 61 CR 51D-21	10	Jesús Nazareno	11/12/2025	0,71	2,25	0,12	0,19	0,46	
3B		CL 61 CR 51D-21	10	Jesús Nazareno	11/12/2025	4,45	4,28	0,12	2,27	5,46	
1	155171	CL 61 CR 51D-85	10	Jesús Nazareno	12/12/2025	8,42	3,78	0,17	4,00	9,61	
2	143137	CL 37 CR 48-02	10	Barrio Colon	12/12/2025	1,90	1,16	0,12	0,26	0,63	
1	164575	CR 52 CL 64-19	10	Jesús Nazareno	15/12/2025	7,62	1,84	0,30	4,21	10,09	
1	165427	CR 45 CL 46-60	10	Barrio Colon	16/12/2025	10,85	1,22	0,12	2,47	5,92	
2	165428	CR 45 CL 46-74	10	Barrio Colon	16/12/2025	5,92	2,30	0,13	1,77	4,25	
1A	147876	CR 52 CL 13A SUR-61	15	La Colina	17/12/2025	3,24	3,20	0,13	1,35	3,23	
1B		CR 52 CL 13A SUR-61	15	La Colina	17/12/2025	2,97	1,26	0,13	0,49	1,17	
2	165430	CR 52 CL 14 SUR-07	15	La Colina	17/12/2025	1,24	1,88	0,14	0,33	0,78	
3A	155306	CR 52 CL 14 SUR-75	15	La Colina	17/12/2025	3,66	1,35	0,13	0,64	1,54	
3B		CR 52 CL 14 SUR-75	15	La Colina	17/12/2025	3,55	0,90	0,13	0,42	1,00	
4	157139	CR 52 CL 14 SUR-79	15	La Colina	17/12/2025	2,10	3,66	0,13	1,00	2,40	
1	165436	CR 28 CL 107-157	1	Santo Domingo Savio No.2	18/12/2025	3,10	2,40	0,13	0,97	2,32	
2A	165437	CR 28 CL 107-147	1	Santo Domingo Savio No.2	18/12/2025	4,73	2,05	0,15	1,45	3,49	
2B		CR 28 CL 107-147	1	Santo Domingo Savio No.2	18/12/2025	2,83	1,64	0,15	0,65	1,55	
3A	165438	CR 28 CL 107-139	1	Santo Domingo Savio No.2	18/12/2025	1,98	2,05	0,15	0,61	1,46	
3B		CR 28 CL 107-139	1	Santo Domingo Savio No.2	18/12/2025	2,47	1,50	0,15	0,56	1,33	
1	165465	CR 52 CL 10-190 +59.00m	15	Campo Amor	19/12/2025	6,70	2,83	0,15	2,84	6,83	
2	165466	CR 52 CL 10-190 +68.00m	15	Campo Amor	19/12/2025	6,50	1,40	0,15	1,32	3,17	
											70,81


ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	70,81
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	70,81
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1305,66
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1376,47
TOTAL POR EJECUTAR	-70,81

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	16/01/2026	VALOR	$	49.254.906.(	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	1.2.2.1	DESCRIPCION	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	13		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

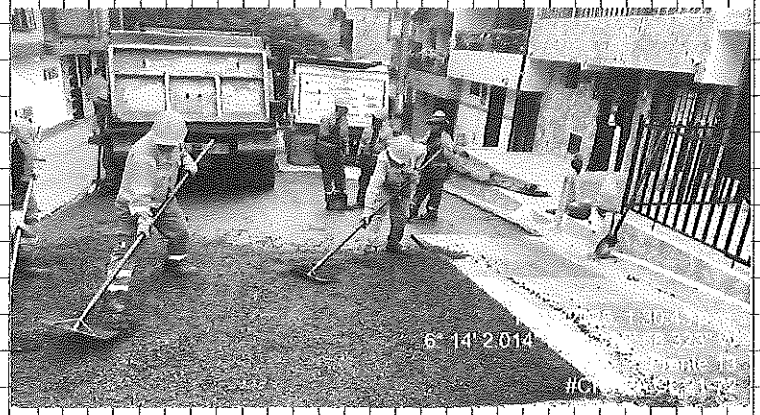

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°13										
1	CL 14 VIA VEREDA BARCINO + 4151 VIA VEREDA BARCINO + 4351	80	El Astillero	11/12/2025	42,50	2,76	0,11	116,15	12,80	
1	CL 14 VIA VEREDA BARCINO + 4151 VIA VEREDA BARCINO + 4351	80	El Astillero	12/12/2025	33,50	2,80	0,09	93,80	8,62	
2	CL 14 VIA VEREDA BARCINO + 4151 VIA VEREDA BARCINO + 4351	80	El Astillero	12/12/2025	27,60	2,80	0,10	77,28	7,34	
3	CL 14 VIA VEREDA BARCINO + 4151 VIA VEREDA BARCINO + 4351	80	El Astillero	12/12/2025	10,50	2,60	0,10	27,30	2,59	
1	CL 14 VIA VEREDA BARCINO + 4151 VIA VEREDA BARCINO + 4351	80	El Astillero	15/12/2025	48,80	3,00	0,09	146,40	12,83	
1A	CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	16/12/2025	3,63	4,60	0,13	16,70	2,10	
1B	CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	16/12/2025	4,90	6,70	0,13	32,83	4,14	
1C	CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	16/12/2025	18,60	3,90	0,13	72,54	9,16	
1	CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	17/12/2025	8,90	4,00	0,17	35,60	6,05	
2	CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	17/12/2025	7,00	6,53	0,17	45,71	7,73	
3	CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	17/12/2025	7,00	3,40	0,16	23,80	3,81	
4	CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	17/12/2025	3,60	2,90	0,16	10,44	1,67	
3	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	19/12/2025	48,00	3,80	0,11	174,80	19,33	
1A	CR 92 CL 34D - 93	San Javier	Belencito	22/12/2025	58,60	3,46	0,09	202,41	17,92	
1B	CR 92 CL 34D - 93	San Javier	Belencito	22/12/2025	2,10	7,10	0,09	14,91	1,32	
1A	CR 92 CL 34D - 93	San Javier	Belencito	23/12/2025	42,00	3,10	0,11	130,20	14,19	
1B	CR 92 CL 34D - 93	San Javier	Belencito	23/12/2025	10,00	5,00	0,10	50,00	5,00	
										136,80

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	136,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	136,80
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1347,43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1484,23
TOTAL POR EJECUTAR	415,77

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.2.2	DESCRIPCION	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	15,21	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



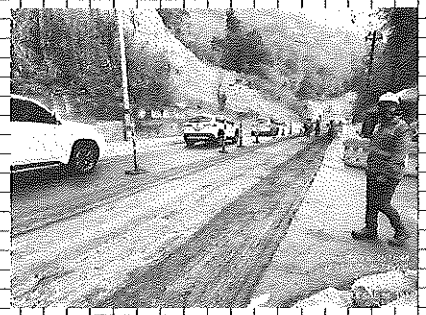



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Drches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°15										
1	CL 58 CR 31 Y CR 32	8	Enciso	12/12/2025	86,59	4,90	0,10	424,29	42,43	
2	CR 32 CL 58 Y CL 58A	8	Enciso	12/12/2025	10,83	4,99	0,10	54,04	5,40	
1	CL 58 CR 32 Y CR 35	8	Enciso	15/12/2025	32,00	2,25	0,10	72,00	7,20	
2	CL 58 CR 35 Y CR 36	8	Enciso	15/12/2025	50,00	2,22	0,10	111,00	11,10	
								0,00	0,00	
										66,13
FRENTE DE OBRA N°21										
1	CR 73 CL 30C CL 31A	16	Belén	11/12/2025	55,00	3,48	0,11	191,40	20,10	
2	CR 73 CL 31A CL 32	16	Belén	11/12/2025	64,49	3,48	0,11	224,43	23,56	
1	CR 73 CL 30C CL 31A	16	Belén	12/12/2025	22,60	3,85	0,10	87,01	8,70	
2	CL 31 CR 73 CR 73A	16	Belén	12/12/2025	17,70	8,15	0,10	144,26	14,43	
3	CR 73 CL 31A CL 32	16	Belén	12/12/2025	52,50	3,56	0,10	186,90	18,69	
4	CR 73 CL 31A CL 32	16	Belén	12/12/2025	4,00	3,50	0,10	14,00	1,40	
1A	CR 73 CL 31A CL 32	16	Belén	15/12/2025	10,60	3,50	0,05	37,10	1,86	
1B	CR 73 CL 31A CL 32	16	Belén	15/12/2025	30,00	3,42	0,11	102,60	10,77	
2A	CL 32 CR 72A CR 73	16	Rosales	15/12/2025	9,89	8,28	0,11	81,89	8,76	
2B	CL 32 CR 72A CR 73	16	Rosales	15/12/2025	32,18	3,19	0,11	102,59	10,98	
3	CR 73 CL 32 CL 32A	16	Belén	15/12/2025	31,43	3,42	0,11	107,49	11,29	
1	CR 73 CL 31A CL 32	16	Belén	16/12/2025	31,12	3,75	0,10	116,70	11,90	
2	CR 73 CL 32 CL 32A	16	Belén	16/12/2025	10,05	4,13	0,10	41,51	4,32	
3A	CL 32 A CR 70+200 CR 73	16	Rosales	16/12/2025	10,00	8,03	0,11	80,30	8,43	
3B	CL 32 A CR 70+200 CR 73	16	Rosales	16/12/2025	3,10	4,20	0,04	13,02	0,52	
4A	CR 73 CL 32A DG 74B	16	Rosales	16/12/2025	29,13	4,13	0,11	120,31	12,63	
4B	CR 73 CL 32A DG 74B	16	Rosales	16/12/2025	9,89	1,35	0,04	13,35	0,53	
1	CR 73 CL 32 CL 32A	16	Belén	17/12/2025	66,54	3,98	0,11	264,83	28,07	
2A	CR 73 CL 32A DG 74B	16	Rosales	17/12/2025	20,00	3,98	0,11	79,60	8,44	
2B	CR 73 CL 32A DG 74B	16	Rosales	17/12/2025	7,20	8,66	0,11	24,70	2,64	
1	CR 9 F CL 10 SUR +200 CL 18A SUR	80	Las Palmas	18/12/2025	226,97	3,66	0,05	815,13	41,57	
1	CR 9 F CL 10 SUR +200 CL 18A SUR	80	Las Palmas	22/12/2025	236,02	3,55	0,06	837,87	46,92	
2	CR 9 F CL 10 SUR +200 CL 18A SUR	80	Las Palmas	22/12/2025	1,98	1,10	0,06	2,18	0,12	
										296,63

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Mateo Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	362,76
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	362,76
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3326,71
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3689,47
TOTAL POR EJECUTAR	1010,43

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	1.2.2.3	DESCRIPCION	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	17,23		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

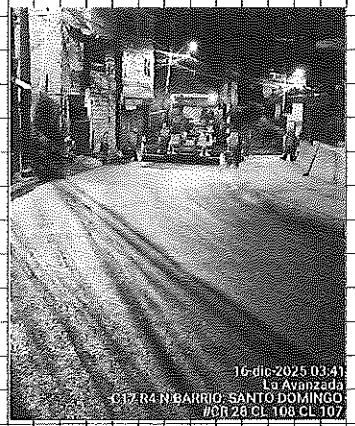

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°17										
1A	CR 28 CL 109 CL 110	1	Santo Domingo Savio No.2	11/12/2025	20,00	5,86	0,08	117,20	8,81	
1B	CR 28 CL 108E CL 109	1	Santo Domingo Savio No.2	11/12/2025	61,00	5,85	0,08	356,85	27,48	
1A	CR 28 CL 108E CL 109	1	Santo Domingo Savio No.2	12/12/2025	77,00	6,20	0,10	477,40	47,74	
1B	CR 28 CL 108E CL 109	1	Santo Domingo Savio No.2	12/12/2025	8,00	6,20	0,06	49,60	2,92	
1A	CR 28 CL 108C CL 108E	1	Santo Domingo Savio No.2	15/12/2025	92,00	5,20	0,10	478,40	48,32	
1B	CR 28 CL 108E CL 109	1	Santo Domingo Savio No.2	15/12/2025	8,00	5,85	0,05	46,80	2,40	
1	CR 28 CL 108A CL 108C	1	La Avanzada	16/12/2025	66,80	3,70	0,10	247,16	25,24	
										162,91
FRENTE DE OBRA N°23										
1	CR 53 CL 67 CL 67 + 200	10	Jesús Nazareno	11/12/2025	125,22	3,76	0,10	470,83	48,97	
1	CR 53 CL 67 CL 67 + 200	10	Jesús Nazareno	12/12/2025	125,20	3,56	0,10	445,71	46,35	
2	CR 53 CL 67 CL 67 + 200	10	Jesús Nazareno	12/12/2025	3,21	5,68	0,10	18,23	1,90	
										97,22

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	260,13
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	260,13
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1985,26
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2245,39
TOTAL POR EJECUTAR	-260,13

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Públicas	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026		VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°		6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.3.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia Semidensa MSC-25 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) que cumpla con los artículos 462 y 450.2.4 de la norma INVIAS 2022, con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Beches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	FRENTE DE OBRA N°23									
1	CR 53 CL 71 Y CL 74	4	Sevilla	15/12/2025	105,11	3,58	0,10	374,19	37,42	
1	CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	17/12/2025	23,89	5,97	0,10	142,62	14,88	
2	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	17/12/2025	102,00	3,62	0,11	369,24	39,38	
1	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	18/12/2025	139,66	3,47	0,10	484,62	49,02	
1	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	19/12/2025	63,34	3,64	0,11	230,58	24,53	
2	CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	19/12/2025	28,00	3,64	0,11	101,92	10,85	
										176,78

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	176,78
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	176,78
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	176,78
TOTAL POR EJECUTAR	-113,78

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046			
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)						
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona								

ITEM	1.3.4	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografía. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

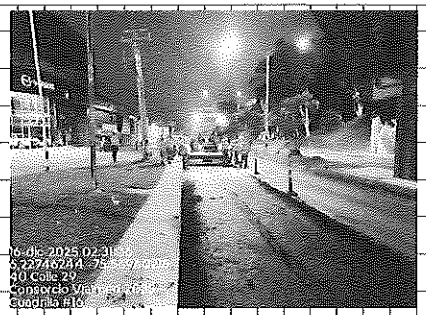

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°16										
1	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	62,12	3,50	0,20	217,42	43,48	
2	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	11/12/2025	28,02	3,50	0,20	98,07	19,61	
1	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	62,15	3,63	0,20	225,60	46,02	
2	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	12/12/2025	28,12	3,63	0,20	102,08	20,82	
1	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	32,80	3,53	0,22	115,78	25,47	
2	CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	15/12/2025	44,09	4,36	0,20	192,23	38,45	
1	CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	89,98	4,02	0,20	361,72	72,34	
										266,19

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	266,19
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	266,19
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1620,33
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1886,52
TOTAL POR EJECUTAR	1433,40

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.3.5	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capítulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografía. HORARIO DIURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad







	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°23										
1	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	22/12/2025	207,11	3,60	0,09	745,60	61,88	
2	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	22/12/2025	16,51	1,66	0,09	27,41	2,27	
3	CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	22/12/2025	23,89	6,97	0,09	142,62	11,84	
1	CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	23/12/2025	200,00	3,65	0,09	730,00	60,59	
2	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	23/12/2025	31,00	3,62	0,09	112,22	9,31	
										145,89

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	145,89
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	145,89
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	145,89
TOTAL POR EJECUTAR	99,11

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.264.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025		ACTA N°		6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.3.6	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica libla adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el articulo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°16										
1	CL 29 INIPUE CR 52 FINPUE CR 52	14	Barrio Colombia	17/12/2025	91,38	7,09	0,10	647,88	64,79	
1A	CL 30 CR 43A CR 43A+57	14	Barrio Colombia	18/12/2025	16,50	7,00	0,06	115,50	6,93	
1B	CL 30 CR 43A+57 CR 43A+117	14	Barrio Colombia	18/12/2025	74,80	5,73	0,07	428,60	27,88	
1C	CL 30 CR 43A+57 CR 43A+117	14	Barrio Colombia	18/12/2025	61,70	5,73	0,07	353,54	22,98	
										122,56

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	122,56
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	122,56
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1828,85
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1951,41
TOTAL POR EJECUTAR	253,59

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025			HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.3.7	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF		FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA		17	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°17										
Resalto	CR 28 CL 109 CL 110	1	La Avanzada	16/12/2025	5,00	1,00	0,08	5,00	0,41	
										0,41

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	0,41
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,41
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	28,80
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	29,21
TOTAL POR EJECUTAR	69,79

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	HOJA N°		DE	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.							VALOR	$		49.254.906.046
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.4.1	DESCRIPCION	Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO DIURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

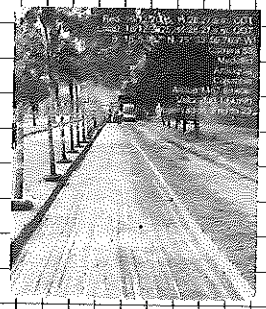

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°23										
Fresado	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	16/12/2025	105,11	3,56	0,18	374,19	67,35	
Fresado	CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	16/12/2025	23,00	2,35	0,18	54,05	9,73	
Fresado	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	16/12/2025	102,00	3,62	0,18	369,24	66,46	
Fresado	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	17/12/2025	140,00	2,47	0,18	345,80	62,24	
Fresado	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	18/12/2025	140,00	1,00	0,18	140,00	25,20	
Fresado	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	18/12/2025	62,00	3,64	0,18	225,68	40,62	
Fresado	CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	18/12/2025	29,00	3,64	0,18	105,56	19,00	
Fresado	CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	22/12/2025	16,51	1,66	0,08	27,41	2,19	
										292,79

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	292,79
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	292,79
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3636,76
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3929,55
TOTAL POR EJECUTAR	-292,79


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.4.2	DESCRIPCION	Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardinetes y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

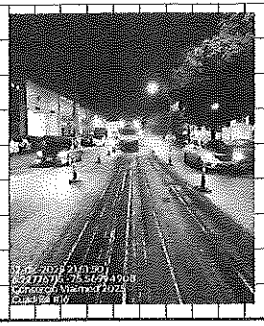

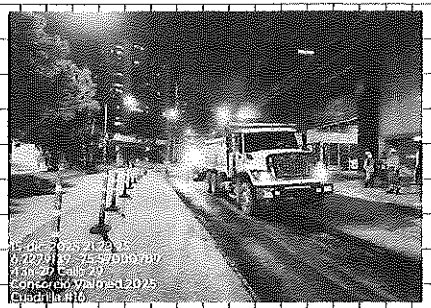

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°16										
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	62,12	3,50	0,20	217,42	43,48	
Fresado	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	11/12/2025	28,02	3,50	0,20	98,07	19,61	
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	62,15	3,63	0,26	225,60	58,66	
Fresado	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	12/12/2025	28,12	3,63	0,26	102,08	26,54	
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	32,80	3,53	0,22	115,78	25,47	
Fresado	CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	15/12/2025	44,09	4,36	0,26	192,23	49,98	
Fresado	CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	89,99	4,02	0,26	361,72	94,05	
										317,79

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	317,79
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	317,79
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3636,76
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3954,55
TOTAL POR EJECUTAR	-317,79

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026		VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025		ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.4.5	DESCRIPCION	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.		FORMULA:				UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA		10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 10 A CR 41A	14	El Poblado	01/12/2025	3,80	0,05		0,19	0,19	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	1,55	3,80		5,89	5,89	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	0,30	3,45		1,04	1,04	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	1,00	3,75		3,75	3,75	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	0,85	3,70		3,15	3,15	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025	7,50	0,10		0,75	0,75	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025	16,50	0,10		1,65	1,65	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	5,40	0,10		0,54	0,54	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	6,10	0,10		0,61	0,61	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	4,70	0,10		0,47	0,47	
										18,04
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CL 10 A CR 42	14	El Poblado	06/12/2025	14,07	0,05		0,70	0,70	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025	0,95	1,80		1,71	1,71	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025	2,00	1,10		2,20	2,20	
										4,61
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	06/12/2025	76,48	0,20		15,30	15,30	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	06/12/2025	72,00	0,10		7,20	7,20	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025	17,15	0,75		12,86	12,86	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	3,65	0,30		1,10	1,10	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	19/12/2025	13,20	3,63		47,92	47,92	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	19/12/2025				0,95	0,95	
										85,33

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	107,98
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	107,98
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	167,45
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	275,43
TOTAL POR EJECUTAR	354,57

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	1.4.6	DESCRIPCION	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

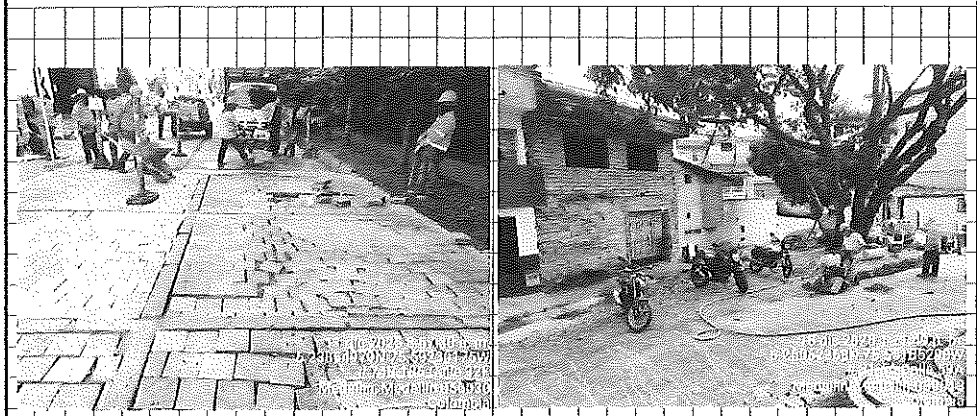

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 10 A CR 41A	14	El Poblado	01/12/2025	3,80				3,80	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	3,70				3,70	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	3,45				3,45	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	10/12/2025	50,30				50,30	
										61,25
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CL 10 A CR 42	14	El Poblado	06/12/2025	14,07				14,07	
										14,07
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	214,87				214,87	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	6/12/2025	76,48				76,48	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	6/12/2025	72,00				72,00	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025	21,85				21,85	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	10/12/2025	51,75				51,75	
										436,95

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Angel Saldarriaga Director de Interventoría	

SUBTOTAL ESTA HOJA	512,27
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	512,27
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	431,82
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	944,09
TOTAL POR EJECUTAR	-317,19

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA		2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°2										
CR 43A CL 31	10	Perpetuo Socorro	11/12/2025	Procopal				2,68	2,68	
CR 30 CL 1A SUR - 30 +14M	14	Los Naranjos	12/12/2025	Procopal				2,69	2,69	
CL 11A CR 31A - 44	14	Las Lomas No.1	15/12/2025	Procopal				2,69	2,69	
CL 11 CR 30A-109	14	Las Lomas No.1	16/12/2025	Procopal				2,71	2,71	
CR 37A CL 29 - 66	9	La Asomadera No.1	17/12/2025	Procopal				2,68	2,68	
CR 43B CL 7 Sur - 24	14	La Aguacatala	18/12/2025	Procopal				2,69	2,69	
CR 37A CL 29 - 26	9	La Asomadera No.1	19/12/2025	Procopal				2,68	2,68	
CL 51 CR 45-57	10	La Candelaria	22/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CL 29 CR 33-9	9	La Asomadera No.1	23/12/2025	Procopal				2,83	2,83	
									0,00	
										27,23
FRENTE DE OBRA N°3										
CL 66 CR 105 - 79	60	Área expansión de Pajarito	11/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CL 64A CR 106 - 115	60	Área expansión de Pajarito	12/12/2025	Procopal				5,61	5,61	
CL 70 CR 126A - 245	60	El Uvito	16/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CL 74 CR 150B - 02	60	El Llano	16/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CL 68 CR 149 - 29	60	Travesías	17/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
CL 73 CR 151 - 55+25m	60	La chucilla	18/12/2025	Procopal				6,73	6,73	
CL 75A CR 158B - 88	60	El Llano	19/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
										40,21
FRENTE DE OBRA N°4										
CL 53 CR 76-76	11	Los Colores	11/12/2025	Procopal				6,14	6,14	
CR 74 CL 60-23	7	San Germán	12/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 74 CL 60 - 20	7	San Germán	15/12/2025	Procopal				6,70	6,70	
CL 73 CR 72 A-64	7	La Pilarica	16/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CL 73 CR 72 A	7	La Pilarica	12/17/2025	Procopal				6,70	6,70	
CL 73 CR 72 A 36	Robledo	La Pilarica	18/12/2025	Procopal				6,72	6,72	
CL 73 CR 72 A 80	7	La Pilarica	19/12/2025	Procopal				5,63	5,63	
										45,27
FRENTE DE OBRA N°5										
CL 61 CR 51D-57	10	Jesús Nazareno	11/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CL 61 CR 51D-85	10	Jesús Nazareno	12/12/2025	Procopal				5,69	5,69	
CR 52 CL 64-19	10	Jesús Nazareno	15/12/2025	Procopal				5,61	5,61	
CR 45 CL 46-60	10	Barrio Colon	16/12/2025	Procopal				5,65	5,65	
CR 52 CL 13A SUR-61	15	La Colina	17/12/2025	Procopal				5,62	5,62	
CR 28 CL 107-157	1	Santo Domingo Savio No.2	18/12/2025	Procopal				5,64	5,64	
CR 52 CL 10-190 +59.00m	15	Campo Amor	19/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
										39,35
FRENTE DE OBRA N°6										
CL 52 CR 10-16	8	Las Estancias	11/12/2025	Procopal				6,67	6,67	
CL 52 CR 10 a	8	Las Estancias	12/12/2025	Procopal				6,67	6,67	
CL 52 CR 11-57	8	Las Estancias	16/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CL 52 CL 9-41	8	Las Estancias	16/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CL 52 CR12-60	8	Las Estancias	17/12/2025	Procopal				6,74	6,74	
CL 52 CR13-69	8	Las Estancias	18/12/2025	Procopal				6,67	6,67	
CL 52 CR 15A-14	8	Las Estancias	19/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
										46,79

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Mad Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

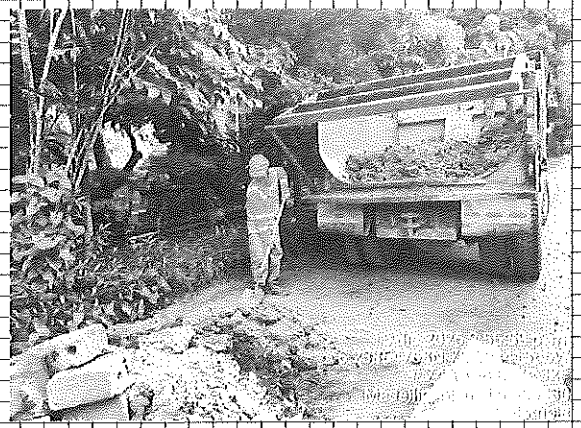




LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°7										
CL 27A CR 80	16	La Palma	11/12/2025	Procopal				6,11	6,11	
CR 74 CL 27 - 88	16	Granada	12/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CL 111B CR 63 - 24	5	Hector Abad Gómez	15/12/2025	Procopal				6,71	6,71	
CL 27A CR 78A - 51	16	La Palma	16/12/2025	Procopal				6,70	6,70	
CL 13C Sur CR 53	15	La Colina	17/12/2025	Procopal				6,72	6,72	
CL 111 B CR 63 - 50	5	Hector Abad Gomez	18/12/2025	Procopal				6,13	6,13	
CR 75A CL 106B-40	6	Pedregal	19/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
										45,74
FRENTE DE OBRA N°8										
CR 51 CL 70A-15	4	San Pedro	11/12/2025	Procopal				6,68	6,68	
CR 45 CL 66-34	4	Manrique Central No.1	12/12/2025	Procopal				6,75	6,75	
CR 50A CL 70-14	4	San Pedro	15/12/2025	Procopal				6,71	6,71	
CR 50A CL 70-46	4	San Pedro	16/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 50A CL 106-90	2	La Francia	17/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CR 50A CL 70-64	4	San Pedro	18/12/2025	Procopal				5,02	6,68	
CL 27 CR 31-20	14	Colombia	19/12/2025	Procopal				6,71	6,71	
										45,60
FRENTE DE OBRA N°9										
CR 24 CL 56C-57	8	El Pinal	11/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
CR 25B CL 56A-20	8	El Pinal	12/12/2025	Procopal				6,12	6,12	
CR 24 CL 56C-16	8	El Pinal	15/12/2025	Procopal				6,12	6,12	
CR 24 CL 56C-04	8	El Pinal	16/12/2025	Procopal				5,63	5,63	
CR 23 CL 56BB-20	8	El Pinal	17/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CL 56B CR 22A-08	8	La Libertad	18/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR 25A CL 56-03	8	El Pinal	19/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
										41,26
FRENTE DE OBRA N°11										
CR 35 CL 77-21	3	El Raizal	11/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
CL 77 CR 35-29	3	El Raizal	12/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CR 43B CL 88-30	3	Las Granjas	15/12/2025	Procopal				6,13	6,13	
CR 43 CL 87-87	3	Las Granjas	16/12/2025	Procopal				6,11	6,11	
CL 84 CR 48-49	4	Campo Valdés No.1	17/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CR 43 CL 87-13	3	Las Granjas	18/12/2025	Procopal				6,13	6,13	
CL 84 CR 47-51	4	Campo Valdés No.1	19/12/2025	Procopal				6,73	6,73	
										41,81
FRENTE DE OBRA N°13										
CL 14 VIA VEREDA BARCINO + 4151 VIA VEREDA BARCINO + 4351	80	El Astillero	11/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	16/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	17/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	17/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CL 42A CR 21 CR 22A - 30	9	Cataluña	17/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	19/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	19/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	19/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
										31,12

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

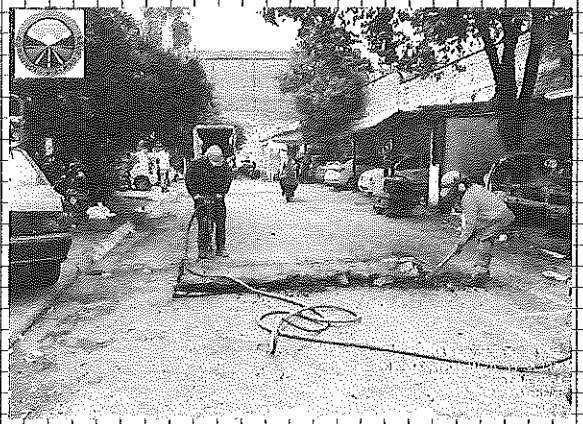




LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°14										
CQ4 CR73 11	11	Bolivariana	11/12/2025	Procopal				5,05	5,05	
CQ1 CR68 02	11	San Joaquín	12/12/2025	Procopal				5,57	5,57	
CL49 CR81A 36	12	Calasanz	15/12/2025	Procopal				5,64	5,64	
CR81 CL49F 16	12	Calasanz	16/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CL49A CR81 15	12	Calasanz	17/12/2025	Procopal				6,69	6,69	
CR81 CL49 37	12	Calasanz	18/12/2025	Procopal				5,58	5,58	
CR76 CL48C 84	12	Calasanz	19/12/2025	Procopal				5,59	5,59	
										40,61
FRENTE DE OBRA N°15										
CR 32 CL 59 Y CL 59A	8	Enciso	12/12/2025	Pavimentar				2,22	2,22	
CL 59 CR 35 Y CR 36	8	Enciso	15/12/2025	Pavimentar				1,67	1,67	
										3,89
FRENTE DE OBRA N°16										
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	11/12/2025	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				3,89	3,89	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Barrio Colombia	12/12/2025	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A CR 43A + 57	14	Perpetuo Socorro	15/12/2025	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 57 CR 43A + 117	14	Barrio Colombia	16/12/2025	Pavimentar				2,78	2,78	
										176,73
FRENTE DE OBRA N°17										
CR 28 CL 108E CL 109	1	Santo Domingo Savio No.2	15/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
CR 28 CL 108A CL 108C	1	La Avanzada	16/12/2025	Procopal				5,56	5,56	
										11,12

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025			HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°21										
CR 73 CL 30C CL 31A	16	Belén	11/12/2025	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 73 CL 30C CL 31A	16	Belén	12/12/2025	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 73 CL 31A CL 32	16	Belén	16/12/2025	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 73 CL 32 CL 32A	16	Belén	17/12/2025	Pavimentar				8,33	8,33	
										33,32
FRENTE DE OBRA N°23										
CR 53 CL 67 CL 67 + 200	10	Jesús Nazareno	11/12/2025	Pavimentar				5,56	5,56	
CR 53 CL 67 CL 67 + 200	10	Jesús Nazareno	12/12/2025	Pavimentar				5,56	5,56	
CR 53 CL 71 Y CL 75	4	Sevilla	15/12/2025	Pavimentar				3,89	3,89	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	16/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	18/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	19/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CR 53 CL 70 Y CL 71	4	Sevilla	22/12/2025	Procopal				3,89	3,89	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	23/12/2025	Procopal				2,78	2,78	
										33,36

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Angel Saldarriaga Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	703,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	703,80
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	7109,74
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7813,54
TOTAL POR EJECUTAR	6,46

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	1.6.1	DESCRIPCION	Diseño estructural de pavimentos, Incluye: Exploración de campo, ejecución de apiques, ensayos de laboratorio, exploración con georadar y evaluación de deflexiones con FWD, analisis estructural y diseños necesarios.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

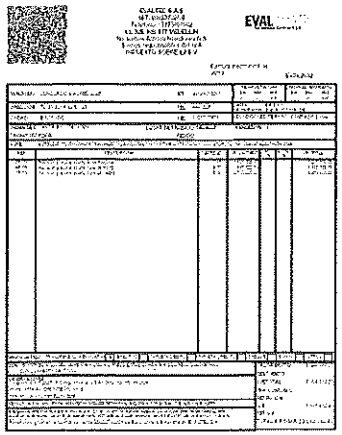

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
Revisión y ajuste diseños avenida regional, Calle 30 entre carrera 53 y 70 y Calle29.					3,75					3,75

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	3,75
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,75
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	139,75
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	143,50
TOTAL POR EJECUTAR	216,06

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2026	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025		ACTA Nº	6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.1.6	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

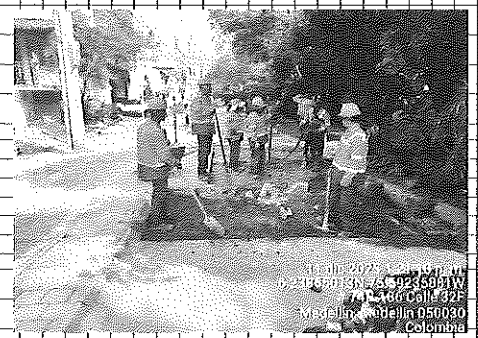

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Bache/ Sit&cora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 10 A CR 41A	14	El Poblado	1/12/2025	3,80	0,15	0,30	0,57	0,17	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	0,15	3,00	0,35	0,45	0,16	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	0,15	3,00	0,35	0,45	0,16	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	0,15	3,00	0,35	0,45	0,16	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	0,15	3,00	0,35	0,45	0,16	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	0,15	3,00	0,35	0,45	0,16	
										0,97
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CL 10 A CR 38	14	El Poblado	02/12/2025	4,80	0,10	0,20	0,48	0,10	
NA	CL 10 A CR 38	14	El Poblado	02/12/2025	0,65	0,15	0,45	0,10	0,04	
NA	CL 10 A CR 38	14	El Poblado	02/12/2025	0,48	0,15	0,45	0,07	0,03	
NA	CL 10 A CR 37-8	14	El Poblado	03/12/2025	2,20	0,15	0,45	0,33	0,15	
NA	CL 10 A CR 42	14	El Poblado	08/12/2025	6,60	0,15	0,45	0,99	0,45	
NA	CL 10 A CR 42	14	El Poblado	08/12/2025	7,10	0,15	0,45	1,07	0,48	
Pompeyano	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	09/12/2025	21,20	0,15	0,45	3,18	1,43	
Pompeyano	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	09/12/2025	21,20	0,12	0,20	2,54	0,51	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	15/12/2025	3,00	0,20	0,30	0,60	0,60	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025	19,63	0,15	0,45	2,94	1,33	
										5,12
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CR 21 CL 59 Y CL 59A	6	Los Mangos	11/11/2025	7,00	3,71	0,22	25,97	5,71	
NA	CR 21 CL 59 Y CL 59A	6	Los Mangos	11/11/2025	0,36	3,81	0,22	1,30	0,29	
NA	CR 21 CL 59 Y CL 59A	6	Los Mangos	11/11/2025	0,36	3,65	0,23	1,31	0,30	
										6,30

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andres Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	12,39
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	12,39
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	139,75
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	152,14
TOTAL POR EJECUTAR	208,42

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.1.7	DESCRIPCION	Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10										
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	2,60	3,00		7,80	7,80	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	2,35	3,00		7,05	7,05	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	2,40	3,00		7,20	7,20	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	11/12/2025	2,55	3,00		7,65	7,65	
										29,70

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	29,70
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	29,70
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	235,81
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	265,51
TOTAL POR EJECUTAR	434,49

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.045
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.1.8	DESCRIPCION	Desmonte y reinstalación de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	FORMULA:				UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,18		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10										
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	16/12/2025	2,34	2,98		6,97	6,97	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	16/12/2025	2,40	1,65		3,96	3,96	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	16/12/2025	2,33	1,72		4,01	4,01	
Pompeyano	DG 75 B x TV 32BB	16	El Nogal - Los almendros	17/12/2025	4,10	3,70		15,17	15,17	
										30,11
FRENTE DE OBRA N°18										
Pompeyano	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	09/12/2025	12,50	3,60		45,00	45,00	
										46,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	75,11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	75,11
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	603,13
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	678,24
TOTAL POR EJECUTAR	-75,11

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026		VALOR	$		49.254.900.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025			HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	2.2.1	DESCRIPCION	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botado del material.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 10 A CR 41A	14	El Poblado	1/12/2025	3,80	0,05	0,15	0,19	0,03	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	12/12/2025	0,90	3,00	0,12	29,70	3,56	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	12/12/2025	0,85	3,70	0,12	3,15	0,38	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	12/12/2025	0,15	3,70	0,15	0,56	0,08	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	12/12/2025	0,30	3,45	0,12	1,04	0,12	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	12/12/2025	0,15	3,45	0,15	0,52	0,08	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	2,34	2,08	0,02	6,97	0,14	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	2,40	1,55	0,02	3,56	0,08	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	2,33	1,72	0,02	4,01	0,08	
Pompeyano	DG 75 B x TV 32BB	16	El Nogal - Los almendros	17/12/2025	4,10	3,70	0,03	15,17	0,46	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025	7,50	0,30	0,35	2,25	0,79	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025	7,50	0,20	0,10	1,50	0,15	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025	16,50	0,30	0,20	4,95	0,99	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025	16,50	0,20	0,10	3,30	0,33	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	5,40	0,30	0,19	1,62	0,31	
NA	CL50A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	5,40	0,20	0,10	1,08	0,11	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	10,80	0,30	0,20	3,24	0,65	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	10,80	0,20	0,10	2,16	0,22	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	2,57	3,90	0,10	10,02	1,00	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	9,65	1,10	0,09	10,62	0,64	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	2,37	1,10	0,10	2,61	0,26	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	0,15	1,10	0,15	0,17	0,02	
										10,48
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CL 10 A CR 42	14	El Poblado	3/12/2025	8,30	0,35	0,10	2,91	0,29	
NA	CL 10 A CR 38	14	El Poblado	4/12/2025	0,88	0,23	0,26	0,20	0,05	
Pompeyano	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No 1	10/12/2025	21,20	0,14	0,30	2,97	0,89	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No 1	15/12/2025	3,00	0,20	0,30	0,60	0,18	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No 1	17/12/2025	7,70	0,25	0,35	1,93	0,67	
										2,08
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	9/12/2025	50,20	0,30	0,28	15,06	4,22	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	10/12/2025	40,35	0,30	0,28	12,11	3,39	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025	28,00	0,30	0,28	8,40	2,35	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025	17,15	0,30	0,28	5,15	1,44	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	3,35	0,30	0,28	1,01	0,28	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025			0,08	0,00	0,03	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	8,20	0,91	0,09	7,46	0,60	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	8,20	0,25	0,20	2,05	0,41	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	19/12/2025	13,20	3,63	0,05	47,92	2,40	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	19/12/2025			0,05	0,00	0,05	
										15,17

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Salamanca
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	27,73
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	27,73
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	178,09
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	205,82
TOTAL POR EJECUTAR	-27,73

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.908.048
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial o infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025			HASTA	31/12/2025			ACTA Nº	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		

ITEM	2.2.4	DESCRIPCION	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 96% del ensayo Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACION					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
M Bache Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA Nº16										
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025	20	0,23	0,2	4,60	0,92	
NA	CR 42B CL110A-26	1	Santo Domingo Savio No.1	17/12/2025	7,7	0,25	0,35	1,93	0,67	
										1,59
FRENTE DE OBRA Nº19										
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	8,40	1,56	0,10	13,10	1,31	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	-1,41	1,00	0,10	-1,41	-0,14	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	8,04	1,58	0,10	12,70	1,27	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025			0,10	0,00	-0,16	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025			0,10	0,00	0,41	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025			0,10	0,00	0,62	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	3,42	4,00	0,10	13,68	1,37	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	3,59	1,90	0,10	6,82	0,68	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	-0,70	0,40	0,10	-0,28	-0,03	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025			0,10	0,00	0,05	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	8,10	1,42	0,10	11,50	1,15	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025	1,63	1,41	0,05	2,30	0,11	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025	3,10	0,64	0,05	1,98	0,10	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025	1,64	0,47	0,05	0,72	0,04	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025	1,54	0,80	0,05	1,23	0,06	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025	1,50	0,82	0,05	1,23	0,06	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025	3,64	0,64	0,05	2,33	0,12	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025		-0,07	0,05	0,00	-0,01	
NA	CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	02/12/2025	7,34	1,26	0,05	9,25	0,46	
NA	CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	02/12/2025	7,01	1,70	0,08	11,92	0,95	
NA	CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	02/12/2025	3,05	1,56	0,08	4,76	0,38	
NA	CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	02/12/2025	7,22	1,45	0,08	10,47	0,84	
NA	CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	02/12/2025	2,90	0,09	0,08	0,26	0,02	
NA	CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	02/12/2025	3,26	1,40	0,08	4,55	0,37	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	02/12/2025	3,25	2,49	0,08	8,09	0,64	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	02/12/2025	1,67	2,69	0,08	4,33	0,35	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	02/12/2025		-0,07	0,08	0,00	-0,01	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	2,30	1,56	0,09	3,59	0,32	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	2,31	1,50	0,09	3,47	0,31	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	12,99	1,48	0,09	19,23	1,73	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	5,91	1,47	0,10	8,69	0,87	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	5,17	1,63	0,10	8,43	0,84	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	3,31	1,70	0,10	5,63	0,56	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026		VALOR	$	49.254.906.040
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025		ACTA N°	6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.2.4	DESCRIPCION	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 98% del ensaye Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será lomada en sitio ya compactado.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	3,80	0,74	0,10	2,81	0,28	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	0,74	0,46	0,10	0,34	0,03	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	0,92	1,70	0,10	1,56	0,16	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	03/12/2025	9,40	0,60	0,08	5,64	0,45	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	05/12/2025	4,26	2,70	0,10	11,50	1,15	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	2,40	1,16	0,05	2,78	0,14	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	6,45	0,88	0,05	5,68	0,28	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	0,50	0,07	0,05	0,49	0,02	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	1,15	0,74	0,05	0,85	0,04	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	2,30	0,97	0,05	2,23	0,11	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	0,28		0,05	0,00	0,01	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	4,50	0,30	0,05	1,35	0,07	
NA	CL 10A CR 40-67	14	El Poblado	05/12/2025	0,90	0,30	0,05	0,27	0,01	
NA	CL 10A CR 41A-09	14	El Poblado	05/12/2025	9,50	1,78	0,05	11,57	0,59	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	05/12/2025	-0,80	0,80	0,05	-0,64	-0,03	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	05/12/2025	3,79	2,59	0,08	9,82	0,79	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	05/12/2025	1,12	0,60	0,08	0,67	0,05	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	05/12/2025	-0,80	0,60	0,08	-0,48	-0,04	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	05/12/2025	-0,50	0,50	0,08	-0,25	-0,02	
NA	CL 10A CR 42	14	El Poblado	05/12/2025	-1,48	0,60	0,08	-0,88	-0,07	
NA	CL 10A CR 42	14	El Poblado	05/12/2025	7,90	1,00	0,08	7,90	0,63	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	3,65	0,36	0,05	1,31	0,07	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	8,2	0,25	0,1	2,05	0,21	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	8,2	0,91	0,08	7,46	0,60	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025			0,08		0,03	
										21,19

ELABORÓ

Juan Guillermo Restrepo
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Castaño Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Bedoya
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	22,78
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	22,78
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	118,02
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	140,80
TOTAL POR EJECUTAR	69,20

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.048			
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025					HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.2.5	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de ARENILLA compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Su medida será en sitio.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	4,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



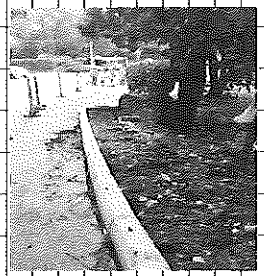

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°4										
NA	CR 64B CL 75-22	5	Caribe	26/11/2025					0,19	
										0,19
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025					2,43	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	12/12/2025					1,23	
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025					0,06	
										3,72

SUBTOTAL ESTA HOJA	3,91
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,91
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1,21
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5,12
TOTAL POR EJECUTAR	44,88

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra


Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046			
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	2.2.7	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:		UNIDAD	m3-km	FRENTE DE OBRA	10,18,19				

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

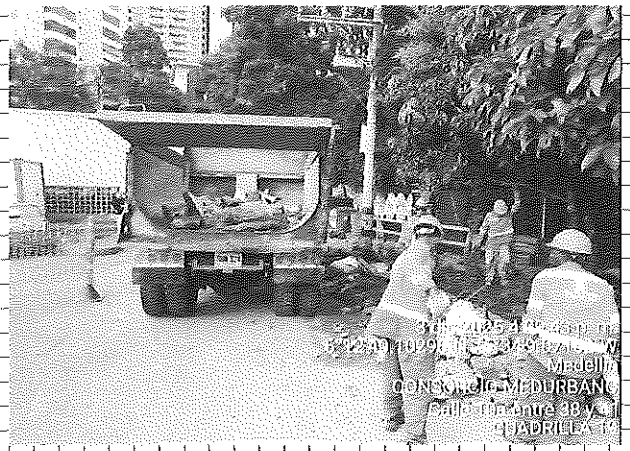

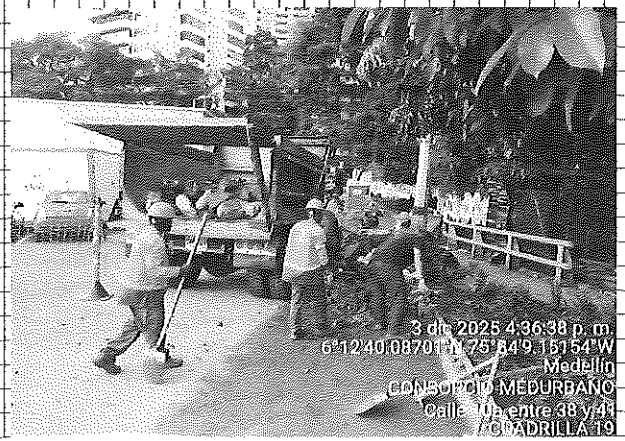

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°10										
CL 10 A CR 41A	14	El Poblado	1/12/2025					0,23	0,23	
CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	12/12/2025					7,28	7,28	
CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025					1,53	1,53	
CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025					1,90	1,90	
CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025					1,29	1,29	
										12,23
FRENTE DE OBRA N°18										
CL 10 A CR 36	14	El Poblado	2/12/2025					0,17	0,17	
CL 10 A CR 40-07	14	El Poblado	3/12/2025					2,23	2,23	
CL 10 A CR 38	14	El Poblado	4/12/2025					0,05	0,05	
CL 10 A CR 39	14	El Poblado	4/12/2025					29,54	29,54	
CL 10 A CR 42	14	El Poblado	6/12/2025					1,14	1,14	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	9/12/2025					1,94	1,94	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	15/12/2025					0,36	0,36	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025					1,78	1,78	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	17/12/2025					0,67	0,67	
										37,88
FRENTE DE OBRA N°19										
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	9/10/2025					2,18	2,18	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	14/10/2025					0,36	0,36	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	14/10/2025					4,64	4,64	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	15/10/2025					0,78	0,78	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	16/10/2025					5,55	5,55	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	17/10/2025					4,96	4,96	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	31/10/2025					3,06	3,06	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	8/11/2025					21,85	21,85	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	11/11/2025					6,30	6,30	
CL 10A CR 40 Y CR 44	14	El Poblado	12/11/2025					2,50	2,50	
CL 10A CR 40 Y CR 44	14	El Poblado	13/11/2025					3,46	3,46	
CL 10A CR 40 Y CR 44	14	El Poblado	19/11/2025					2,58	2,58	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025					5,38	5,38	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025					6,32	6,32	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025					5,94	5,94	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025					4,03	4,03	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025					3,27	3,27	
CL10 A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025					5,56	5,56	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	10/12/2025					7,61	7,61	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025					3,79	3,79	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025					0,28	0,28	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.048			
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025						ACTA N°	6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	2.2.7	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:				UNIDAD	m3-km	FRENTE DE OBRA	10,18,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:	
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra		
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoria	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoria	SUBTOTAL ESTA HOJA	154,02
		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	154,02
		TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	171,28
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	325,28
		TOTAL POR EJECUTAR	437,72

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026		VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025				ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	2.2.8	DESCRIPCION	Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	FORMULA:				UNIDAD	m3-km	FRENTE DE OBRA	19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°19										
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	9/10/2025					2,18	2,18	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	14/10/2025					0,36	0,36	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	14/10/2025					4,64	4,64	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	15/10/2025					0,78	0,78	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	16/10/2025					5,55	5,55	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	17/10/2025					4,96	4,96	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	18/10/2025					0,94	0,94	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	24/10/2025					16,32	16,32	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	25/10/2025					0,02	0,02	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	31/10/2025					3,06	3,06	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	1/11/2025					3,14	3,14	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	6/11/2025					26,52	26,52	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	8/11/2025					21,85	21,85	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	10/11/2025					0,20	0,20	
CR 21 CL 59 Y CL 59A	8	Los Mangos	11/11/2025					6,30	6,30	
CR 84C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	6/12/2025					28,50	28,50	
										125,32

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

María Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	125,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	125,32
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	25,67
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	150,99
TOTAL POR EJECUTAR	21213,01

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026		VALOR	$		49.254.906.045
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025			HASTA	31/12/2025		ACTA N°		6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.3.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.		FORMULA:			UNIDAD	kg	FRENTE DE OBRA		10,19	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad




	LOCALIZACION				DIMENSIONES					
Id Bachas Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	243,39				243,39	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	3,78				3,78	
										247,17
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	39,85				39,85	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	23/12/2025	173,2				173,20	
										213,05

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:	
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Mónica Calderón Vásquez Director de Obra		
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría	SUBTOTAL ESTA HOJA	459,22
		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	459,22
		TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	5763,30
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6222,52
		TOTAL POR EJECUTAR	-459,22

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025			HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.4.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todo los demás elementos necesario para su correcta construcción. Curado con Antisol.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

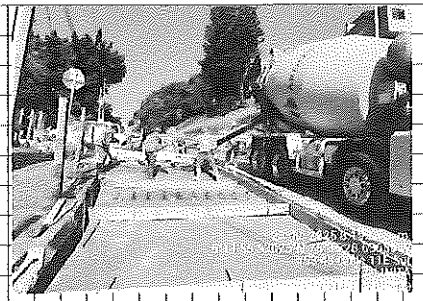

LOCALIZACION					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°16										
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	10,20	3,00	0,20	30,60	6,12	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	2,00	3,80	0,20	7,60	1,52	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	0,15	3,70	0,15	0,56	0,08	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	2,00	3,75	0,20	7,50	1,50	
Pompeyano	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	0,15	3,45	0,15	0,52	0,08	
										9,30
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	23/12/2025	12,35	3,92	0,20	48,41	9,68	
										9,68

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Carlos Andrés Angel Santamaría Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	19,98
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	19,98
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	133,66
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	152,64
TOTAL POR EJECUTAR	127,46

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026			VALOR	$	49.254.908.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial o infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025		ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona	

ITEM	2.4.3	DESCRIPCION	Suministro, transporte y aplicación de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos. Aplica para concretos premezclados o realizados en obra. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de aplicación, de manejo, de almacenamiento dadas por el productor. Se pagará por m3 de concreto con aditivo colocado en obra.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

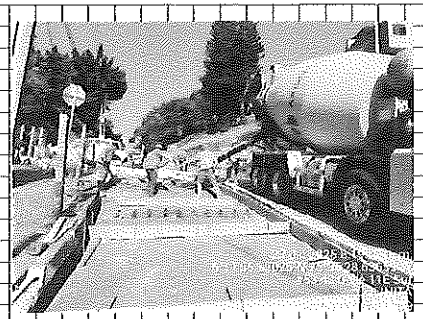

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Bachee Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
Pompeyano	CL 32F CR 74B-170	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025				0,00	0,30	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025				0,00	1,00	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	9,65	1,10	0,10	10,62	1,00	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025				0,00	0,28	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025				0,00	0,03	
										11,67
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025	10,20	0,23	0,10	2,35	0,23	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	17/12/2025	5,60	0,23	0,10	1,27	0,13	
										0,36
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025					5,30	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025	3,42	4,00	0,05	13,68	0,62	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	01/12/2025				0,00	6,09	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	04/12/2025				0,00	21,75	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Calma	23/12/2025					9,68	
										44,42

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	66,45
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	66,45
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	162,90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	209,35
TOTAL POR EJECUTAR	-66,45

COD. FO-GEOP-020	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025			HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	2.5.1	DESCRIPCION	Realce de caja válvula de compuerta incluye tapa polimérica.		FORMULA:			UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA		19	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACION				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	1,00				1,00	
									1,00

ELABORÓ

Juan Gustavo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra


Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,00
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°	8 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	2.5.2	DESCRIPCION	Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente y todo lo necesario para su correcta construcción.			FORMULA:				UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	10

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
	FRENTE DE OBRA N°10									
	CL 32F CR 74B-176	16	El Nogal Los Almendros	15/12/2025	1,00				1,00	
										1,00

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:	
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra		
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Angel Saldarriaga Director de Interventoría	SUBTOTAL ESTA HOJA	1,00
		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
		TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,00
		TOTAL POR EJECUTAR	3,00

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.908.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA Nº		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.5.7	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM.	FORMULA:		UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	12		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
FRENTE DE OBRA N°12									
CL 10A CR 36	14	El Poblado	02/12/2025	1,00				1,00	
CL 10A CR 37	14	El Poblado	03/12/2025	4,00				4,00	
CL 10A CR 38	14	El Poblado	04/12/2025	4,00				4,00	
									9,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	9,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	9,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	7,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	16,00
TOTAL POR EJECUTAR	-9,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	3.1.1	DESCRIPCION	Demolición de anden existente e=8-10 cm. No incluye retiro de entresuelo. El cargue y botada de material resultante de la demolición se pagará en ítem independiente.	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,16,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



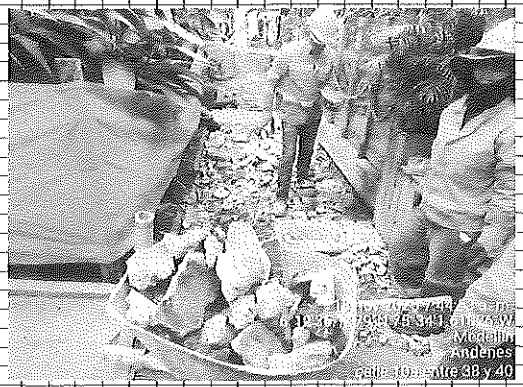


LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10									
CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	9,65	1,10	0,04	10,62	10,62	
									10,62
FRENTE DE OBRA N°18									
CL 10 A CR 42	14	El Poblado	3/12/2025	8,30	0,65	0,10	5,40	5,40	
CL 10 A CR 40-07	14	El Poblado	3/12/2025	13,90	0,90	0,10	12,51	12,51	
CL 10 A CR 42	14	El Poblado	6/12/2025	2,98	0,74		2,21	2,21	
									20,12
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,40	1,56		13,10	13,10	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	-1,41	1,00		-1,41	-1,41	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,04	1,58		12,70	12,70	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				-1,61	-1,61	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				4,05	4,05	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				6,25	6,25	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	3,42	4,00		13,68	13,68	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	3,59	1,90		6,82	6,82	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	-0,70	0,40		-0,28	-0,28	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				0,50	0,50	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025	1,63	1,41		2,30	2,30	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	3,10	0,64		1,98	1,98	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,54	0,47		0,72	0,72	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,54	0,80		1,23	1,23	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,50	0,82		1,23	1,23	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	3,64	0,64		2,33	2,33	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025		-0,07		-0,07	-0,07	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	7,34	1,26		9,25	9,25	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	7,01	1,70		11,92	11,92	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	3,05	1,56		4,76	4,76	
CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	2/12/2025	7,22	1,45		10,47	10,47	
CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	2/12/2025	2,90	0,09		0,26	0,26	
CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	2/12/2025	3,26	1,40		4,56	4,56	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025	3,25	2,46		8,00	8,00	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025	1,67	2,59		4,33	4,33	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025		-0,07		-0,07	-0,07	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	2,30	1,56		3,59	3,59	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	2,31	1,50		3,47	3,47	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	12,99	1,48		19,23	19,23	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	5,91	1,47		8,69	8,69	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	5,17	1,63		8,43	8,43	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	3,31	1,70		5,63	5,63	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	3,80	0,74		2,81	2,81	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	0,74	0,46		0,34	0,34	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	0,92	1,70		1,56	1,56	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	9,40	0,60		5,64	5,64	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,76	2,02		5,58	5,58	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025				1,41	1,41	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	3.1.1	DESCRIPCION	Demolición de anden existente e=8-10 cm. No incluye retiro de entresuelo. El cargue y botada de material resultante de la demolición se pagará en ítem independiente.	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,18,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

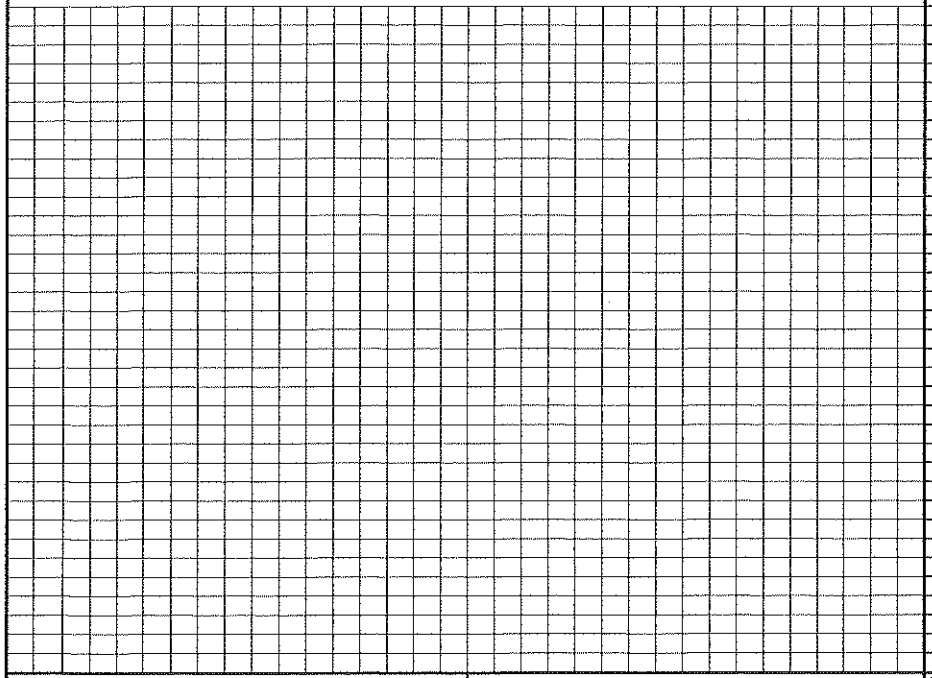

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,61	1,88		4,91	4,91	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025				0,93	0,93	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025				1,00	1,00	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	19,47	1,34		26,09	26,09	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,01	0,20		0,40	0,40	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,95	1,57		4,63	4,63	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,50	1,18		2,95	2,95	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	6,50	2,00		13,00	13,00	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	3,60	0,70		2,52	2,52	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,41	0,10		0,24	0,24	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	1,89	0,61		1,15	1,15	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	3,61	1,31		4,73	4,73	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,50	0,51		1,28	1,28	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	1,90	0,81		1,54	1,54	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,35	0,10		0,24	0,24	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	4,50	0,10		0,45	0,45	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	2,40	1,16		2,78	2,78	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	6,45	0,88		5,68	5,68	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	0,50	0,97		0,49	0,49	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	1,15	0,74		0,85	0,85	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	2,30	0,97		2,23	2,23	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	0,28			0,28	0,28	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	4,50	0,30		1,35	1,35	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	0,90	0,30		0,27	0,27	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	3,40	0,30		1,02	1,02	
CL 10A CR 40-07	14	El Poblado	5/12/2025	3,40	0,30		1,02	1,02	
CL 10A CR 41 A-09	14	El Poblado	5/12/2025	6,50	1,78		11,57	11,57	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	3,79	2,59		9,82	9,82	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	1,12	0,60		0,67	0,67	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	-0,80	0,60		-0,48	-0,48	
CL 10A CR 42	14	El Poblado	5/12/2025	-0,50	0,50		-0,25	-0,25	
CL 10A CR 42	14	El Poblado	5/12/2025	-1,46	0,60		-0,88	-0,88	
CL 10A CR 42	14	El Poblado	5/12/2025	7,90	1,00		7,90	7,90	
CL10 A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	4,26	2,70		11,50	11,50	
									305,26

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	336,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	336,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	385,62
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	721,62
TOTAL POR EJECUTAR	-336,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	3.1.2	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	18		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°18									
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025	19,63	0,10	0,23	1,96	0,45	
								0,00	
								0,00	
									0,45

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	0,45
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,45
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0,45
TOTAL POR EJECUTAR	75,55

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

												HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026				VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.														
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025				ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vielmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:					Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	3.1.4	DESCRIPCION	Demolición y retiro de sumideros de cualquier tipo. La disposición de la rejilla será autorizada por la interventoría por ser propiedad de EPM. Incluye recuperación del material aprovechable.		FORMULA:				UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	12			

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
	FRENTE DE OBRA N°12									
	CL 10A CR 36	14	El Poblado	2/12/2025	1,00				1,00	
	CL 10A CR 37	14	El Poblado	3/12/2025	4,00				4,00	
	CL 10A CR 38	14	El Poblado	4/12/2025	4,00				4,00	
										9,00


ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría	


SUBTOTAL ESTA HOJA	9,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	9,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	9,00
TOTAL POR EJECUTAR	-9,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	3.2.4	DESCRIPCION	Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	FORMULA:		UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	19				

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19									
CR 84C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	8,62				8,62	
								0,00	
								0,00	
									8,62

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	8,62
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	8,62
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8,62
TOTAL POR EJECUTAR	81,38

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	3.2.5	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de bordito prefabricado de 15 x 45 x 80 cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, tres caras. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega y todo lo necesario para su correcta instalación.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

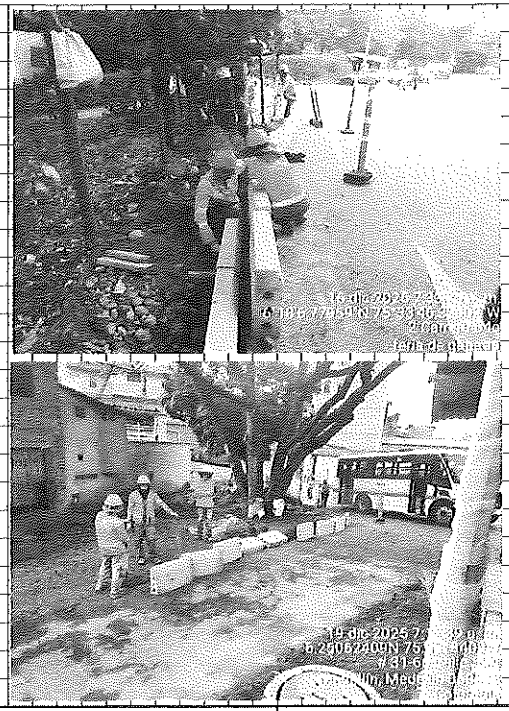

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10									
CL 10 A CR 41A	14	El Poblado	01/12/2025	3,80				3,80	
CL 10 A CR 42	14	El Poblado	06/12/2025	13,70				13,70	
CL 10 A CR 42	14	El Poblado	06/12/2025	13,70				13,70	
CL59A CR 31	8	Enciso	19/12/2025	24,00				24,00	
CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	16,20				16,20	
									71,40
FRENTE DE OBRA N°18									
CL 10 A CR 36	14	El Poblado	02/12/2025	0,65				0,65	
CL 10 A CR 36	14	El Poblado	02/12/2025	0,48				0,48	
CL 10 A CR 37-8	14	El Poblado	03/12/2025	2,20				2,20	
CL 10 A CR 38	14	El Poblado	04/12/2025	0,82				0,82	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	11/12/2025	8,00				8,00	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	12/12/2025	12,00				12,00	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	17/12/2025	3,30				3,30	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	17/12/2025	11,57				11,57	
									39,02
FRENTE DE OBRA N°19									
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	10/12/2025	35,00				35,00	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025	15,00				15,00	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	11/12/2025	40,60				40,60	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	12/12/2025	27,75				27,75	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	16/12/2025	3,35				3,35	
CR 64C CL 111B +90	5	Plaza de ferias	17/12/2025	17,15				17,15	
									138,85

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	249,27
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	249,27
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	419,65
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	668,92
TOTAL POR EJECUTAR	-249,27


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°			6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	3.2.6	DESCRIPCION	Construcción de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De acuerdo a diseño y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10									
CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	1,83	0,15	0,10	0,27	0,03	
									0,03

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoria

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	0,03
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,03
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,76
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0,79
TOTAL POR EJECUTAR	5,21

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	3.2.11	DESCRIPCION	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	FORMULA:			UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	19	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	04/12/2025	25,60				25,60	
									25,60

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	25,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	25,60
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	25,60
TOTAL POR EJECUTAR	-5,60


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	3.2.12	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquin de 10x20x6 cm,color según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10									
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	04/12/2025	23,69				23,69	
									23,69

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	23,69
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	23,69
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	23,69
TOTAL POR EJECUTAR	176,31

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°			6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	3.2.13	DESCRIPCION	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolitico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10									
CL 10 A CR 42	14	El Poblado	09/12/2025	2,97	0,74	0,10	2,20	0,22	
CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	2,57	3,90	0,10	10,02	1,00	
CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	9,65	1,10	0,10	10,62	1,06	
CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	2,37	1,10	0,10	2,61	0,26	
CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	0,15	1,10	0,15	0,17	0,02	
									2,56
FRENTE DE OBRA N°18									
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	16/12/2025	10,20	0,23	0,10	2,35	0,23	
CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No.1	17/12/2025	5,50	0,23	0,10	1,27	0,13	
									0,36
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	3,42	4,00	0,05	13,68	0,62	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	3,59	4,06	0,15	14,58	2,19	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,40	1,62	0,15	13,61	2,04	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,04	1,60	0,10	12,86	1,29	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,65	1,33	0,10	2,19	0,22	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,20	0,55	0,10	0,66	0,07	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,70	1,01	0,10	1,72	0,17	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,10	1,42	0,10	11,50	1,15	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,85	0,11	0,10	0,20	0,02	
CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	-8,10	0,20	0,10	-1,62	-0,16	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,63	1,41	0,10	2,30	0,23	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	3,10	0,64	0,10	1,98	0,20	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,54	0,47	0,10	0,72	0,07	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	3.2.13	DESCRIPCION	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,64	0,80	0,10	1,23	0,12	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,50	0,82	0,10	1,23	0,12	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	3,64	0,64	0,10	2,33	0,23	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025		-0,07	0,10	0,00	-0,01	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	7,34	1,26	0,10	9,25	0,92	
CL 10A CR 41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	-7,34	0,20	0,10	-1,47	-0,15	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	7,01	1,70	0,10	11,92	1,19	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	3,05	1,56	0,15	4,76	0,71	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	7,22	1,45	0,10	10,47	1,05	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	2,90	0,09	0,10	0,26	0,03	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	3,26	1,40	0,15	4,56	0,68	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	3,25	2,46	0,15	8,00	1,20	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	1,67	2,59	0,10	4,33	0,43	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025		-0,07	0,10	0,00	-0,01	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	2,30	1,56	0,10	3,59	0,36	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	2,31	1,50	0,10	3,47	0,35	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	12,99	1,48	0,10	19,23	1,92	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	3/12/2025	5,91	1,47	0,10	8,69	0,87	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	3/12/2025	5,17	1,63	0,10	8,43	0,84	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	3/12/2025	3,31	1,70	0,15	5,63	0,84	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	3/12/2025	3,80	0,74	0,15	2,81	0,42	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	3/12/2025	0,74	0,46	0,15	0,34	0,05	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	3/12/2025	0,10	11,08	0,20	1,11	0,22	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	3/12/2025	0,92	1,70	0,15	1,56	0,23	
CL 10 A 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	9,40	0,60	0,15	5,64	0,85	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	4,26	2,70	0,15	11,50	1,73	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026		VALOR	$	49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025		ACTA N°	6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	3.2.13	DESCRIPCION	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

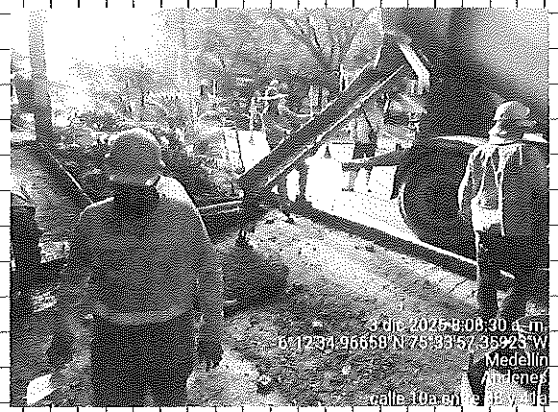

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	2,40	1,16	0,15	2,78	0,42	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	6,45	0,88	0,15	5,68	0,85	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	0,50	0,97	0,15	0,49	0,07	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	1,15	0,74	0,15	0,85	0,13	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	2,30	0,97	0,15	2,23	0,33	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	0,28		0,15	0,00	0,04	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	4,50	0,30	0,15	1,35	0,20	
CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	0,90	0,30	0,15	0,27	0,04	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	5/12/2025	3,40	0,30	0,13	1,02	0,13	
CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	5/12/2025	3,40	0,30	0,13	1,02	0,13	
CL 10A CR 41A-09	14	El Poblado	5/12/2025	6,50	1,78	0,10	11,57	1,16	
CL 10A CR 41A-09	14	El Poblado	5/12/2025	-6,50	0,20	0,10	-1,30	-0,13	
CL 10A CR 41A-09	14	El Poblado	5/12/2025	-0,80	0,80	0,10	-0,64	-0,06	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	3,79	2,59	0,15	9,82	1,47	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	1,12	0,60	0,15	0,67	0,10	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	0,80	0,60	0,10	0,48	0,10	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	0,50	0,50	3,00	0,25	0,08	
CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	-1,46	0,60	0,10	-0,88	-0,09	
CL 10A CR 42	14	El Poblado	5/12/2025	7,90	1,00	0,10	7,90	0,79	
									29,06

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	31,98
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	31,98
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	24,22
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	56,20

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	3.3.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	20/12/2025	2,57	3,90		10,02	10,02	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	9,65	1,10		10,62	10,62	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	2,37	1,10		2,61	2,61	
NA	CL59A CR 31	8	Enciso	22/12/2025	0,15	1,10		0,17	0,17	
										23,42
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,40	1,56		13,10	13,10	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	-1,41	1,00		-1,41	-1,41	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,04	1,58		12,70	12,70	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				-1,61	-1,61	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				4,05	4,05	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				6,25	6,25	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	3,42	4,00		13,68	13,68	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	3,59	1,90		6,82	6,82	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	-0,70	0,40		-0,28	-0,28	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025				0,50	0,50	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	3,59	4,06		14,58	14,58	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,40	1,62		13,61	13,61	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,04	1,60		12,86	12,86	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,65	1,33		2,19	2,19	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,20	0,55		0,66	0,66	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,70	1,01		1,72	1,72	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	8,10	1,42		11,50	11,50	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	1,65	0,11		0,20	0,20	
NA	CL 10A CR 40-28	14	El Poblado	1/12/2025	-8,10	0,20		-1,62	-1,62	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025	1,63	1,41		2,30	2,30	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025	3,10	0,64		1,98	1,98	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,54	0,47		0,72	0,72	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,54	0,80		1,23	1,23	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	1,50	0,82		1,23	1,23	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	3,64	0,64		2,33	2,33	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025		-0,07		-0,07	-0,07	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	7,34	1,26		9,25	9,25	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	7,01	1,70		11,92	11,92	
NA	CL 10A CR41A-45	14	El Poblado	2/12/2025	3,05	1,56		4,76	4,76	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	15/01/2026			VALOR	$		40.254.006.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona					

ITEM	3.3.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

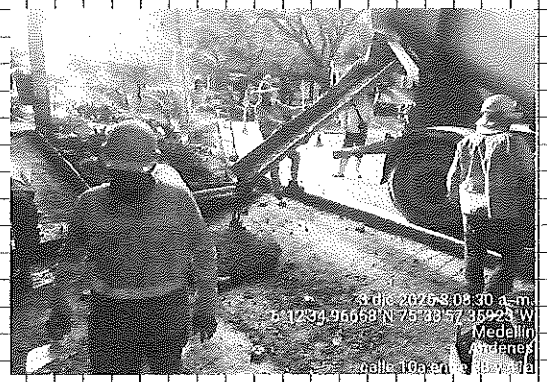



	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
NA	CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	7,22	1,45		10,47	10,47	
NA	CL 10A CR 41-08	14	El Poblado	2/12/2025	2,90	0,09		0,26	0,26	
NA	CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	2/12/2025	3,26	1,40		4,56	4,56	
NA	CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	2/12/2025	3,25	2,46		8,00	8,00	
NA	CL 10A CR 41-20	14	El Poblado	2/12/2025	1,67	2,59		4,33	4,33	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	2/12/2025		-0,07		-0,07	-0,07	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	2,30	1,56		3,59	3,59	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	2,31	1,50		3,47	3,47	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	12,99	1,48		19,23	19,23	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	5,91	1,47		8,69	8,69	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	5,17	1,63		8,43	8,43	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	3,31	1,70		5,63	5,63	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	3,80	0,74		2,81	2,81	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	0,74	0,46		0,34	0,34	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	0,92	1,70		1,56	1,56	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	3/12/2025	9,46	0,60		5,64	5,64	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,76	2,02		5,58	5,58	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025				1,41	1,41	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,61	1,88		4,91	4,91	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025				0,93	0,93	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025				1,00	1,00	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	19,47	1,34		26,09	26,09	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,01	0,20		0,40	0,40	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	6,50	2,00		13,00	13,00	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	4,26	2,70		11,50	11,50	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	2,40	1,16		2,78	2,78	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	6,45	0,88		5,68	5,68	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	0,50	0,97		0,49	0,49	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	1,15	0,74		0,85	0,85	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	2,30	0,97		2,23	2,23	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	0,28			0,28	0,28	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	4,50	0,30		1,35	1,35	
NA	CL 10A CR 26	14	El Poblado	5/12/2025	0,90	0,30		0,27	0,27	
NA	CL 10A CR 41A-09	14	El Poblado	5/12/2025	6,50	1,76		11,57	11,57	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	-0,80	0,80		-0,64	-0,64	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	3,79	2,59		9,82	9,82	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.264.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025		ACTA N°		5 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmad 2025		INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	3.3.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Bache o Sitio	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	1,12	0,60		0,67	0,67	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	-0,80	0,60		-0,48	-0,48	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	5/12/2025	-0,50	0,50		-0,25	-0,25	
NA	CL 10A CR 42	14	El Poblado	5/12/2025	-1,40	0,60		-0,88	-0,88	
NA	CL 10A CR 42	14	El Poblado	5/12/2025	7,90	1,00		7,90	7,90	
										338,65

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Cristina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría


OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	361,97
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	361,97
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	122,95
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	484,92
TOTAL POR EJECUTAR	-184,92

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		15/01/2026		VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	3.5.8	DESCRIPCION	Reparación de salida para abastos Ø = 1/2" (Incluye 2 mt de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluya cancha, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	FORMULA:			UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19			

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	4,00				4,00	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	1,00				1,00	
										5,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	5,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5,00
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$	49.254.908.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025		ACTA N°	6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	3.5.9	DESCRIPCION	Retiro de tubería Sanitaria de 4" incluye accesorios, para cambio de red de alcantarillado, con personal certificado de EPM. La excavación, demolición en caso de requerirse y la disposición final de material se pagarán en su ítem respectivo.	FORMULA:				UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	10,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 10A CR 40 - 55	14	El Poblado	11/11/2025	6,00				6,00	
										6,00
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	8,00				8,00	
										8,00

ELABORÓ

Joan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	14,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	14,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	14,00
TOTAL POR EJECUTAR	86,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025				HASTA	31/12/2025		ACTA N°		6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaima Cardona				
ITEM	3.6.10	DESCRIPCION	Reparación tubería de gas (diámetro 3/8") con personal certificado por EPM, incluye excavación, reparación, todo lo necesario para su correcto funcionamiento, lleno con material de prestamo y botada de escombros.	FORMULA:				UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	3,00				3,00	
										3,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3,00
TOTAL POR EJECUTAR	2,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	3.6.1	DESCRIPCION	Realce de medidores de acueducto. No incluye tapas ni reposicion de ningun elemento.	FORMULA:		UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19				

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,00				2,00	
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	4,00				4,00	
										6,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	6,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7,00
TOTAL POR EJECUTAR	13,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	3.6.3	DESCRIPCION	Realce de caja menor o igual a 60*60 cm.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	1,00				1,00	
										1,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,00
TOTAL POR EJECUTAR	3,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	3.6.4	DESCRIPCION	Realce de caja mayor a 60*80 cm y hasta 1.20*80 cm.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	2,00				2,00	
										2,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,00
TOTAL POR EJECUTAR	3,00


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.908.948	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	3.6.5	DESCRIPCION	Resice para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrejes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACION				DIMENSIONES					
Id Bachas Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	1,00				1,00	
NA	CR 42B CL110A-20	1	Santo Domingo Savio No 1	17/12/2025	1,00				1,00	
										2,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,00
TOTAL POR EJECUTAR	3,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026			VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025			ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	3.6.6	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalacion de tapa con dimension menor o igual a 60*60 cm.	FORMULA:			UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19			

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	6,00				6,00	
										6,00

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodríguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez Residente de Interventoría	Camilo Andrés Ángel Saldarriaga Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	6,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6,00
TOTAL POR EJECUTAR	-1,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046			
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)			
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona					
ITEM	3.6.7	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalacion de tapa con dimension mayor o igual a 60*80 cm y hasta 1.20*80 cm.	FORMULA:		UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA		19			

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 10A CR 40-70	14	El Poblado	4/12/2025	3,00				3,00	
										3,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoria

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3,00
TOTAL POR EJECUTAR	2,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.908.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	4.1.1	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	20

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 95 CR 68 Y CR 69	5	Castilla	11/12/2025	3,00	1,20		3,60	3,60	
CL 95 CR 68 Y CR 69	5	Castilla	11/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
CR 47 CL 52	10	La Candelaria	11/12/2025	1,00	22,11		22,11	22,11	
CL 5 SUR CR 37 Y CR 38	14	Alejandría	12/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 5 SUR CR 37 Y CR 38	14	Alejandría	12/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 5 SUR CR 38	14	Alejandría	12/12/2025	1,00	1,50		1,50	1,50	
CL 5 SUR CR 38	14	Alejandría	12/12/2025	1,00	1,20		1,20	1,20	
CL 5 SUR CL 5 SUR Y CR 43A	14	Alejandría	15/12/2025	1,00	1,43		1,43	1,43	
CL 5 SUR CL 5 SUR Y CR 43A	14	Alejandría	15/12/2025	3,00	1,20		3,60	3,60	
CL 5 SUR CR 42 Y 43A	14	Alejandría	15/12/2025	2,00	2,20		4,40	4,40	
CR 47 CL 52	10	La Candelaria	17/12/2025	2,00	0,31		0,62	0,62	
CR 47 CL 52	10	La Candelaria	17/12/2025	2,00	0,28		0,56	0,56	
CL 56 BD CR 20B-134	8	La Libertad	17/12/2025	1,00	13,86		13,86	13,86	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Astorga	22/12/2025	5,00	1,20		6,00	6,00	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Astorga	22/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandría	23/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandría	29/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandría	29/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 42 CL 5 SUR CL 6 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	1,00	2,10		2,10	2,10	
CR 42 CL 5 SUR CL 6 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	2,00	2,20		4,40	4,40	
CR 42 CL 5 SUR CL 6 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 42 CL 6 SUR CL 7 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	1,00	1,20		1,20	1,20	
CL 42 CL 6 SUR CL 7 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	1,00	2,20		2,20	2,20	
									86,98

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	86,98
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	86,98
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	235,13
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	322,11
TOTAL POR EJECUTAR	8287,89

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	4.1.2	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura acrilica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	20		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

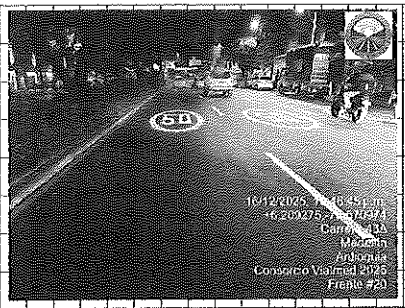

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 43A CL 8 Y CL 9	14	Astorga	16/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 43A CL 8 Y CL 9	14	Astorga	16/12/2025	1,00	3,52		3,52	3,52	
CL 58 CL 31-06	8	Enciso	17/12/2025	1,00	10,71		10,71	10,71	
CL 58 CL 31-06	8	Enciso	17/12/2025	1,00	3,15		3,15	3,15	
CL 33 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo Socorro	18/12/2025	2,00	1,20		2,40	2,40	
							0,00	0,00	
									22,18

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	22,18
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	22,18
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	806,74
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	828,92
TOTAL POR EJECUTAR	7781,08

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.048
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	11/12/2025	HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	4.1.3	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frio con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	20

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

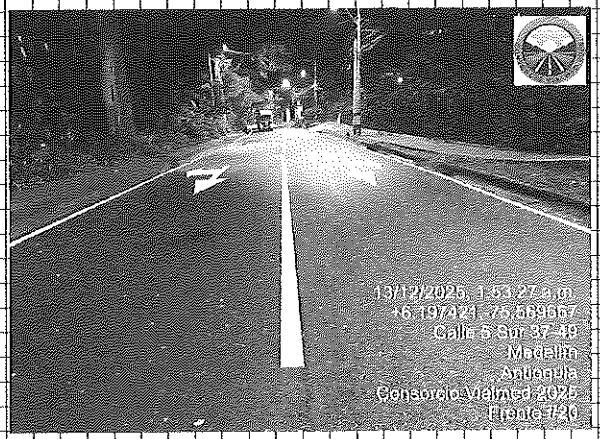

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 95 CR 68 Y CR 69	5	Castilla	11/12/2025	38,50				38,50	
CL 5 SUR CR 37 Y CR 38	14	Alejandria	12/12/2025	61,45				61,45	
CL 5 SUR CR 37 Y CR 38	14	Alejandria	12/12/2025	142,65				142,65	
CL 5 SUR CR 37 Y CR 38	14	Alejandria	12/12/2025	100,64				100,64	
CL 5 SUR CR 38	14	Alejandria	12/12/2025	13,70				13,70	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Asorga	16/12/2025	54,95				54,95	
CR 47 CL 52	10	La Candelaria	17/12/2025	8,95				8,95	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Asorga	22/12/2025	49,64				49,64	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Asorga	22/12/2025	53,17				53,17	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandria	23/12/2025	73,54				73,54	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandria	23/12/2025	156,62				156,62	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandria	29/12/2025	187,53				187,53	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandria	29/12/2025	39,77				39,77	
CL 5 SUR CR 38 Y CR 42	14	Alejandria	29/12/2025	57,20				57,20	
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	14	Alejandria	30/12/2025	59,63				59,63	
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	14	Alejandria	30/12/2025	75,50				75,50	
CR 42 CL 5 SUR CL 6 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	29,71				29,71	
CL 42 CL 6 SUR CL 7 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	12,00				12,00	
									1215,16

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	1215,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1215,16
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	798,36
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2013,51
TOTAL POR EJECUTAR	10286,49

COD. FO-GEOP-026	Formato	Alcaldía de Medellín
Versión 2	FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°	6 (2)		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	4.1.4	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:		UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	20		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 43A CL 8 Y CL 9	14	Astorga	16/12/2025	30,00				30,00	
CL 33 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo Socorro	16/12/2025	59,50				59,50	
CL 33 CR 46 Y CR 48	10	Perpetuo Socorro	16/12/2025	77,39				77,39	
CR 38 + INIPUE CL 28 INIPUE CL 28 + 200	10	San Diego	23/12/2025	6,00				6,00	
CR 9F CL 10 SUR +200 CL 16 A	90	Las Palmas	23/12/2025	187,84				187,84	
									360,73

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	360,73
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	360,73
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	7755,34
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8116,07
TOTAL POR EJECUTAR	4183,93

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$		49.254.906.046
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025		ACTA N°		6 (2)
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	4.1.5	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	20

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 5 SUR CR 38	14	Alejandría	12/12/2025	3,47				3,47	
CL 5 SUR CR 38	14	Alejandría	12/12/2025	1,00				1,00	
CL 5 SUR CL 5 SUR Y CR 43A	14	Alejandría	15/12/2025	4,46				4,46	
CL 5 SUR CL 5 SUR Y CR 43A	14	Alejandría	15/12/2025	21,00				21,00	
CL 5 SUR CL 5 SUR Y CR 43A	14	Alejandría	15/12/2025	4,80				4,80	
CL 5 SUR CL 5 SUR Y CR 43A	14	Alejandría	15/12/2025	45,50				45,50	
CL 5 SUR CR 42 Y 43A	14	Alejandría	15/12/2025	46,88				46,88	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Astorga	16/12/2025	129,80				129,80	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Astorga	16/12/2025	9,72				9,72	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Astorga	22/12/2025	90,64				90,64	
CR 43A CL 9 CL 10	14	Astorga	22/12/2025	8,90				8,90	
CR 42 CL 5 SUR CL 6 SUR	14	Los Balsos No.2	30/12/2025	3,30				3,30	
									369,47

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	369,47
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	369,47
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	809,04
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1178,51
TOTAL POR EJECUTAR	7815,49

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4800105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR	$	49.254.906.046	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		11/12/2025		HASTA	31/12/2025	ACTA N°		6 (2)	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	O.E.07	DESCRIPCION	Suministro, transporte y Riego de emulsión asfáltica.	FORMULA:	UNIDAD	gal	FRENTE DE OBRA	14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
			12/12/2025	250,00				250,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
									250,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	250,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	250,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	250,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	500,00
TOTAL POR EJECUTAR	250,00
