
COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°	DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026			VALOR	$ 59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	1.1.1	DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos.	FORMULA:	UNIDAD	día	FRENTE DE OBRA	15,16,23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
FRENTE DE OBRA N°15									
CR 43A CL 7D Y CL 8	14	Barrio Colombia	14/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	15/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	16/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	19/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	20/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	22/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	23/1/2026	1,00				1,00	
CR 45 CL 29 CL 30	10	Perpetuo socorro	26/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	27/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	28/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A CR 43G	14	Barrio Colombia	29/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	30/1/2026	1,00				1,00	
									12,00
FRENTE DE OBRA N°16									
CL 29 CR 45 INEPUE CR 45	14	Barrio Colombia	5/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	6/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/1/2026	1,00				1,00	
CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	8/1/2026	1,00				1,00	
CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	13/1/2026	1,00				1,00	
CL 6 CR 25 - CR 28	14	El Tesoro	19/1/2026	1,00				1,00	
CL 6 CL 5 - CR 28	14	El Tesoro	20/1/2026	1,00				1,00	
CL 6 CR 28 - CR 29	14	El Tesoro	22/1/2026	1,00				1,00	
									8,00
FRENTE DE OBRA N°23									
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	6/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	7/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	8/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	13/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	15/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	4	Sevilla	16/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	4	Sevilla	19/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	20/1/2026	1,00				1,00	
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	21/1/2026	1,00				1,00	
									9,00

ELABORÓ

Juan Roberto Rodríguez
Residente de Obra

Cristian Cadavid Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Gabriel Cardona Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Sepúlveda
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	29,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	29,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	55,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	84,00
TOTAL POR EJECUTAR	-12,00

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA Nº		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026			VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026	HASTA	31/01/2026				ACTA Nº	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	1.2.1.1	DESCRIPCION	Rango 0. De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	FORMULA:					UNIDAD		FRENTE DE OBRA	2	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad








LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitúcora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA Nº2											
1	163928	CL 109 CR 22-20	14	Altos del Poblado	6/1/2026	3,87	1,16	0,12	0,54	1,29	
2	165842	CL 109 CR 22-25	14	Altos del Poblado	6/1/2026	3,06	1,41	0,08	0,35	0,83	
3	165843	CL 109 CR 22-30	14	Altos del Poblado	6/1/2026	1,75	2,61	0,12	0,55	1,32	
4	165861	CL 109 CR 23-83	14	Altos del Poblado	6/1/2026	2,18	2,19	0,10	0,48	1,15	
5	165662	CR 38 CL 26 - 224	10	San Diego	6/1/2026	1,57	2,30	0,03	0,11	0,26	
1	165663	CR 65A CL 31-36	16	Fátima	7/1/2026	2,50	2,24	0,18	1,01	2,42	
2	165683	CR 65A CL 31-43	16	Fátima	7/1/2026	1,52	2,06	0,15	0,47	1,13	
3	165558	CL 37 CR 66B-123	16	Rosales	7/1/2026	3,20	1,12	0,15	0,54	1,29	
1	162838	CL 51 CR 38-23	10	Boston	8/1/2026	2,61	1,71	0,13	0,62	1,50	
2	164992	CL 51 CR 37-82	10	Boston	8/1/2026	0,93	2,14	0,12	0,24	0,57	
3A	164681	CR 40 CL 52-27	10	Boston	8/1/2026	1,44	0,70	0,18	0,18	0,44	
3B		CR 40 CL 52-27	10	Boston	8/1/2026	3,00	1,60	0,18	0,69	2,07	
4	164955 (Segunda parte Dic 9)	CL 57 CR 38 - 65	10	Boston	8/1/2026	2,55	0,97	0,04	0,10	0,25	
1	165820	CL 18 Sur CR 35	14	Diamante No 2	13/1/2026	2,52	3,78	0,14	1,29	3,09	
2	165821	CL 18 Sur CR 35-56	14	Diamante No 2	13/1/2026	2,77	1,27	0,12	0,40	0,97	
3	165848	CR 41AA CL 18 Sur -12	14	Diamante No 2	13/1/2026	1,40	1,68	0,14	0,33	0,79	
1A	161657	CL 18B Sur CR 39A-139	14	Diamante No 2	14/1/2026	1,56	0,95	0,10	0,15	0,38	
1B		CL 18B Sur CR 39A-139	14	Diamante No 2	14/1/2026	2,48	2,01	0,10	0,50	1,20	
2A	122093	CL 20 Sur CR 35-15	14	Diamante No 2	14/1/2026	2,06	1,34	0,13	0,36	0,86	
2B		CL 20 Sur CR 35-15	14	Diamante No 2	14/1/2026	3,70	1,77	0,13	0,85	2,04	
3	165841	CR 41AA CL18 Sur -35	14	Diamante No 2	14/1/2026	1,01	0,70	0,11	0,08	0,19	
4	165822	CL 1 Sur CR 29-251	14	El Tesoro	14/1/2026	1,30	0,90	0,10	0,08	0,19	
1	165902	CR 22 CL19 Sur-57	14	San Lucas	15/1/2026	3,00	1,60	0,14	0,65	1,56	
2	165730	CR 22 CL19 Sur-60	14	San Lucas	15/1/2026	1,70	1,30	0,14	0,31	0,74	
3	164898	CL 20A Sur CR 22-84	14	San Lucas	15/1/2026	2,20	1,40	0,15	0,46	1,11	
4	165903	CL 20A Sur CR 22-60	14	San Lucas	15/1/2026	2,01	1,86	0,14	0,52	1,26	
5	165899	CR 26C CL 18AA Sur-83	14	San Lucas	15/1/2026	1,02	1,50	0,04	0,06	0,15	
1A	165918	CL 12 Sur CR 10-390	14	Los Balsos No.1	16/1/2026	2,02	1,25	0,13	0,33	0,79	
1B		CL 12 Sur CR 10-390	14	Los Balsos No.1	16/1/2026	0,81	1,90	0,13	0,20	0,48	
2	165918	CL 12 Sur CR 10-378	14	Los Balsos No.1	16/1/2026	5,82	1,84	0,13	1,24	2,98	
3	165934	CL 12 Sur CR 10-350	14	Los Balsos No.1	16/1/2026	1,15	2,13	0,11	0,27	0,65	
4	143817	CR 18 CL12 Sur-203	14	Los Balsos No.1	16/1/2026	1,00	0,70	0,03	0,02	0,05	
1A	156813	CR 35 CL 7A Sur	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	1,94	1,17	0,13	0,30	0,71	
1B		CR 35 CL 7A Sur	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	1,31	1,87	0,13	0,32	0,78	
2	157257	CR 35 CL 5 Sur-350	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	1,77	1,17	0,09	0,19	0,45	
3	156812	CL 7A Sur CR 35-45	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	2,71	3,14	0,08	0,64	1,53	
4A	165988	CL 7A Sur CR 35-55	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	2,48	0,96	0,08	0,19	0,45	
4B		CL 7A Sur CR 35-55	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	1,17	1,65	0,08	0,15	0,37	
5A	165987	CL 7A Sur CR 35-50	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	1,41	0,71	0,05	0,05	0,12	
5B		CL 7A Sur CR 35-50	14	Los Balsos No.2	19/1/2026	0,97	2,52	0,05	0,12	0,29	
6	163368	CL 2 Sur CR 35-09	14	Alejandría	19/1/2026	0,71	0,60	0,13	0,06	0,13	
7	165872	CL 4 Sur CR 43AA-28	14	La Aguacatala	19/1/2026	0,40	0,80	0,04	0,01	0,03	
8	165988	CL 4 Sur CR 43A-10	14	La Aguacatala	19/1/2026	0,25	0,25	0,11	0,01	0,02	
1	166050	CR 50 CL 44-19	10	Boston	20/1/2026	0,60	1,85	0,11	0,12	0,29	
2	166051	CR 50 CL44-91	10	Boston	20/1/2026	0,50	1,25	0,10	0,06	0,15	
3	165802	CL 50 CR 39-65	10	Boston	20/1/2026	0,91	5,23	0,15	0,71	1,71	
4	166053	CL 49A CR 39-112	10	Boston	20/1/2026	3,22	2,11	0,13	0,88	2,12	
5	158280	CL 49A CR 39-105	10	Boston	20/1/2026	3,25	0,70	0,03	0,07	0,18	
6	164684	CR 42 CL 49-29	10	Boston	20/1/2026	0,73	1,55	0,12	0,14	0,33	
7	165955	CR 39 CL 51-30	10	Boston	20/1/2026	0,30	0,50	0,03	0,00	0,01	
8	166052	CR 39 CL 51 - 34	10	Boston	20/1/2026	0,60	0,60	0,03	0,01	0,03	
1A	166132	CR 81C CL 76E-20	7	Palenque	22/1/2026	1,03	1,05	0,12	0,13	0,31	
1B		CR 81C CL 76E-20	7	Palenque	22/1/2026	2,19	1,84	0,12	0,43	1,03	
2	166133	CR 81D CL 76E-25	7	Palenque	22/1/2026	1,80	1,70	0,11	0,34	0,81	
3	166139	CL 65 CR 89-97	7	Cucarracho	22/1/2026	2,11	1,82	0,12	0,46	1,11	
4	166138	CR 90 CL 65	7	Cucarracho	22/1/2026	1,78	2,03	0,14	0,51	1,21	
5	166140	CL 78 CR 80-496	7	Palenque	22/1/2026	1,20	0,90	0,03	0,03	0,08	
6	166147	CR 85 CL 65A - 93	7	Palenque	22/1/2026	0,60	0,45	0,03	0,01	0,02	
7	166141	CL 69 CR 87-100	7	Palenque	22/1/2026	0,90	0,90	0,03	0,02	0,06	
8	161029	CR 91 CL 64B	7	Cucarracho	22/1/2026	1,65	1,06	0,03	0,06	0,14	
9	166143	CL 64 CR 91	7	Cucarracho	22/1/2026	1,10	1,05	0,03	0,03	0,08	
1	166183	CR 69 CL 95-04	5	Castilla	23/1/2026	3,12	2,35	0,18	1,32	3,17	
2	166182	CR 69 CL-89	5	Castilla	23/1/2026	2,72	2,00	0,13	0,68	1,63	
3	166145	CL 87 CR 64C	5	Castilla	23/1/2026	0,40	1,00	0,04	0,02	0,04	
1	166249	CL 18A Sur CR 30-93	14	San Lucas	26/1/2026	4,37	1,12	0,12	0,58	1,35	
2	166250	CL 18A Sur CR 30-30	14	San Lucas	26/1/2026	4,63	1,50	0,12	0,80	1,92	
3	166262	CR 29C CL 18A Sur-34	14	San Lucas	26/1/2026	3,33	1,81	0,11	0,69	1,42	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026			VALOR	$	69.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA		31/01/2026			ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Mid Urbano 20005377					SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.1	DESCRIPCION		Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno		FORMULA:				UNIDAD		FRENTE DE OBRA	2

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

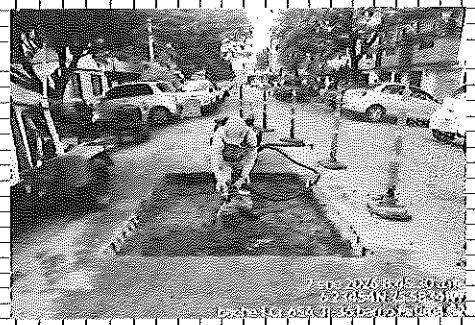

	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
4	166269	CR 25 CL 9B Sur-197	14	Los Balsos No.1	26/1/2026	1,21	0,50	0,03	0,02	0,04	
5	166276	CR 25 CL 8A Sur	14	Los Balsos No.1	26/1/2026	0,60	0,30	0,03	0,01	0,01	
6	163405	CR 25 CL 5 Sur-50	14	Los Naranjos	26/1/2026	0,50	0,40	0,03	0,01	0,01	
7	166274	CR 25 CL 3-150	14	Los Naranjos	26/1/2026	1,35	1,35	0,03	0,05	0,13	
1	166296	CR 35 CL 7 Sur-5	14	Los Balsos No.2	27/1/2026	3,87	1,82	0,15	0,97	2,32	
2	166297	CR 35 CL 7 Sur	14	Los Balsos No.2	27/1/2026	5,10	0,89	0,15	0,68	1,63	
3A	165937 (Segunda capa)	CL 7A Sur CR 35-50	14	Los Balsos No.2	27/1/2026	1,41	0,71	0,06	0,06	0,14	
3B		CL 7A Sur CR 35-50	14	Los Balsos No.2	27/1/2026	0,87	2,52	0,06	0,15	0,35	
4	166312	CR 30 CL 10C-280	14	Las Lomas No.1	27/1/2026	0,85	0,93	0,04	0,03	0,08	
5	166313	CR 30 CL 10B-18	14	Las Lomas No.1	27/1/2026	0,65	0,45	0,04	0,01	0,03	
6	166314	CR 30 CL 10B	14	Las Lomas No.1	27/1/2026	1,28	0,38	0,04	0,02	0,05	
7	166319	CR 30 CL 10-120	14	Las Lomas No.1	27/1/2026	1,15	0,40	0,04	0,02	0,04	
8	166317	CR 30 CL 10-87	14	Las Lomas No.1	27/1/2026	1,20	0,50	0,04	0,02	0,06	
9	166318	CR 30 CL 10-79	14	Las Lomas No.1	27/1/2026	1,87	0,83	0,05	0,07	0,17	
1	166351	CL 62 CR 92-30	7	Fuente Clara	28/1/2026	5,65	1,30	0,13	0,95	2,29	
2A	166359	CL 62C CR 89C-64	7	Fuente Clara	28/1/2026	4,15	1,50	0,11	0,68	1,64	
2B		CL 62C CR 89C-64	7	Fuente Clara	28/1/2026	1,60	1,30	0,11	0,23	0,55	
3	166360	CL 62 CR 85-775	7	Fuente Clara	28/1/2026	2,29	1,66	0,04	0,15	0,36	
4	166361	CL 62 CR 92	7	Fuente Clara	28/1/2026	0,80	0,40	0,03	0,01	0,02	
1	166394	CL 62 CR 85-500	7	Robledo	29/1/2026	4,07	1,75	0,11	0,80	2,18	
2	166395	CL 62 CR 85 550	7	Robledo	29/1/2026	5,94	1,38	0,11	0,90	2,18	
3	166309	CL 62 CR 85 - 33	7	Robledo	29/1/2026	1,48	1,25	0,11	0,20	0,49	
1	166479	CL 62 CR 85 - 50	7	Robledo	30/1/2026	3,27	2,60	0,12	1,02	2,45	
2A	166483	CL 54A CR 77D	11	Los Colores	30/1/2026	4,33	1,20	0,10	0,52	1,25	
2B		CL 54A CR 77D	11	Los Colores	30/1/2026	1,06	0,62	0,10	0,07	0,18	
3	166484	CR 77D CL 54-47	11	Los Colores	30/1/2026	3,80	2,07	0,04	0,31	0,78	
4	166491	CL 57 CR 77B - 92	11	Los Colores	30/1/2026	0,85	0,83	0,12	0,08	0,20	
											77,55

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	77,55
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	77,55
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	589,24
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	666,79
TOTAL POR EJECUTAR	-62,57

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026		VALOR	$		69.105.887.265
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA		31/01/2026		ACTA N°		7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:					UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



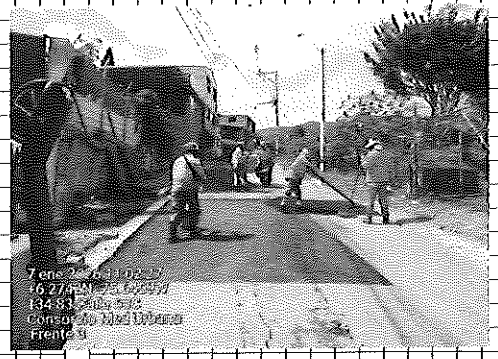


	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
				FRENTE DE OBRA N°2							
1A	165752	CL 12 Sur CR 10-383	14	Los Balsos No.1	09/01/2026	1,46	1,55	0,08	0,18	0,43	
1B		CL 12 Sur CR 10-360	14	Los Balsos No.1	09/01/2026	5,07	2,69	0,08	1,09	2,62	
2A	165753	CL 12 Sur CR 10-375	14	Los Balsos No.1	09/01/2026	2,24	3,71	0,11	0,91	2,19	
2B		CL 12 Sur CR 10-375	14	Los Balsos No.1	09/01/2026	2,53	0,90	0,11	0,25	0,60	
3A	165754	CL 12 Sur CR 10-370	14	Los Balsos No.1	09/01/2026	6,08	1,39	0,10	0,85	2,03	
3B		CL 12 Sur CR 10-370	14	Los Balsos No.1	09/01/2026	2,24	4,64	0,10	1,04	2,49	
4	165661 (Segunda capa)	CL 108 CR 23-83	14	Altos del Poblado	09/01/2026	2,18	2,19	0,04	0,19	0,46	
5	165789	CR 32 CL10 - 8	14	Las Lomas No.1	09/01/2026	1,25	0,55	0,05	0,03	0,08	
6	165790	CL 10 CR 32 - 67	14	Las Lomas No.1	09/01/2026	0,75	0,50	0,04	0,02	0,04	
7	165791	CL 10 CR 32 - 55	14	Las Lomas No.1	09/01/2026	1,40	0,75	0,04	0,04	0,10	
1A	164056	CR 45 CL 31-92	10	Perpetuo Socorro	21/01/2026	11,85	1,32	0,17	2,66	6,38	
1B		CR 45 CL 31-92	10	Perpetuo Socorro	21/01/2026	2,87	1,84	0,17	0,90	2,15	
2	166092	CL 31 CR 44A - 60	10	Perpetuo Socorro	21/01/2026	1,77	2,24	0,14	0,56	1,33	
3	165936	CR 64 CL 37	10	Perpetuo Socorro	21/01/2026	0,70	0,98	0,04	0,03	0,07	
4	165937	CR 60 CL 36 - 166	10	Perpetuo Socorro	21/01/2026	1,10	0,80	0,04	0,04	0,08	
											21,05
				FRENTE DE OBRA N°3							
1A	151656	CR 148 CL 68 - 173	60	Travesías	06/01/2026	3,75	2,05	0,12	0,90	2,16	
1B		CR 148 CL 68 - 173	60	Travesías	06/01/2026	11,80	1,15	0,12	1,59	3,81	
2	165669	CR 148 CL 68 - 153	60	Travesías	06/01/2026	2,30	1,60	0,12	0,50	1,19	
3A	165673	CR 148 CL 68 - 145	60	Travesías	06/01/2026	5,80	0,80	0,11	0,51	1,22	
3B		CR 148 CL 68 - 145	60	Travesías	06/01/2026	1,35	0,90	0,11	0,13	0,32	
4	165674	CR 148 CL 68 - 87	60	Travesías	06/01/2026	3,00	1,60	0,12	0,58	1,38	
1A	145717	CL 60C CR 145 - 225	60	La Palma	07/01/2026	2,10	5,05	0,13	1,38	3,31	
1B		CL 60C CR 145 - 225	60	La Palma	07/01/2026	4,45	3,28	0,13	1,90	4,55	
2A	165712	CL 60C CR 135 - 136	60	La Palma	07/01/2026	2,50	2,16	0,10	0,54	1,30	
2B		CL 60C CR 135 - 136	60	La Palma	07/01/2026	2,20	1,00	0,10	0,22	0,53	
2C		CL 60C CR 135 - 136	60	La Palma	07/01/2026	2,50	2,20	0,10	0,55	1,32	
1A	110897	CL 60 CR 152D-560	60	La Palma	08/01/2026	6,40	3,69	0,10	2,49	5,98	
1B		CL 60 CR 152D-560	60	La Palma	08/01/2026	4,20	5,00	0,10	2,10	5,04	
1	163359	CL 64 CR 91 - 87	7	Cucaracho	09/01/2026	1,50	1,30	0,12	0,23	0,56	
2	165809	CL 64 CR 91 - 154	7	Cucaracho	09/01/2026	1,60	1,00	0,12	0,19	0,46	
3A	163361	CL 64 CR 91 - 161	7	Cucaracho	09/01/2026	15,30	1,70	0,13	3,38	8,12	
3B		CL 64 CR 91 - 161	7	Cucaracho	09/01/2026	2,02	3,00	0,13	0,78	1,89	
1A	154962	CL 64 CR 91D- 76	7	Cucaracho	13/01/2026	6,83	1,20	0,15	1,23	2,95	
1B		CL 64 CR 91D- 76	7	Cucaracho	13/01/2026	1,75	0,84	0,15	0,22	0,53	
2	165837	CL 64 CR 91D- 98	7	Cucaracho	13/01/2026	2,30	2,25	0,14	0,72	1,74	
3A	165839	CL 64 CR 91D- 106	7	Cucaracho	13/01/2026	5,00	1,20	0,12	0,72	1,73	
3B		CL 64 CR 91D- 106	7	Cucaracho	13/01/2026	6,50	1,10	0,12	0,86	2,06	
4A	165840	CL 64 CR 91D- 120	7	Cucaracho	13/01/2026	1,90	1,90	0,11	0,40	0,95	
4B		CL 64 CR 91D- 120	7	Cucaracho	13/01/2026	3,00	1,40	0,11	0,46	1,11	
1A	163362	CL 64 CR 93 -10	7	Cucaracho	14/01/2026	5,30	2,00	0,14	1,48	3,56	
1B		CL 64 CR 93 -10	7	Cucaracho	14/01/2026	1,00	0,90	0,14	0,13	0,30	
2A	165856	CL 64 CR 91D-190	7	Cucaracho	14/01/2026	1,50	1,40	0,13	0,27	0,68	
2B		CL 64 CR 91D-190	7	Cucaracho	14/01/2026	6,15	2,65	0,13	2,12	5,08	

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026			VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada, Horario diurno.	FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



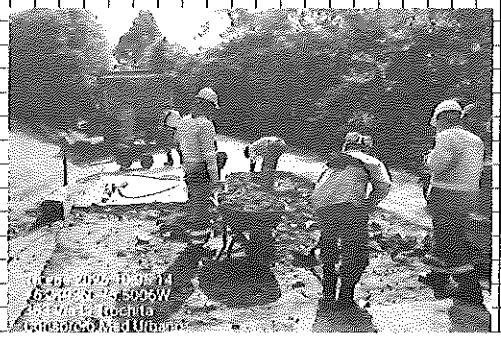

	LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
3A	165857	CL 84 CR 91D-180	7	Cucaracho	14/01/2026	3,20	1,20	0,10	0,38	0,92	
3B		CL 84 CR 91D-180	7	Cucaracho	14/01/2026	1,60	1,30	0,10	0,21	0,50	
1	165944	CIL 19 CR 35 Este-184	90	El Placer	15/01/2026	15,04	1,90	0,11	3,33	8,00	
1A	165945	CL 19 CR 35 Este-181	90	El Placer	16/01/2026	3,80	4,50	0,10	1,71	4,10	
1B		CL 19 CR 35 Este-181	90	El Placer	16/01/2026	2,60	2,00	0,10	0,52	1,25	
2A	165946	CL 19 CR 35 Este-184	90	El Placer	16/01/2026	1,10	1,27	0,10	0,14	0,34	
2B		CL 19 CR 35 Este-184	90	El Placer	16/01/2026	8,75	1,13	0,10	0,99	2,37	
1	166369	CR 94B CL 63 - 211	7	Cucaracho	26/01/2026	3,70	1,25	0,20	0,93	2,22	
2A	166368	CR 94B CL 63 - 317	7	Cucaracho	26/01/2026	4,30	1,30	0,20	1,12	2,68	
2B		CR 94B CL 63 - 317	7	Cucaracho	26/01/2026	2,00	1,90	0,20	0,76	1,82	
3A	161838	CR 94B CL 63 - 191	7	Cucaracho	26/01/2026	4,85	1,10	0,20	1,09	2,61	
3B		CR 94B CL 63 - 191	7	Cucaracho	26/01/2026	1,95	1,30	0,20	0,51	1,22	
4	166488	CR 94B CL 63 - 385	7	Cucaracho	26/01/2026	10,00	0,40	0,05	0,20	0,48	
1A	166374	CR 94B CL 63 - 398	7	Cucaracho	27/01/2026	3,67	1,29	0,17	0,80	1,93	
1B		CR 94B CL 63 - 398	7	Cucaracho	27/01/2026	2,76	2,30	0,17	1,08	2,59	
2	166377	CR 94B CL 63 - 376	7	Cucaracho	27/01/2026	8,50	1,30	0,15	1,66	3,98	
3	166378	CR 94B CL 63 - 378	7	Cucaracho	27/01/2026	7,00	1,00	0,15	1,05	2,52	
1	166379	CR 94B CL 63 - 305	7	Cucaracho	28/01/2026	5,00	1,50	0,18	1,35	3,24	
2	166382	CR 94B CL 63 - 271	7	Cucaracho	28/01/2026	8,20	1,00	0,18	1,12	2,68	
3A	166383	CR 94B CL 63 - 257	7	Cucaracho	28/01/2026	3,64	3,30	0,19	2,28	5,48	
3B		CR 94B CL 63 - 257	7	Cucaracho	28/01/2026	1,20	1,20	0,19	0,27	0,66	
1	166505	CR 143 CL 68 - 60	60	Travesías	29/01/2026	8,30	1,20	0,12	1,20	2,87	
2A	166506	CR 143 CL 68 - 38	60	Travesías	29/01/2026	4,38	1,30	0,11	0,63	1,50	
2B		CR 143 CL 68 - 38	60	Travesías	29/01/2026	1,90	2,00	0,11	0,42	1,00	
3	166507	CR 143 CL 68 - 48	60	Travesías	29/01/2026	1,30	2,00	0,11	0,29	0,69	
4	166508	CR 143 CL 68 - 103	60	Travesías	29/01/2026	12,00	1,30	0,11	1,72	4,12	
1	166509	CL 68 CR 143-02	60	Travesías	30/01/2026	3,60	1,20	0,18	0,78	1,87	
2A	166511	CL 68 CR 143	60	Travesías	30/01/2026	1,00	1,60	0,18	0,29	0,69	
2B		CL 68 CR 143	60	Travesías	30/01/2026	1,60	2,60	0,18	0,75	1,80	
3A	166512	Cl 68 CR 143 - 34	60	Travesías	30/01/2026	3,40	1,80	0,14	0,68	2,06	
3B		Cl 68 CR 143 - 34	60	Travesías	30/01/2026	1,30	1,10	0,14	0,20	0,48	
4	166513	Cl 68 CR 143 - 36	60	Travesías	30/01/2026	4,50	1,10	0,14	0,69	1,66	
5A	166514	Cl 68 CR 143 - 42	60	Travesías	30/01/2026	6,60	0,93	0,15	0,92	2,21	
5B		Cl 68 CR 143 - 42	60	Travesías	30/01/2026	2,40	1,50	0,15	0,54	1,30	
											137,65
				FRENTE DE OBRA N°6							
1	165676	CR 39B CL 43-66	9	El Salvador	6/1/2026	2,75	3,23	0,15	1,33	3,20	
2A	165677	CR 39B CL 43-92	9	El Salvador	6/1/2026	3,20	2,05	0,15	0,98	2,36	
2B		CR 39B CL 43-92	9	El Salvador	6/1/2026	2,70	5,05	0,15	2,05	4,91	
3	165678	CR 39B CL 44-1	9	El Salvador	6/1/2026	1,15	1,45	0,15	0,25	0,60	
1	165709	CL 10 CR 65	15	Guayabal	7/1/2026	4,60	2,20	0,20	2,11	5,07	
2A	165710	CL 10 CR 65 + 2	15	Guayabal	7/1/2026	1,15	6,45	0,20	1,48	3,56	
2B		CL 10 CR 65 + 2	15	Guayabal	7/1/2026	5,37	1,33	0,20	1,43	3,43	
1A	151174	DG 75B CL 2A-143	16	La Mota	8/1/2026	2,49	2,55	0,17	1,08	2,58	
1B		DG 75B CL 2A-143	16	La Mota	8/1/2026	2,20	1,25	0,17	0,47	1,12	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
2A	165797	DG 75B CL 2A-9	16	La Mota	8/1/2026	2,00	2,07	0,17	0,70	1,69	
2B		DG 75B CL 2A-29	16	La Mota	8/1/2026	4,25	3,60	0,17	2,60	6,24	
3	165798	DG 75B CL 2A	16	La Mota	8/1/2026	1,45	1,50	0,08	0,17	0,42	
1	165696	CL 9 Sur CR 53-35	15	El Rodeo	9/1/2026	11,05	1,70	0,12	2,25	5,41	
2	165814	CR 52B CL 8A Sur-21	16	La Mota	9/1/2026	8,05	2,87	0,12	2,77	6,65	
1A	165863	CL 24 65 D 15	15	Trinidad	13/1/2026	4,50	2,10	0,16	1,51	3,63	
1B		CL 24 65 D 15	15	Trinidad	13/1/2026	4,70	4,13	0,16	3,11	7,45	
1	165865	CL 18 CR 105-15	70	Altavista Sector Central	14/1/2026	4,90	3,00	0,17	2,50	6,00	
2A	165866	CL 18 CR 105-15+10	70	Altavista Sector Central	14/1/2026	1,55	2,05	0,17	0,54	1,30	
2B		CL 18 CR 105-15+15	70	Altavista Sector Central	14/1/2026	3,15	1,00	0,15	0,47	1,13	
3	165867	CL 18 CR 105-15+15	70	Altavista Sector Central	14/1/2026	3,95	1,80	0,15	1,07	2,58	
1	165931	CL 18 CR 105-15	70	Altavista Sector Central	15/1/2026	2,07	2,90	0,17	1,02	2,45	
2	161741	CL 18 CR 105 – 69	70	Altavista Sector Central	15/1/2026	23,00	1,11	0,14	3,57	8,58	
1A	165978	CL 17 CR 111A - 66	70	Buga Patio Bonito	16/1/2026	4,00	3,03	0,14	1,72	4,14	
1B		CL 17 CR 111A - 66	70	Buga Patio Bonito	16/1/2026	0,95	2,30	0,14	0,31	0,73	
2A	165980	CL 17 CR 111A - 129	70	Buga Patio Bonito	16/1/2026	4,30	3,15	0,14	1,90	4,55	
2B		CL 17 CR 111A - 129	70	Buga Patio Bonito	16/1/2026	2,75	1,70	0,14	0,65	1,57	
1A	166013	CL 17 CR 111 - 61	70	Buga Patio Bonito	19/1/2026	6,00	1,20	0,19	1,37	3,28	
1B		CL 17 CR 111 - 61	70	Buga Patio Bonito	19/1/2026	7,30	0,90	0,19	1,25	3,00	
2A	161748	CL 17 CR 111 - 61+1	70	Buga Patio Bonito	19/1/2026	3,40	1,70	0,19	1,10	2,64	
2B		CL 17 CR 111 - 61+1	70	Buga Patio Bonito	19/1/2026	1,22	4,00	0,18	0,88	2,11	
1	166064	CL 18 CR 110 A - 93	70	Altavista Sector Central	20/1/2026	2,75	2,33	0,17	1,09	2,61	
2	166067	CL 18 CR 110 A - 93+2	70	Altavista Sector Central	20/1/2026	1,90	1,60	0,17	0,52	1,24	
3	166069	CL 18 CR 110 A - 101	70	Altavista Sector Central	20/1/2026	4,70	2,65	0,17	2,12	5,08	
4	166072	CL 18 CR 110 A - 101+1	70	Altavista Sector Central	20/1/2026	6,40	1,19	0,17	1,26	3,03	
1	166151	CL 18 108 B - 96	70	Altavista Sector Central	21/1/2026	7,25	1,95	0,17	2,40	5,77	
2	166152	CL 18 108 B - 72	70	Altavista Sector Central	21/1/2026	7,00	2,35	0,16	2,63	6,32	
1	166153	CL 18 CR 110 A -96	70	Altavista Sector Central	22/1/2026	13,15	1,05	0,13	1,79	4,31	
2	166155	CL 18 CR 110 A - 3	70	Altavista Sector Central	22/1/2026	8,90	1,40	0,13	1,62	3,89	
3	166156	CL 18 CR 110 A - 3 + 1	70	Altavista Sector Central	22/1/2026	2,90	2,00	0,13	0,75	1,81	
1A	166284	CL 20 CR84C-34	70	Altavista Sector Central	23/1/2026	8,35	1,70	0,18	2,56	6,13	
1B		CL 20 CR84C-34	70	Altavista Sector Central	23/1/2026	2,70	2,35	0,18	1,14	2,74	
2	166285	CL 20 CR84C-34 +1	70	Altavista Sector Central	23/1/2026	4,25	1,70	0,18	1,30	3,12	
1	166401	CL 18 CR 109-92	70	Altavista	26/1/2026	5,08	1,30	0,10	0,66	1,58	
2	166400	CL 18 CR 109-8	70	Altavista	26/1/2026	2,42	1,26	0,20	0,62	1,49	
3A	166398	CL 18 CR 109-55	70	Altavista	26/1/2026	1,38	1,30	0,20	0,36	0,86	
3B		CL 18 CR 109-55	70	Altavista	26/1/2026	0,60	1,60	0,20	0,28	0,61	
4	166397	CL 18 CR 109-67	70	Altavista	26/1/2026	2,07	1,00	0,20	0,41	0,99	
5	166399	CL 18 CR 110-48	70	Altavista	26/1/2026	2,10	1,58	0,20	0,66	1,59	
6	166391	CR 111 CL 18	70	Altavista	26/1/2026	2,15	2,88	0,20	1,24	2,97	
1A	166406	CR 29 CL 45-12	9	Buenos Aires	27/1/2026	2,30	3,60	0,18	1,56	3,74	
1B		CR 29 CL 45-12	9	Buenos Aires	27/1/2026	1,60	1,20	0,18	0,35	0,83	
2	166405	CR 29 CL 45-40	9	Buenos Aires	27/1/2026	0,90	1,50	0,17	0,23	0,55	
3A	166403	CR 29 CL 45-49	9	Buenos Aires	27/1/2026	2,84	2,13	0,17	1,03	2,47	
3B		CR 29 CL 45-49	9	Buenos Aires	27/1/2026	2,80	2,27	0,17	1,08	2,59	
4A	166473	CR 29 CL 45-70	9	Buenos Aires	27/1/2026	1,00	1,10	0,17	0,19	0,45	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026				VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026				ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377						SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION		Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada Horario diurno.		FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
4B		CR 29 CL 45-70	9	Buenos Aires	27/1/2026	1,72	2,05	0,17	0,60	1,44	
1A	166474	CL 46 CR 27-21	9	Buenos Aires	28/1/2026	4,35	3,40	0,23	3,33	7,99	
1B		CL 46 CR 27-21	9	Buenos Aires	28/1/2026	2,32	1,90	0,21	0,90	2,17	
1A	166475	CL 50 CR 30A-4	9	Buenos Aires	29/1/2026	8,30	0,90	0,18	1,32	3,17	
1B		CL 50 CR 30A-4	9	Buenos Aires	29/1/2026	4,14	1,60	0,18	1,19	2,86	
2A	166476	CL 50 CR 30A-16	9	Buenos Aires	29/1/2026	1,60	1,74	0,19	0,60	1,43	
2B		CL 50 CR 30A-16	9	Buenos Aires	29/1/2026	1,06	2,00	0,19	0,40	0,97	
3A	166477	CL 50 CR 30A-26	9	Buenos Aires	29/1/2026	3,63	1,63	0,18	1,07	2,56	
3B		CL 50 CR 30A-26	9	Buenos Aires	29/1/2026	1,20	1,85	0,18	0,42	1,01	
1A	166534	CL 50 CR 36 - 22	9	Buenos Aires	30/1/2026	3,10	2,70	0,15	1,24	2,97	
1B		CL 50 CR 36 - 22	9	Buenos Aires	30/1/2026	2,12	1,45	0,15	0,48	1,09	
2	166535	CL 50 CR 36 - 32	9	Buenos Aires	30/1/2026	5,40	1,50	0,16	1,30	3,11	
3A	166536	CL 50 CR 36 - 93	9	Buenos Aires	30/1/2026	7,45	1,30	0,16	1,55	3,72	
3B		CL 50 CR 36 - 93	9	Buenos Aires	30/1/2026	1,50	1,93	0,16	0,46	1,11	
											204,73
		FRENTE DE OBRA N°7									
1	165907	CL 98 CR 85A-34	6	Picachito	13/01/2026	5,65	1,70	0,13	1,25	3,00	
2	165908	CL 98 CR 85A-24	6	Picachito	13/01/2026	7,35	2,00	0,13	1,91	4,59	
3	165909	CL 98 CR 85A-04	6	Picachito	13/01/2026	5,10	1,75	0,11	1,01	2,42	
1	165910	CL 98 CR 85A-13	6	Picachito	14/01/2026	12,00	1,60	0,16	3,46	8,29	
2	165911	CL 98 CR 85A-06	6	Picachito	14/01/2026	4,00	1,90	0,15	1,14	2,74	
3	165912	CL 99 CR 85A	6	Picachito	14/01/2026	1,60	1,67	0,14	0,41	0,99	
1	165965	CL 97 CR 84-120	6	Picachito	15/01/2026	10,60	2,28	0,15	3,69	8,86	
2	165966	CL 97 CR 84-116	6	Picacho	15/01/2026	4,40	1,07	0,14	0,66	1,58	
3	165967	CL 97 CR 84-102	6	Picacho	15/01/2026	3,50	1,60	0,12	0,66	1,57	
1A	165998	CL 105B CR 74A-05	6	Pedregal	16/01/2026	4,92	2,06	0,11	1,11	2,68	
1B		CL 105B CR 74A-05	6	Pedregal	16/01/2026	3,83	1,85	0,11	0,78	1,87	
2	165999	CL 105B CR 74-75	6	Pedregal	16/01/2026	5,25	2,23	0,06	0,73	1,74	
3	166000	CL 105B CR 74-77	6	Pedregal	16/01/2026	4,93	2,20	0,12	1,30	3,12	
4	166001	CL 105B CR 74-72	6	Pedregal	16/01/2026	4,50	2,20	0,11	1,09	2,61	
1	166194	CL 105 CR 74	6	Pedregal	19/01/2026	3,48	1,07	0,13	0,48	1,16	
2	166195	CL 105 CR 74	6	Pedregal	19/01/2026	8,75	1,24	0,13	1,41	3,39	
3	166196	CL 105 CR 74	6	Pedregal	19/01/2026	3,08	1,26	0,11	0,43	1,02	
4	166197	CL 105 CR 74	6	Pedregal	19/01/2026	6,85	1,70	0,14	1,39	3,34	
5	166198	CL 105 CR 74	6	Pedregal	19/01/2026	3,53	1,43	0,14	0,71	1,70	
6	165999 (Segunda capa)	CL 105B CR 74-75	6	Pedregal	19/01/2026	5,25	2,23	0,05	0,59	1,40	
1A	166199	CL 60C CR 145+2	60	La Palma	20/01/2026	5,70	4,04	0,14	3,22	7,74	
1B		CL 60C CR 145+2	60	La Palma	20/01/2026	3,64	2,35	0,13	1,11	2,67	
2	166200	CL 60C CR 145+5	60	La Palma	20/01/2026	1,00	2,00	0,14	0,28	0,67	
1	166211	CR 69 CL 96-122	5	Castilla	21/01/2026	5,10	3,42	0,20	3,49	8,37	
2	166212	CL 97 CR 69-01	5	Castilla	21/01/2026	4,30	2,00	0,19	1,51	3,63	
1	166213	CL 111B CR 64C CR 64C+200	5	Las Brisas	22/01/2026	7,60	4,00	0,14	4,23	10,14	
2	166215	CL 111B CR 64C CR 64C+204	5	Las Brisas	22/01/2026	1,60	4,00	0,13	0,78	1,87	
1A	162343	CR 27A CL 49-39	9	Alejandro Echavarria	23/01/2026	2,57	4,14	0,14	1,49	3,57	
1B		CR 27A CL 49-39	9	Alejandro Echavarria	23/01/2026	3,20	2,66	0,14	1,28	3,08	
2	165718	CR 27A CL 49-36	9	Alejandro Echavarria	23/01/2026	4,00	2,00	0,14	1,10	2,65	


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026			VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA		31/01/2026			ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:						UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





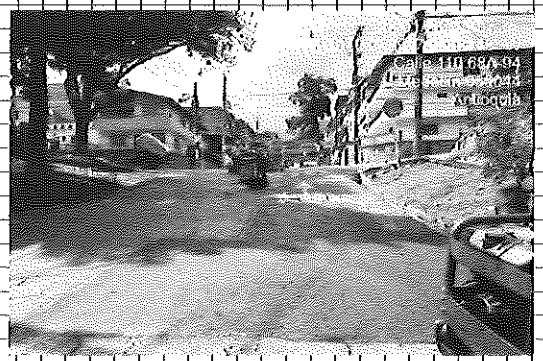



	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Báscora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
3	160727	CR 27A CL 49-8	9	Alejandro Echavarría	23/01/2026	1,90	1,20	0,13	0,30	0,71	
1A	166371	CL 111B CR 63+306	5	Plaza de Ferias	26/01/2026	4,37	1,35	0,13	0,77	1,84	
1B		CL 111B CR 63+306	5	Plaza de Ferias	26/01/2026	4,17	3,09	0,13	1,67	4,01	
2	166375	CL 111B CR 63+304	5	Plaza de Ferias	26/01/2026	5,33	2,90	0,13	1,96	4,72	
3	166376	CL 111B CR 63+120	5	Plaza de Ferias	26/01/2026	3,70	1,66	0,10	0,61	1,47	
1	166465	CR 73A CL 92-13	5	Alfonso López	27/01/2026	11,00	4,42	0,10	5,00	12,00	
1A	166470	CL 110 CR 68A-102	5	Tejelo	28/01/2026	3,27	2,07	0,13	0,88	2,09	
1B		CL 110 CR 68A-102	5	Tejelo	28/01/2026	2,60	4,18	0,18	1,95	4,67	
2A	166471	CL 110 CR 68A-80	5	Tejelo	28/01/2026	2,45	1,83	0,17	0,76	1,83	
2B		CL 110 CR 68A-80	5	Tejelo	28/01/2026	2,20	3,84	0,17	1,44	3,45	
1A	160934	CL 49AC CR 95B-7	13	La Pradera	29/01/2026	1,42	2,65	0,15	0,56	1,35	
1B		CL 49AC CR 95B-7	13	La Pradera	29/01/2026	2,00	2,12	0,15	0,64	1,53	
2	166938	CL 49AC CR 95B-5	13	La Pradera	29/01/2026	3,60	1,66	0,10	0,68	1,64	
3A	165711	CL 49AC CR 95B-17	13	La Pradera	29/01/2026	2,40	1,60	0,19	0,82	1,97	
3B		CL 49AC CR 95B-17	13	La Pradera	29/01/2026	2,50	3,10	0,19	1,47	3,53	
1	166559	CL 112 CR 68A-107	5	Tejelo	30/01/2026	3,60	3,50	0,17	2,14	5,14	
2	166560	CL 112 CR 68A-90	5	Tejelo	30/01/2026	2,48	1,40	0,17	0,59	1,41	
3	166561	CL 112 CR 68A-78	5	Tejelo	30/01/2026	6,60	2,20	0,16	2,28	5,47	
											151,26
		FRENTE DE OBRA N°8									
1A	165650	CR 39B CL 65-13	8	Villa Hermosa	06/01/2026	8,75	2,94	0,11	2,83	6,79	
1B		CR 39B CL 65-13	8	Villa Hermosa	06/01/2026	1,63	4,55	0,11	0,82	1,96	
2A	165657	CL 65 CR 39-36	8	Villa Hermosa	06/01/2026	3,40	1,55	0,11	0,58	1,39	
2B		CL 65 CR 39-36	8	Villa Hermosa	06/01/2026	2,65	1,33	0,11	0,39	0,93	
1	165698	CL 68 CR 33-60	3	Versalles No.1	07/01/2026	3,02	2,03	0,12	0,74	1,77	
2A	152035	CL 68 CR 33-80	3	Versalles No.1	07/01/2026	1,90	3,77	0,12	0,68	2,06	
2B		CL 68 CR 33-80	3	Versalles No.1	07/01/2026	2,80	1,85	0,12	0,62	1,49	
3	165193	CL 68 CR 33-88	3	Versalles No.1	07/01/2026	7,60	2,14	0,12	1,95	4,68	
4A	161863	CL 68 CR 33-66	3	Versalles No.1	07/01/2026	1,75	1,15	0,12	0,24	0,58	
4B		CL 68 CR 33-66	3	Versalles No.1	07/01/2026	0,94	1,72	0,12	0,19	0,47	
1	165721	CL 82 CR 46-19	3	Campo Valdés No.1	08/01/2026	4,00	3,30	0,13	1,72	4,12	
2	165773	CL 82 CR 46-23	3	Campo Valdés No.1	08/01/2026	5,30	1,60	0,13	1,10	2,65	
3A	165725	CL 82 CR 46-32	3	Campo Valdés No.1	08/01/2026	1,45	1,33	0,12	0,23	0,56	
3B		CL 82 CR 46-32	3	Campo Valdés No.1	08/01/2026	2,35	1,23	0,12	0,35	0,83	
4A	165726	CL 82 CR 46-42	3	Campo Valdés No.1	08/01/2026	2,67	1,55	0,12	0,50	1,19	
4B		CL 82 CR 46-42	3	Campo Valdés No.1	08/01/2026	1,53	1,54	0,12	0,28	0,68	
1A	165767	CL 81A CR 69-57	7	Aures No.2	09/01/2026	4,64	2,50	0,12	1,39	3,34	
1B		CL 81A CR 69-57	7	Aures No.2	09/01/2026	6,68	1,92	0,12	1,59	3,80	
2	164844	CL 81A CR 69-54	7	Aures No.2	09/01/2026	3,70	2,70	0,12	1,20	2,88	
1A	165567	CL 81A CR 69-32	7	Aures No.2	13/01/2026	6,69	3,27	0,14	3,06	7,35	
1B		CL 81A CR 69-32	7	Aures No.2	13/01/2026	3,72	2,94	0,14	1,53	3,67	
1A	159585	CR 52 CL 109B-33	2	La Francia	14/01/2026	4,68	4,14	0,15	2,81	6,74	
1B		CR 52 CL 109B-33	2	La Francia	14/01/2026	3,84	3,37	0,15	1,78	4,27	
1A	166608	CR 52 CL 120-24	2	La Frontera	15/01/2026	2,87	1,94	0,14	0,78	1,87	
1B		CR 52 CL 120-24	2	La Frontera	15/01/2026	2,27	2,10	0,14	0,67	1,60	
2	159403	CR 52 CL 120-34	2	La Frontera	15/01/2026	3,97	1,48	0,14	0,82	1,97	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:			UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



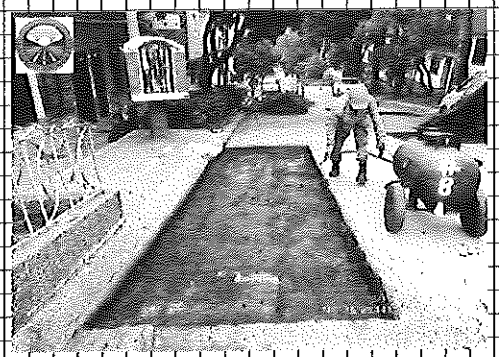




LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES					
Id Baches Básicos	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
3	159360	CR 52 CL 120-56	2	La Frontera	15/01/2026	2,75	1,48	0,14	0,57	1,37	
4	163238	CR 52 CL 120-63	2	La Frontera	15/01/2026	5,70	1,23	0,13	0,91	2,19	
5	164554	CR 52 CL 120-88	2	La Frontera	15/01/2026	2,95	1,10	0,13	0,42	1,01	
1	165939	CL 69 CR 45 Este-94	90	Piedras Blancas	16/01/2026	17,85	1,70	0,11	3,34	8,01	
1	166933 (Segunda parte)	CL 69 CR 45 Este-94	90	Piedras Blancas	19/01/2026	6,60	1,05	0,11	0,79	1,88	
2A	165974	CL 69 CR 45 Este-96	90	Piedras Blancas	19/01/2026	5,78	2,60	0,11	1,78	4,28	
2B		CL 69 CR 45 Este-96	90	Piedras Blancas	19/01/2026	3,10	2,27	0,11	0,77	1,86	
1	166012	CR 53 CL 61A 1211	90	Barro Blanco	20/01/2026	7,17	4,43	0,11	3,34	8,00	
1	166166	CR 46 68-320-9	90	Piedras Blancas	21/01/2026	56,45	0,26	0,05	0,70	1,67	
2	166107	CL 68 CR 46 Este 265 E- 31	90	Mazo	21/01/2026	5,90	1,01	0,12	0,69	1,64	
3	166108	CL 68 CR 46 Este 265 E- 37	90	Mazo	21/01/2026	3,34	0,80	0,12	0,31	0,74	
4A	166109	CL 68 CR 46 Este 265 E- 36	90	Mazo	21/01/2026	2,90	0,70	0,12	0,23	0,56	
4B		CL 68 CR 46 Este 265 E- 36	90	Mazo	21/01/2026	3,43	0,80	0,12	0,32	0,76	
5	166110	CL 68 CR 46 Este 265 E- 40	90	Mazo	21/01/2026	2,62	0,62	0,12	0,19	0,45	
6	166111	CL 68 CR 46 Este 265 E- 55	90	Mazo	21/01/2026	8,00	1,00	0,12	0,92	2,21	
1	166259	CL 61A CR 48 Este-499	90	Barro Blanco	22/01/2026	8,08	1,45	0,12	1,41	3,37	
2	166256	CL 61A CR 48 Este-487	90	Barro Blanco	22/01/2026	6,27	1,45	0,12	1,09	2,62	
3	166257	CL 61A CR 48 Este-1089	90	Barro Blanco	22/01/2026	6,16	1,24	0,11	0,84	2,02	
1	166167	DG 48 19-38	90	Barro Blanco	23/01/2026	11,90	1,31	0,11	1,64	3,93	
2	166168	DG 48 19-42	90	Barro Blanco	23/01/2026	3,12	1,64	0,11	0,54	1,29	
3	166161	DG 48 19-112	90	Barro Blanco	23/01/2026	3,21	2,65	0,11	0,89	2,14	
4	166258	DG 48 19-120	90	Barro Blanco	23/01/2026	2,21	1,50	0,11	0,35	0,84	
1	166251	CL 85A CR 52-27	4	Bermejal Los Álamos	26/01/2026	12,00	1,65	0,12	2,38	5,70	
2	166253	CR 52A CL 85-46	4	Bermejal Los Álamos	26/01/2026	2,36	2,06	0,14	0,66	1,58	
3A	166254	CL 85A CR52-02	4	Bermejal Los Álamos	26/01/2026	3,60	1,21	0,14	0,57	1,37	
3B		CL 85A CR52-02	4	Bermejal Los Álamos	26/01/2026	2,02	1,90	0,14	0,52	1,24	
4	166263	CL 85A CR 52A -07	4	Bermejal Los Álamos	26/01/2026	2,13	1,72	0,14	0,49	1,19	
1	166295	CL 35 CR 46-59	10	Perpetuo Socorro	27/01/2026	6,85	1,70	0,15	1,49	3,58	
2A	166301	CL 35 CR 46-24	10	Perpetuo Socorro	27/01/2026	2,80	1,13	0,15	0,47	1,14	
2B		CL 35 CR 46-24	10	Perpetuo Socorro	27/01/2026	2,35	2,08	0,15	0,73	1,76	
3	166302	CL 35 CR 45A 45	10	Perpetuo Socorro	27/01/2026	2,85	2,28	0,15	0,97	2,34	
4	166320	CR 45A CL 34-46	10	Perpetuo Socorro	27/01/2026	5,30	1,18	0,15	0,91	2,18	
1	166343	CL 31 CR 44A 189	10	Perpetuo Socorro	28/01/2026	7,65	1,05	0,15	1,20	2,89	
2A	166344	CL 31 CR 44A 157	10	Perpetuo Socorro	28/01/2026	3,31	1,64	0,15	0,81	1,95	
2B		CL 31 CR 44A 157	10	Perpetuo Socorro	28/01/2026	2,73	1,05	0,15	0,43	1,03	
3	166352	CL34 CR 44A 56	10	Perpetuo Socorro	28/01/2026	4,08	1,71	0,16	1,12	2,68	
4	166607	CL 31 CR 44A - 60	10	Perpetuo Socorro	28/01/2026	2,40	1,71	0,15	0,62	1,48	
1A	166275	CR 43A CL 108B-19	1	Popular	29/01/2026	2,90	1,47	0,14	0,58	1,38	
1B		CR 43A CL 108B-19	1	Popular	29/01/2026	6,60	3,53	0,14	2,76	6,63	
2A	166415	CR 43A CL 108B-07	1	Popular	29/01/2026	1,75	1,26	0,13	0,28	0,66	
2B		CR 43A CL 108B-07	1	Popular	29/01/2026	2,18	1,90	0,13	0,52	1,24	
3	166404	CL 108B CR 43A-38	1	Popular	29/01/2026	2,27	1,64	0,13	0,47	1,12	
1	166275	CR 43A 108A-60	1	Popular	30/01/2026	4,30	3,76	0,19	2,99	7,18	
2	166606	CR 43A CL 108B-05	1	Popular	30/01/2026	3,90	2,73	0,15	1,60	3,83	
									0,00	0,00	
											178,63

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026				VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026				ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:					UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA		2,3,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

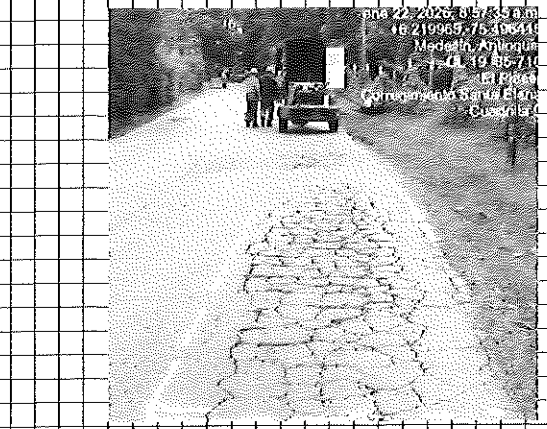





	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
1A	162392	CL 65 CR 75	7	San Germán	29/01/2026	4,38	1,76	0,18	1,23	2,96	
1B		CL 65 CR 75	7	San Germán	29/01/2026	2,52	0,75	0,18	0,30	0,73	
2	166464	CR 75 CL 65-02	7	San Germán	29/01/2026	5,10	2,90	0,18	2,37	5,69	
3	166463	CR 75 CL 64-171	7	San Germán	29/01/2026	1,54	1,64	0,11	0,28	0,67	
1A	161173	CR 67 CL 78-40	5	El Progreso	30/01/2026	6,32	4,21	0,17	4,52	10,86	
1B		CR 67 CL 78-40	5	El Progreso	30/01/2026	1,65	1,65	0,17	0,52	1,25	
											181,13
		FRENTE DE OBRA N°11									
1	165665	CR 46 CL 71-15	4	Manrique Central No.1	06/01/2026	7,90	2,65	0,13	2,72	6,53	
2	165668	CL 71A CR 45-83	4	Manrique Central No.1	06/01/2026	5,30	1,30	0,11	0,76	1,82	
3	165667	CL 71A CR 45-84	4	Manrique Central No.1	06/01/2026	4,60	1,80	0,10	0,83	1,99	
4	165668	CL 71A CR 45-77	4	Manrique Central No.1	06/01/2026	2,80	1,02	0,11	0,31	0,75	
1	165733	CR 64B CL 104A - 183	5	Héctor Abad Gómez	07/01/2026	4,00	0,98	0,14	0,55	1,32	
2	165734	CR 64B CL 104A - 181	5	Héctor Abad Gómez	07/01/2026	1,95	1,10	0,14	0,30	0,72	
3	165735	CR 64B CL 104A - 201	5	Héctor Abad Gómez	07/01/2026	9,20	1,40	0,13	1,67	4,02	
4	165737	CR 64B CL 104A - 211	5	Héctor Abad Gómez	07/01/2026	7,50	1,60	0,14	1,68	4,03	
1A	165831	CR 73 CL 42Sur-30	80	San Antonio de Prado	13/01/2026	3,10	4,70	0,13	1,89	4,55	
1B		CR 73 CL 42Sur-30	80	San Antonio de Prado	13/01/2026	1,70	4,30	0,13	0,95	2,28	
2A	165832	CR 73 CL 42Sur-28	80	San Antonio de Prado	13/01/2026	1,30	1,80	0,12	0,28	0,67	
2B		CR 73 CL 42Sur-28	80	San Antonio de Prado	13/01/2026	1,20	1,30	0,12	0,19	0,45	
3	165833	CR 73 CL 42Sur-17	80	San Antonio de Prado	13/01/2026	1,80	1,90	0,12	0,41	0,98	
4	165834	CR 73 CL 42Sur-20	80	San Antonio de Prado	13/01/2026	2,10	1,45	0,15	0,48	1,10	
1	165890	CL 73 CR 45A-05	4	Manrique Central No.1	14/01/2026	4,10	2,70	0,21	2,32	5,58	
2A	163724	CR 45A CL 73-20	4	Manrique Central No.1	14/01/2026	5,20	2,55	0,09	1,19	2,86	
2B		CR 45A CL 73-20	4	Manrique Central No.1	14/01/2026	4,60	3,60	0,09	1,49	3,58	
1A	165892	CL 92A CR 53B-17	4	Palermo	15/01/2026	1,65	1,20	0,09	0,18	0,43	
1B		CL 92A CR 53B-17	4	Palermo	15/01/2026	1,30	2,00	0,09	0,23	0,56	
2	142755	CL 92A CR 53B-23	4	Palermo	15/01/2026	3,15	4,15	0,10	1,31	3,14	
3	165893	CR 54 CL 92-10	4	Palermo	15/01/2026	5,55	2,10	0,10	1,17	2,80	
4A	165894	CR 54 CL 92-07	4	Palermo	15/01/2026	2,75	1,80	0,10	0,50	1,19	
4B		CR 54 CL 92-07	4	Palermo	15/01/2026	3,50	1,35	0,10	0,47	1,13	
5	165895	CR 54 CL 92-03	4	Palermo	15/01/2026	5,30	1,95	0,10	1,03	2,46	
6	165897	CR 54 CL 91-80	4	Palermo	15/01/2026	1,45	1,10	0,09	0,14	0,34	
1	165778	CR 52 CL 85A-33	4	Bermejal Los Álamos	16/01/2026	2,82	1,80	0,18	0,81	1,95	
2	163793	CR 52 CL 85A-23	4	Bermejal Los Álamos	16/01/2026	5,60	4,50	0,15	3,78	9,07	
											66,32
		FRENTE DE OBRA N°14									
1A	165644	CR79 CL47 11	11	El Velódromo	06/01/2026	6,30	2,65	0,14	2,34	5,61	
1B		CR79 CL47 11	11	El Velódromo	06/01/2026	1,75	3,60	0,14	0,88	2,12	
2	165651	CR79 CL47 26	11	El Velódromo	06/01/2026	3,90	1,20	0,14	0,66	1,57	
3A	165654	CR79 CL47 50	11	El Velódromo	06/01/2026	1,67	1,50	0,14	0,35	0,84	
3B		CR79 CL47 50	11	El Velódromo	06/01/2026	1,30	2,05	0,14	0,37	0,90	
1A	165685	CR81A CL51 54	12	Calasanz	07/01/2026	3,80	0,85	0,14	0,45	1,09	
1B		CR81A CL51 54	12	Calasanz	07/01/2026	1,90	1,30	0,14	0,35	0,83	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:			UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

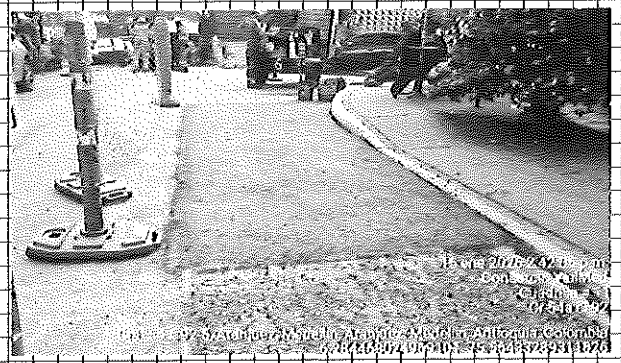

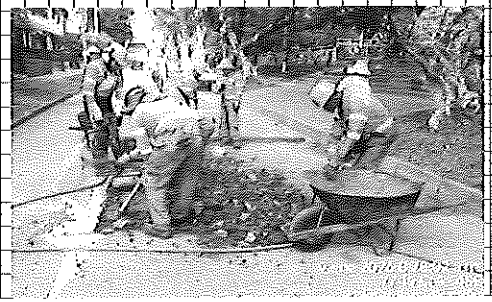



LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
2	165707	CL52 CR81 35	12	Calasanz	07/01/2026	6,00	1,20	0,14	1,01	2,42	
3	165683	CL51B CR81A 19	12	Calasanz	07/01/2026	6,70	1,65	0,14	1,55	3,71	
4	165695	CL51B CR81A 40	12	Calasanz	07/01/2026	2,50	2,60	0,15	0,98	2,34	
5	165708	CL51B CR81A 35	12	Calasanz	07/01/2026	3,95	1,15	0,15	0,68	1,64	
1	164817	CR 77 CL45B 115	11	El Velódromo	08/01/2026	3,00	4,55	0,16	2,18	5,24	
2A	165727	CR 77 CL45B 153	11	El Velódromo	08/01/2026	3,50	1,20	0,16	0,67	1,61	
2B		CR 77 CL45B 153	11	El Velódromo	08/01/2026	1,20	1,90	0,16	0,36	0,88	
3A	165729	CR 77 CL45B 153+2	11	El Velódromo	08/01/2026	3,10	2,00	0,16	0,99	2,38	
3B		CR 77 CL45B 153+2	11	El Velódromo	08/01/2026	2,50	1,60	0,16	0,64	1,54	
4	165745	CR 77 CL45B 125	11	El Velódromo	08/01/2026	2,20	1,50	0,05	0,17	0,40	
1	165762	CL45E CR77 07	11	El Velódromo	09/01/2026	4,40	3,80	0,14	2,34	5,62	
2A	165761	CL45E CR77 10	11	El Velódromo	09/01/2026	3,80	1,50	0,14	0,80	1,92	
2B		CL45E CR77 10	11	El Velódromo	09/01/2026	2,20	0,90	0,14	0,28	0,67	
3	165760	CL45E CR77 53	11	El Velódromo	09/01/2026	2,60	3,46	0,15	1,45	3,49	
4	165715	CR34 CL32C 99	11	La Castellana	09/01/2026	1,60	0,50	0,08	0,06	0,15	
5	165764	CR81 CL37 47	12	Simón Bolívar	09/01/2026	1,10	0,80	0,08	0,07	0,17	
1A	165819	CL44A CR78 51	11	El Velódromo	13/01/2026	1,90	3,60	0,15	1,03	2,48	
1B		CL44A CR78 51	11	El Velódromo	13/01/2026	3,80	3,00	0,15	1,71	4,10	
2	165824	CR77 CL44 09	11	El Velódromo	13/01/2026	2,95	1,90	0,15	0,84	2,02	
3	165825	CR77 CL44 21	11	El Velódromo	13/01/2026	1,65	1,00	0,15	0,25	0,59	
4	165826	CR77 CL44 14	11	El Velódromo	13/01/2026	3,20	1,00	0,15	0,48	1,15	
5	165827	CR77 CL44 29	11	El Velódromo	13/01/2026	3,70	1,00	0,15	0,56	1,33	
6	152339	CL45FF CR77 93	11	El Velódromo	13/01/2026	0,60	0,60	0,05	0,01	0,03	
7	143113	CL45FF CR77 97	11	El Velódromo	13/01/2026	0,50	0,60	0,05	0,02	0,04	
8	157052	CL45FF CR77 95	11	El Velódromo	13/01/2026	0,50	0,50	0,07	0,02	0,04	
9	162884	CL45FF CR77 23	11	El Velódromo	13/01/2026	1,30	1,00	0,08	0,10	0,25	
1	165842	CL42C CR81 144	11	La America	14/01/2026	2,80	3,30	0,17	1,57	3,77	
2A	165843	CR82 CL42C 15	11	La America	14/01/2026	3,70	1,30	0,17	0,82	1,96	
2B		CR82 CL42C 15	11	La America	14/01/2026	1,70	1,90	0,17	0,55	1,32	
3	165844	CR82 CL42C 15 + 1	11	La America	14/01/2026	3,00	2,40	0,17	1,22	2,94	
4A	165845	CR82 CL42C 35	11	La America	14/01/2026	2,30	1,60	0,08	0,29	0,71	
4B		CR82 CL42C 35	11	La America	14/01/2026	1,55	3,60	0,09	0,53	1,27	
1A	165845 (Segunda capa)	CR82 CL42C 35	11	La America	15/01/2026	2,30	1,60	0,08	0,22	0,53	
1B		CR82 CL42C 35	11	La America	15/01/2026	1,55	3,60	0,08	0,35	0,85	
2	165884	CR82 CL42C 73	11	La America	15/01/2026	1,35	1,70	0,13	0,30	0,72	
3A	165874	CR82 CL42D 05	11	La America	15/01/2026	2,55	3,60	0,13	1,19	2,86	
3B		CR82 CL42D 05	11	La America	15/01/2026	1,55	2,20	0,13	0,44	1,06	
4	165885	CR82 CL42D 09	11	La America	15/01/2026	4,40	2,00	0,13	1,14	2,75	
5A	165888	CR82 CL42D 31	11	La America	15/01/2026	2,50	1,95	0,11	0,54	1,29	
5B		CR82 CL42D 31	11	La America	15/01/2026	1,45	2,30	0,11	0,37	0,88	
6	165896	CR82 CL42D 59	11	La America	15/01/2026	4,15	1,00	0,11	0,46	1,10	
1A	165926	CR82 CL45E 10	11	La Floresta	16/01/2026	3,50	1,70	0,14	0,83	2,00	
1B		CR82 CL45E 10	11	La Floresta	16/01/2026	3,00	3,80	0,14	1,60	3,83	
2A	165927	CR82 CL45E 22	11	La Floresta	16/01/2026	3,80	1,80	0,12	0,82	1,97	
2B		CR82 CL45E 22	11	La Floresta	16/01/2026	1,78	2,70	0,12	0,57	1,37	
3	165928	CR82 CL45E 36	11	La Floresta	16/01/2026	3,10	1,00	0,12	0,37	0,89	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026			VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

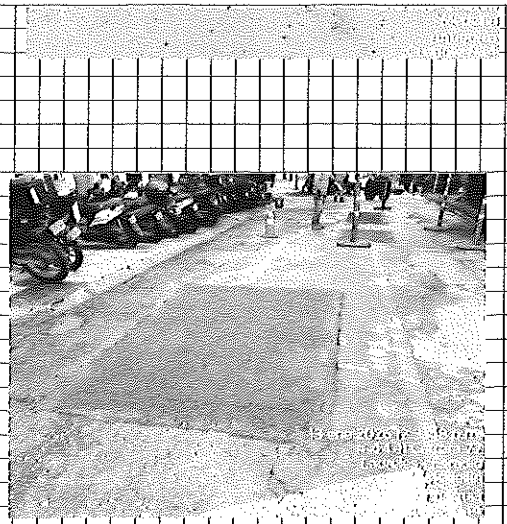

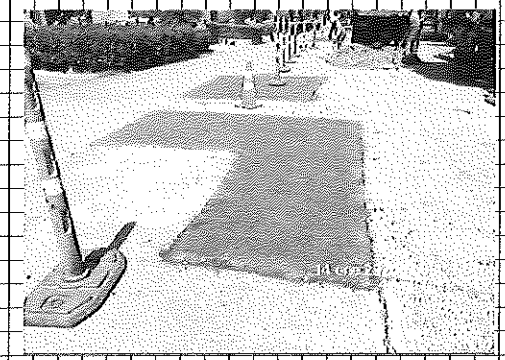

	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
4	165929	CR82 CL45E 42	11	La Floresta	16/01/2026	5,60	1,20	0,12	0,81	1,94	
1	165981	CR82 CL45F 00	11	La Floresta	19/01/2026	1,90	2,40	0,14	0,64	1,53	
2A	165982	CR82 CL45F 02	11	La Floresta	19/01/2026	1,60	3,20	0,14	0,72	1,72	
2B		CR82 CL45F 02	11	La Floresta	19/01/2026	1,20	0,80	0,14	0,13	0,32	
3	165983	CR82 CL45F 08	11	La Floresta	19/01/2026	2,15	1,60	0,14	0,48	1,16	
4	166004	CR82 CL45F 09	11	La Floresta	19/01/2026	1,80	1,00	0,14	0,25	0,60	
5	165984	CR82 CL45F 47	11	La Floresta	19/01/2026	7,00	1,70	0,14	1,67	4,00	
6	165985	CR82 CL45F 65	11	La Floresta	19/01/2026	3,70	2,50	0,08	0,69	1,67	
1A	166026	CL31 CR81 84	16	Belen	20/01/2026	0,84	1,55	0,13	0,17	0,41	
1B		CL31 CR81 84	16	Belen	20/01/2026	1,60	0,90	0,13	0,19	0,45	
2	164369	CL31 CR81A 61	16	Belen	20/01/2026	4,10	2,20	0,13	1,17	2,81	
3	166027	CL31 CR81 82	16	Belen	20/01/2026	5,80	1,65	0,13	1,24	2,99	
4	166025	CL31 CR81 72	16	Belen	20/01/2026	1,70	0,90	0,13	0,20	0,48	
5	166024	CL31 CR81 56	16	Belen	20/01/2026	5,70	1,73	0,14	1,38	3,31	
6	166031	CR81A CL30AA 66	16	Belen	20/01/2026	1,60	1,30	0,13	0,27	0,65	
7	166030	CR81A CL30AA 26	16	Belen	20/01/2026	1,50	1,10	0,13	0,21	0,51	
8	156648	CR81A CL30AA 10	16	Belen	20/01/2026	1,60	0,90	0,13	0,18	0,42	
1	166095	CR82 TV45C 30	11	La Floresta	21/01/2026	2,00	1,20	0,15	0,36	0,86	
2	166096	CR82 TV45C 15	11	La Floresta	21/01/2026	1,30	0,80	0,15	0,16	0,37	
3	161499	CR82 TV45C 09	11	La Floresta	21/01/2026	1,20	0,80	0,15	0,14	0,35	
4	166087	TV45C CR82 25	11	La Floresta	21/01/2026	3,20	1,10	0,15	0,53	1,27	
5	166088	TV45C CR82 33	11	La Floresta	21/01/2026	2,70	2,15	0,15	0,87	2,09	
6	166089	TV45C CR82 37	11	La Floresta	21/01/2026	3,00	1,70	0,15	0,77	1,84	
7	166090	TV45C CR82 48	11	La Floresta	21/01/2026	1,70	1,20	0,15	0,31	0,73	
8	166097	TV45C CR84 45	11	La Floresta	21/01/2026	1,40	1,80	0,14	0,37	0,89	
9A	166098	TV45C CR84 47	11	La Floresta	21/01/2026	2,30	1,90	0,14	0,61	1,47	
9B		TV45C CR84 47	11	La Floresta	21/01/2026	3,10	1,10	0,14	0,48	1,15	
1A	166123	CL37B CR84A 06	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	1,20	2,00	0,18	0,43	1,04	
1B		CL37B CR84A 06	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	1,00	1,00	0,18	0,18	0,43	
2	166122	CL37B CR84A 05	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	1,60	3,70	0,18	1,07	2,56	
3	166124	CL37B CR84A 53	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	7,30	0,90	0,15	0,99	2,37	
4	166125	CL37B CR84A 55	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	6,80	1,00	0,15	1,02	2,45	
5	156581	CL37B CR84B 56	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	1,40	1,35	0,14	0,26	0,64	
6	164190	CR86 CL37 105	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	1,15	1,50	0,14	0,24	0,58	
1	166169	CR90 CL38 07	12	Santa Mónica	23/01/2026	7,90	2,10	0,13	2,16	5,18	
2	166170	CR90 CL38 15	12	Santa Mónica	23/01/2026	1,30	1,40	0,14	0,25	0,61	
3A	166171	CR90 CL38 37	12	Santa Mónica	23/01/2026	1,10	2,50	0,13	0,36	0,86	
3B		CR90 CL38 37	12	Santa Mónica	23/01/2026	1,50	1,60	0,13	0,31	0,75	
4	166172	CR90 CL38 39	12	Santa Mónica	23/01/2026	3,30	1,80	0,13	0,77	1,85	
5	166173	CR90 CL38 67	12	Santa Mónica	23/01/2026	4,30	2,08	0,13	1,16	2,79	
1	166264	CL43 CR89 24	12	El Danubio	26/01/2026	3,15	2,75	0,14	1,21	2,91	
2A	166266	CR89 CL42C 58	12	El Danubio	26/01/2026	1,76	1,65	0,14	0,41	0,98	
2B		CR89 CL42C 58	12	El Danubio	26/01/2026	3,20	1,55	0,14	0,69	1,67	
3A	166278	CR89 CL42C 02	12	El Danubio	26/01/2026	1,30	3,45	0,14	0,63	1,51	
3B		CR89 CL42C 02	12	El Danubio	26/01/2026	4,70	1,10	0,14	0,72	1,74	
4	166277	CR89 CL41 48	12	El Danubio	26/01/2026	4,50	0,80	0,14	0,50	1,21	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026			VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA		31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.		FORMULA:						UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches BRÁscora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
1A	165690	CL 66 CR 24AA-24	8	El Pinal	09/01/2026	7,10	2,46	0,12	2,10	6,03	
1B		CL 66 CR 24AA-24	8	El Pinal	09/01/2026	2,11	1,60	0,12	0,41	0,97	
2A	165770	CL 66 CR 24AA-43	8	El Pinal	09/01/2026	4,74	2,69	0,12	1,53	3,67	
2B		CL 66 CR 24AA-43	8	El Pinal	09/01/2026	1,33	1,24	0,12	0,20	0,47	
3	165772	CL 66 CR 24AA-42	8	El Pinal	09/01/2026	1,75	1,75	0,12	0,37	0,88	
1A	165600	CR 24 CL 62-84	8	La Libertad	13/01/2026	10,70	2,40	0,15	3,85	9,24	
1B		CR 24 CL 62-84	8	La Libertad	13/01/2026	3,10	1,64	0,15	0,76	1,83	
1A	162382	CL 65 CR 74B-109	7	San Germán	14/01/2026	4,72	3,50	0,17	2,81	6,74	
1B		CL 65 CR 74B-109	7	San Germán	14/01/2026	1,05	2,15	0,17	0,38	0,92	
2	165861	CL 65 CR 74C-07	7	San Germán	14/01/2026	1,58	1,62	0,16	0,41	0,98	
3	165862	CL 65 CR 74C-11	7	San Germán	14/01/2026	4,20	1,50	0,16	1,01	2,42	
1A	162387	CR 74B CL 65-172	7	San Germán	15/01/2026	4,60	2,45	0,09	1,01	2,43	
1B		CR 74B CL 65-172	7	San Germán	15/01/2026	6,45	4,50	0,09	2,61	6,27	
2	162388	CR 74BB CR 66-29	7	San Germán	15/01/2026	5,01	1,77	0,11	0,98	2,34	
1A	165919	CL 19 47A ESTE E-119	90	El Placer	16/01/2026	6,65	0,91	0,11	0,67	2,08	
1B		CL 19 47A ESTE E-119	90	El Placer	16/01/2026	6,06	2,90	0,11	1,93	4,64	
2	165930	CL 19 47A ESTE E-93	90	El Placer	16/01/2026	2,90	1,70	0,11	0,54	1,30	
1	165919 (Segunda parte)	CL 19 CR 47A Este E-119	90	El Placer	19/01/2026	6,85	3,24	0,08	1,62	3,64	
2A	165923	CL 19 CR 47A Este E--117	90	El Placer	19/01/2026	2,70	2,33	0,12	0,76	1,81	
2B		CL 19 CR 47A Este E--117	90	El Placer	19/01/2026	6,62	1,39	0,12	1,09	2,61	
1A	165924	CL 19 CR 47A Este E-135	90	El Placer	20/01/2026	3,37	4,48	0,13	1,96	4,71	
1B		CL 19 CR 47A Este E-135	90	El Placer	20/01/2026	4,30	1,39	0,13	0,78	1,86	
2	165919 (Tercer parte)	CL 19 CR 47A Este E-119	90	El Placer	20/01/2026	6,00	2,43	0,05	0,73	1,76	
1A	166017	CL 19 47A ESTE E-47	90	El Placer	21/01/2026	2,96	1,70	0,12	0,60	1,45	
1B		CL 19 47A ESTE E-47	90	El Placer	21/01/2026	2,53	1,55	0,12	0,47	1,13	
2A	166018	CL 19 47A ESTE E-45	90	El Placer	21/01/2026	5,90	3,19	0,11	2,07	4,97	
2B		CL 19 47A ESTE E-45	90	El Placer	21/01/2026	1,30	1,40	0,11	0,20	0,48	
1	166075	CL 19 CR 35-714	90	El Placer	22/01/2026	2,90	1,60	0,09	0,39	0,94	
2	166115	CL 19 CR 35-716	90	El Placer	22/01/2026	5,60	1,95	0,09	0,98	2,36	
3	166077	CL 19 CR 35-718	90	El Placer	22/01/2026	4,40	2,10	0,09	0,83	2,00	
4	166126	CL 19 CR 35-712	90	El Placer	22/01/2026	4,60	1,74	0,04	0,33	0,80	
5	166128	CL 19 CR 35-682	90	El Placer	22/01/2026	3,12	2,92	0,04	0,36	0,87	
6	166129	CL 19 CR 35-666	90	El Placer	22/01/2026	3,62	3,24	0,04	0,46	1,09	
1A	166070	CL 19 CR 35-450	90	El Placer	23/01/2026	4,08	4,48	0,10	1,83	4,39	
1B		CL 19 CR 35-450	90	El Placer	23/01/2026	0,90	1,80	0,10	0,16	0,39	
2	166073	CL 19 CR 35-462	90	El Placer	23/01/2026	3,30	4,25	0,10	1,40	3,37	
1	162390	CR 74C CL 66	7	San Germán	26/01/2026	4,30	3,83	0,10	1,65	3,95	
2	164218	CL 66 CR 74C-44	7	San Germán	26/01/2026	3,75	4,10	0,10	1,54	3,69	
3	166282	CL 66 CR 74C-37	7	San Germán	26/01/2026	8,00	1,55	0,07	0,92	2,22	
4	162387 (Segunda capa)	CR 74B CL 65-172	7	San Germán	26/01/2026	3,65	2,60	0,05	0,48	1,16	
1	166244	CR 74C CL 66-57	7	San Germán	27/01/2026	5,25	2,76	0,12	1,74	4,17	
2	166325	CR 74C CL 66-49	7	San Germán	27/01/2026	6,22	1,86	0,11	1,27	3,05	
3	166245	CR 74C CL 66-33	7	San Germán	27/01/2026	2,89	4,22	0,11	1,34	3,22	
4	166282 (Segunda capa)	CL 66 CR 74C-37	7	San Germán	27/01/2026	8,00	1,65	0,05	0,66	1,58	
1	166364	CL 65 CR 70-137	7	Ecoparque Cerro El Volador	28/01/2026	1,03	1,10	0,16	0,18	0,44	
2	140294	CL 65 CR 70-177	7	Ecoparque Cerro El Volador	28/01/2026	7,10	2,15	0,17	2,60	6,23	
3	166365	CL 65 CR 70-243	7	Ecoparque Cerro El Volador	28/01/2026	3,62	1,77	0,16	1,03	2,60	
4	166366	CL 65 CR 70-137 +5M	7	Ecoparque Cerro El Volador	28/01/2026	2,85	2,20	0,05	0,31	0,76	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026	HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.1.2	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	FORMULA:			UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,14	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Bache Básicra	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
1A	166307	CR80 CL44B 15	12	La America	27/01/2026	1,20	1,90	0,17	0,39	0,93	
1B		CR80 CL44B 15	12	La America	27/01/2026	4,10	1,90	0,17	1,32	3,18	
2	166327	CR80 CL44B 05	12	La America	27/01/2026	5,05	1,60	0,17	1,37	3,30	
3	166310	CR80 CL44 121	12	La America	27/01/2026	4,30	1,45	0,16	1,00	2,39	
4	166550	CR80 CL44 100	12	Los Pinos	27/01/2026	0,90	0,90	0,13	0,11	0,25	
1	166354	CR81 CL43B 75	12	La America	28/01/2026	9,30	1,30	0,18	2,18	5,22	
2	166355	CR81 CL43B 72	12	La America	28/01/2026	9,20	1,20	0,16	1,77	4,24	
1	166399	CR81 CL43 22	12	La America	29/01/2026	5,60	1,20	0,18	1,25	3,01	
2	166402	CR81 CL43 44	12	La America	29/01/2026	5,00	0,90	0,17	0,77	1,84	
3	166485	CR81 CL43 70	12	La America	29/01/2026	6,90	1,06	0,18	1,32	3,16	
4	166447	CR81 CL43 96	12	La America	29/01/2026	7,40	1,00	0,17	1,26	3,02	
1A	166518	CR80 CL44B-15	12	La America	30/01/2026	3,00	2,60	0,14	1,05	2,52	
1B		CR80 CL44B-15	12	La America	30/01/2026	8,60	2,00	0,15	2,58	6,19	
2	166523	CR80 CL44B-03	12	La America	30/01/2026	0,75	1,70	0,15	0,19	0,46	
3	166517	CR80 CL44B-01	12	La America	30/01/2026	1,65	1,40	0,15	0,35	0,83	
											201,88

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	1150,65
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1150,65
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	8788,11
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	9938,76
TOTAL POR EJECUTAR	-469,57

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026			VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA		31/01/2026			ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vietmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	1.2.1.3	DESCRIPCION		Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.		FORMULA:				UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	3,11

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

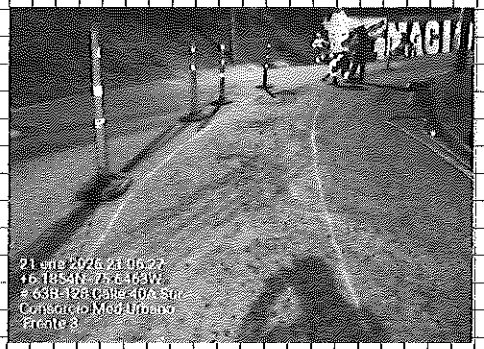



	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°3											
1	166039	CL 19 CR 35 Este-430	90	El Placer	19/01/2026	3,30	1,54	0,11	0,56	1,34	
2	166040	CL 19 CR 35 Este-400	90	El Placer	19/01/2026	3,60	1,65	0,11	0,65	1,57	
3	166042	CL 19 CR 35 Este-378	90	El Placer	19/01/2026	4,30	1,60	0,11	0,85	2,04	
4	166043	CL 19 CR 35 Este-374	90	El Placer	19/01/2026	8,40	1,40	0,11	1,29	3,10	
1	166205	CL 43 Sur CR 75B-38	80	San Antonio de Prado	20/01/2026	15,75	2,00	0,16	5,04	12,10	
1	166206	CL 40A Sur CR 63-128	80	San Antonio de prado	22/01/2026	11,69	1,60	0,24	4,28	10,22	
1	166207	CL 38B Sur CR 69 -54	80	San Antonio de prado	23/01/2026	9,40	1,60	0,15	2,54	6,09	
2	166208	CL 38B Sur CR 69 -86	80	San Antonio de prado	23/01/2026	5,00	2,00	0,15	1,68	4,03	
3	166209	CR 69C CL 38 Sur - 37	80	San Antonio de prado	23/01/2026	4,50	1,10	0,13	0,64	1,54	
4	166210	CL 39 Sur CR 70 - 35	80	San Antonio de prado	23/01/2026	1,00	1,08	0,14	0,15	0,38	
											42,39
FRENTE DE OBRA N°11											
1	165748	CR 64AA CL 113A-381	5	Toscana	08/01/2026	1,90	11,65	0,10	2,21	5,31	
2	165749	CR 64AA CL 120-16	5	Toscana	08/01/2026	1,90	11,60	0,09	1,98	4,76	
1	165785	CR 64AA CL 113A-383	5	Toscana	09/01/2026	1,80	13,50	0,11	2,67	6,42	
2	165784	CR 64AA CL 120-17	5	Toscana	09/01/2026	1,60	7,10	0,08	0,91	2,18	
3	159978	CR 64AA CL 120-101	5	Toscana	09/01/2026	3,20	1,62	0,12	0,62	1,49	
1A	166008	CL 56Sur CR 70-58	80	San Antonio de Prado	19/01/2026	6,00	4,40	0,12	3,17	7,60	
1B		CL 56Sur CR 70-58	80	San Antonio de Prado	19/01/2026	4,50	3,45	0,12	1,86	4,47	
1A	166117	CL 56Sur CR 70-50	80	San Antonio de Prado	20/01/2026	4,20	1,70	0,13	0,93	2,23	
1B		CL 56Sur CR 70-50	80	San Antonio de Prado	20/01/2026	5,40	0,75	0,13	0,53	1,26	
2	166118	CL 56Sur CR 70-54	80	San Antonio de Prado	20/01/2026	9,00	2,30	0,13	2,69	6,46	
3	166119	CR 75 CL 54Sur-01	80	San Antonio de Prado	20/01/2026	2,90	2,50	0,13	0,94	2,26	
1	166158	CL 56Sur CR 70-62	80	San Antonio de Prado	22/01/2026	10,60	2,81	0,11	3,34	8,01	
2	166159	CL 56Sur CR 70-74	80	San Antonio de Prado	22/01/2026	1,10	0,65	0,11	0,08	0,19	
3	166160	CL 56Sur CR 70-78	80	San Antonio de Prado	22/01/2026	0,70	1,10	0,11	0,08	0,20	
4	166162	CR 75 CL 62Sur-02	80	San Antonio de Prado	22/01/2026	3,45	1,40	0,15	0,72	1,74	
1	166270	CL 41Sur CR 62B-33	80	San Antonio de Prado	23/01/2026	2,30	1,17	0,08	0,22	0,52	
2A	166271	DG 60E CL 41BSur-19	80	San Antonio de Prado	23/01/2026	4,90	3,20	0,18	2,82	6,77	
2B		DG 60E CL 41BSur-19	80	San Antonio de Prado	23/01/2026	2,00	3,00	0,06	0,30	0,72	
3	166272	CL 41CSur CR 60E-03	80	San Antonio de Prado	23/01/2026	6,30	1,40	0,19	1,68	4,02	
1	166287	CL 18A CR 48-67	14	Villa Carlota	26/01/2026	3,00	2,00	0,12	0,72	1,73	
2	166288	CL 18A CR 48-62	14	Villa Carlota	26/01/2026	1,60	2,60	0,11	0,51	1,24	
3	166289	CL 18A CR 48-48	14	Villa Carlota	26/01/2026	1,20	2,50	0,11	0,33	0,79	
4A	166290	CL 18A CR 48-38	14	Villa Carlota	26/01/2026	3,50	2,30	0,11	0,99	2,31	
4B		CL 18A CR 48-38	14	Villa Carlota	26/01/2026	3,65	3,35	0,11	1,42	3,40	
5	166292	CL 18A CR 48-08	14	Villa Carlota	26/01/2026	1,75	1,10	0,15	0,29	0,69	
1A	166341	CR 38 CL 29-64	9	La Asomadera No.1	27/01/2026	1,40	9,02	0,06	0,76	1,82	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°	DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	69.105.687.265	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.2.1.3	DESCRIPCION	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	FORMULA:	UNIDAD	TON	FRENTE DE OBRA	3,11

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN						DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	Id (SIRO)	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
1B		CR 38 CL 29-64	9	La Asomadera No.1	27/01/2026	0,79	9,05	0,18	1,29	3,09	
1A	166435	CL 53 CR 49-155	10	La Candelaria	28/01/2026	1,85	1,70	0,12	0,38	0,91	
1B		CL 53 CR 49-155	10	La Candelaria	28/01/2026	2,50	2,00	0,12	0,60	1,44	
2A	166164	CL 53 CR 49-145	10	La Candelaria	28/01/2026	1,80	3,20	0,15	0,86	2,07	
2B		CL 53 CR 49-145	10	La Candelaria	28/01/2026	2,60	2,10	0,15	0,88	2,12	
3	166607	CL 53 CR 47-55	10	La Candelaria	28/01/2026	4,30	2,20	0,15	1,51	3,63	
1	166500	CR 48 CL 11B Sur-331	14	La Aguacatala	29/01/2026	5,25	1,65	0,15	1,30	3,12	
2	166502	CR 48 CL 14Sur-15	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	3,40	2,30	0,14	1,09	2,63	
3A	166503	CR 48 CL 14Sur-19	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	1,20	3,65	0,18	0,79	1,89	
3B		CR 48 CL 14Sur-19	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	2,70	2,10	0,18	1,02	2,45	
1A	166349	CR 51 CL 35-69	10	Perpetuo Socorro	30/01/2026	3,40	2,80	0,14	1,33	3,20	
1B		CR 51 CL 35-69	10	Perpetuo Socorro	30/01/2026	3,00	1,60	0,14	0,76	1,81	
2A	166552	CR 51 CL 35-74	10	Perpetuo Socorro	30/01/2026	1,90	1,70	0,15	0,48	1,16	
2B		CR 51 CL 35-74	10	Perpetuo Socorro	30/01/2026	5,50	1,67	0,15	1,30	3,11	
3	166553	CL 35 CR 51-11	10	Perpetuo Socorro	30/01/2026	2,10	1,60	0,11	0,37	0,89	
											112,11

ELABORÓ

Juan Camilo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	154,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	154,50
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1378,47
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1530,97
TOTAL POR EJECUTAR	-154,50

COD. FO-GEOP-026	Formato	Alcaldía de Medellín
Versión 2	FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105 887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026				HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.2.1	DESCRIPCION	Rango 3. De 8 a 19.99 m3/Jornada.	FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	13	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

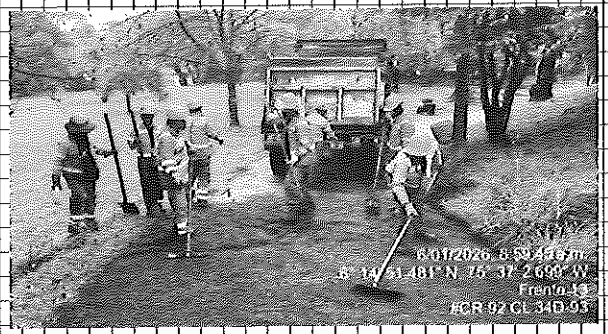



Id Fichas Básicas	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LOCALIZACIÓN LARGO	DIMENSIONES ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°13										
1	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	06/01/2026	58,00	4,00	0,08	232,00	18,78	
1	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	07/01/2026	47,00	4,70	0,08	220,90	18,73	
1	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	08/01/2026	28,00	4,95	0,08	138,60	8,32	
2	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	08/01/2026	9,00	6,00	0,08	54,00	3,24	
3	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	08/01/2026	32,00	3,60	0,08	115,20	7,19	
1	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	09/01/2026	6,00	4,60	0,08	28,80	1,73	
2	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	09/01/2026	23,00	4,20	0,08	96,60	6,05	
3	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	09/01/2026	22,00	1,80	0,08	39,60	2,38	
4	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	09/01/2026	22,00	5,40	0,08	118,80	7,13	
5	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	09/01/2026	4,00	4,00	0,08	16,00	0,96	
6	CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	09/01/2026	2,00	4,00	0,08	8,00	0,48	
1A	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	13/01/2026	10,00	3,50	0,08	35,00	2,97	
1B	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	13/01/2026	7,50	3,60	0,10	27,00	2,70	
1C	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	13/01/2026	9,10	7,50	0,10	68,25	6,83	
1A	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	10,00	3,50	0,08	35,00	2,80	
1B	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	7,50	3,60	0,08	27,00	2,16	
1C	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	9,10	7,50	0,08	68,25	5,46	
1D	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	7,50	4,30	0,17	32,25	5,48	
1E	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	8,80	1,80	0,16	12,24	2,16	
1F	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	3,50	3,80	0,09	13,30	1,20	
1A	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	3,50	3,80	0,08	13,30	1,06	
1B	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	2,70	3,80	0,19	10,26	1,95	
1C	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	3,10	2,34	0,19	7,25	1,38	
1D	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	3,60	4,10	0,19	14,76	2,80	
1E	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	4,70	5,60	0,20	26,32	5,14	
2A	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	3,40	1,60	0,19	5,44	1,03	
2B	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	4,00	4,00	0,19	19,60	3,72	
2C	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	4,80	2,30	0,19	11,04	2,10	
1	CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	16/01/2026	44,00	5,50	0,08	242,00	19,21	
1A	CR 112 CL 12 CL 12 + 87	70	Buga Patio Bonito	19/01/2026	18,30	5,12	0,15	93,70	14,28	
1B	CR 112 CL 12 CL 12 + 87	70	Buga Patio Bonito	19/01/2026	2,90	3,20	0,15	9,28	1,39	
1C	CR 112 CL 12 CL 12 + 87	70	Buga Patio Bonito	19/01/2026	6,10	5,00	0,10	30,50	3,05	
1	CL 8A CR 112 - 82	70	Buga Patio Bonito	20/01/2026	3,35	3,10	0,10	10,39	1,04	

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026			HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.2.2.1	DESCRIPCION	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	13	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



Id Excel BitSecra	LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
2	CL 8A CR 112 - 82	70	Buga Patio Bonito	20/01/2026	17,60	5,10	0,11	90,78	9,81	
3	CL 8A CR 112 - 82	70	Buga Patio Bonito	20/01/2026	6,70	3,00	0,11	20,19	2,21	
4A	CR 112 CL 12 CL 12 + 87	70	Buga Patio Bonito	20/01/2026	6,10	5,00	0,08	30,50	1,83	
4B	CR 112 CL 12 CL 12 + 87	70	Buga Patio Bonito	20/01/2026	11,50	2,40	0,14	27,60	3,86	
1A	CL 121 CR 30 - 18	1	Santo Domingo Savio No.2	21/01/2026	35,00	3,92	0,10	137,20	13,04	
1B	CL 121 CR 30 - 18		Santo Domingo Savio No.2	21/01/2026	6,10	2,00	0,10	12,20	1,22	
1C	CL 121 CR 30 - 18	1	Santo Domingo Savio No.2	21/01/2026	2,20	5,00	0,10	11,00	1,10	
1D	CL 121 CR 30 - 18	1	Santo Domingo Savio No.2	21/01/2026	3,00	2,95	0,10	8,85	0,89	
1E	CL 121 CR 30 - 18	1	Santo Domingo Savio No.2	21/01/2026	3,90	5,20	0,10	20,28	1,01	
1F	CL 121 CR 30 - 18	1	Santo Domingo Savio No.2	21/01/2026	4,00	5,30	0,10	21,20	1,06	
1	CL 121 CR 30 - 18	1	Santo Domingo Savio No.2	22/01/2026	11,40	5,00	0,10	57,00	5,70	
2A	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	22/01/2026	14,50	4,80	0,15	69,60	10,44	
2B	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	22/01/2026	6,20	4,80	0,09	29,76	2,70	
1A	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	23/01/2026	6,20	4,80	0,05	29,76	1,49	
1B	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	23/01/2026	19,60	5,25	0,14	102,90	14,28	
1C	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	23/01/2026	6,30	5,30	0,09	33,39	3,01	
1A	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	26/01/2026	6,30	5,30	0,05	33,39	1,67	
1B	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	26/01/2026	15,20	6,30	0,11	95,76	11,00	
1C	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	26/01/2026	9,00	6,30	0,10	56,70	5,67	
1A	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	27/01/2026	9,00	6,30	0,05	56,70	2,84	
1B	CL 118 CR 30 CR 30 +	1	Santo Domingo Savio No.2	27/01/2026	16,70	6,00	0,15	100,20	15,50	
1	CL 118 CR 48A CR 458	2	La Isla	28/01/2026	17,36	6,00	0,16	104,16	16,29	
2	CR 48A CL 112A CL 118	2	La Isla	28/01/2026	7,30	3,00	0,12	21,90	2,63	
										294,15

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Cesar Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	294,15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	294,15
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1484,23
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1778,38
TOTAL POR EJECUTAR	121,62

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026		VALOR	$		59.105.897.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026			HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.2.2	DESCRIPCION	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.		FORMULA:					UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°23										
1	CR 78A CL 45G Y CL 46	11	El Velódromo	23/01/2026	96,50	3,95	0,09	381,18	33,18	
2	CR 78A CL 45G Y CL 46	11	El Velódromo	23/01/2026	4,22	1,76	0,13	7,43	0,97	
1	CR 78A CL 46 Y CL 47	11	El Velódromo	26/01/2026	100,00	4,12	0,10	412,00	40,38	
2	CR 78A CL 47 Y CL 47D	11	El Velódromo	26/01/2026	23,61	4,12	0,10	97,27	9,53	
1	CR 78A CL 45G Y CL 46	11	El Velódromo	27/01/2026	76,00	4,01	0,09	304,76	28,82	
3	CR 78A CL 46 Y CL 47	11	El Velódromo	27/01/2026	54,62	4,10	0,09	223,94	19,93	
1	CR 78A CL 46 Y CL 47	11	El Velódromo	28/01/2026	30,00	4,25	0,09	127,50	11,88	
2	CR 78A CL 47 Y CL 47D	11	El Velódromo	28/01/2026	11,75	4,25	0,09	49,94	4,64	
3	CL 47 CR 78A Y CL 79	11	El Velódromo	28/01/2026	31,00	11,14	0,09	345,34	32,12	
1	CR 78A CL 47 Y CL 47D	11	El Velódromo	29/01/2026	117,95	4,11	0,09	484,77	43,63	
										223,04

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	223,04
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	223,04
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3689,47
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3912,51
TOTAL POR EJECUTAR	527,28

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026			HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.2.2.3	DESCRIPCION	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.			FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	21

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

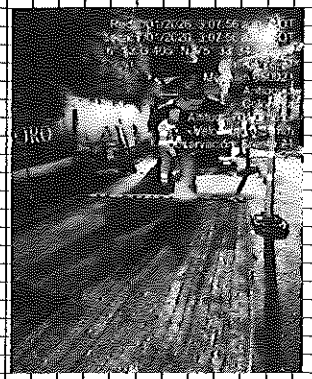

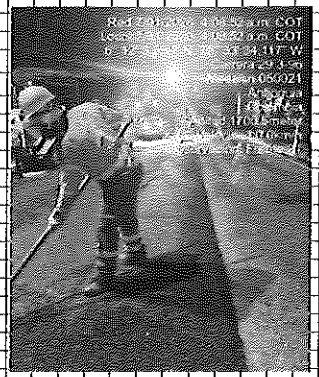

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Bachas Básicora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°21										
1	CR 29 CR 29 CL 4	14	El Tesoro	06/01/2026	18,02	3,58	0,10	64,51	8,52	
2A	CL 4 CR 29 - 188.1 CR 29	14	El Tesoro	06/01/2026	19,70	8,56	0,10	168,63	17,54	
2B	CL 4 CR 29 - 188.1 CR 29	14	El Tesoro	06/01/2026	19,40	8,61	0,11	167,03	17,54	
1	CR 29 CR 29 CL 4	14	El Tesoro	07/01/2026	22,78	3,41	0,11	77,68	8,16	
2A	CR 29 CL 4 CL 5	14	El Tesoro	07/01/2026	8,00	2,20	0,10	17,60	0,92	
2B	CR 29 CL 4 CL 5	14	El Tesoro	07/01/2026	28,30	3,41	0,11	96,50	10,13	
3	CR 29 CL 5 CL 6	14	El Tesoro	07/01/2026	38,20	3,99	0,11	152,42	16,16	
1	CR 29 CR 29 CL 4	14	El Tesoro	08/01/2026	40,00	3,55	0,11	142,00	14,91	
2A	CR 29 CL 4 CL 5	14	El Tesoro	08/01/2026	27,20	3,55	0,11	96,56	10,14	
2B	CR 29 CL 4 CL 5	14	El Tesoro	08/01/2026	8,00	2,05	0,08	16,40	1,31	
3A	CR 29 CL 5 CL 6	14	El Tesoro	08/01/2026	30,00	3,62	0,11	108,60	11,73	
3B	CR 29 CL 5 CL 6	14	El Tesoro	08/01/2026	4,60	5,20	0,10	23,92	2,49	
1	CR 29 CL 5 CL 6	14	El Tesoro	09/01/2026	10,50	3,70	0,10	38,85	3,98	
2A	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	09/01/2026	13,34	6,35	0,10	84,71	8,61	
2B	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	09/01/2026	32,12	8,63	0,10	277,20	28,83	
1A	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	13/01/2026	79,00	3,60	0,10	284,40	29,58	
1B	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	13/01/2026	8,70	3,12	0,08	27,14	2,17	
2	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	13/01/2026	13,70	7,10	0,10	97,27	9,92	
1A	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	14/01/2026	14,49	8,47	0,10	122,73	12,52	
1B	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	14/01/2026	7,20	5,45	0,10	39,24	4,00	
2	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	14/01/2026	23,43	7,06	0,10	165,42	16,87	
1	CL 7 CR 25 + 400 CR 28A	14	El Tesoro	15/01/2026	7,70	5,35	0,10	41,20	4,20	
2A	CL 7 CR 28A CR 29	14	El Tesoro	15/01/2026	17,90	6,61	0,10	118,32	12,07	
2B	CL 7 CR 28A CR 29	14	El Tesoro	15/01/2026	10,00	7,40	0,10	74,00	7,55	
3	CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	15/01/2026	37,00	4,75	0,10	175,75	17,93	
1	CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	16/01/2026	30,00	7,24	0,10	217,20	22,59	
2	CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	16/01/2026	46,50	3,66	0,10	170,19	17,53	
3A	CR 9 F CL 10 SUR +200 CL 16A SUR	90	Las Palmas	16/01/2026	5,08	3,50	0,08	17,78	1,42	
3B	CR 9 F CL 10 SUR +200 CL 16A SUR	90	Las Palmas	16/01/2026	0,25	3,50	0,13	0,88	0,11	
1	CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	19/01/2026	119,55	3,42	0,10	408,66	41,70	
1	CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	20/01/2026	30,00	3,64	0,10	109,20	11,14	
2	CR 29D CL 5G TV 7A	14	El Tesoro	20/01/2026	82,00	3,64	0,10	298,70	30,47	
1A	CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	22/01/2026	116,81	3,50	0,10	408,84	40,68	
1B	CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	22/01/2026	12,00	1,28	0,05	15,36	0,77	
1A	CR 29D CL 5G TV 7A	14	El Tesoro	23/01/2026	50,49	5,11	0,10	258,00	26,06	
1B	CR 29D CL 5G TV 7A	14	El Tesoro	23/01/2026	32,22	4,84	0,10	155,94	15,59	
1	CR 30 CR 30 CR 29D	14	El Tesoro	27/01/2026	71,69	5,69	0,09	407,92	34,67	
1	CR 29D CL 5G TV 7A	14	El Tesoro	28/01/2026	51,00	4,07	0,10	207,57	20,98	
2	CR 30 CR 30 CR 29D	14	El Tesoro	28/01/2026	14,90	4,58	0,10	68,24	7,03	
3A	TV 7A CR 29D CR 30	14	El Tesoro	28/01/2026	17,58	3,50	0,10	61,53	6,28	
3B	TV 7A CR 29D CR 30	14	El Tesoro	28/01/2026	20,79	6,54	0,10	135,97	13,60	
1	CR 29D CL 5G TV 7A	14	El Tesoro	29/01/2026	41,70	4,65	0,10	193,91	19,78	
2	CR 30 CR 29D CR 30	14	El Tesoro	29/01/2026	36,37	7,61	0,10	276,78	28,23	
1A	TV 7A CR 29D CR 30	14	El Tesoro	30/01/2026	34,61	4,64	0,10	160,69	16,38	
1B	TV 7A CR 29D CR 30	14	El Tesoro	30/01/2026	16,25	3,84	0,10	62,40	6,36	
2	TV 7A CR 29D CR 30	14	El Tesoro	30/01/2026	37,29	3,86	0,10	143,94	14,68	
										652,19

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Colce Álvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Ramiro Andrés Ángel Saltarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	652,19
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	652,19
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	2245,39
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2897,58
TOTAL POR EJECUTAR	-652,19

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	1.3.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia Semidensa MSC-25 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) que cumpla con los artículos 462 y 450.2.4 de la norma INVIAS 2022, con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Bases Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°23										
1	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	07/01/2026	52,00	6,89	0,10	358,28	35,63	
2	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	07/01/2026	17,36	3,39	0,10	58,85	5,69	
1	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	08/01/2026	114,74	3,45	0,11	395,85	41,66	
1	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	09/01/2026	69,32	3,45	0,11	239,15	25,11	
2	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	09/01/2026	65,00	6,94	0,11	451,10	47,37	
1	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	14/01/2026	111,38	3,77	0,11	419,90	45,77	
2	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	14/01/2026	2,59	3,87	0,11	10,02	1,09	
1	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	15/01/2026	114,95	3,55	0,12	408,07	46,93	
1	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	4	Sevilla	16/01/2026	102,31	3,47	0,11	355,02	39,78	
										289,31

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	289,31
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	289,31
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	176,76
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	466,07
TOTAL POR EJECUTAR	-289,31

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	1.3.2	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica discontinua tibla SMA (Stone Mastic Asphalt), las cuales se pueden obtener bajo el resultado de la combinación de material bituminoso, agregados de granulometría discontinua con gran cantidad de gruesos, poco tamaño medio y gran cantidad de finos, con fibras de celulosa y eventualmente aditivos, bajo las normas SMA Internacionales y en concordancia con lo estipulado en la norma INVIAS 2022 para estos casos especiales y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificados. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

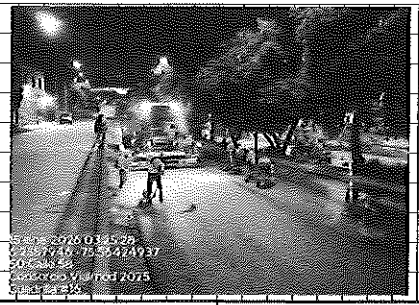

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°16										
1A	CR 46 INDEP CR 51 CR 50A	10	Prado	14/01/2026	112,00	9,14	0,05	1023,68	51,18	
1B	CR 46 INDEP CR 51 CR 50A	10	Prado	14/01/2026	11,52	5,41	0,05	62,32	3,12	
1	CR 46 INDEP CR 51 CR 50A	10	Prado	15/01/2026	121,00	9,14	0,05	1105,94	55,30	
1	CL 6 CR 25 - CR 28	14	El Tesoro	19/01/2026	124,10	7,41	0,05	919,58	45,98	
1	CL 6 CL 5 - CR 28	14	El Tesoro	20/01/2026	124,68	6,72	0,05	839,19	41,96	
1A	CL 6 CR 28 - CR 29	14	El Tesoro	22/01/2026	133,00	7,12	0,05	946,96	47,35	
1B	CL 6 CR 28 - CR 29	14	El Tesoro	22/01/2026	23,90	2,78	0,05	66,44	3,32	
								0,00	0,00	
										248,21

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	248,21
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	248,21
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	509,77
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	757,98
TOTAL POR EJECUTAR	-185,29

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

											HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026			VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada												
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026			HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.3.4	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificado, incluya suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluya reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografía. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	16,16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACION				DIMENSIONES					
M Bachos Bifalcore	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°18										
1	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	13/1/2026	119,15	3,50	0,08	417,13	33,37	
1	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	14/1/2026	139,74	3,74	0,08	522,63	41,81	
1	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	15/1/2026	50,00	3,66	0,08	183,00	14,64	
2	CL 29 - ENTRE CR 45 - CL 29 -	14	Barrio Colombia	15/1/2026	92,85	3,66	0,08	339,83	27,19	
1	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	16/1/2026	13,50	3,66	0,08	49,41	3,95	
2	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	16/1/2026	33,53	3,56	0,08	119,37	9,55	
3	CL 29 - ENTRE CR 45 - CL 29 -	14	Barrio Colombia	19/1/2026	50,00	6,10	0,08	305,00	24,40	
1	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	19/1/2026	67,41	3,70	0,08	249,42	19,95	
2	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	19/1/2026	41,00	3,70	0,20	151,70	30,34	
1	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	20/1/2026	39,51	3,60	0,20	142,24	28,45	
2	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	20/1/2026	33,14	3,50	0,20	116,50	21,70	
1	CL 29 CR 45 CR 45	14	Barrio Colombia	22/1/2026	36,19	3,50	0,08	126,67	10,13	
2	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	22/1/2026	44,54	3,60	0,20	160,62	31,62	
1	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	23/1/2026	30,52	7,11	0,20	217,00	43,40	
1	CL 29 + ENTRE CR 45 + CR 45 +	10	Perpetuo socorro	26/1/2026	40,00	7,03	0,07	281,20	19,68	
2	CL 22 + CR 45 + CR 52 +	10	Perpetuo socorro	26/1/2026	44,95	7,03	0,07	315,00	22,12	
										382,93
FRENTE DE OBRA N°16										
1	CL 29 CR 43A # 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	6/1/2026	45,24	7,00	0,20	316,68	63,34	
1	CL 29 CR 43A # 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/1/2026	12,57	7,01	0,20	88,12	17,62	
2	CL 29 CR 43A # 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/1/2026	8,60	12,00	0,20	103,20	20,64	
3	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	7/1/2026	7,00	12,00	0,20	84,00	16,80	
3	CL 29 CR 43A CR 43	13	San Diego	8/1/2026	30,00	3,49	0,20	104,70	20,94	
4	CR 29 CR 43 CR 43A	13	San Diego	8/1/2026	29,80	3,50	0,20	104,30	20,86	
1	CL 29 CR 43A CR 43	13	San Diego	8/1/2026	30,00	3,50	0,20	105,00	21,00	
2	CR 29 CR 43 CR 43A	13	San Diego	9/1/2026	29,70	3,50	0,20	103,95	20,79	
1	CR 29 CR 43 CR 43A	13	San Diego	13/1/2026	80,91	3,79	0,20	306,65	61,33	
14	CL 29 CR 43 - CR 43A	14	Colombia	15/1/2026	70,00	3,50	0,20	245,00		
15	CL 29 CR 43 - CR 43A	14	Colombia	16/1/2026	19,54	3,75	0,20	74,75		
										383,13

ELABORÓ

Residente de Obra

Residente de Interventoría

REVISÓ

Director de Obra

Director de Interventoría

OBSERVACIONES

SUBTOTAL ESTA HOJA	645,92
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	645,92
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1886,52
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2532,44
TOTAL POR EJECUTAR	787,56


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.3.6	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidense MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografia HORARIO DIURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



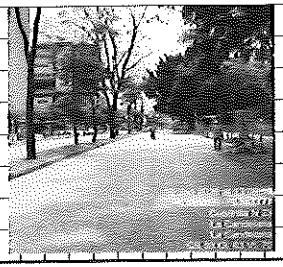

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°23										
1	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	4	Sevilla	19/01/2026	111,50	7,12	0,09	793,68	72,24	
2	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	4	Sevilla	19/01/2026	57,55	2,54	0,09	146,18	13,15	
1	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	4	Sevilla	20/01/2026	90,00	7,05	0,09	634,50	55,20	
2	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	20/01/2026	49,05	7,05	0,09	345,80	30,08	
1	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	21/01/2026	71,00	6,90	0,09	489,90	43,60	
2	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	21/01/2026	51,75	3,50	0,09	181,13	16,12	
										230,40

ELABORÓ

Juan Gustavo Rodriguez
Residente de Obra

Leidy Bibiana Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Director de Obra

Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	230,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	230,40
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	145,89
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	376,29
TOTAL POR EJECUTAR	-131,29

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105 887 255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.3.6	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluya: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografía. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	15,16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

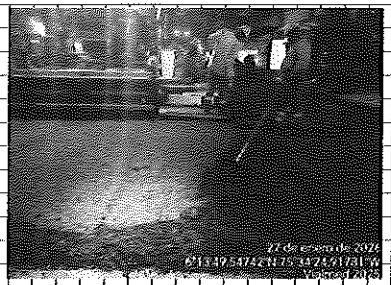



	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°15										
3	CR 48 CL 29 CL 30	10	Perpetuo socorro	26/01/2026	26,07	12,00	0,04	312,84	12,51	
1	CL 29 - INIPUE CR 48 - CL 29 -	14	Barrio Colombia	27/01/2026	31,00	9,50	0,06	294,50	17,67	
2	CL 29 - INIPUE CR 48 - CL 29 -	14	Barrio Colombia	27/01/2026	30,00	6,90	0,06	207,00	12,42	
3	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	27/01/2026	23,30	6,90	0,06	160,77	9,65	
4	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	27/01/2026	29,27	10,70	0,06	313,19	18,79	
1	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	28/01/2026	117,20	10,70	0,06	1254,04	75,24	
1	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	29/01/2026	69,05	10,70	0,06	738,84	46,55	
2	CL 29 CR 43A CR 43G	14	Barrio Colombia	29/01/2026	45,15	10,70	0,06	483,11	29,95	
3	CL 29 CR 43A CR 43G	14	Barrio Colombia	29/01/2026	12,08	5,60	0,06	67,65	4,19	
1	CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	30/01/2026	26,10	3,70	0,06	96,57	5,79	
2	CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	30/01/2026	95,00	7,20	0,06	684,00	41,04	
3	CR 43A CR 43A CL 29	10	San Diego	30/01/2026	8,51	5,00	0,06	42,55	2,55	
4	CR 43 CL 29 CL 29+41	10	San Diego	30/01/2026	12,24	12,50	0,06	153,00	9,18	
										285,53
FRENTE DE OBRA N°18										
1	CL 29 CR 45 INIPUE CR 48	14	Barrio Colombia	05/01/2026	21,28	7,14	0,10	151,94	15,19	
2	CL 29 INIPUE CR 52 FINPUE CR 52	15	Santa Fe	05/01/2026	50,00	7,14	0,10	357,00	35,70	
1	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	07/01/2026	8,70	12,15	0,06	105,71	6,66	
2	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	07/01/2026	7,13	12,15	0,06	86,63	5,46	
1	CR 43A + INIPUE CL 29 CL 29	14	Barrio Colombia	08/01/2026	18,90	6,84	0,05	129,28	6,46	
2	CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	08/01/2026	40,00	3,56	0,04	142,40	5,70	
1	CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	09/01/2026	10,00	3,50	0,06	35,00	2,10	
2	CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	09/01/2026	13,89	3,50	0,06	48,62	2,92	
										80,19

ELABORÓ

Juan Gonzalo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	365,72
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	365,72
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1951,41
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2317,13
TOTAL POR EJECUTAR	-112,13

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105 887 255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.3.7	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



Id Bache BAlcora	LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°23										
Resalto	CR 78A CL 45G Y CL 46	11	El Velódromo	27/01/2026	7,85	3,00	0,08	23,55	1,88	
										1,88

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Nubia Calle
Director de Obra

Director de Interventoria

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	1,88
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,88
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	29,21
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	31,09
TOTAL POR EJECUTAR	67,91


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.265	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	1.4.1	DESCRIPCION	Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), Incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 450-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO DIURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

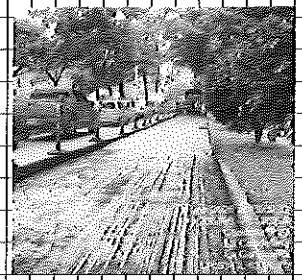

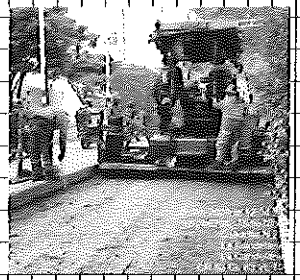

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
H Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°23										
Fresado	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	06/01/2026	52,00	8,89	0,18	358,28	64,49	
Fresado	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	06/01/2026	47,50	3,39	0,18	161,03	28,98	
Fresado	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	07/01/2026	65,00	2,70	0,18	175,50	31,59	
Fresado	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	08/01/2026	90,00	3,45	0,18	310,50	55,89	
Fresado	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	08/01/2026	64,90	6,90	0,18	447,81	80,61	
Fresado	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	13/01/2026	155,00	3,78	0,24	585,90	138,27	
Fresado	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	14/01/2026	97,00	3,55	0,30	344,35	103,99	
Fresado	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	15/01/2026	69,00	3,50	0,29	241,50	69,07	
										572,89

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Jaime Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	572,89
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	572,89
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	292,79
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	865,68
TOTAL POR EJECUTAR	-515,68

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		69.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.4.2	DESCRIPCION	Fresado de vias con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), Incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO NOCTURNO	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	15,16

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

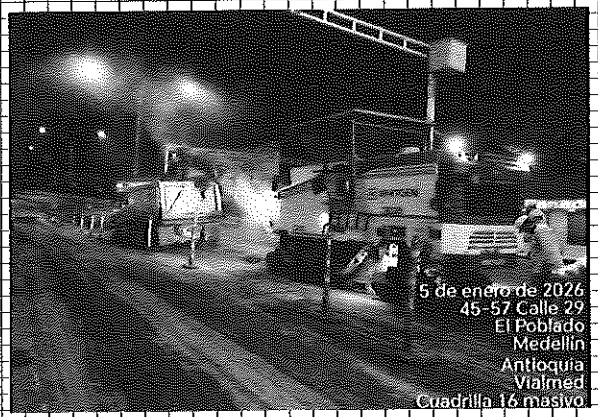

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
H Sardinel Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°15										
Fresado	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	13/01/2026	119,18	3,50	0,14	417,13	58,40	
Fresado	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	14/01/2026	139,74	3,74	0,14	522,63	73,17	
Fresado	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	15/01/2026	50,00	3,68	0,14	183,00	25,62	
Fresado	CL 29 - INIPUE CR 49 - CL 29 -	14	Barrio Colombia	15/01/2026	92,85	3,66	0,14	339,83	47,58	
Fresado	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	16/01/2026	13,50	3,68	0,14	49,41	6,92	
Fresado	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	16/01/2026	33,53	3,56	0,14	119,37	16,71	
Fresado	CL 29 - INIPUE CR 49 - CL 29 -	14	Barrio Colombia	16/01/2026	50,00	6,10	0,14	305,00	42,70	
Fresado	CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	19/01/2026	67,41	3,70	0,14	249,42	34,92	
Fresado	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	19/01/2026	41,00	3,70	0,26	151,70	39,44	
Fresado	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	20/01/2026	39,51	3,60	0,26	142,24	36,98	
Fresado	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	20/01/2026	30,14	3,60	0,26	108,50	28,21	
Fresado	CL 29 CR 45 CR 46	14	Barrio Colombia	22/01/2026	36,19	3,50	0,14	126,67	17,73	
Fresado	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	22/01/2026	44,34	3,60	0,26	159,62	41,50	
Fresado	CL 29 CR 44 CR 45	14	Barrio Colombia	23/01/2026	30,62	7,11	0,26	217,00	56,42	
Fresado	CL 29 + INIPUE CR 48 + CR 48 +	10	Perpetuo socorro	26/01/2026	40,00	7,03	0,12	281,20	33,74	
Fresado	CL 29 + CR 48 + CR 52 +	10	Perpetuo socorro	26/01/2026	44,95	7,03	0,12	316,00	37,92	
Fresado	CR 48 CL 29 CL 30	10	Perpetuo socorro	26/01/2026	26,07	12,00	0,08	312,84	25,03	
										622,99
FRENTE DE OBRA N°16										
Fresado	CL 29 CR 45 INIPUE CR 48	14	Barrio Colombia	05/01/2026	21,28	7,14	0,10	151,94	15,19	
Fresado	CL 29 INIPUE CR 52 FINPUE CR 52	15	Santa Fe	05/01/2026	50,00	7,14	0,10	357,00	35,70	
Fresado	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	06/01/2026	45,24	7,00	0,26	316,68	82,34	
Fresado	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	07/01/2026	12,57	7,01	0,26	88,12	22,91	
Fresado	CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	07/01/2026	8,60	12,00	0,26	103,20	26,83	
Fresado	CL 29 CR 43G CR 44	14	Barrio Colombia	07/01/2026	7,00	12,00	0,26	84,00	21,84	
Fresado	CR 43A + INIPUE CL 29 CL 29	14	Barrio Colombia	08/01/2026	18,90	6,84	0,05	129,28	6,46	
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	08/01/2026	40,00	3,56	0,01	142,40	1,42	
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	08/01/2026	30,00	3,49	0,26	104,70	27,22	
Fresado	CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	08/01/2026	29,80	3,50	0,26	104,30	27,12	
Fresado	CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	09/01/2026	30,00	3,50	0,26	105,00	27,30	
Fresado	CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	09/01/2026	29,70	3,50	0,26	103,95	27,03	
Fresado	CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	13/01/2026	80,91	3,79	0,26	306,65	79,73	
Fresado	CL 29 CR 43 - CR 43A	14	Colombia	16/01/2026	70,00	3,50	0,26	245,00	63,70	
Fresado	CL 29 CR 43 - CR 43A	14	Colombia	16/01/2026	19,94	3,75	0,26	74,78	19,44	
Fresado	CL 6 CR 25 - CR 28	14	El Tesoro	19/01/2026	124,10	7,41	0,05	919,58	45,98	
Fresado	CL 6 CL 6 - CR 28	14	El Tesoro	20/01/2026	124,68	6,72	0,05	839,19	41,96	
Fresado	CL 6 CR 28 - CR 29	14	El Tesoro	22/01/2026	133,00	7,12	0,05	946,96	47,35	
Fresado	CL 6 CR 28 - CR 29	14	El Tesoro	22/01/2026	23,50	2,78	0,05	65,44	3,32	
										622,84

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Cortes Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	1245,83
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1245,83
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	3954,65
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5200,38
TOTAL POR EJECUTAR	-1245,83

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	69.105.687.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						
ITEM	1.4.3	DESCRIPCION	Sellado de grietas, comprende suministro, aplicación de sello SIN ruteado de grieta, de 18 mm de espesor por 19 mm de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas.	FORMULA:		UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	6		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°5										
NA	CR 46 INIDEP CR 51 CR 50A	10	Prado	07/01/2026	880,00				880,00	
NA	CL 58 CR 50A CR 51	10	Villanueva	07/01/2026	1100,00				1100,00	
NA	CR 46 INIDEP CR 51 CR 50A	10	Prado	08/01/2026	550,00				550,00	
NA	CL 58 CR 50A CR 51	10	Villanueva	08/01/2026	1100,00				1100,00	
NA	CL 44 CR 69 CR 68A	11	San Joaquín	08/01/2026	123,00				123,00	
NA	CL 44 CR 68 CR 69	11	San Joaquín	08/01/2026	152,00				152,00	
NA	CL 44 CR 65 CR 66	11	Naranjal	08/01/2026	127,00				127,00	
NA	CL 44 CR 64 CR 65	11	Naranjal	08/01/2026	143,00				143,00	
NA	CL 44 CR 69 CR 68A	11	San Joaquín	09/01/2026	128,00				128,00	
NA	CL 44 CR 68 CR 69	11	San Joaquín	09/01/2026	82,00				82,00	
NA	CL 44 CR 65 CR 66	11	Naranjal	09/01/2026	256,00				256,00	
NA	CL 44 CR 64 CR 65	11	Naranjal	09/01/2026	254,00				254,00	
NA	CL 44 CR 69 CR 70	11	Naranjal	13/01/2026	283,00				283,00	
NA	CL 44 CR 68A CR 69	11	Naranjal	13/01/2026	54,00				54,00	
NA	CL 44 CR 68 CR 68A	11	San Joaquín	13/01/2026	97,00				97,00	
NA	CL 44 CR 68 CR 68	11	San Joaquín	13/01/2026	80,00				80,00	
NA	CL 44 CR 69 CR 70	11	Naranjal	14/01/2026	153,00				153,00	
NA	CL 44 CR 68A CR 69	11	Naranjal	14/01/2026	181,00				181,00	
NA	CL 44 CR 69 CR 68A	11	San Joaquín	14/01/2026	58,00				58,00	
NA	CL 44 CR 68 CR 68	11	San Joaquín	14/01/2026	29,00				29,00	
NA	CL 44 CR 65 CR 66	11	Naranjal	14/01/2026	45,00				45,00	
NA	CL 43 CR 69A CR 70	11	Bolivariana	14/01/2026	302,00				302,00	
NA	CL 43 CR 69 CR 69A	11	Bolivariana	14/01/2026	319,00				319,00	
NA	CL 43 CR 68A CR 69	11	San Joaquín	14/01/2026	135,00				135,00	
NA	CL 43 CR 68 CR 68A	11	San Joaquín	15/01/2026	512,00				512,00	
NA	CL 43 CR 67A CR 68	11	San Joaquín	16/01/2026	162,00				162,00	
NA	CL 43 CR 67 CR 67A	11	San Joaquín	16/01/2026	110,00				110,00	
NA	CL 43 CR 66 CR 67	11	San Joaquín	16/01/2026	80,00				80,00	
NA	CL 43 CR 65 CR 66	11	San Joaquín	16/01/2026	152,00				152,00	
NA	CL 49B CR 64B CR 64C	11	Suramericana	16/01/2026	648,00				648,00	
NA	CR 64B CL 49A CL 49B	11	Suramericana	19/01/2026	870,00				870,00	
NA	CL 49B CR 64B CR 64C	11	Suramericana	19/01/2026	534,00				534,00	
NA	CL 49B CR 64C CR 65	11	Suramericana	20/01/2026	692,00				692,00	
NA	CL 49B CR 65 CR 66	11	Suramericana	20/01/2026	406,00				406,00	
NA	CL 49B CR 65 CR 66	11	Suramericana	21/01/2026	756,00				756,00	
NA	CL 49B CR 66 CR 67	11	Suramericana	21/01/2026	139,00				139,00	
NA	CL 49B CR 67B CR 68	11	Suramericana	21/01/2026	362,00				362,00	
NA	CL 49B CR 68 CR 69	11	Suramericana	22/01/2026	376,00				376,00	
NA	CL 49B CR 69 CR 70	11	Suramericana	22/01/2026	606,00				606,00	
NA	CL 49B CR 67 CR 67A	11	Suramericana	23/01/2026	98,00				98,00	
NA	CL 49B CR 67A CR 67B	11	Suramericana	23/01/2026	185,00				185,00	
NA	CL 49B CR 68 CR 69	11	Suramericana	23/01/2026	305,00				305,00	
NA	CR 45 CL 66 CL 67	4	Manrique Central No.1	26/01/2026	210,00				210,00	
NA	CL 66A CR 45 CR 47	4	Manrique Central No.1	27/01/2026	180,00				180,00	
NA	CL 67 CR 47 CR 48A	4	Manrique Central No.1	27/01/2026	234,00				234,00	
NA	CL 67 CR 48A CR 49	4	Manrique Central No.1	27/01/2026	193,00				193,00	
NA	CL 67 CR 49 CR 50	10	Prado	27/01/2026	105,00				105,00	
NA	CL 67 CR 50 CR 50A	4	San Pedro	27/01/2026	71,00				71,00	
NA	CL 67 CR 50A CR 50B	4	San Pedro	27/01/2026	38,00				38,00	
NA	CL 67 CR 50B CR 50C	4	San Pedro	27/01/2026	32,00				32,00	
NA	CL 67 CR 50C CR 51	10	Prado	27/01/2026	60,00				60,00	

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2028	VALOR	$		69.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°		7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	1.4.3	DESCRIPCION	Sellado de grietas, comprende suministro, aplicación de sello SIN ruteado de grieta, de 16 mm de espesor por 19 mm de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	6

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
NA	CL 67 CR 51	10	Prado	27/01/2026	155,00				155,00	
NA	CL 67 CR 51B CR 51C	4	Sevilla	27/01/2026	95,00				95,00	
NA	CR 45 CL 66 CL 67	4	Manrique Central No.1	28/01/2026	99,00				99,00	
NA	CL 66A CR 45 CR 47	4	Manrique Central No.1	28/01/2026	30,00				30,00	
NA	CL 67 CR 47 CR 48A	4	Manrique Central No.1	28/01/2026	72,00				72,00	
NA	CL 67 CR 48A CR 49	4	Manrique Central No.1	28/01/2026	71,00				71,00	
NA	CL 67 CR 51B CR 51C	4	Sevilla	28/01/2026	23,00				23,00	
NA	CL 67 CR 51C CR 51D	4	Sevilla	28/01/2026	77,00				77,00	
NA	CL 67 CR 51D CR 52	4	Sevilla	28/01/2026	79,00				79,00	
NA	CL 67 CR 52 CR 53	4	Sevilla	28/01/2026	236,00				236,00	
NA	CR 52 CL 67 CL 67A	4	Sevilla	29/01/2026	200,00				200,00	
NA	CR 52 CL 67A CL 68	4	Sevilla	29/01/2026	121,00				121,00	
NA	CR 52 CL 68 CL 69	4	Sevilla	29/01/2026	74,00				74,00	
NA	CR 52 CL 69 CL 70	4	Sevilla	29/01/2026	89,00				89,00	
NA	CR 52 CL 70 CL 71	4	Sevilla	29/01/2026	80,00				80,00	
NA	CR 52 CL 71 CL 73	4	Sevilla	29/01/2026	452,00				452,00	
NA	CL 30 CR 69B CR 70	15	Granada	30/01/2026	751,00				751,00	
										17850,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	17850,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	17850,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	7580,01
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	25430,01
TOTAL POR EJECUTAR	-17850,00


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.4.5	DESCRIPCION	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,13,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



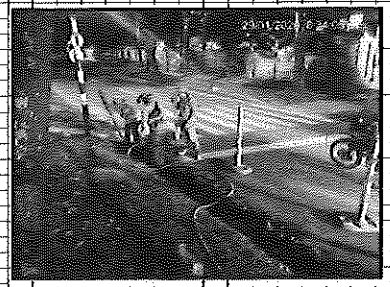

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Bachas Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
			FRENTE DE OBRA N°19							
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	06/01/2026	3,59	9,53		34,21	34,21	
NA	CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	16/01/2026	19,50	0,10		1,95	1,95	
NA	CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	17/01/2026	21,80	0,10		2,18	2,18	
										38,34
			FRENTE DE OBRA N°13							
NA	CL 11 + CL 10 CR 48	14	Manila	29/01/2026	17,60	8,00	0,19	140,80	140,80	
NA	CL 11 CR 48 CR 48	14	Manila	29/01/2026	7,40	3,40	0,19	25,16	25,16	
NA	CL 11 CR 48 CR 48	14	Manila	29/01/2026	5,00	7,00	0,19	35,00	35,00	
NA	CL 11 CR 48 CR 48	14	Manila	30/01/2026	16,50	7,00	0,19	115,50	115,50	
NA	CL 11 + CL 10 CR 48	14	Manila	30/01/2026	7,00	7,10	0,19	49,70	49,70	
										365,16
			FRENTE DE OBRA N°18							
NA	CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	06/01/2026	36,65	0,05		1,83	1,83	
NA	CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	07/01/2026	7,40	0,05		0,37	0,37	
NA	CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	08/01/2026	22,40	0,05		1,12	1,12	
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	10/01/2026	8,00	0,05		0,40	0,40	
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	13/01/2026	31,45	0,05		1,57	1,57	
NA	CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de Los Angeles	15/01/2026	8,85	0,05		0,44	0,44	
NA	CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	20/01/2026	22,70	0,05		1,14	1,14	
NA	CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	21/01/2026	7,00	0,05		0,35	0,35	
NA	R 48 DG 47A Y CL 18C S	14	Santa María de los Ángeles	23/01/2026	54,20	0,05		2,71	2,71	
NA	CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	28/01/2026	12,15	0,05		0,61	0,61	
NA	CR 48 CL18 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	28/01/2026	11,80	0,05		0,59	0,59	
NA	CR 48 DG 47A Y CL 15 S	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	47,50	0,05		2,38	2,38	
NA	CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	30/01/2026	30,41	0,05		1,52	1,52	
NA	CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	31/01/2026	36,00	0,05		1,80	1,80	
										19,03
			FRENTE DE OBRA N°10							
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	07/01/2026	13,00	3,52		45,76	45,76	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	09/01/2026	14,60	3,47		50,66	50,66	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	14/01/2026	15,60	3,48		54,29	54,29	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	19/01/2026	13,10	3,25		42,58	42,58	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	21/01/2026	15,20	3,44		52,29	52,29	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	23/01/2026	14,90	3,44		51,28	51,28	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	24/01/2026	13,77	3,55		48,27	48,27	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	26/01/2026				24,64	24,64	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	26/01/2026	5,00	3,58		17,80	17,80	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	28/01/2026	15,00	3,60		54,00	54,00	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	29/01/2026	15,20	3,52		53,50	53,50	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	30/01/2026	13,60	3,47		47,19	47,19	
										640,24

ELABORÓ

Juan Gustavo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Cadena Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Caballero Vasquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES

SUBTOTAL ESTA HOJA	961,57
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	961,57
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	276,43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1237,00
TOTAL POR EJECUTAR	-607,00

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.6	DESCRIPCION	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado.	FORMULA:		UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	10,13,18,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

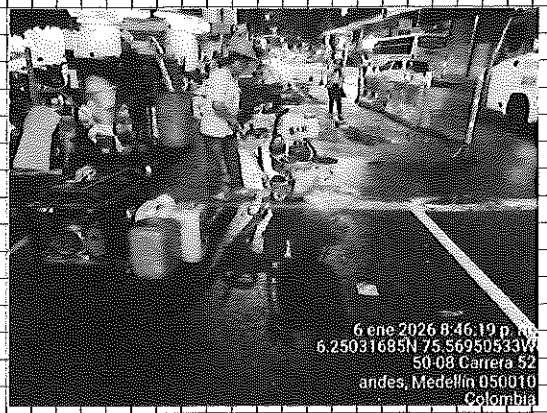

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	05/01/2026	16,97				16,97	
										16,97
FRENTE DE OBRA N°13										
NA	CL 11 + CL 10 CR 48	14	Manila	30/01/2026	7,10				7,10	
NA	CL 11 + CL 10 CR 48	14	Manila	30/01/2026	28,20				28,20	
										35,30
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	05/01/2026	106,08				106,08	
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	09/01/2026	142,40				142,40	
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	21/01/2026	28,40				28,40	
NA	CR 48 CL15 Sur Y CL18 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	27/01/2026	28,92				28,92	
NA	CR 48 DG 47A Y CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	47,50				47,50	
NA	CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	30/01/2026	30,41				30,41	
NA	CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	31/01/2026	36,00				36,00	
										417,71
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	9/01/2026	5,00				5,00	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	15/01/2026	23,68				23,68	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	19/01/2026	76,93				76,93	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	26/01/2026	5,60				5,60	
										110,19

ELABORÓ

Juan Gonzalo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Gómez Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Ramírez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Santiago
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	580,17
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	580,17
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1139,17
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1719,34
TOTAL POR EJECUTAR	-580,17

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.887.265
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.4.7	DESCRIPCION	Transporte, aplicación y compactación de llenos con material reciclado de fresado de pavimento, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellín. Medido en sitio.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Bache Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°2										
NA	CR 69 CL 85-04	5	Castilla	23/01/2026	1,60	1,60	0,60	2,56	1,54	
										1,54

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES

SUBTOTAL ESTA HOJA	1,54
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,54
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	56,60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	58,14
TOTAL POR EJECUTAR	161,86

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026		VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)			CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026			HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.		FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA			2,3,6,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

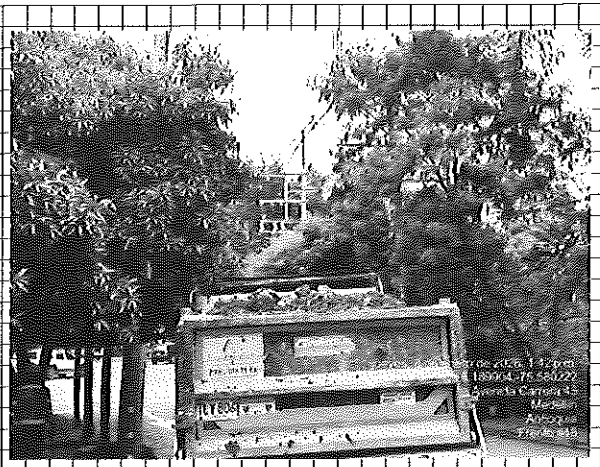



LOCALIZACION					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°2										
CL 108 CR 22-20	14	Altos del Poblado	06/01/2026	Pavimentar				2,69	2,69	
CR 65A CL 31-36	16	Fátima	07/01/2026	Pavimentar				2,69	2,69	
CL 51 CR 39-23	10	Boston	08/01/2026	Pavimentar				2,68	2,68	
CL 12 Sur CR 10-383	14	Los Balsos No.1	09/01/2026	Pavimentar				6,13	6,13	
CL 18 Sur CR 35	14	Diamante No.2	13/01/2026	Pavimentar				2,69	2,69	
CL 18B Sur CR 39A-139	14	Diamante No.2	14/01/2026	Procopal				2,69	2,69	
CR 22 CL19 Sur-57	14	San Lucas	15/01/2026	Procopal				2,68	2,68	
CL 12 Sur CR 10-390	14	Los Balsos No.1	16/01/2026	Procopal				2,75	2,75	
CR 35 CL 7A Sur	14	Los Balsos No 2	19/01/2026	Procopal				2,70	2,70	
CR 50 CL 44-19	10	Boston	20/01/2026	Procopal				2,67	2,67	
CR 45 CL 31-92	10	Perpetuo Socorro	21/01/2026	Procopal				5,56	5,56	
CR 81C CL 76E-20	7	Palenque	22/01/2026	Procopal				2,69	2,69	
CR 69 CL 95-04	5	Castilla	23/01/2026	Procopal				2,69	2,69	
CL 16A Sur CR 30-33	14	San Lucas	26/01/2026	Procopal				2,71	2,71	
CR 35 CL 7 Sur-5	14	Los Balsos No.2	27/01/2026	Procopal				2,69	2,69	
CL 62 CR 92-30	7	Fuente Clara	28/01/2026	Procopal				2,70	2,70	
CL 62 CR 85-600	7	Robledo	29/01/2026	Procopal				2,67	2,67	
CL 62 CR 85 - 50	7	Robledo	30/01/2026	Procopal				2,68	2,68	
										54,76
FRENTE DE OBRA N°3										
CR 148 CL 68 - 173	60	Travesías	06/01/2026	Pavimentar				6,61	6,61	
CL 60C CR 145 - 225	60	La Palma	07/01/2026	Pavimentar				6,12	6,12	
CL 60 CR 152D-560	60	La Palma	08/01/2026	Pavimentar				6,12	6,12	
CL 64 CR 91 - 87	7	Cucaracho	09/01/2026	Pavimentar				6,13	6,13	
CL 64 CR 91D- 76	7	Cucaracho	13/01/2026	Pavimentar				6,15	6,15	
CL 64 CR 93 -10	7	Cucaracho	14/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
CL 19 CR 35 Este-164	90	El Placer	15/01/2026	Procopal				4,44	4,44	
CL 19 CR 35 Este-181	90	El Placer	16/01/2026	Procopal				4,48	4,48	
CL 19 CR 35 Este-430	90	El Placer	19/01/2026	Procopal				4,48	4,48	
CL 43 Sur CR 75B-38	80	San Antonio de Prado	20/01/2026	Procopal				6,72	6,72	
CL 40A Sur CR 63-128	80	San Antonio de prado	22/01/2026	Pavimentar				5,68	5,68	
CL 38B Sur CR 69 -54	80	San Antonio de prado	23/01/2026	Pavimentar				6,68	6,68	
CR 94B CL 63 - 211	7	Cucaracho	26/01/2026	Pavimentar				6,13	6,13	
CR 94B CL 63 - 396	7	Cucaracho	27/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
CR 94B CL 63 - 305	7	Cucaracho	28/01/2026	Procopal				6,69	6,69	
CR 143 CL 68 - 60	60	Travesías	29/01/2026	Procopal				5,66	5,66	
CL 68 CR 143-02	60	Travesías	30/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
										100,09
FRENTE DE OBRA N°6										
CR 39B CL 43-66	9	El Salvador	06/01/2026	Pavimentar				6,15	6,15	
CL 10 CR 65	15	Guayabal	07/01/2026	Pavimentar				6,69	6,69	
DG 75B CL 2A-143	16	La Mota	08/01/2026	Pavimentar				6,68	6,68	
CL 9 Sur CR 53-35	16	La Mota	09/01/2026	Pavimentar				6,69	6,69	
CL 24 65 D 15	15	Trinidad	13/01/2026	Procopal				6,16	6,16	
CL 18 CR 105-15	70	Altavista Sector Central	14/01/2026					6,12	6,12	
CL 18 CR 105-15	70	Altavista Sector Central	15/01/2026	Procopal				6,12	6,12	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026		VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026			HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:			UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,13,14,15,18,21,23			

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad






LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
CL 17 CR 111A - 66	70	Buga Patio Bonito	18/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
CL 17 CR 111 - 61	70	Buga Patio Bonito	19/01/2026	Pavimentar				6,14	6,14	
CL 18 CR 110 A - 93	70	Altavista Sector Central	20/01/2026	Pavimentar				6,67	6,67	
CL 18 106 B - 66	70	Altavista Sector Central	21/01/2026	Procopal				6,71	6,71	
CL 18 CR 110 A -56	70	Altavista Sector Central	22/01/2026	Procopal				5,56	5,56	
CL 20 CR84C-34	70	Altavista Sector Central	23/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CL 18 CR 109-92	70	Altavista	26/01/2026	Procopal				5,61	5,61	
CR 29 CL 45-12	9	Buenos Aires	27/01/2026	Procopal				6,71	6,71	
CL 46 CR 27-21	9	Buenos Aires	28/01/2026	Procopal				5,64	5,64	
CL 50 CR 30A-4	9	Buenos Aires	29/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CL 50 CR 36 - 22	9	Buenos Aires	30/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
										113,78
FRENTE DE OBRA N°7										
CL 98 CR 85A-34	6	Picachito	13/01/2026	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 98 CR 85A-13	6	Picachito	14/01/2026	Procopal				6,68	6,68	
CL 97 CR 84-120	6	Picachito	15/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CL 105B CR 74A-05	6	Pedregal	16/01/2026	Procopal				6,68	6,68	
CL 105 CR 74	6	Pedregal	19/01/2026	Pavimentar				6,67	6,67	
CL 60C CR 145+2	60	La Palma	20/01/2026	Pavimentar				6,16	6,16	
CR 69 CL 96-122	5	Castilla	21/01/2026	Pavimentar				6,67	6,67	
CR 69 CL 96-122	5	Castilla	22/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CR 27A CL 49-39	9	Alejandro Echavarría	23/01/2026	Procopal				5,56	5,56	
CL 111B CR 63+306	5	Plaza de Ferias	26/01/2026	Procopal				6,69	6,69	
CR 73A CL 92-13	5	Alfonso López	27/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CL 110 CR 68A-102	5	Tejelo	28/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CL 49AC CR 95B-7	13	La Pradera	29/01/2026	Procopal				5,57	5,57	
CL 112 CR 68A-107	5	Tejelo	30/01/2026	Procopal				6,68	6,68	
										89,60
FRENTE DE OBRA N°8										
CR 39B CL 65-13	8	Villa Hermosa	06/01/2026	Pavimentar				6,15	6,15	
CL 68 CR 33-60	3	Versalles No.1	07/01/2026	Pavimentar				6,14	6,14	
CL 82 CR 46-19	3	Campo Valdés No.1	08/01/2026	Pavimentar				5,57	5,57	
CL 61A CR 69-57	7	Aures No.2	09/01/2026	Pavimentar				5,57	5,57	
CL 61A CR 69-32	7	Aures No.2	13/01/2026	Pavimentar				6,12	6,12	
CR 52 CL 109B-33	2	La Francia	14/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
CR 52 CL 120-24	2	La Frontera	15/01/2026	Procopal				5,56	5,56	
CL 69 CR 45 Este-94	90	Piedras Blancas	16/01/2026	Procopal				4,45	4,45	
CL 69 CR 45 Este-96	90	Piedras Blancas	19/01/2026	Procopal				4,46	4,46	
CR 53 CL 61A 1211	90	Barro Blanco	20/01/2026	Procopal				4,44	4,44	
CL 68 CR 48 Esta 265 E- 31	90	Mazo	21/01/2026	Procopal				4,46	4,46	
CL 51A CR 48 Este-499	90	Barro Blanco	22/01/2026	Procopal				4,45	4,45	
DG 48 19-38	90	Barro Blanco	23/01/2026	Procopal				4,56	4,56	
CL 85A CR 52-27	4	Bermejal Los Álamos	26/01/2026	Procopal				6,16	6,16	
CL 35 CR 46-59	10	Perpetuo Socorro	27/01/2026	Procopal				6,11	6,11	
CL 31 CR 44A 169	10	Perpetuo Socorro	28/01/2026	Procopal				5,57	5,57	
CR 43A CL 108B-19	1	Popular	29/01/2026	Procopal				6,13	6,13	
CR 43A 108A-60	1	Popular	30/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
										98,14

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026			VALOR	$		59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026				HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA		2,3,6,7,8,9,11,13,14,15,18,21,23	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

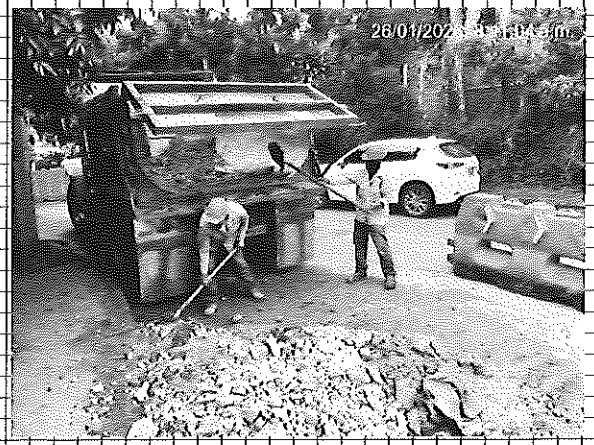



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°8										
CR 25A CL 56-20	8	El Pinal	06/01/2026	Pavimentar				5,60	5,60	
CL 56 CR 25A-19	8	El Pinal	07/01/2026	Pavimentar				6,13	6,13	
CL 56B CR 24AA-01	8	El Pinal	08/01/2026	Pavimentar				6,67	6,67	
CL 58 CR 24AA-24	8	El Pinal	09/01/2026	Pavimentar				6,14	6,14	
CR 24 CL 52-84	8	La Libertad	13/01/2026	Pavimentar				6,14	6,14	
CL 65 CR 74B-109	7	San Germán	14/01/2026	Procopal				6,14	6,14	
CR 74B CL 65-172	7	San Germán	15/01/2026	Procopal				6,13	6,13	
CL 19 47A ESTE E-119	90	El Placer	16/01/2026	Procopal				4,46	4,46	
CL 19 CR 47A Este E-119	90	El Placer	19/01/2026	Procopal				4,48	4,48	
CL 19 CR 47A Este E-135	90	El Placer	20/01/2026	Procopal				4,62	4,62	
CL 19 47A ESTE E-47	90	El Placer	21/01/2026	Procopal				4,46	4,46	
CL 19 CR 35-714	90	El Placer	22/01/2026	Procopal				4,46	4,46	
CL 19 CR 35-450	90	El Placer	23/01/2026	Procopal				4,52	4,52	
CR 74C CL 66	7	San Germán	26/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
CR 74C CL 66-57	7	San Germán	27/01/2026	Procopal				6,68	6,68	
CL 65 CR 70-137	7	Ecoparque Cerro El Volador	28/01/2026	Procopal				5,56	5,56	
CL 65 CR 75	7	San Germán	29/01/2026	Procopal				5,57	5,57	
CR 67 CL 78-40	5	El Progreso	30/01/2026	Procopal				6,72	6,72	
										100,60
FRENTE DE OBRA N°11										
CR 46 CL 71-15	4	Manrique Central No.1	06/01/2026	Pavimentar				6,16	6,16	
CR 64B CL 104A - 183	5	Héctor Abad Gómez	07/01/2026	Pavimentar				5,61	5,61	
CR 64AA CL 113A-391	5	Toscana	08/01/2026	Pavimentar				5,59	5,59	
CR 64AA CL 113A-383	5	Las Brisas	09/01/2026	Pavimentar				5,61	5,61	
CR 73 CL 42Sur-30	80	San Antonio de Prado	13/01/2026	Pavimentar				5,57	5,57	
CL 73 CR 45A-05	4	Manrique Central No.1	14/01/2026	Procopal				6,68	6,68	
CL 92A CR 53B-17	4	Palermo	15/01/2026	Procopal				6,71	6,71	
CR 52 CL 85A-33	4	Barrejal Los Álamos	16/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
CL 56Sur CR 70-58	80	San Antonio de Prado	19/01/2026	Procopal				6,71	6,71	
CL 56Sur CR 70-50	80	San Antonio de Prado	20/01/2026	Pavimentar				6,78	6,78	
CL 56Sur CR 70-62	80	San Antonio de Prado	22/01/2026	Pavimentar				5,63	5,63	
CL 41Sur CR 62B-33	80	San Antonio de Prado	23/01/2026	Pavimentar				6,68	6,68	
CL 16A CR 48-67	14	Villa Carlota	26/01/2026	Procopal				5,64	5,64	
CR 38 CL 29-64	9	La Asomadera No.1	27/01/2026	Procopal				2,73	2,73	
CL 53 CR 49-155	10	La Candelaria	28/01/2026	Procopal				5,65	5,65	
CR 49 CL 11B Sur-331	14	La Aguacatala	29/01/2026	Procopal				5,61	5,61	
CR 51 CL 35-69	10	Perpetuo Socorro	30/01/2026	Procopal				5,65	5,65	
										99,13
FRENTE DE OBRA N°13										
CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	07/01/2026	Pavimentar				5,91	5,91	
CR 92 CL 34D - 93	13	Belencito	09/01/2026	Pavimentar				2,06	2,06	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	13/01/2026	Pavimentar				5,53	5,53	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	13/01/2026	Pavimentar				5,75	5,75	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	13/01/2026	Pavimentar				6,73	6,73	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	Procopal				3,89	3,89	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	Procopal				3,89	3,89	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	14/01/2026	Procopal				3,89	3,89	

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2028			VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026				HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377					SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad




LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	Procopal				3,69	3,69	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	Procopal				3,69	3,69	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	15/01/2026	Procopal				3,89	3,89	
CL 103 CR 45A CR 46A	2	Moscú No.1	16/01/2026	Procopal				3,89	3,89	
										53,21
FRENTE DE OBRA N°14										
CR79 CL47 11	11	El Velódromo	06/01/2026	Pavimentar				6,13	6,13	
CR81A CL61 64	12	Calasanz	07/01/2026	Pavimentar				6,13	6,13	
CR 77 CL45B 115	11	El Velódromo	08/01/2026	Pavimentar				6,69	6,69	
CL45E CR77 07	11	El Velódromo	09/01/2026	Pavimentar				6,67	6,67	
CL44A CR76 61	11	El Velódromo	13/01/2026	Pavimentar				6,67	6,67	
CL42C CR81 144	11	La America	14/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CR82 CL42C 73	11	La America	15/01/2026	Procopal				6,69	6,69	
CR82 CL45E 10	11	La Floresta	16/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CR82 CL45F 00	11	La Floresta	19/01/2026	Pavimentar				6,11	6,11	
CL31 CR81 94	16	Belen	20/01/2026	Pavimentar				6,68	6,68	
CR82 TV45C 30	11	La Floresta	21/01/2026	Pavimentar				6,12	6,12	
CL37B CR84A 06	12	Barrio Cristobal	22/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CR90 CL38 07	12	Santa Mónica	23/01/2026	Procopal				6,67	6,67	
CL43 CR89 24	12	El Danubio	26/01/2026	Procopal				5,56	5,56	
CR80 CL44B 15	12	La America	27/01/2026	Procopal				5,58	5,58	
CR81 CL43B 75	12	La America	28/01/2026	Procopal				5,26	5,26	
CR81 CL43 22	12	La America	29/01/2026	Procopal				6,12	6,12	
CR80 CL44B-15	12	La America	30/01/2026	Procopal				6,05	6,05	
										113,14
FRENTE DE OBRA N°15										
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	13/01/2026	Pavimentar				2,22	2,22	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	14/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	15/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	16/01/2026	Pavimentar				3,89	3,89	
										21,67
FRENTE DE OBRA N°16										
CL 29 CR 45 INIPUE CR 48	14	Barrio Colombia	5/01/2026	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	6/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	6/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/01/2026	Pavimentar				3,89	3,89	
CR 43A + INIPUE CL 29 CL 29	14	Barrio Colombia	8/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CR 43A + INIPUE CL 29 CL 29	14	Barrio Colombia	8/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CR 43A + INIPUE CL 29 CL 29	14	Barrio Colombia	8/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	13/03/2026			VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026				HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	1.4.9	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:				UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,3,6,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

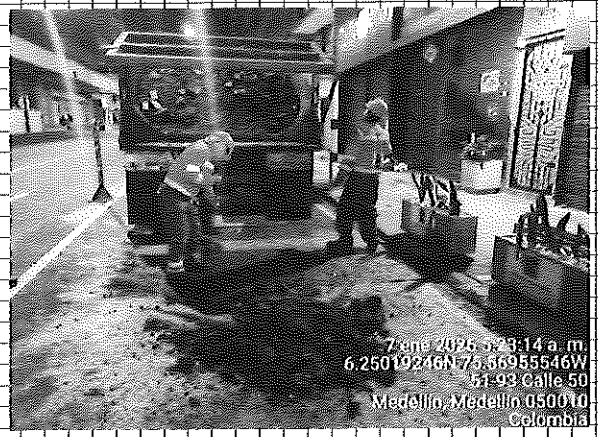

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
CR 43A # INSPUE CL 29 CL 29	14	Barrio Colombia	6/01/2026	Pavimentar				3,89	3,89	
CL 29 CR 43A CR 43	10	San Diego	9/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	13/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	13/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	13/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CR 29 CR 43 CR 43A	10	San Diego	13/01/2026	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 6 CR 25 - CR 28	14	El Tesoro	19/01/2026	Pavimentar				7,78	7,78	
CL 6 CL 5 - CR 28	14	El Tesoro	20/01/2026	Pavimentar				5,56	5,56	
CL 6 CR 28 - CR 29	14	El Tesoro	22/01/2026	Pavimentar				6,67	6,67	
										132,27
FRENTE DE OBRA N°21										
CR 29 CR 29 CL 4	14	El Tesoro	6/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 29 CR 29 CL 4	14	El Tesoro	7/01/2026	Pavimentar				9,44	9,44	
CR 29 CR 29 CL 4	14	El Tesoro	8/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 29 CL 5 CL 6	14	El Tesoro	9/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	13/01/2026	Pavimentar				9,44	9,44	
CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	13/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	14/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CL 7 CR 25 + 400 CR 28A	14	El Tesoro	15/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 29 CL 6 CL 7	14	El Tesoro	16/01/2026	Pavimentar				9,44	9,44	
CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	19/01/2026	Pavimentar				9,44	9,44	
CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	20/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CL 6A CL 7 CL 5G	14	El Tesoro	22/01/2026	Pavimentar				9,44	9,44	
										105,51
FRENTE DE OBRA N°23										
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	7/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	7/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	8/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	9/01/2026	Pavimentar				8,33	8,33	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	14/01/2026	Procopal				8,33	8,33	
CR 53 CL 67 Y CL 67+200	10	Jesús Nazareno	15/01/2026	Procopal				8,33	8,33	
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	20/01/2026	Procopal				8,33	8,33	
										58,31

ELABORÓ	REVISÓ
Juan Guillermo Rodríguez	Natalia Calderón Vásquez
Residente de Obra	Director de Obra
Catalina Ochoa Alvarez	Pedro Andrés Angel Saldarriaga
Residente de Interventoría	Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	1140,12
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1140,12
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	7813,54
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8953,66
TOTAL POR EJECUTAR	-1133,66

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialvred 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.5.1	DESCRIPCION	Realce de caja válvula de compuerta Incluye tapa polimérica.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	10,23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	7/01/2026	1,00				1,00	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	9/01/2026	1,00				1,00	
										2,00
FRENTE DE OBRA N°23										
NA	CR 78A CL 45G Y CL 46	11	El Velódromo	23/1/2026	1,00				1,00	
										1,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	4,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7,00
TOTAL POR EJECUTAR	8,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Galvis Alvarez
Residente de Interventoria

Jaime Calderón Vásquez
Director de Obra


Director de Interventoria


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	1.5.2	DESCRIPCION	Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente y todo lo necesario para su correcta construcción.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Bacheo Bitúmen	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°23										
NA	CR 63 CL 71 Y CL 73	11	El Velódromo	23/1/2026	7,00				7,00	
										7,00

ELABORÓ	REVISÓ	OBSERVACIONES:
Juan Guillermo Rodriguez Residente de Obra	Natalia Calderón Vásquez Director de Obra	
Estefanía Cadavid Alvarez Residente de Interventoría	Edwin Andrés Angel Restrepo Director de Interventoría	


SUBTOTAL ESTA HOJA	7,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	7,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7,00
TOTAL POR EJECUTAR	3,00

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona		

ITEM	1.5.8	DESCRIPCION	Suministro, transporta e Instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	23

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Bachas Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°23										
NA	CR 53 CL 67 Y CL 67+200	11	El Velódromo	23/01/2026	5,00				5,00	
										5,00

ELABORÓ

Residente de Obra

Residente de Interventoría

REVISÓ

Director de Obra

Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	5,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5,00
TOTAL POR EJECUTAR	1,00


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887 25	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.1.6	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

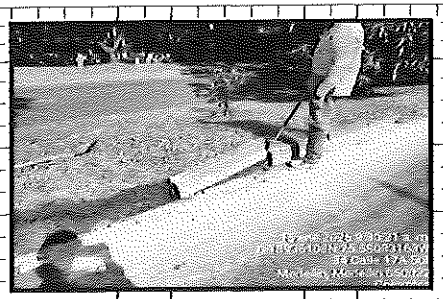

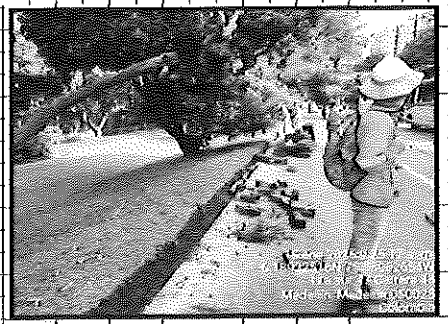

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	16/01/2026	19,50	0,15	0,35	2,93	1,02	
NA	CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	17/01/2026	21,80	0,15	0,35	3,27	1,14	
										2,16
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	06/01/2026	36,65	0,15	0,35	5,50	1,92	
NA	CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	07/01/2026	7,40	0,15	0,35	1,11	0,39	
NA	CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	08/01/2026	22,40	0,15	0,35	3,36	1,18	
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	10/01/2026	8,00	0,15	0,35	1,20	0,42	
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	13/01/2026	31,45	0,15	0,35	4,72	1,65	
NA	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	14/01/2026	11,20	0,15	0,45	1,68	0,76	
NA	CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	15/01/2026	14,90	0,15	0,35	2,24	0,78	
NA	CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	20/01/2026	22,70	0,15	0,35	3,41	1,19	
NA	CR 48 DG 47A Y CL 18C Sur	14	Santa María de los Ángeles	21/01/2026	7,00	0,15	0,35	1,05	0,37	
NA	CR 48 DG 47A Y CL 18C Sur	14	Santa María de los Ángeles	23/01/2026	48,70	0,15	0,35	7,31	2,56	
NA	CR 48 CL15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	24/01/2026	5,70	1,20	0,10	6,84	0,68	
NA	CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	26/01/2026	12,15	0,15	0,35	1,82	0,64	
NA	CR 48 CL15 Sur Y CL16 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	27/01/2026	5,70	2,20	0,15	12,54	1,88	
NA	CR 48 CL16 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	28/01/2026	11,80	0,15	0,35	1,77	0,62	
NA	CR 48 DG 47A Y CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	47,50	0,15	0,35	7,13	2,49	
NA	CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	1,20	0,80	0,08	0,96	0,08	
NA	CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	30/01/2026	30,41	0,15	0,35	4,56	1,60	
NA	CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	31/01/2026	36,00	0,15	0,35	5,40	1,89	
										21,10
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026	26,15	0,15	0,61	3,92	2,00	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026	22,25	0,15	0,61	3,34	1,70	
								0,00	0,00	
										3,70

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderon Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	26,96
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	26,96
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	152,14
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	179,10
TOTAL POR EJECUTAR	179,48

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.1.7	DESCRIPCION	Desmonte de piso en edoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,18		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

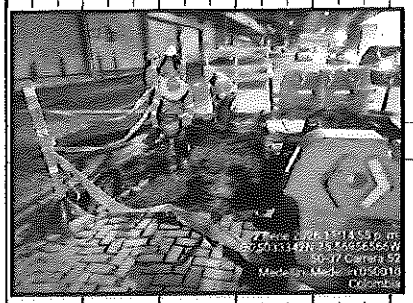

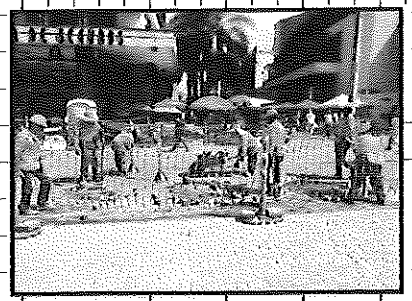

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches BRAcera	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	05/01/2026	11,10	3,80		42,18	42,18	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	08/01/2026	6,90	3,80		26,22	26,22	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	23/01/2026	11,10	3,90		43,29	43,29	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	28/01/2026	6,10	3,80		23,18	23,18	
										134,87

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	134,87
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	134,87
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	265,51
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	400,38
TOTAL POR EJECUTAR	299,62


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026			HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.1.8	DESCRIPCION	Desmonte y reinstalación de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	10,18

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

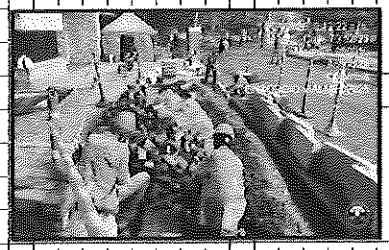

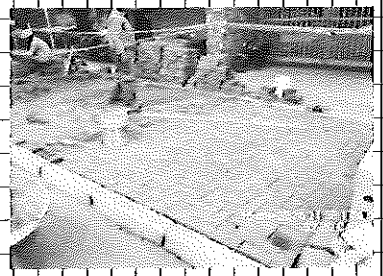

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	30/01/2026	12,00	2,10		25,20	25,20	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	30/01/2026	1,30	0,80		1,04	1,04	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	30/01/2026	1,00	1,00		1,00	1,00	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	31/01/2026	2,85	1,00		2,85	2,85	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	31/01/2026	2,40	0,85		2,04	2,04	
										32,13
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	14/01/2026	3,35	6,47		21,67	21,67	
NA	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	14/01/2026	3,35	2,25		7,54	7,54	
NA	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	15/01/2026	3,35	6,47		21,67	21,67	
NA	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	15/01/2026	3,35	6,47		-21,67	-21,67	
NA	CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	16/01/2026	3,35	2,25		7,54	7,54	
										36,75

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Darío Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	68,88
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	68,88
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	678,24
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	747,12
TOTAL POR EJECUTAR	-38,28


COD. FO-GECP-028	Formato FO-GECP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Públicas	
Versión 2		

												HOJA N°		OE
CONTRATO No	4600100052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/3/2026			VALOR	$		59 105 857 255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.													
FECHA DE ELABORACION (dd/mm/aaaa)			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE:		1/01/2026				HASTA:	31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Valmed 2025		INTERVENTOR:		Consorcio Mad Urbano 20250377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	2.2.1	DESCRIPCION	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneos de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: mal descompuesta, bolos de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye acarreo ni botada del material.	FORMULA:					UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	2,10,18,19		

Registro fotográfico & diagrama de la actividad







LOCALIZACION					DIMENSIONES					
Id Bodies Sistema	DIRECCION PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCION	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°2										
NA	CR 60 CL 95-04	5	Castilla	23/1/2026	1.80	1.60	0.80	2.88	1.84	
										1,84
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 56 CR 52	10	La Candelaria	5/1/2026	14.55	0.45	0.40	6.55	2.62	
NA	CL 56 CR 52	10	La Candelaria	8/1/2026	9.23	0.45	0.40	4.14	1.66	
NA	CR 49 55 SUR 100	14	Santa Maria de los Angeles	7/1/2026	10.50	0.28	0.15	4.86	0.73	
NA	CR 49 55 SUR 100	14	Santa Maria de los Angeles	7/1/2026	31.80	0.28	0.15	8.48	0.82	
NA	CL 56 CR 52	10	La Candelaria	23/1/2026	10.55	3.10	0.20	33.61	6.73	
NA	CL 56 CR 52	10	La Candelaria	23/1/2026	10.85	0.35	0.40	3.80	1.52	
NA	CL 56 CR 52	10	La Candelaria	23/1/2026	3.35	0.35	0.40	1.17	0.47	
NA	CL 56 CR 52	10	La Candelaria	26/1/2026	9.23	0.35	0.40	3.22	1.29	
NA	CL 56 CR 52	10	La Candelaria	28/1/2026	10.23	3.10	0.20	31.62	6.32	
										22,10
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CR 49 CL 55 Sur-100	14	Santa Maria de los Angeles	6/1/2026	39.70	0.30	0.35	11.91	3.85	
NA	CR 49 CL 55 Sur-100	14	Santa Maria de los Angeles	7/1/2026	7.40	0.30	0.35	2.22	0.78	
NA	CR 49 CL 55 Sur-100	14	Santa Maria de los Angeles	8/1/2026	22.40	0.30	0.35	6.72	2.35	
NA	CR 49 CL 55 Sur-92	14	Santa Maria de los Angeles	15/1/2026	8.00	0.30	0.35	2.40	0.84	
NA	CR 49 CL 55 Sur-92	14	Santa Maria de los Angeles	19/1/2026	31.65	0.30	0.35	9.44	3.30	
NA	CR 53 CL 67-200 Y CL 73	4	Bavaria	14/1/2026	11.22	0.38	0.32	4.29	1.36	
NA	CR 53 CL 67-200 Y CL 73	4	Bavaria	14/1/2026	5.35	0.47	0.15	31.87	2.25	
NA	CR 53 CL 67-200 Y CL 73	4	Bavaria	14/1/2026	3.35	3.25	0.15	7.64	1.13	
NA	CR 49 55 SUR 100	14	Santa Maria de los Angeles	15/1/2026	14.00	0.35	0.30	3.22	1.56	
NA	CR 49 CL 55 Sur- 92	14	Santa Maria de los Angeles	20/1/2026	22.73	0.30	0.35	6.81	2.39	
NA	CR 49 CL 55 Sur- 92	14	Santa Maria de los Angeles	21/1/2026	7.00	0.30	0.35	2.10	0.74	
NA	CR 49 CL 55 SUR 100	14	Santa Maria de los Angeles	23/1/2026	49.70	0.30	0.35	14.81	5.11	
NA	CR 49 CL 55 Sur- 92	14	Santa Maria de los Angeles	26/1/2026	12.15	0.30	0.35	3.65	1.28	
NA	CR 49 CL 55 A Sur	14	Santa Maria de los Angeles	28/1/2026	11.80	0.30	0.35	3.54	1.24	
NA	CR 49 CL 55 A Sur	14	Santa Maria de los Angeles	29/1/2026	47.50	0.30	0.35	14.25	4.99	
NA	CR 49 CL 55 Sur	14	Santa Maria de los Angeles	30/1/2026	30.41	0.30	0.35	9.12	3.19	
NA	CR 49 CL 55 Sur	14	Santa Maria de los Angeles	31/1/2026	26.00	0.30	0.35	10.80	3.78	
										41,13
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	7/01/2026	13.00	3.50	0.05	45.78	2.29	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	9/01/2026	14.60	3.47	0.05	50.68	2.53	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	14/01/2026	15.50	3.45	0.07	54.28	3.80	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026	21.45	0.25	0.51	5.36	2.73	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	19/01/2026	13.10	3.25	0.12	42.58	5.11	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	21/01/2026	15.20	3.44	0.10	52.22	5.23	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	23/01/2026	14.90	3.44	0.10	51.24	5.13	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	24/01/2026	13.77	3.36	0.10	46.27	4.63	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	26/01/2026			0.10	0.00	2.46	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	28/01/2026	5.05	3.50	0.10	17.68	1.79	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	29/01/2026	15.00	3.50	0.10	54.50	5.49	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	29/01/2026	15.20	3.52	0.10	53.50	5.35	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	30/01/2026	13.10	3.47	0.10	47.19	4.72	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026	21.30	1.42	0.10		3.02	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026	21.30	0.10	0.10		0.03	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026			0.10		0.38	
NA	CL 110 Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026			0.10		0.32	
										64,99

ELABORÓ

Residente de Obra

REVISÓ

Director de Obra

Residente de Interventoría

Director de Interventoría

OBSERVACIONES

SUBTOTAL ESTA ACTA	119,73
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	119,73
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	805,82
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	925,55
TOTAL POR EJECUTAR	-119,73

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.887.265
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°		7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	2.2.2	DESCRIPCION	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	13

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Bachas Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°13										
NA	CL 11 + CL 10 CR 48	14	Manila	29/1/2026	7,10	1,30	0,75	9,23	6,92	
NA	CL 11 CR 49 CR 48	14	Manila	30/1/2026	5,00	1,10	0,75	5,50	4,13	
										11,05

ELABORÓ

Juan Guillermo Restrepo
Residente de Obra

Estefanía Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	11,05
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	11,05
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11,05
TOTAL POR EJECUTAR	198,95


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	69.105.687.25	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.2.4	DESCRIPCION	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 98% del ensayo Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

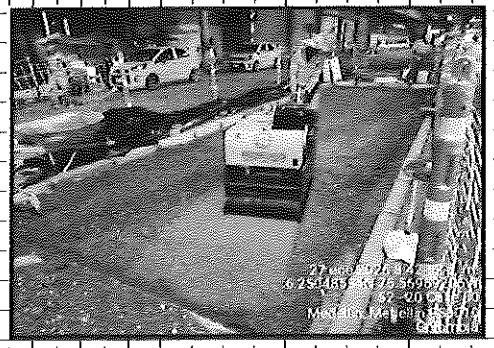

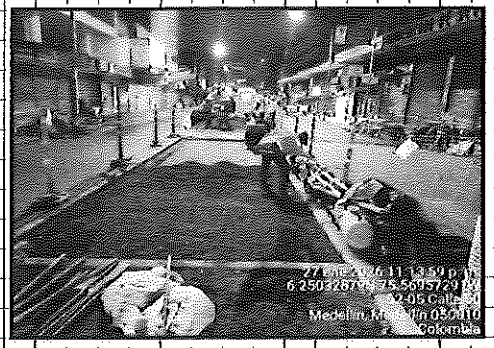

	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	FRENTE DE OBRA N°10									
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	27/01/2026	10,85	3,10	0,20	33,64	6,73	
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	29/01/2026	10,20	3,10	0,20	31,62	6,32	
										13,05
	FRENTE DE OBRA N°18									
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	14/01/2026	44,50	1,40	0,30	62,30	18,69	
NA	CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Angeles	19/01/2026	24,40	1,50	0,15	36,60	5,49	
NA	CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Angeles	19/01/2026	6,00	2,20	0,10	13,20	1,32	
NA	CR 48 CL15 Sur	14	Santa María de los Angeles	24/01/2026	5,70	1,20	0,05	6,84	0,34	
										25,84
	FRENTE DE OBRA N°19									
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026	21,45	0,25	0,51	5,36	2,73	
	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026					1,51	
	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026					0,11	
	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026					0,19	
	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	31/01/2026					0,16	
										4,70

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Cardona Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	43,89
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	43,89
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	140,50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	184,39
TOTAL POR EJECUTAR	25,61


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	2.2.7	DESCRIPCION	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	FORMULA:	UNIDAD	m3-km	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



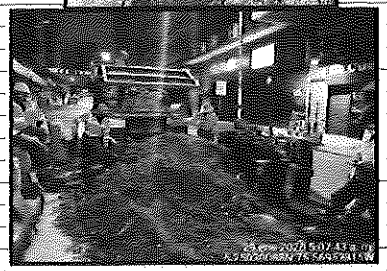

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FRENTE DE OBRA N°10										
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	5/01/2026					3,37	3,37	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	6/01/2026					2,10	2,10	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	8/01/2026					3,98	3,98	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	8/01/2026					3,98	3,98	
CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	16/01/2026					1,75	1,75	
CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	17/01/2026					1,96	1,96	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	24/01/2026					12,18	12,18	
										29,32
FRENTE DE OBRA N°18										
CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	6/01/2026					1,92	1,92	
CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	7/01/2026					0,39	0,39	
CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	8/01/2026					1,18	1,18	
CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	9/01/2026					6,23	6,23	
CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	15/01/2026					0,78	0,78	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	20/01/2026					1,19	1,19	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	21/01/2026					0,37	0,37	
CR 48 DG 47A Y CL 16C Sur	14	Santa María de los Ángeles	23/01/2026					2,56	2,56	
CR 48 CL15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	24/01/2026					0,68	0,68	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	26/01/2026					0,64	0,64	
CR 48 CL15 Sur Y CL16 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	27/01/2026					1,88	1,88	
CR 48 CL16 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	28/01/2026					0,62	0,62	
CR 48 DG 47A Y CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026					2,49	2,49	
CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026					0,08	0,08	
CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	30/01/2026					1,60	1,60	
CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	31/01/2026					1,89	1,89	
										24,50
FRENTE DE OBRA N°19										
CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026					18,31	18,31	
										18,31

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	72,13
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	72,13
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	325,28
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	397,41
TOTAL POR EJECUTAR	365,59

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.687 25
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA Nº		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		

ITEM	228	DESCRIPCION	Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	FORMULA:	UNIDAD	m3-km	FRENTE DE OBRA	19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	PLANTA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA Nº19										
CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026					18,31	18,31	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
										18,31

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	18,31
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	18,31
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	150,99
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	169,30
TOTAL POR EJECUTAR	21194,70

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	13/03/2026	VALOR	$		59.103.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACIÓN (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA Nº		7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.3.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	FORMULA:	UNIDAD	kg	FRENTE DE OBRA	10,18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10										
NA	CL 50 CR 52	10	La Candelaria	19/01/2026	2,4				2,40	
									0,00	
										2,40
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CR 48 CL15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	24/01/2026	39,81				39,81	
NA	CR 48 CL16 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	28/01/2026	114,85				114,85	
										154,66
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	07/01/2026	348,02				348,02	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	13/01/2026	174,56				174,56	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	14/01/2026	497,1				497,10	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	20/01/2026	136,8				136,80	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	22/01/2026	114,54				114,54	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	23/01/2026	113,69				113,69	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	24/01/2026	73,66				73,66	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	26/01/2026	355,87				355,87	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	28/01/2026	103,49				103,49	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	29/01/2026	191,26				191,26	
NA	CL 119 Sur CR 53	15	La Colina	30/01/2026	168,98				168,98	
										2267,97

ELABORÓ

Juan Alberto Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	2425,03
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2425,03
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	6222,52
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8647,55
TOTAL POR EJECUTAR	-2425,03


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		OE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7		
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.4.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la Interventoría, soporta fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todo los demás elementos necesario para su correcta construcción. Curado con Antisol.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

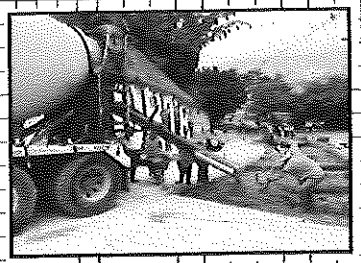

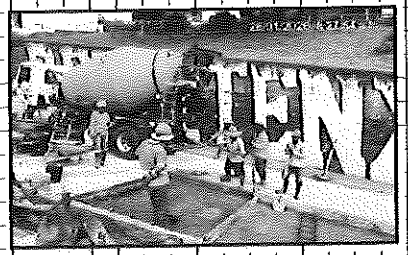

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Baches BMcore	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	8/1/2026	13,00	3,52	0,20	45,76	9,15	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	8/1/2026	3,52	0,20	0,20	0,70	0,14	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	13/1/2026	14,60	3,47	0,20	50,66	10,13	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	13/1/2026	3,47	0,20	0,20	0,69	0,14	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	15/1/2026	15,63	3,48	0,20	54,29	10,86	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	15/1/2026	3,49	0,30	0,30	1,04	0,31	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	20/1/2026	13,10	3,25	0,20	42,58	8,52	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	22/1/2026	15,20	3,44	0,20	52,29	10,46	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	23/1/2026	14,90	3,44	0,20	51,26	10,25	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	24/1/2026	13,77	3,36	0,20	46,27	9,25	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	27/1/2026			0,20	0,00	4,93	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	27/1/2026	5,00	3,66	0,20	17,60	3,56	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	28/1/2026	15,00	3,60	0,20	54,00	10,80	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	29/1/2026	15,20	3,52	0,20	53,50	10,70	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	30/1/2026	13,60	3,47	0,20	47,19	9,44	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	30/1/2026	3,12	0,20	0,20	0,62	0,12	
										159,76

ELABORÓ

Juan Guillermo Ruiz Arias
Residente de Obra

Catalina Ochoa Álvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Edwin Andrés Ángel Ballesteros
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	159,76
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	159,76
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	102,54
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	261,30
TOTAL POR EJECUTAR	18,70


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600106052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2028		VALOR	$	59.106.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.4.3	DESCRIPCION	Suministro, transporte y aplicación de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos. Aplica para concretos premezclados o realizados en obra. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de aplicación, de manejo, de almacenamiento dadas por el productor. Se pagará por m3 de concreto con aditivo colocado en obra.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



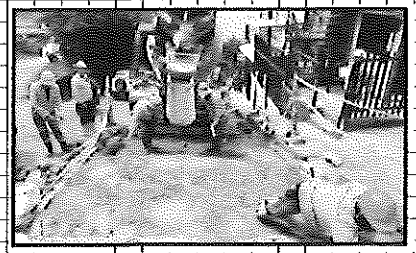

LOCALIZACION					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Eadres Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°18										
NA			La Candelaria	31/01/2026					2,40	
										2,40
FRENTE DE OBRA N°19										
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	08/01/2026	13,00	3,52	0,20	45,76	9,15	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	08/01/2026	3,52	0,20	0,20	0,70	0,14	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	13/01/2026				0,00	10,27	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	15/01/2026				0,00	11,17	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	20/01/2026	13,10	3,25	0,20	42,58	8,52	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	22/01/2026	15,20	3,44	0,20	52,29	10,45	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	23/01/2026	14,90	3,44	0,20	51,28	10,25	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	24/01/2026	13,77	3,36	0,20	46,27	9,25	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	24/01/2026				0,00	10,25	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	27/01/2026				0,00	8,43	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	28/01/2026	15,00	3,60	0,20	54,00	10,80	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	29/01/2026	15,20	3,52	0,20	53,50	10,70	
NA	CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	30/01/2026				0,00	9,56	
										119,01

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Nicolás Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Gallardo
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	121,41
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	121,41
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	209,35
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	330,76
TOTAL POR EJECUTAR	-121,41

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA Nº		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026			VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026			ACTA Nº	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	2.5.5	DESCRIPCION	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.	FORMULA:	UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	14

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACION				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
FRENTE DE OBRA N°18									
CR 48 CL 15 Sur-60	14	Santa María de Los Angeles	22/01/2026					1,00	
									1,00

ELABORÓ

Juan Gabriel Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Orozco Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Nelly Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,00
TOTAL POR EJECUTAR	1,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION		13/03/2026		VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026			ACTA N°	7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona		
ITEM	2.5.7	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM.			FORMULA:			UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19	

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

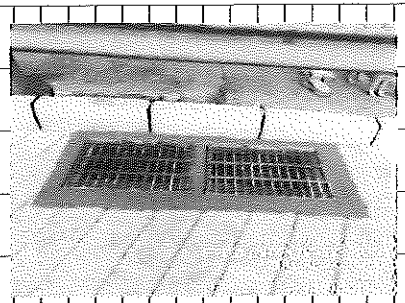

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026	2,00				2,00	
								0,00	
								0,00	
									2,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	16,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	18,00
TOTAL POR EJECUTAR	-2,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

								HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026	ACTA N°			7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	3.1.1	DESCRIPCION	Demolición de anden existente e=8-10 cm. No incluye retiro de entresuelo. El cargue y botada de material resultante de la demolición se pagará en ítem independiente.	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA			19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°18									
CR 48 CL 15 Sur-60	14	Santa María de Los Angeles	22/1/2026	29,70	1,50		44,55	44,55	
CR 48 CL 15 Sur-60	14	Santa María de Los Angeles	22/1/2026	10,00	2,20		22,00	22,00	66,55
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 118 Sur CR 53	15	La Colina	17/1/2026	21,45	0,25		5,36	5,36	
CL 118 Sur CR 53	15	La Colina	31/1/2026				3,80	3,80	
CL 118 Sur CR 53	15	La Colina	31/1/2026				3,21	3,21	
CL 118 Sur CR 53	15	La Colina	31/1/2026				30,25	30,25	
									42,62

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	109,17
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	109,17
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	721,62
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	830,79
TOTAL POR EJECUTAR	-109,17

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			
ITEM	3.1.3	DESCRIPCION	Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante.	FORMULA:		UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	15,16,21,22		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

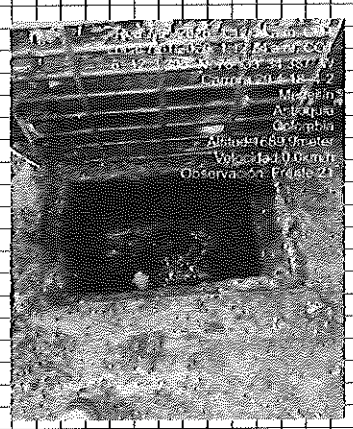



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OTRO		
FRENTE DE OBRA N°15									
CL 29 CR 44A CR 45	14	Barrio Colombia	16/1/2026	1,00				1,00	
									1,00
FRENTE DE OBRA N°16									
CL 29 INPUE CR 52 FINPUE CR 52	15	Santa Fe	5/1/2026	1,00				1,00	
CL 29 CR 43A + 117 CR 43G	14	Barrio Colombia	7/1/2026	2,00				2,00	
CL 6 CR 28 - CR 29	14	El Tesoro	22/1/2026	8,00				8,00	
									11,00
FRENTE DE OBRA N°10									
CR 40 CL 48	10	Bomboná No.1	14/1/2026	2,00				2,00	
									2,00
FRENTE DE OBRA N°21									
CR 29 CR 29 CL 4	14	El Tesoro	8/1/2026	1,00				1,00	
TV 7A CR 29D CR 30	14	El Tesoro	28/1/2026	2,00				2,00	
								0,00	
									3,00
FRENTE DE OBRA N°22									
CL 10A CR 43A	14	El Poblado	27/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	28/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	28/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	28/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	28/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	28/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	30/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	30/1/2026	1,00				1,00	
CL 44 CR 55	10	Guayaquil	31/1/2026	1,00				1,00	
									9,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoria

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoria

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	26,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	26,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	63,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	89,00
TOTAL POR EJECUTAR	261,00

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026			VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026				HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				
ITEM	3.2.5	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 15 x 45 x 80 cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, tres caras. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega y todo lo necesario para su correcta instalación.	FORMULA:				UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	10,18,19		

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



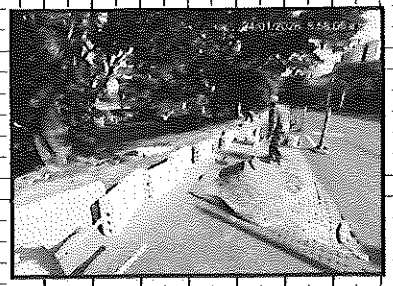

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10									
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	05/01/2026	14,55				14,55	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	06/01/2026	9,20				9,20	
CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	16/01/2026	19,50				19,50	
CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	17/01/2026	21,80				21,80	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	24/01/2026	14,20				14,20	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	27/01/2026	9,20				9,20	
									88,45
FRENTE DE OBRA N°18									
CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	06/01/2026	36,65				36,65	
CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	07/01/2026	7,40				7,40	
CR 48 CL15 Sur-160	14	Santa María de Los Angeles	08/01/2026	22,40				22,40	
CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	10/01/2026	8,00				8,00	
CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	13/01/2026	31,45				31,45	
CR 53 CL 67+200 Y CL 70	4	Sevilla	14/01/2026	11,20				11,20	
CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Angeles	15/01/2026	14,90				14,90	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	20/01/2026	22,70				22,70	
CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	21/01/2026	7,00				7,00	
CR 48 DG 47A Y CL 18C Sur	14	Santa María de los Ángeles	23/01/2026	54,20				54,20	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	26/01/2026	12,15				12,15	
CR 48 CL16 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	28/01/2026	11,80				11,80	
CR 48 DG 47A Y CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	47,50				47,50	
CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	30/01/2026	30,41				30,41	
CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	31/01/2026	36,00				36,00	
									353,76
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	15/01/2026	28,15				28,15	
CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	17/01/2026	22,25				22,25	
CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	26/01/2026	6,40				6,40	
									56,80

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	497,01
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	497,01
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	668,82
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1165,83
TOTAL POR EJECUTAR	-497,01


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	69.105.887.265
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°	7	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	3.2.11	DESCRIPCION	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	18,19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°18									
CR 48 15 SUR 160	14	Santa María de los Ángeles	17/01/2026	61,00				61,00	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	19/01/2026	7,40				7,40	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	22/01/2026	45,40				45,40	
CR 48 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	9,60				9,60	
									123,40
FRENTE DE OBRA N°19									
CL 11B Sur CR 53	15	La Colina	30/01/2026	12,40				12,40	
									12,40

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Carolina Ochoa Arrieta
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vélez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	135,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	135,80
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	25,60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	161,40
TOTAL POR EJECUTAR	-135,80

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	3.2.13	DESCRIPCION	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	10,18

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°10									
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	05/01/2026	14,55	0,30	0,25	4,37	1,09	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	06/01/2026	9,20	0,30	0,25	2,76	0,69	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	08/01/2026	4,00	0,20	0,07	0,80	0,06	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	19/01/2026				0,00	0,03	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	24/01/2026	14,20	0,20	0,25	2,84	0,71	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	27/01/2026	9,20	0,20	0,25	1,84	0,46	
CL 50 CR 52	10	La Candelaria	31/01/2026	0,20	3,55	0,15	0,71	0,11	
									3,15
FRENTE DE OBRA N°18									
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	19/01/2026	44,50	1,20	0,10	53,40	5,34	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	19/01/2026	41,00	0,10	0,10	4,10	0,41	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	22/01/2026	18,00	0,10	0,10	1,80	0,18	
CR 48 CL15 Sur- 92	14	Santa María de los Ángeles	22/01/2026	33,82	1,50	0,10	50,73	5,07	
CR 48 CL15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	24/01/2026	5,70	1,20	0,10	6,84	0,68	
CR 48 CL16 A Sur	14	Santa María de los Ángeles	28/01/2026	5,70	2,20	0,09	12,54	1,13	
CR 49 CL 15 Sur	14	Santa María de los Ángeles	29/01/2026	1,85	2,00	0,10	3,70	0,37	
									13,18

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Álvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Ángel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	16,33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	16,33
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	56,20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	72,53
TOTAL POR EJECUTAR	-16,33


COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$	59.105.887.255	
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026	ACTA N°	7				
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmad 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Mad Urbano 20005377	SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona						

ITEM	3.3.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	18

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad





	LOCALIZACION					DIMENSIONES					
18 Baches Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°18										
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	9/1/2026	44,50	1,40		62,30	62,30	
NA	CR 48 CL15 Sur-92	14	Santa María de Los Angeles	29/1/2026				70,81	70,81	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
										133,11

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Cristina Correa Linares
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	133,11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	133,11
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	484,92
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	618,03
TOTAL POR EJECUTAR	-133,11

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA Nº		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026	VALOR	$		59.105.837.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/08/2025		HASTA	31/08/2025	ACTA Nº		2	
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	3.4.2	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	2

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					
Id Bache o Estructura	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°2										
HA	CR 69 CL 95-04	5	Castilla	23/1/2026	3,20	1,60		5,12	5,12	
										5,12

ELABORÓ

Juan Esteban Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Calderón Vásquez
Director de Obra

Cesar Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	5,12
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5,12
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	35,50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	40,62
TOTAL POR EJECUTAR	247,38

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:	Consorcio Med Urbano 20005377			SUPERVISOR:	Gabriel Jaime Cardona				

ITEM	3.5.1	DESCRIPCION	Mantenimiento de cárcamos con Rejilla en HD, incluye el cambio de elementos como tornillos, tuercas y otros consumibles.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	22

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

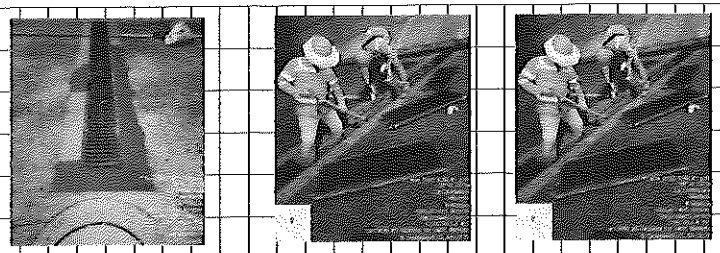

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
Id Sachos Edilcora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°22										
NA	CL 10A CR 43A	14	El Poblado	27/01/2026	1,00				1,00	
NA	CL 10A CR 43A	14	El Poblado	27/01/2026	1,00				1,00	
										2,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Carlos Ortiz Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Natalia Cotter
Director de Obra

Carlos Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,00
TOTAL POR EJECUTAR	28,00

COD. FO-GEOP-028	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

										HOJA N°		DE	
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026			VALOR	$		59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)				CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025			INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377				SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona	
ITEM	3.6.3	DESCRIPCION		Realce de caja menor o igual a 60*60 cm		FORMULA:				UNIDAD	un	FRENTE DE OBRA	19

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad



	LOCALIZACION					DIMENSIONES					
Id Bachas Bitácora	DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
FRENTE DE OBRA N°19										
	CR 48 CL 15 Sur-60	14	Santa María de Los Angeles	22/01/2026	2,00				2,00	
										2,00

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodríguez
Residente de Obra

Catalina Ochoa Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Andrea Calderón Vásquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:


SUBTOTAL ESTA HOJA	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	2,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4,00
TOTAL POR EJECUTAR	1,00


COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.687.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:			Gabriel Jaime Cardona		

ITEM	4.1.1	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	17,2

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

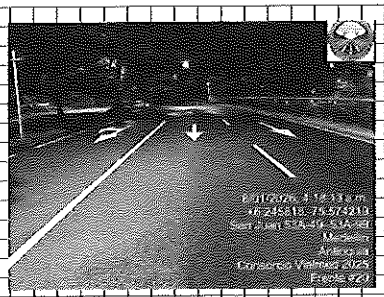

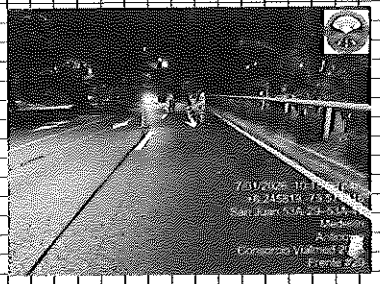

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
FRENTE DE OBRA N°17									
CR 48 INIDEP CR 51 Y CR 50A	10	Prado	14/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 48 CL 99 Y CL 100	2	Moscú No.1	16/01/2026	1,00	3,15		3,15	3,15	
CR 48 CL 99 Y CL 100	2	Moscú No.1	16/01/2026	1,00	2,54		2,54	2,54	
CR 48 CL 99 Y CL 100	2	Moscú No.1	16/01/2026	2,00	5,66		11,32	11,32	
CR 48 CL 99 Y CL 100	2	Moscú No.1	16/01/2026	1,00	5,89		5,89	5,89	
CR 48 CL 99 Y CL 100	2	Moscú No.1	16/01/2026	1,00	8,69		8,69	8,69	
CR 47 CL 98A Y CL 99	2	Moscú No.1	16/01/2026	1,00	6,94		6,94	6,94	
CR 47 CL 98A Y CL 99	2	Moscú No.1	16/01/2026	1,00	6,59		6,59	6,59	
CL 47D CR 86B CR 87	12	La Floresta	28/01/2026	3,00	1,20		3,60	3,60	
CL 47D CR 86B CR 87	12	La Floresta	28/01/2026	1,00	2,20		2,20	2,20	
CR 43A CL 6SUR Y CL 7SUR	14	Los Balsos No.2	29/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 43A CL 7SUR Y INIPUE CR43A	14	La Aguacatala	29/01/2026	1,00	0,72		0,72	0,72	
CR 43A CL 7SUR Y INIPUE CR43A	14	La Aguacatala	29/01/2026	1,00	1,62		1,62	1,62	
CL 47D CR 87 Y CR 87B	12	La Floresta	30/01/2026	2,00	2,20		4,40	4,40	
									62,66
FRENTE DE OBRA N°20									
CL 44 CR 53A CR 53 + 68	10	Centro Administrativo	7/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 44 CR 53A - 159 CR 53A	10	Guayaquil	7/01/2026	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 44 CR 52 INIPUE CR 57	10	Calle Nueva	8/01/2026	5,00	3,52		17,60	17,60	
CR 48 CR 48 INIDEP CR 51	10	Prado	8/01/2026	4,00	1,20		4,80	4,80	
CR 48 CR 48 INIDEP CR 51	10	Prado	8/01/2026	1,00	2,20		2,20	2,20	
CR 48 CR 48 INIDEP CR 51	10	Prado	9/01/2026	1,00	2,20		2,20	2,20	
CR 48 CR 48 INIDEP CR 51	10	Prado	9/01/2026	7,00	1,20		8,40	8,40	
CL 44 CR 55 + 90 CR 55 + 160	10	La Alpujarra	9/01/2026	1,00	1,50		1,50	1,50	
CL 44 CR 55 + 90 CR 55 + 160	10	La Alpujarra	9/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 44 CR 52 INIPUE CR 57	10	Calle Nueva	13/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 86 CL 47C Y CL 47D	12	La Floresta	15/01/2026	2,00	2,20		4,40	4,40	
CR 86 CL 47B Y CL 47C	12	La Floresta	15/01/2026	1,00	1,50		1,50	1,50	
CR 86 CL 47C Y CL 47D	12	La Floresta	16/01/2026	1,00	2,10		2,10	2,10	
CL 47D CR 86 Y CR 86A	12	La Floresta	16/01/2026	1,00	2,20		2,20	2,20	
CL 44 CR 52 INIPUE CR 57	10	Calle Nueva	19/01/2026	1,00	1,20		1,20	1,20	
CL 30 CR 69B CL 27	15	Inst_Tif Parques Juan Pablo II	19/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 44 + CR 55 + CR 57 +	10	Guayaquil	21/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 53 CL 67 CL 67 + 200	10	Jesús Nazareno	21/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 55 CL 44A CL 45	10	Guayaquil	22/01/2026	6,00	1,20		7,20	7,20	
CR 53 CL 67 CL 67 + 200	10	Jesús Nazareno	23/01/2026	2,00	3,52		7,04	7,04	
CR 53 CL 71 Y CL 73	4	Sevilla	23/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 55 CL 44A CL 45	10	Guayaquil	27/01/2026	1,00	2,10		2,10	2,10	
CR 55 CL 44A CL 45	10	Guayaquil	27/01/2026	1,00	2,20		2,20	2,20	
CR 55 CL 45 CL 45A	10	Guayaquil	27/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CL 45A CR 57 CR 56B	10	Guayaquil	27/01/2026	3,00	1,50		4,50	4,50	
CL 30 CR 66B CR 66B + 195	15	Inst_Tif Parques Juan Pablo II	27/01/2026	1,00	2,20		2,20	2,20	

COD. FO-GEOP-026	Formato FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Alcaldía de Medellín
Versión 2		

									HOJA N°		DE
CONTRATO No	4600105052	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	13/03/2026		VALOR	$	59.105.887.255
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/01/2026		HASTA	31/01/2026		ACTA N°		7
CONTRATISTA:	Consorcio Vialmed 2025	INTERVENTOR:		Consorcio Med Urbano 20005377		SUPERVISOR:		Gabriel Jaime Cardona			

ITEM	4.1.1	DESCRIPCION	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	FORMULA:	UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	17,2

Registro fotográfico ó diagrama de la actividad

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
DIRECCIÓN PLACA	COMUNA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA		
CL 44 - CR 57 - CR 59 -	10	La Alpujarra	28/01/2026	2,00	1,20		2,40	2,40	
CR 55 + CL 42A CL 44	10	La Alpujarra	28/01/2026	4,00	1,20		4,80	4,80	
CL 30 CR 66B CR 66B + 195	15	Ifsl_19 Parque Juan Pablo II	28/01/2026	1,00	1,20		1,20	1,20	
CL 30 CR 66B CR 66B + 195	15	Ifsl_19 Parque Juan Pablo II	28/01/2026	1,00	8,95		8,95	8,95	
CR 43A CL 7 Y CL 7D	14	La Florida	29/01/2026	1,00	5,98		5,98	5,98	
CR 43A CL 7 Y CL 7D	14	La Florida	29/01/2026	1,00	3,95		3,95	3,95	
CR 43A CL 7 Y CL 7D	14	La Florida	29/01/2026	3,00	3,87		11,61	11,61	
CL 30 CR 65 + 193 CR 65 + 384	15	Tenche	30/01/2026	3,00	1,20		3,60	3,60	
CL 30 CR 66B CR 66B + 195	15	Ifsl_19 Parque Juan Pablo II	30/01/2026	1,00	10,56		10,56	10,56	
									147,79

ELABORÓ

Juan Guillermo Rodriguez
Residente de Obra

Catalina Ospina Alvarez
Residente de Interventoría

REVISÓ

Nubia Cabrera Vasquez
Director de Obra

Camilo Andrés Angel Saldarriaga
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL ESTA HOJA	210,45
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	210,45
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	322,11
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	532,56
TOTAL POR EJECUTAR	8077,44

INFORME INTERNO DE MEZCLA FRENTE 23

MEDIDAS EN CAMPO										VIAJES DE VOLQUETAS						
Fecha	ABS Inicio	ABS Final	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Área (m2)	Volumen (m3	Volumen (Ton)	Volumen Total Día (Ton)	Fecha	Placa	Nº Remisión	Planta	Tipo de Mezcla	Volumen (m3)	Volumen (Ton)	Volumen Total Día (Ton)
7/01/2026	0+248,00	0+300,00	52,00	6,89	0,10	358,28	35,83	86,35	100,18	7/01/2026	SMOS68	533089	PAVIMENTAR	MSC-25	10,38	25,01	100,18
											TRL740	533090	PAVIMENTAR	MSC-25	10,39	25,04	
	0+248,00	0+265,36	17,36	3,39	0,10	58,85	5,89	13,83			WPT376	533091	PAVIMENTAR	MSC-25	10,39	25,05	
											ESP092	533092	PAVIMENTAR	MSC-25	10,41	25,08	
8/01/2026	0+300,00	0+414,74	114,74	3,45	0,105	395,65	41,56	100,17	100,17	8/01/2026	TZT308	533142	PAVIMENTAR	MSC-25	10,38	25,01	100,17
											TJZ678	533144	PAVIMENTAR	MSC-25	10,39	25,03	
											WPT376	533147	PAVIMENTAR	MSC-25	10,40	25,07	
											ESP092	533149	PAVIMENTAR	MSC-25	10,40	25,06	
9/01/2026	0+414,74	0+484,06	69,32	3,45	0,105	239,15	25,11	60,52	174,67	9/01/2026	TZT308	533203	PAVIMENTAR	MSC-25	9,97	24,02	170,32
											ESP092	533204	PAVIMENTAR	MSC-25	9,98	24,04	
											TRL740	533205	PAVIMENTAR	MSC-25	10,00	24,09	
											WPT376	533206	PAVIMENTAR	MSC-25	10,39	25,05	
	0+414,74	0+479,74	65,00	6,94	0,105	451,10	47,37	114,15			TJZ678	533207	PAVIMENTAR	MSC-25	10,38	25,02	
											STX105	533208	PAVIMENTAR	MSC-25	9,99	24,07	
											SNX167	533210	PAVIMENTAR	MSC-25	9,97	24,03	
14/01/2026	0+479,74	0+591,12	111,38	3,77	0,109	419,90	45,77	107,56	110,13	14/01/2026	TJZ679	23574	PROCOPAL	MSC-25	11,51	27,05	110,13
											TJZ678	23575	PROCOPAL	MSC-25	11,94	28,05	
											WPT376	23576	PROCOPAL	MSC-25	11,93	28,03	
	0+484,06	0+486,65	2,59	3,87	0,109	10,02	1,09	2,57			ESP092	23577	PROCOPAL	MSC-25	11,49	27	
15/01/2026	0+479,74	0+570,05	114,95	3,55	0,115	408,07	46,93	110,28	110,28	15/01/2026	TJZ679	235791	PROCOPAL	MSC-25	11,52	27,08	110,29
											TJZ678	235792	PROCOPAL	MSC-25	11,93	28,03	
											ESP092	235793	PROCOPAL	MSC-25	11,92	28,02	
											SMOS68	235794	PROCOPAL	MSC-25	11,56	27,16	
16/01/2026	0+479,74	0+570,05	102,31	3,47	0,112	355,02	39,76	93,44	93,44	16/01/2026	SMOS68	235814	PROCOPAL	MSC-25	9,90	23,26	93,44
											TRL740	235815	PROCOPAL	MSC-25	9,84	23,13	
											WPT376	235816	PROCOPAL	MSC-25	10,22	24,02	
											ESP092	235817	PROCOPAL	MSC-25	9,80	23,03	
19/01/2026	0+248,00	0+359,50	111,50	7,12	0,091	793,88	72,24	169,77	200,69	19/01/2026	TJZ677	235829	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,69	25,11	200,69
											TJZ679	235830	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,98	25,8	
											TJZ678	235831	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,65	25,03	
											WPT376	235832	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,45	24,55	
	0+248,00	0+305,55	57,55	2,54	0,09	146,18	13,16	30,92			SNX167	235833	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,68	25,1	
											ESP092	235834	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,68	25,09	
											SMOS68	235835	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,66	25,06	
											TAP993	235841	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,62	24,95	
20/01/2026	0+359,50	0+408,55	49,05	7,05	0,09	345,80	30,08	70,70	200,42	20/01/2026	TJZ677	235855	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,70	25,15	200,42
											TAP993	235856	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,66	25,04	
											SMOS68	235857	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,66	25,04	
											SNX167	235858	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,66	25,06	
	0+359,50	0+485,55	90,00	7,05	0,09	634,50	55,20	129,72			TJZ679	235859	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,67	25,08	
											TJZ678	235860	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,66	25,06	
											WPT376	235861	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,61	24,94	
											ESP092	235862	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	10,66	25,05	
21/01/2026	0+485,55	0+568,55	71,00	6,90	0,09	489,90	43,60	102,46	140,34	21/01/2026	TJZ677	235872	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	11,94	28,05	140,34
											TJZ679	235873	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	11,96	28,1	
											WPT376	235874	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	12,09	28,4	
	0+485,55	0+556,00	51,75	3,50	0,09	181,13	16,12	37,88			SMOS68	235875	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	11,89	27,93	
											ESP092	235876	PROCOPAL	MSC-19+FIBRA	11,86	27,86	

VOLUMEN TOTAL FRESADO SEGUN MEDIDAS EN CAMPO	1230,32

VOLUMEN TOTAL FRESADO SEGUN MEDIDAS EN CAMPO	1225,98

Informe de volumen

Cliente: **Preparado por:**
Client Preparer

Client Company Your Company Name
Fecha: 17/01/2026 6:50:34 p. m.

Alienación: EJE VIA
Grupo de líneas de muestreo: SL Collection - 1
P.K. inicial: 0+248.00
P.K. final: 0+569.99

P.K.	Área de Mezcla (Metros cuadrados)	Volumen de Mezcla (Metros cúbicos)	Volumen de Mezcla (Ton)	Vol. Mezcla acumul. (Metros cúbicos)	Vol. Mezcla acumul. (Ton)
0+248,00	1,72	0	0	0	0
0+250,00	1,78	4	9,64	4	9,64
0+255,00	1,87	9,83	23,6903	13,83	33,3303
0+260,00	1,88	9,87	23,7867	23,7	57,117
0+265,00	1,9	9,93	23,9313	33,63	81,0483
0+270,00	1,91	10	24,1	43,63	105,1483
0+275,00	1,91	10,04	24,1964	53,67	129,3447
0+280,00	1,92	10,07	24,2687	63,74	153,6134
0+285,00	1,91	10,07	24,2687	73,81	177,8821
0+290,00	1,91	10,05	24,2205	83,86	202,1026
0+295,00	1,85	9,88	23,8108	93,74	225,9134
0+300,00	1,74	9,47	22,8227	103,21	248,7361
0+305,00	1,65	8,98	21,6418	112,19	270,3779
0+315,00	1,47	16,09	38,7769	128,28	309,1548
0+320,00	1,38	7,63	18,3883	135,91	327,5431
0+325,00	1,3	7,22	17,4002	143,13	344,9433
0+330,00	1,28	6,97	16,7977	150,1	361,741
0+335,00	1,28	6,97	16,7977	157,07	378,5387
0+340,00	1,28	6,97	16,7977	164,04	395,3364
0+345,00	1,29	6,97	16,7977	171,01	412,1341
0+350,00	1,29	6,94	16,7254	177,95	428,8595
0+355,00	1,28	6,94	16,7254	184,89	445,5849
0+360,00	1,27	6,94	16,7254	191,83	462,3103
0+365,00	1,27	6,96	16,7736	198,79	479,0839
0+370,00	1,27	6,95	16,7495	205,74	495,8334
0+375,00	1,24	6,76	16,2916	212,5	512,125
0+380,00	1,2	7	16,87	219,5	528,995
0+385,00	1,19	6,47	15,5927	225,97	544,5877
0+390,00	1,2	6,48	15,6168	232,45	560,2045
0+395,00	1,23	6,58	15,8578	239,03	576,0623
0+400,00	1,25	6,79	16,3639	245,82	592,4262
0+405,00	1,26	6,77	16,3157	252,59	608,7419
0+410,00	1,27	6,82	16,4362	259,41	625,1781
0+415,00	1,27	6,84	16,4844	266,25	641,6625
0+420,00	1,27	6,85	16,5085	273,1	658,171
0+425,00	1,25	6,8	16,388	279,9	674,559
0+430,00	1,23	6,8	16,388	286,7	690,947
0+435,00	1,25	6,71	16,1711	293,41	707,1181
0+440,00	1,26	6,78	16,3398	300,19	723,4579
0+445,00	1,25	6,78	16,3398	306,97	739,7977
0+450,00	1,25	6,75	16,2675	313,72	756,0652
0+455,00	1,24	6,78	16,3398	320,5	772,405
0+460,00	1,25	6,74	16,2434	327,24	788,6484
0+465,00	1,27	6,81	16,4121	334,05	805,0605
0+470,00	1,27	6,84	16,4844	340,89	821,5449
0+475,00	1,32	6,98	16,8218	347,87	838,3667
0+480,00	1,38	7,26	17,4966	355,13	855,8633
0+485,00	1,44	7,84	18,8944	362,97	874,7577
0+490,00	1,5	7,84	18,8944	370,81	893,6521
0+495,00	1,55	8,13	19,5933	378,94	913,2454
0+500,00	1,62	8,44	20,3404	387,38	933,5858
0+505,00	1,68	8,95	21,5695	396,33	955,1553
0+510,00	1,7	8,95	21,5695	405,28	976,7248
0+515,00	1,7	9	21,69	414,28	998,4148
0+520,00	1,7	9	21,69	423,28	1020,1048
0+525,00	1,71	9,02	21,7382	432,3	1041,843
0+530,00	1,71	9,04	21,7864	441,34	1063,6294
0+535,00	1,71	9,06	21,8346	450,4	1085,464
0+540,00	1,73	9,02	21,7382	459,42	1107,2022
0+545,00	1,72	9,12	21,9792	468,54	1129,1814
0+550,00	1,71	8,89	21,4249	477,43	1150,6063
0+555,00	1,62	8,82	21,2562	486,25	1171,8625
0+560,00	1,54	8,4	20,244	494,65	1192,1065
0+565,00	1,41	8,41	20,2681	503,06	1212,3746
0+570,00	0,63	6,48	15,6168	509,54	1227,9914

INFORME INTERNO DE FRESADO FRENTE 23

MEDIDAS EN CAMPO								VIAJES DE VOLQUETAS						
Fecha	ABS Inicio	ABS Final	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Volumen (m3	Volumen Total Día (m3)	Fecha	Placa	Nº Remisión	Escombrera	Volumen suelto (m3)	Volumen suelto Total Día (m3)	Volumen Compacto Total Día (m3)
6/01/2026	0+248,00	0+300,00	52,00	6,89	0,18	64,49	93,47	6/01/2026	SMX568	22597	Acopio la 30	15,00	120,00	92,31
									TRL740	22596	Acopio la 30	15,00		
									WPT376	22598	Acopio la 30	15,00		
	0+248,00	0+295,50	47,50	3,39	0,18	28,98			SMX568	24665	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	24666	Acopio la 30	15,00		
									WPT376	24667	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	24668	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	24669	Acopio la 30	15,00		
7/01/2026	0+295,50	0+360,50	65,00	2,70	0,18	31,59	31,59	7/01/2026	TRL740	24673	Acopio la 30	15,00	42,00	32,31
									SMX568	24674	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	24675	Acopio la 30	12,00		
8/01/2026	0+360,50	0+450,50	90,00	3,45	0,18	55,89	136,50	8/01/2026	SMX568	24676	Acopio la 30	15,00	179,00	137,69
									TRL740	24677	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	24679	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	24681	Acopio la 30	15,00		
									TJZ678	24682	Acopio la 30	15,00		
									TZT308	24683	Acopio la 30	15,00		
									WPT376	24684	Acopio la 30	15,00		
	0+450,50	0+560,00	64,9	6,9	0,18	80,61			ESP092	24685	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	24686	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	24687	Acopio la 30	12,00		
									WPT376	24688	Acopio la 30	12,00		
									ESP092	24689	Acopio la 30	10,00		
									SMX568	24690	Acopio la 30	10,00		
13/01/2026	0+248,00	0+380,00	155	3,78	0,236	138,27	138,27	13/01/2026	TRL740	24692	Acopio la 30	15,00	180,00	138,46
									WPT376	24693	Acopio la 30	15,00		
									TJZ677	24694	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	24695	Acopio la 30	15,00		
									WPT376	24696	Acopio la 30	15,00		
									TJZ677	24697	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	24698	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	24699	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	24700	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	25422	Acopio la 30	15,00		
									TRL740	25423	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	25425	Acopio la 30	15,00		
14/01/2026	0+380,00	0+477,00	97,00	3,55	0,302	103,99	103,99	14/01/2026	SMX568	25426	Acopio la 30	15,00	135,00	103,85
									SNX167	25427	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	25428	Acopio la 30	15,00		
									SNX167	25429	Acopio la 30	15,00		
									TJZ678	25430	Acopio la 30	15,00		
									TJZ679	25431	Acopio la 30	15,00		
									WPT376	25432	Acopio la 30	15,00		
									SNX167	25436	Acopio la 30	15,00		
									ESP092	25435	Acopio la 30	15,00		
15/01/2026	0+477,00	0+546,00	69,00	3,5	0,286	69,07	69,07	15/01/2026	SNX167	25437	Acopio la 30	15,00	89,00	68,46
									TJZ679	25438	Acopio la 30	15,00		
									ESP092	25439	Acopio la 30	15,00		
									TJZ678	25440	Acopio la 30	15,00		
									SNX167	25442	Acopio la 30	15,00		
									SMX568	24441	Acopio la 30	14,00		

VOLUMEN TOTAL FRESADO SEGÚN MEDIDAS EN CAMPO	572,90


VOLUMEN TOTAL FRESADO SEGÚN MEDIDAS EN CAMPO	573,08

PLANTA ESC 1: 350



Material	Area	Espesor prom	Volumen
Fresado	2624.87m2	0.218 M.	572.89 m3
MSC-25	2696.25m2	0.107 M.	269.31 m3
MSC-19+Fib	2591.38m2	0.089 M.	230.40 m3

CCIONES VOLUMEN ESC 1: 150

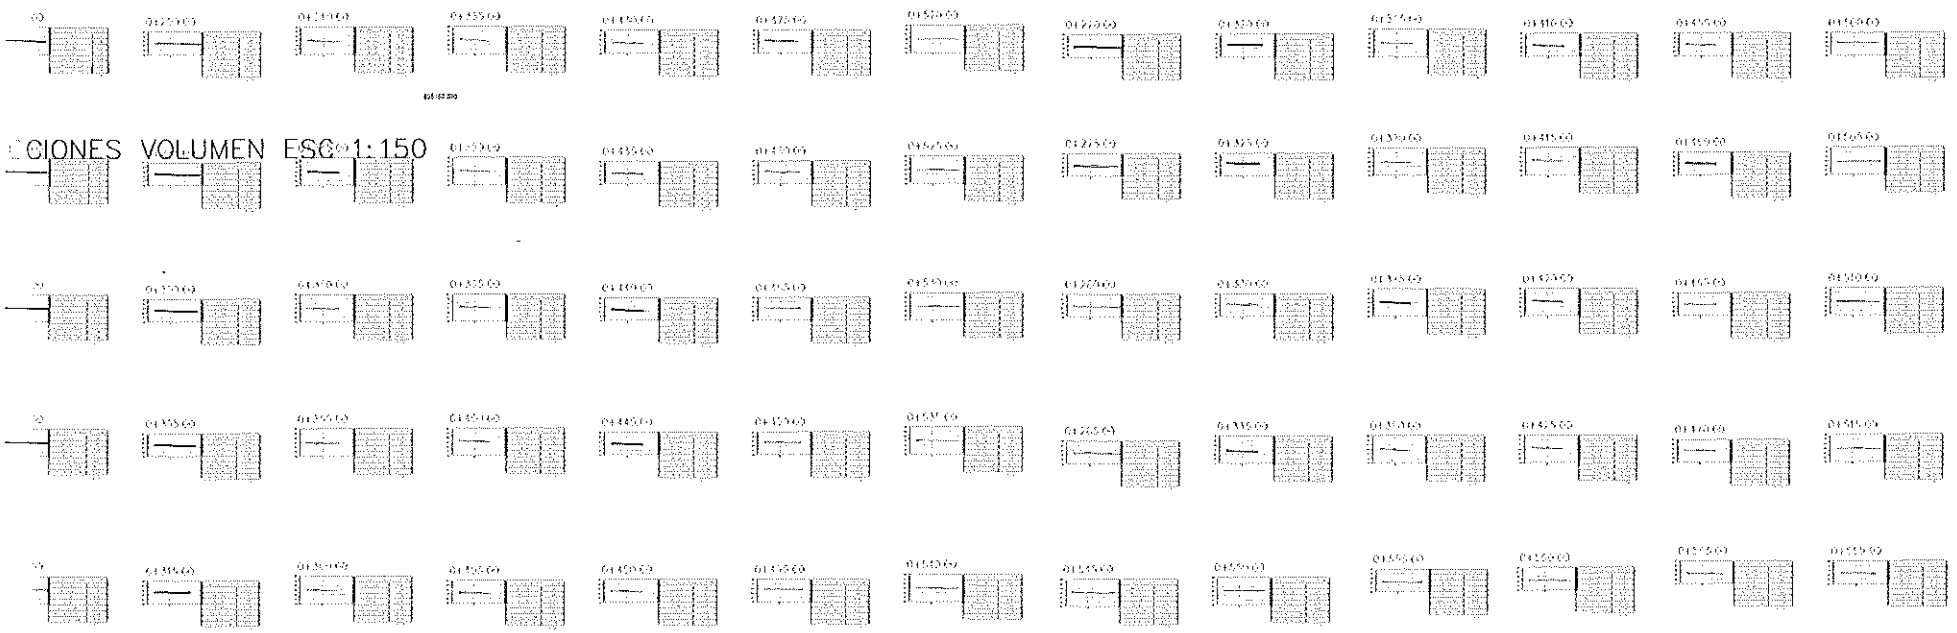

Municipio: Medellin
Antioquia.

LEVANTÓ:

TOPOGRAFO JULIAN SEPULVEDA
LIC. 01-14634 OPNT
TEL.3052256849

CONTIENE:

LEVANTAMIENTO ALTIPLANIMETRICO.
PLANTA, SECCIONES Y VOLUMENES

DIBUJO Y CALCULO:

TOPOGRAFO RUBEN SEPULVEDA
LIC. 01-14177 OPNT
TEL.3133138524

AREA:

ARCHIVO :

FECHA :
Febrero 2026

ESCALA :
Indicadas

PLANO No. :
1 DE :1

CALZADA

FECHA	SEGMENTO	BARRIO	COMUNA	CUADRILLA	ORDEN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	Area (m2)	ESPESOR (m)	Volumen (m3)	Volumen total por dia (m3)	TIPO DE MEZCLA ESPESOR 1
5/01/2026	2000639	Barrio Colombia	14	16	2	21,26	7,14	151,94	0,1	15,19	50,89	MSC-19 + Fibra
5/01/2026	2000640	Santa fe	15	16	2	50	7,14	357,00	0,1	35,70		MSC-19 + Fibra
6/01/2026	2000635	Barrio Colombia	14	16	2	45,24	7	316,68	0,2	63,34	63,34	MAM-25
7/01/2026	2000635	Barrio Colombia	14	16	2	12,57	7,01	88,12	0,2	17,62	67,18	MAM-25
7/01/2026	2000635	Barrio Colombia	14	16	2	8,6	12	103,20	0,2	20,64		MAM-25
7/01/2026	2000636	Barrio Colombia	14	16	2	7	12	84,00	0,2	16,80		MAM-25
7/01/2026	2000635	Barrio Colombia	14	16	2	8,7	12,15	105,71	0,063	6,66		MSC-19 + Fibra
7/01/2026	2000636	Barrio Colombia	14	16	2	7,13	12,15	86,63	0,063	5,46		MSC-19 + Fibra
8/01/2026	2000262	Barrio Colombia	14	16	2	18,9	6,84	129,28	0,05	6,46	53,96	MSC-19 + Fibra
8/01/2026	4004578	San Diego	10	16	2	40	3,56	142,40	0,04	5,70		MSC-19 + Fibra
8/01/2026	4004576	San Diego	10	16	2	50	3,48	104,70	0,2	20,94		MAM-25
8/01/2026	4004579	San Diego	10	16	2	29,8	3,5	104,30	0,2	20,86		MAM-25
9/01/2026	4004576	San Diego	10	16	2	30	3,5	105,00	0,2	21,00	46,81	MAM-25
9/01/2026	4004579	San Diego	10	16	2	29,7	3,5	103,95	0,2	20,79		MAM-25
9/01/2026	4004578	San Diego	10	16	2	10	3,5	35,00	0,06	2,10		MSC-19 + Fibra
9/01/2026	4004579	San Diego	10	16	2	13,89	3,5	48,62	0,06	2,92		MSC-19 + Fibra
13/01/2026	4004579	San Diego	10	16	2	80,91	3,79	306,65	0,2	61,33	94,70	MAM-25
13/01/2026	2000638					119,18	3,5	417,13	0,08	33,37		MAM-25
14/01/2026	2000576	Prado	10	16	2	112	9,14	1023,68	0,05	51,18	98,11	SMA (Stone Mastic Asphalt)
14/01/2026	2000578	Prado	10	16	2	11,52	5,41	62,32	0,05	3,12		SMA (Stone Mastic Asphalt)
14/01/2026	2000638					139,74	3,74	522,63	0,08	41,81		MAM-25
15/01/2026	2000579	Jesús Nazareno	10	16	2	121	9,14	1105,94	0,05	55,30	97,12	SMA (Stone Mastic Asphalt)
15/01/2026	2000638					50	3,66	183,00	0,08	14,64		MAM-25
15/01/2026	2001742					92,85	3,66	339,83	0,08	27,19		MAM-25
16/01/2026	2004579	San Diego	10	16	2	70	3,5	245,00	0,2	49,00	101,45	MAM-25
16/01/2026	2004579	San Diego	10	16	2	19,4	3,75	72,75	0,2	14,55		MAM-25
16/01/2026	2000638					13,5	3,66	49,41	0,08	3,95		MAM-25
16/01/2026	2000638					33,53	3,56	119,37	0,08	9,55		MAM-25
16/01/2026	2001742					50	6,1	305,00	0,08	24,40		MAM-25
19/01/2026	4001052	El Tesoro	14	16	2	124,1	7,41	919,58	0,05	45,98	96,27	SMA (Stone Mastic Asphalt)
19/01/2026	2000638					57,41	3,7	249,42	0,08	19,95		MAM-25
19/01/2026	2000637					41	3,7	151,70	0,2	30,34		MAM-25
20/01/2026	4001053	El Tesoro	14	16	2	124,88	6,72	839,19	0,05	41,96	92,11	SMA (Stone Mastic Asphalt)
20/01/2026	2000637					39,51	3,6	142,24	0,2	28,45		MAM-25
20/01/2026	2000637					30,14	3,6	108,50	0,2	21,70		MAM-25
22/01/2026	4001054	El Tesoro	14	16	2	133	7,12	946,96	0,05	47,35	52,73	SMA (Stone Mastic Asphalt)
22/01/2026	4001054	El Tesoro	14	16	2	23,9	2,78	66,44	0,05	3,32		SMA (Stone Mastic Asphalt)
22/01/2026	2000638					35,19	3,5	126,67	0,08	10,13		MAM-25
22/01/2026	2000637					44,34	3,6	159,62	0,2	31,92		MAM-25
23/01/2026	2000637	Barrio Colombia	10	15	2	30,52	7,11	217,00	0,2	43,40	43,40	MAM-25
26/01/2026	2001744	Perpetuo socorro	10	15	2	40	7,03	281,20	0,07	19,68	54,32	MAM-25
26/01/2026	2001743	Perpetuo socorro	10	15	2	44,95	7,03	316,00	0,07	22,12		MAM-25
26/01/2026	4002565	Perpetuo socorro	10	15	2	26,07	12	312,84	0,04	12,51		MSC-19 + Fibra
27/01/2026	2001742	Barrio Colombia	10	15	2	31	8,6	264,60	0,06	17,67	58,53	MSC-19 + Fibra
27/01/2026	2001742	Barrio Colombia		15	2	30	6,9	207,00	0,06	12,42		MSC-19 + Fibra
27/01/2026	2000638	Barrio Colombia	10	15	2	23,3	6,9	160,77	0,06	9,65		MSC-19 + Fibra
27/01/2026	2000638	Barrio Colombia	10	15	2	29,27	10,7	313,19	0,06	18,79		MSC-19 + Fibra
28/01/2026	2000638	Barrio Colombia	10	15	2	117,2	10,7	1254,04	0,06	75,24	75,24	MSC-19 + Fibra
29/01/2026	2000638	Barrio Colombia	10	15	2	69,05	10,7	738,84	0,063	46,55	80,69	MSC-19 + Fibra
29/01/2026	2000636	Barrio Colombia	10	15	2	45,15	10,7	483,11	0,062	29,95		MSC-19 + Fibra
29/01/2026	2000636	Barrio Colombia	10	15	2	12,08	5,6	67,65	0,062	4,19		MSC-19 + Fibra
30/01/2026	4004578	San Diego	10	15	2	26,1	3,7	96,57	0,06	5,79	58,57	MSC-19 + Fibra
30/01/2026	4004579	San Diego	10	15	2	95	7,2	684,00	0,06	41,04		MSC-19 + Fibra
30/01/2026	4003028	San Diego	10	15	2	8,51	5	42,55	0,06	2,55		MSC-19 + Fibra
30/01/2026	4003027	San Diego	10	15	2	12,24	12,5	153,00	0,06	9,18		MSC-19 + Fibra
TOTAL								16151,78		1323,42		

Volumenes X segmentos Enero 2026				
Fecha	Segmento	Area	Vol(m3)	Mezcla
5/01/2026	2000639-2000640	508,94	50,89	MSC-19
6/01/2026	2000635	316,68	63,34	MAM 25
7/01/2026	2000635-2000636	275,32	55,06	MAM 25
7/01/2026	2000635-2000636	192,33	12,12	MSC-19
8/01/2026	2000264-2000634	209	41,8	MAM 25
8/01/2026	2000264-2000634	271,68	12,16	MSC-19
9/01/2026	2000264	208,95	41,79	MAM 25
9/01/2026	2000264	83,62	5,02	MSC-19
13/01/2026	4004579	306,64	61,33	MAM 25
13/01/2026	2000638	417,13	33,37	MAM 25
14/01/2026	2000638	522,63	41,81	MAM 25
14/01/2026	2000580	1086	54,3	SMA
15/01/2026	2000581	1105,94	55,3	SMA
15/01/2026	2000639-2000639	522,83	41,83	MAM 25
16/01/2026	2000264	317,75	63,55	MAM 25
16/01/2026	2000639-2000639	473,78	37,9	MAM 25
19/01/2026	4004052	919,58	45,98	SMA
19/01/2026	2000637	401,12	50,29	MAM 25
20/01/2026	4001053	839,19	41,96	SMA
20/01/2026	2000637	250,74	50,15	MAM 25
22/01/2026	4001054	1013,4	50,67	SMA
22/01/2026	2000636	286,29	42,06	MAM 25
23/01/2026	2000636	217	43,4	MAM 25
26/01/2026	2001743-2001744	597,2	41,8	MAM 25
26/01/2026	4002565	312,84	12,51	MSC-19
27/01/2026	2000638-2000639	975,46	58,53	MSC-19
28/01/2026	2000638	1254,04	75,24	MSC-19
29/01/2026	2000637	1289,58	80,69	MSC-19
30/01/2026	2000259	976,12	58,57	MSC-19

PENDIENTE


IMPRECIÓN

AUTOCAD.

Volcano

Invasion

Erosion

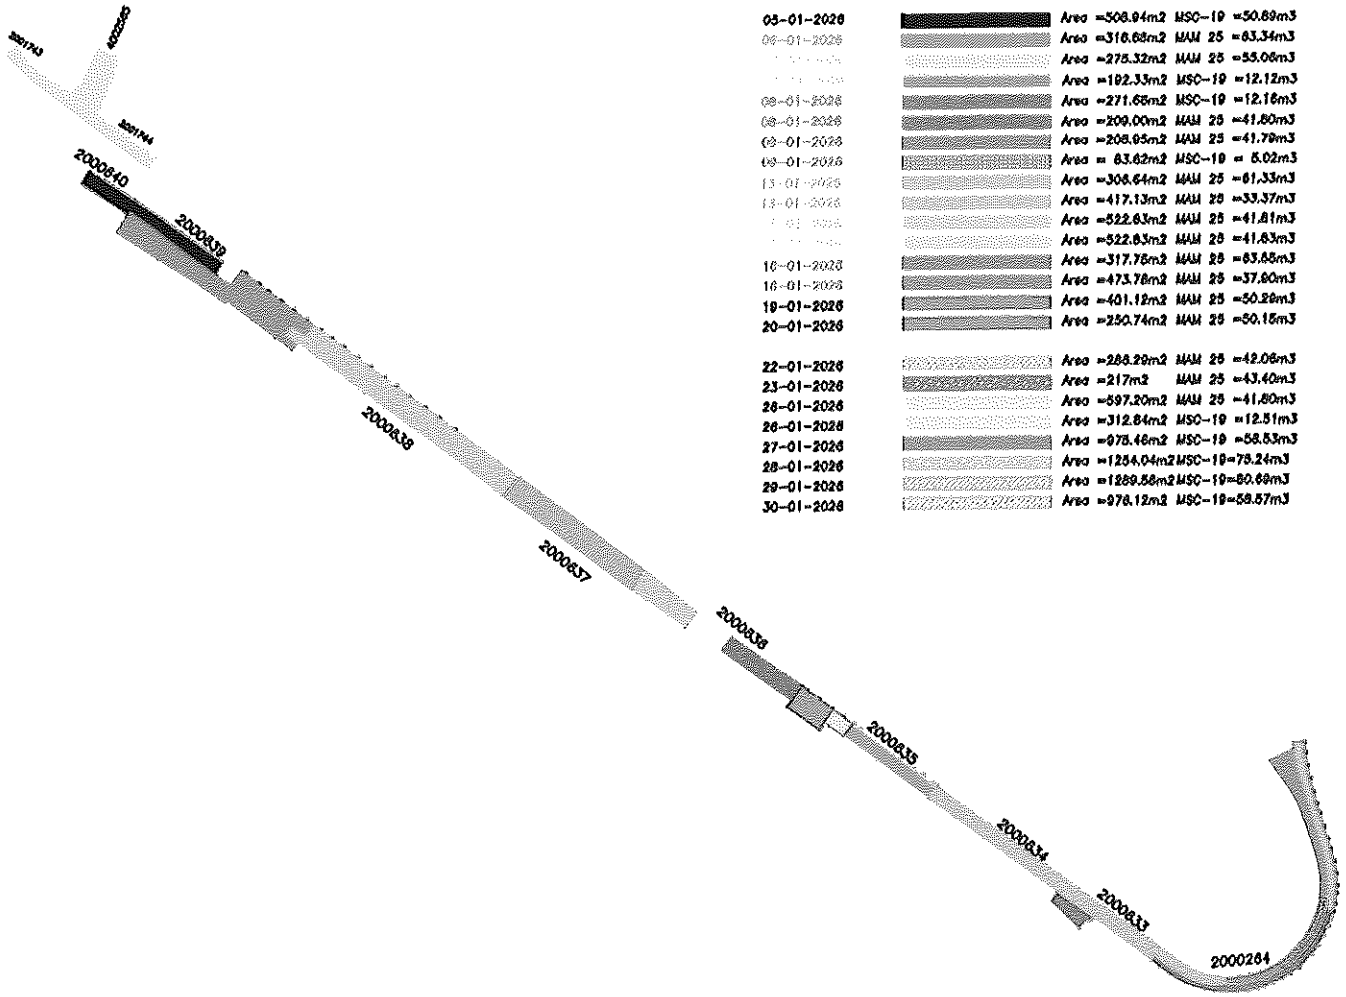
3021743
3021744
3021745
2000640
2000639
2000638
2000637
2000636
2000635
2000634
2000633
2000264
03-01-2026 Area =508.94m2 MSC-19 =50.89m3
04-01-2026 Area =316.68m2 MAM 25 =63.34m3
Area =275.32m2 MAM 25 =55.06m3
Area =192.33m2 MSC-19 =12.12m3
08-01-2026 Area =271.65m2 MSC-19 =12.16m3
08-01-2026 Area =209.00m2 MAM 25 =41.80m3
09-01-2026 Area =208.95m2 MAM 25 =41.79m3
09-01-2026 Area = 83.62m2 MSC-19 = 5.02m3
13-01-2026 Area =306.64m2 MAM 25 =61.33m3
13-01-2026 Area =417.13m2 MAM 25 =33.37m3
Area =522.63m2 MAM 25 =41.81m3
Area =522.63m2 MAM 25 =41.83m3
16-01-2026 Area =317.75m2 MAM 25 =63.55m3
16-01-2026 Area =473.78m2 MAM 25 =37.90m3
19-01-2026 Area =401.12m2 MAM 25 =50.29m3
20-01-2026 Area =250.74m2 MAM 25 =50.15m3
22-01-2026 Area =288.29m2 MAM 25 =42.06m3
23-01-2026 Area =217m2 MAM 25 =43.40m3
26-01-2026 Area =597.20m2 MAM 25 =41.80m3
26-01-2026 Area =312.84m2 MSC-19 =12.51m3
27-01-2026 Area =975.46m2 MSC-19 =58.53m3
28-01-2026 Area =1254.04m2 MSC-19=75.24m3
29-01-2026 Area =1289.58m2 MSC-19=80.69m3
30-01-2026 Area =976.12m2 MSC-19=58.57m3
