Rionegro, 04 de mayo de 2026.

Ingeniera,
MONICA VERGARA MEJÍA
Profesional Aeronáutico II.
Unidad Administrativa Especial AERONAUTICA CIVIL.
Rionegro, Antioquia.

Referencia: Contrato 26000258 H3, con objeto "*Prestar servicios profesionales especializados para estructurar, evaluar y apoyar la supervisión de los proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la infraestructura de la Regional Noroccidente* ".


Asunto: Informe de actividades del mes de abril de 2026.

En calidad de contratista por prestación de servicios y, de acuerdo con el contrato de la referencia, me permito presentar el informe de actividades realizadas en el período del asunto, acorde a las tareas indicadas al alcance del contrato.

ACTIVIDADES.

Apoyo profesional a la Regional Noroccidente, en los siguientes asuntos:

1. Gestiones para la prórroga a los contratos, de obra pública 25000692 H4 con objeto "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO" y de interventoría 25000858 H3 con objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO"

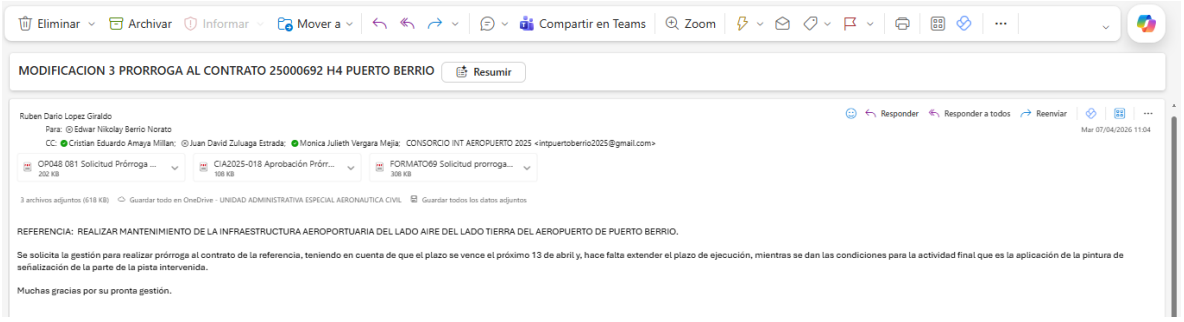

RE: OP048 Solicitud de adición en plazo por restricciones de movilidad de carga y ejecución de actividades adicionales en mejoramiento de subrasante Resumir

De: CONSORCIO INT AEROPUERTO 2025 <intpuertoberrio2025@gmail.com>
Enviado: lunes, 6 de abril de 2026 16:33
Para: Alvaro Hernan Restrepo Guzman <alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co>
Cc: Paola Neira <paola.neira@grupointerlomas.com.co>; Ruben Dario Lopez Giraldo <ruben.lopez@aerocivil.gov.co>; Monica Julieth Vergara Mejia <monica.vergara@aerocivil.gov.co>; Jeffersson Camilo Aguilar Parra <jeffersson.aguilar@aerocivil.gov.co>; Andres Girón <andres.giron@grupointerlomas.com.co>
Asunto: Re: OP048 Solicitud de adición en plazo por restricciones de movilidad de carga y ejecución de actividades adicionales en mejoramiento de subrasante

Puerto Berrío, Antioquía 31 de marzo de 2026
CV 2023-018

Señores,
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
Regional Noroccidente, Rio Negro Antioquia
Ingeniero:
Alvaro Hernán Restrepo Guzmán
Supervisor

REF: Contrato de Obra No. CO1.SLCNTR.15751098
OBJETO: **REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO**
ASUNTO: Aprobación prórroga No 3

Cordial Saludo Ingeniero,

En mi calidad de Interventor del Contrato de Obra y en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, aprobamos la solicitud del contratista de obra, en prorrogar el tiempo de ejecución de las obras en un plazo de 15 días calendario, es decir hasta el 28 de abril de 2026, esta extensión de plazo es necesaria para garantizar la correcta ejecución de las actividades contratadas, lo cual implica que el contrato de interventoría también sea adicionado en tiempo, sin que ellos generen sobre costos al contrato de interventoría.

Atentamente,

Carlos Ernesto Perdomo Rubiano
Director de Interventoría

RE: MODIFICACION 3 PRORROGA AL CONTRATO 25000692 H4 PUERTO BERRIO Resumir

Ruben Dario Lopez Giraldo
Para: Cristian Eduardo Amaya Millan
CC: Alvaro Hernan Restrepo Guzman; Monica Julieth Vergara Mejia; Juan David Zuluaga Estrada; Edwar Nikolay Berrio Norato; CONSORCIO INT AEROPUERTO 2025 <intpuertoberrio2025@gmail.com>
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 08/04/2026 10:10

Cordial saludo.

Se responde las observaciones con intención de acuerdo, ya que proceder de nuevo a las modificaciones tardaría un poco mas de tiempo, amen a la recolección de firmas por parte de la interventoría, lo que tardaría mas el proceso, teniendo en cuenta de que estamos ad portas a la terminacion del plazo:

En la casilla "fecha" se registro el dia de la solicitud en el formato 69, porque este formato no tiene otro aparte para registrar este dato que es importante para llevar la secuencia de las actuaciones procesales del contrato; la fecha de inicio del contrato es otro asunto. Por tanto no es un error de diligenciamiento; Al respecto, observe varias modificaciones de vigencias anteriores y de otros contratos y observo la fecha de solicitud y en otros casos, pocos mas bien, la fecha de suscripción del contrato. Por tanto, se sugiere solicitar aclaración de que fecha va en esta casilla, porque si es la fecha del contrato, no se tendrá registro de fecha de la solicitud del contrato, caso contrario si se registra allí la fecha de solicitud de la prorroga.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	OBRA		
Número:	25000692 H4	Fecha:	07/04/2026
Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO			

En relación al uso reiterado de la expresión "adición en plazo", estamos de acuerdo en su posición, en el sentido de que en materia jurídica, adición se refiere a aumento del valor del negocio jurídico mientras que prórroga se refiere a la extensión del plazo de ejecución del contrato, por esto es que en el formato 69, en todos los espacios, (**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**, **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**, **JUSTIFICACIÓN LEGAL**, **JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA**, **EVIDENCIAS APORTADAS** y **CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR)** que redacta o revisa la supervisión (caso ultimo por tener interventoría este contrato), se utiliza el término "prórroga" mientras que en el especio **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**, lo que se hizo allí fue transcribir la solicitud del contratista en comunicado con radicado OP048_081, sin cambiar palabras; es decir que el uso de la expresión "adición en plazo" es del contratista del bilateral 25000692 H4. Así que interpretamos en la expresión del contratista que lo que solicitó fue prórroga o aumento de tiempo de ejecución, en su propio léxico,

Así que si se considera necesario solicitarle al contratista cambiar la solicitud cambiando la expresión cuestionada, tardaríamos otro tanto en el proceso.

En cuanto a la justificación técnica, es lo que realmente sucedió, tanto fallos en la subrasante como las restricciones al transito pesado por la época previa y en semana santa, según el contratista y la interventoría, teniendo en cuenta de que una semana antes de semana santa y durante esta semana, se estuvo aplicando el asfalto a la pavimento de la pista, asfalto que tenia que ser transportado desde Barrancabermeja en caliente y aplicado a tal temperatura, pero las restricciones al tránsito pesado por la época fue lo que expuso el contratista, que la retrasaron la actividad. Situación que fue de conocimiento por la interventoría y supervisión y por esta las justificaciones son acordadas.

Frente a la necesidad de un periodo de aproximadamente 20 días para la señalización posterior a la pavimentación, pero la prórroga solicitada es de 15 días. Si hay una conexión clara entre ambos tiempos, ya que el asfalto entre ayer y hoy o mañana se estaría terminando de aplicar, requiriendo luego, por lo menos de 20 días para su maduración y poder aplicar la pintura de señalización, para garantizar su adherencia; en este sentido el contratista solicita 15 días de prórroga y esto se entiende a partir de la fecha de terminación actual, que es el día 13 del mes corriente, y hoy estamos a 8, así que 6 días que faltan para terminar el plazo mas 15 de solicitud de prórroga, suman 21 días.

El estado financiero del contrato, corresponde a la realidad de su avance físico, a la fecha de allegada la solicitud de prórroga, siendo correcto, ya que en la columna "VALOR CONTRATO), se registra el presupuesto contractual, mientras que en la columna "VALOR EJECUTADO", la sumatoria de las actividades ejecutadas a la fecha de la solicitud registradas en fila "OBRA EJECUTADA" y en "OTROS" se relacionó lo que faltaba por ejecutar a la fecha de la solicitud, así ambas columnas deben sumar igual, que es

RE: MODIFICACION 3 PRORROGA AL CONTRATO 25000692 H4 PUERTO BERRIO Resumir

De: Cristian Eduardo Amaya Millan <cristian.amaya@aerocivil.gov.co>
Enviado: Martes, 07 de Abril de 2026 16:14
Para: Ruben Dario Lopez Giraldo <ruben.lopez@aerocivil.gov.co>
Asunto: RE: MODIFICACION 3 PRORROGA AL CONTRATO 25000692 H4 PUERTO BERRIO

Ingeniero Ruben

Propongo algunas revisiones para el formato 69.

Se evidencia una inconsistencia en la fecha del contrato, ya que el formato indica 07/04/2026, mientras que el inicio del contrato es 27/10/2025. Esto sugiere un error en el diligenciamiento de la fecha que debe ser verificado y corregido para evitar observaciones formales.

En el documento se utiliza reiteradamente la expresión "adición en plazo", lo cual no es correcto desde el punto de vista jurídico. La figura aplicable es "prórroga del plazo", por lo que debe ajustarse esa redacción tanto en la justificación como en cualquier otro apartado donde aparezca.

No se incluye un análisis del plazo total acumulado del contrato con las prórrogas anteriores. Considerando que ya existen dos prórrogas previas, es recomendable dejar explícito el plazo total adicional acumulado, como control y trazabilidad de la ejecución contractual.


La justificación técnica, aunque completa, resulta extensa y reiterativa. Se repiten varias ideas relacionadas con restricciones de movilidad, fallos en subrasante y actividades adicionales. Esto puede generar observaciones por falta de síntesis, por lo que se recomienda consolidarla en un texto más concreto y ejecutivo.

Se menciona la necesidad de un periodo de aproximadamente 20 días para la señalización posterior a la pavimentación, pero la prórroga solicitada es de 15 días. No hay una conexión clara entre ambos tiempos, lo cual puede generar cuestionamientos sobre la suficiencia del plazo solicitado.

El estado financiero presenta inconsistencias, ya que el valor ejecutado y el saldo no corresponden con el valor pendiente de pago que se indica como el total del contrato. Esto debe revisarse y ajustarse para que haya coherencia entre los valores reportados.

Quedo atento, son propuestas, conforme a su análisis, evalúa y hace la modificación en caso de ser necesarias.

Saludos



SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO 25000858 H3 Resumir

Ruben Dario Lopez Giraldo
Para: Juan David Zuluaga Estrada; Edwar Nikolay Berrio Norato; Cristian Eduardo Amaya Millan
CC: Alvaro Hernan Restrepo Guzman; Monica Julieth Vergara Mejia; Juan Manuel Bello Rodriguez; Jeffersson Camilo Aguilar Parra; Maria Alejandra Ramirez Avila

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mie 08/04/2026 16:54

Form 69 Prorroga 3 Cont 25000... 360 KB | CIA2025-018 Aprobación Prórr... 108 KB | Form 69 Prorroga 3 Cont 25000... 211 KB | Certificado parafiscales- CONS... 156 KB

4 archivos adjuntos (836 KB) Guardar todo en OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL Guardar todos los datos adjuntos


REFERENCIA: REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.

Cordial saludo.

Se envia solicitud de modificación al contrato de la referencia, que vence el plazo de ejecución el próximo 13 de abril, sustentado en prórroga al contrato que se vigila, 25000692 H4, por sus propias justificaciones técnicas.

Atentamente,

2. Realización de la evaluación técnica preliminar del proceso 26001082 H4, relacionado con el mantenimiento de la red contra incendio en el aeropuer6to JMC de Rionegro", el cual se efectúa durante 3 ciclos, debido a que en cada ciclo el menor valor ha tenido que subsanar.

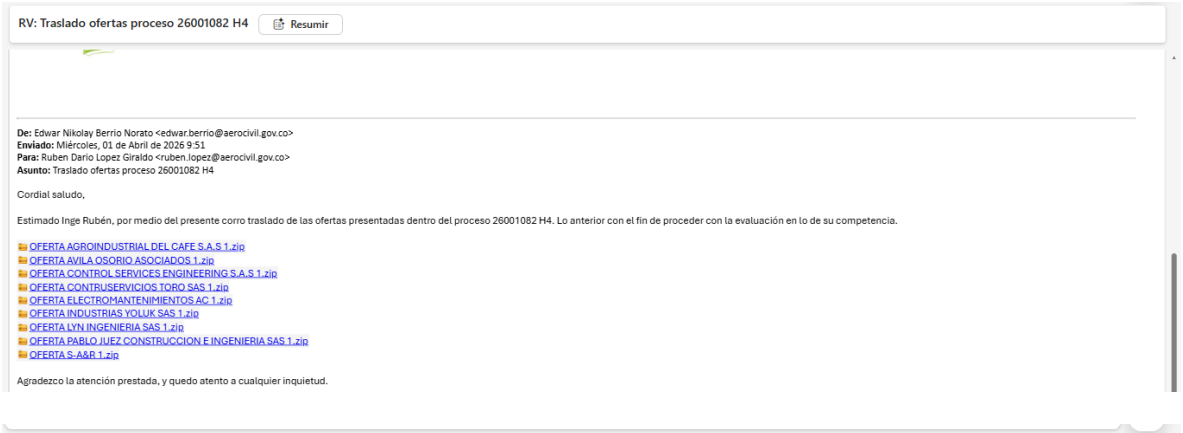

RV: Traslado ofertas proceso 26001082 H4 Resumir


De: Edwar Nikolay Berrio Norato <edwar.berrio@aerocivil.gov.co>
Enviado: Miércoles, 01 de Abril de 2026 9:51
Para: Ruben Dario Lopez Giraldo <ruben.lopez@aerocivil.gov.co>
Asunto: Traslado ofertas proceso 26001082 H4

Cordial saludo,

Estimado Inge Rubén, por medio del presente corro traslado de las ofertas presentadas dentro del proceso 26001082 H4. Lo anterior con el fin de proceder con la evaluación en lo de su competencia.

OFERTA AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S 1.zip
OFERTA AVILA OSORIO ASOCIADOS 1.zip
OFERTA CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S 1.zip
OFERTA CONTRUSERVICIOS TORO SAS 1.zip
OFERTA ELECTROMANTENIMIENTOS AC 1.zip
OFERTA INDUSTRIAS YOLUK SAS 1.zip
OFERTA LYN INGENIERIA SAS 1.zip
OFERTA PABLO JUEZ CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS 1.zip
OFERTA S-A&R 1.zip

Agradezco la atención prestada, y quedo atento a cualquier inquietud.

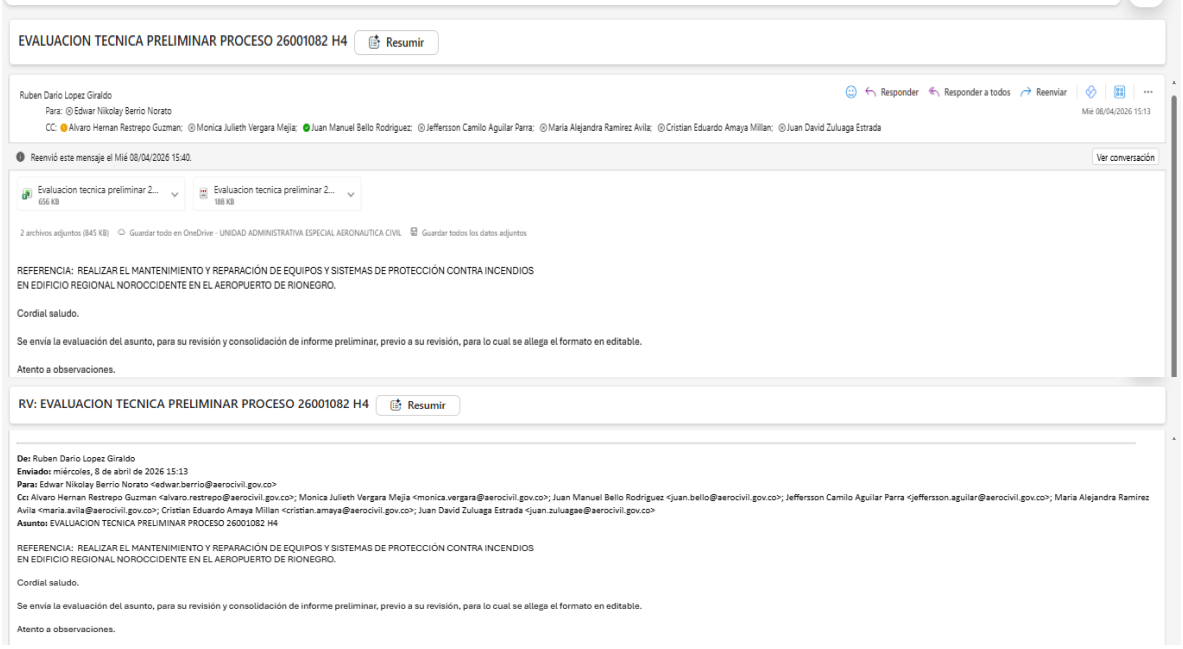

EVALUACION TECNICA PRELIMINAR PROCESO 26001082 H4 Resumir

Ruben Dario Lopez Giraldo
Para: Edwar Nikolay Berrio Norato
CC: Alvaro Hernan Restrepo Guzman; Monica Julieth Vergara Mejia; Juan Manuel Bello Rodriguez; Jeffersson Camilo Aguilar Parra; Maria Alejandra Ramirez Avila; Cristian Eduardo Amaya Millan; Juan David Zuluaga Estrada

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mie 08/04/2026 15:13

Reenvió este mensaje el Mié 08/04/2026 15:40. Ver conversación

Evaluacion tecnica preliminar 2... 656 KB | Evaluacion tecnica preliminar 2... 188 KB

2 archivos adjuntos (845 KB) Guardar todo en OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL Guardar todos los datos adjuntos

REFERENCIA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN EDIFICIO REGIONAL NOROCCIDENTE EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO.

Cordial saludo.

Se envía la evaluación del asunto, para su revisión y consolidación de informe preliminar, previo a su revisión, para lo cual se allega el formato en editable.

Atento a observaciones.

RV: EVALUACION TECNICA PRELIMINAR PROCESO 26001082 H4 Resumir


De: Ruben Dario Lopez Giraldo
Enviado: miércoles, 8 de abril de 2026 15:13
Para: Edwar Nikolay Berrio Norato <edwar.berrio@aerocivil.gov.co>
Cc: Alvaro Hernan Restrepo Guzman <alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co>; Monica Julieth Vergara Mejia <monica.vergara@aerocivil.gov.co>; Juan Manuel Bello Rodriguez <juan.bello@aerocivil.gov.co>; Jeffersson Camilo Aguilar Parra <jeffersson.aguilar@aerocivil.gov.co>; Maria Alejandra Ramirez Avila <maria.avila@aerocivil.gov.co>; Cristian Eduardo Amaya Millan <cristian.amaya@aerocivil.gov.co>; Juan David Zuluaga Estrada <juan.zuluagae@aerocivil.gov.co>
Asunto: EVALUACION TECNICA PRELIMINAR PROCESO 26001082 H4

REFERENCIA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN EDIFICIO REGIONAL NOROCCIDENTE EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO.

Cordial saludo.

Se envía la evaluación del asunto, para su revisión y consolidación de informe preliminar, previo a su revisión, para lo cual se allega el formato en editable.


Atento a observaciones.

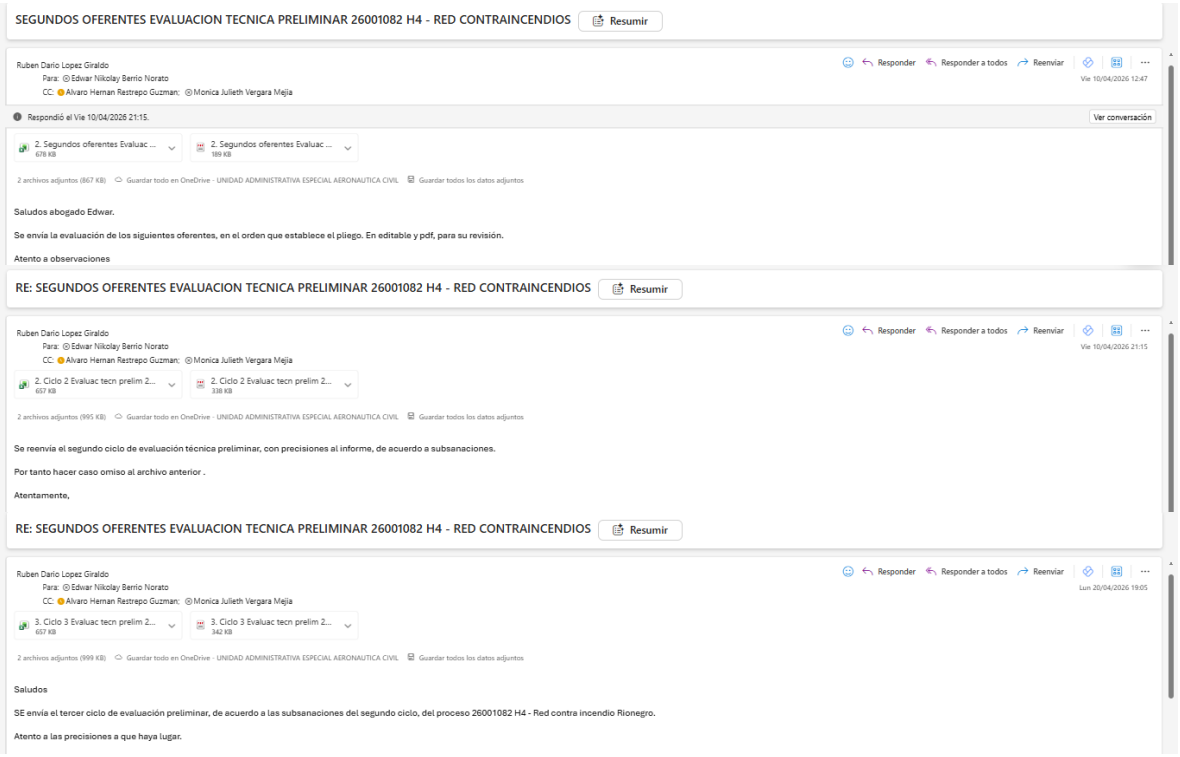


3. Se apoya la realización de la evaluación técnica preliminar del proceso precontractual 26001072 H4 con objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO”.



4. Revisión del acta de cobro por corte de obra Nro. 01 del contrato 25000692 H4 con objeto "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO", con observaciones al respecto.

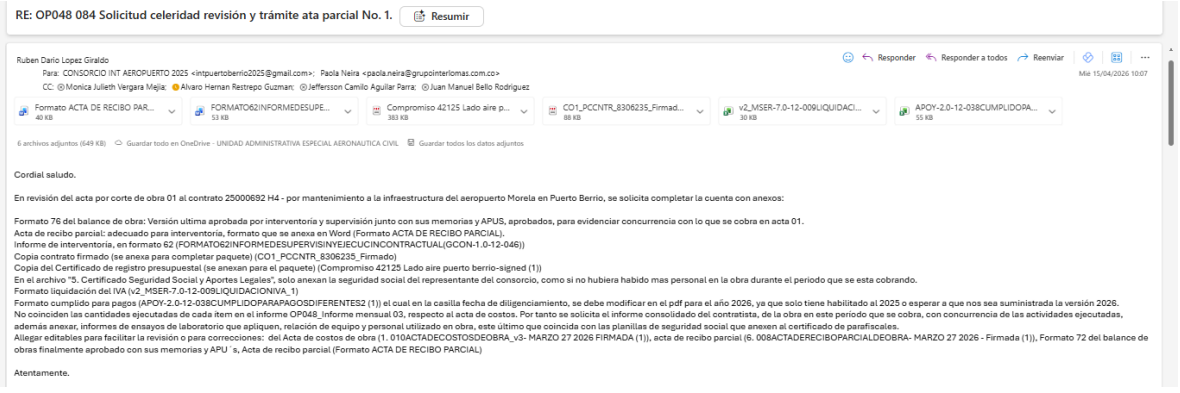

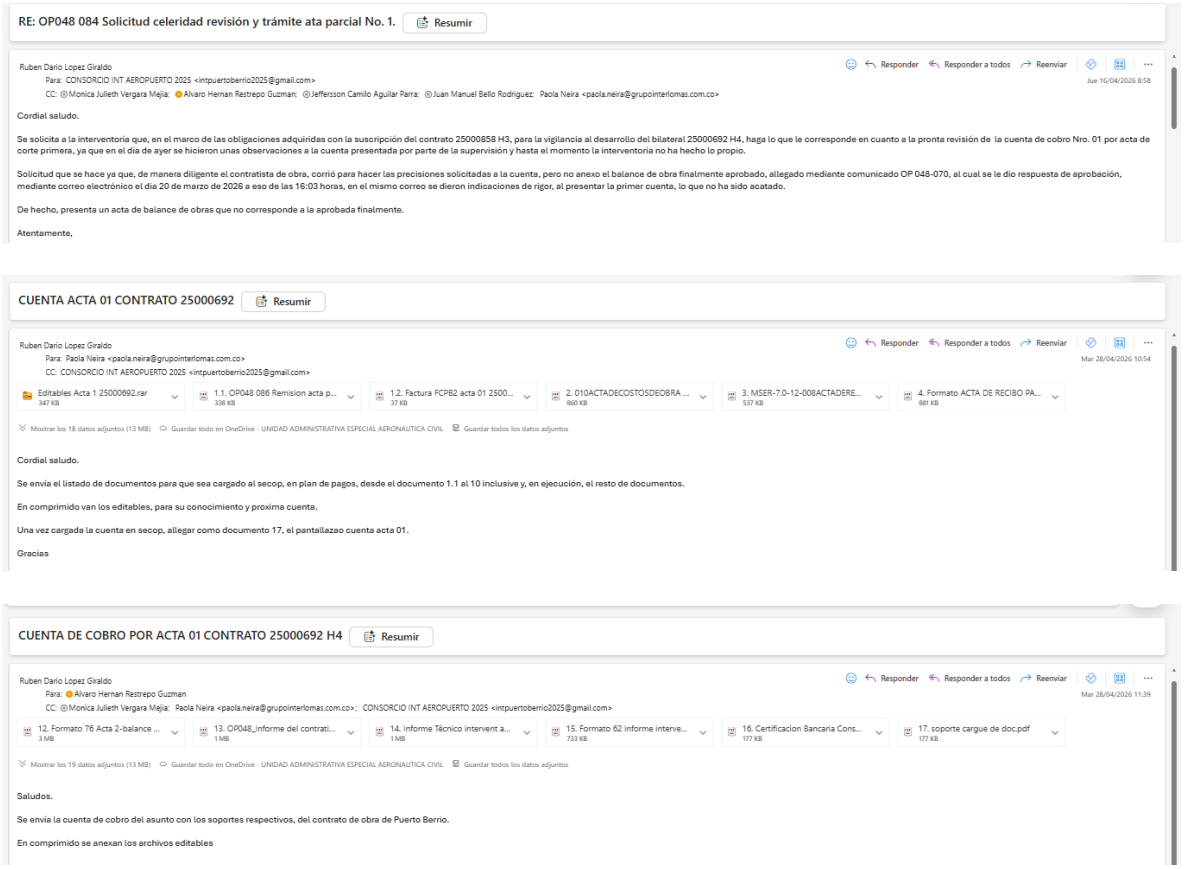
RE: OP048 084 Solicitud celeridad revisión y trámite ata parcial No. 1. Resumir

Ruben Darío Lopez Giraldo
Para: CONSORCIO INT AEROPUERTO 2025 <intpuertoberrio2025@gmail.com>
CC: Monica Julieth Vergara Mejia; Alvaro Hernan Restrepo Guzman; Jefferson Camilo Aguilar Parra; Juan Manuel Bello Rodriguez; Paola Neira <paola.neira@grupointerlomas.com.co>

Responder Responder a todos Reenviar
Jue 16/04/2026 8:58

Cordial saludo.

Se solicita a la interventoria que, en el marco de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato 25000858 H3, para la vigilancia al desarrollo del bilateral 25000692 H4, haga lo que le corresponde en cuanto a la pronta revisión de la cuenta de cobro Nro. 01 por acta de corte primera, ya que en el dia de ayer se hicieron unas observaciones a la cuenta presentada por parte de la supervisión y hasta el momento la interventoria no ha hecho lo propio.

Solicitud que se hace ya que, de manera diligente el contratista de obra, corrió para hacer las precisiones solicitadas a la cuenta, pero no anexo el balance de obra finalmente aprobado, allegado mediante comunicado OP 048-070, al cual se le dio respuesta de aprobación, mediante correo electrónico el dia 20 de marzo de 2026 a eso de las 16:03 horas, en el mismo correo se dieron indicaciones de rigor, al presentar la primer cuenta, lo que no ha sido acatado.

De hecho, presenta un acta de balance de obras que no corresponde a la aprobada finalmente.

Atentamente,

CUENTA ACTA 01 CONTRATO 25000692 Resumir

Ruben Darío Lopez Giraldo
Para: Paola Neira <paola.neira@grupointerlomas.com.co>
CC: CONSORCIO INT AEROPUERTO 2025 <intpuertoberrio2025@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar
Mar 28/04/2026 10:54

Editables Acta 1 25000692.rar 347 KB | 1.1. OP048 086 Remision acta p... 338 KB | 1.2. Factura FCPB2 acta 01 2500... 37 KB | 2. 010ACTADECOSTOSDEOBRA ... 860 KB | 3. MSER-7.0-12-008ACTADERE... 537 KB | 4. Formato ACTA DE RECIBO PA... 881 KB

Mostrar los 18 datos adjuntos (13 MB) Guardar todo en OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo.

Se envía el listado de documentos para que sea cargado al secop, en plan de pagos, desde el documento 1.1 al 10 inclusive y, en ejecución, el resto de documentos.

En comprimido van los editables, para su conocimiento y proxima cuenta.

Una vez cargada la cuenta en secop, allegar como documento 17, el pantallazao cuenta acta 01.

Gracias

CUENTA DE COBRO POR ACTA 01 CONTRATO 25000692 H4 Resumir

Ruben Darío Lopez Giraldo
Para: Alvaro Hernan Restrepo Guzman
CC: Monica Julieth Vergara Mejia; Paola Neira <paola.neira@grupointerlomas.com.co>; CONSORCIO INT AEROPUERTO 2025 <intpuertoberrio2025@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar
Mar 28/04/2026 11:39

12. Formato 76 Acta 2-balance ... 3 MB | 13. OP048_Informe del contrati... 1 MB | 14. Informe Técnico intervent a... 1 MB | 15. Formato 62 informe interve... 733 KB | 16. Certificacion Bancaria Cons... 177 KB | 17. soporte cargue de doc.pdf 177 KB

Mostrar los 19 datos adjuntos (13 MB) Guardar todo en OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL Guardar todos los datos adjuntos

Saludos.

Se envía la cuenta de cobro del asunto con los soportes respectivos, del contrato de obra de Puerto Berrio.

En comprimido se anexan los archivos editables

5. Apoyo en la evaluación técnica preliminar del proceso precontractual 26001073 H4 con objeto "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTELIBANO, MONTERIA Y CAREPA".


RE: Resultado evaluación de presupuestos – 46 proponentes REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTELIBANO, MONTERIA Y CAREPA Resumir

Ruben Darío Lopez Giraldo
Para: Maria Alejandra Ramirez Avila

Responder Responder a todos Reenviar
Mar 21/04/2026 15:29

Muchas gracias,

Al WhatsApp, te envié imágenes de otros con diferencias para revisarlos porfa, con las mismas formulas del presupuestos oficial

EVALUACION TECNICA PRELIMINAR 26001073 H4 Resumir

Ruben Darío Lopez Giraldo
Para: Juan David Zuluaga Estrada
CC: Alvaro Hernan Restrepo Guzman; Monica Julieth Vergara Mejia; Cristian Eduardo Amaya Millan; Edwar Nikolay Berrio Norato; Juan Manuel Bello Rodriguez; Jefferson Camilo Aguilar Parra; Maria Alejandra Ramirez Avila; Maria Alejandra Ramirez Avila

Responder Responder a todos Reenviar
Vie 24/04/2026 15:02


Eval. tecnica preliminar 260010... 656 KB | Eval. tecnica preliminar 260010... 746 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL Guardar todos los datos adjuntos


Cordial saludo.

Se envía la evaluación del asunto, en pdf firmada y editable en caso de precisiones que se requieran.


6. Revisión cuenta de cobro por acta de recibo final del contrato 25000847 H4 por mantenimiento en el aeropuertol El Pindo en Montelíbano.

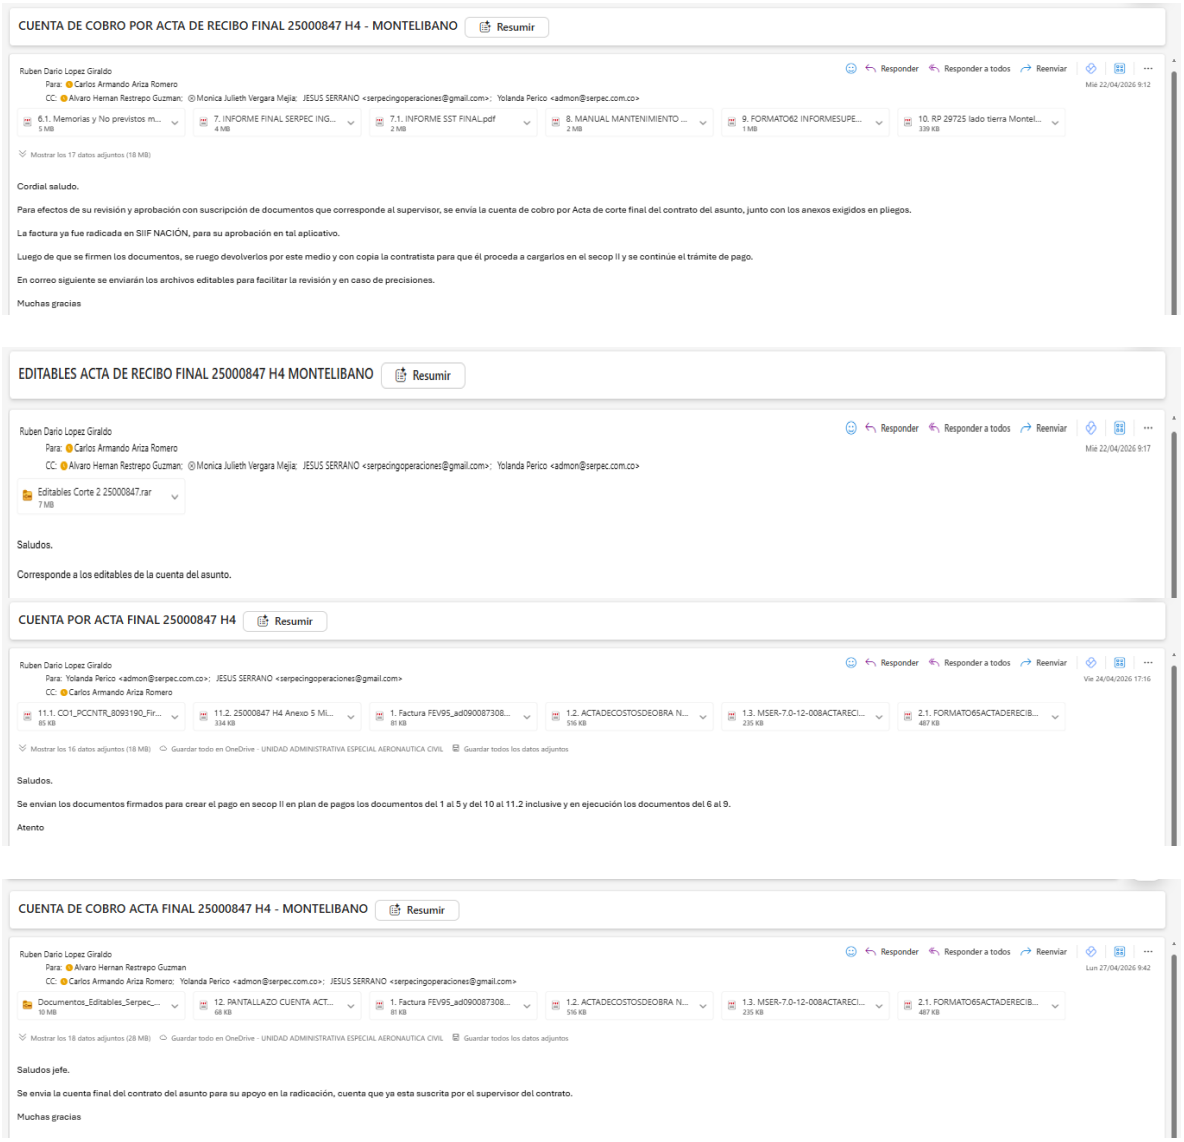


7. Inducción a la profesional social, respecto a la metodología de evaluación técnica de procesos precontractuales, para ser aplicados en los proyectos del sector social de la entidad.




8. Elaboración de informes por comisión y desplazamiento durante el pasado mes de febrero a los aeropuertos El Pindo, Berástegui y Los Garzones en el departamento de Montería.




9. Se realiza la evaluación técnica definitiva del proceso precontractual 26001072 H4 con objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO”.



10. Se elabora la evaluación técnica definitiva del proceso 26001082 H4, relacionado con el mantenimiento de la red contra incendio en el aeropuer6to JMC de Rionegro".



11. Elaboración de estudios previos, presupuestos oficial, matriz de riesgos, matriz 1 de experiencia y formato 3 de experiencia, para su revisión, aprobación y solicitud de CDP y numero de proceso contractual; además de, precisiones a que haya lugar y elaboración del componente jurídico con base en pliegos tipo para menor cuantía, mientras se elaboran de nuestra parte, el resto de documentos técnicos que aplican del proyecto “REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE NUQUI"



12. Elaboración del orden de elegibilidad del proceso precontractual 26001072 H4 con objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO” y, a disposición de la jurídica para lo de rigor.



13. Elaboración del informe mensual de abril de 2026, del contrato CPS 2600258 H3, en el marco de las obligaciones establecidas, para efectos de respaldo a la cuenta de cobro correspondiente

Atentamente,

RUBEN DARIO LOPEZ GIRALDO
Contratista Prestación de servicios especializados
C.C. 70.826.387
