Comité Tecnico De Obra N°3

Dia 30 Mes 01 AÑO 2025

Asistentes: Ing Angela Zambrano Supervisora

Ing Juan Camilo Polania Representante Legal

Ing James Andrade Coordinador Interventoria

Ing Luis Carlos Fonseca Director Interventoria

Ing Leiner Guerrero Representante Legal

Ing Jose Mauricio Duran Apoyo supervisión

Comité programado como Compromiso del comité N°2 y levado a cabo en la oficina de Vias e Infraestructura.

Dia 31 MES 01 AÑO 2025

Clima: Soleado

Personal: Topografo
1) Cadenero primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de los mojones de referencia del proyecto, GPS-1 y GPS-2 los cuales sirven como vértices de amarre para el control horizontal y vertical del proyecto ubicado en la vereda Alto Bejucal del municipio de Compoalegre.

Equipos: GNSS, estación Total y Sofware para cálculos.

Dia 01 MES 02 AÑO 2025

Clima: Soleado

Personal: Topografo
1) Cadenero primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método Estatico diferencial de los mojones de referencia del proyecto, GPS-1 y GPS-2 los cuales sirven como Vertices de amarre para el control horizontal y Vertical del proyecto ubicado en la Vereda Llanitos del Municipio de Rivera.

Equipos: GNSS, Estación Total y Sofware para calculos.

Dia 03 Mes 02 Año 2025

Clima: soleado

Personal: Topografo
1) Cadenero Primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de los dos mojones de referencia del proyecto, GPS-1 GPS-2, los cuales sirven como Vértices de amarre para el control horizontal y Vertical del proyecto Ubicado en la Vereda Buena Vista y Vereda el Guayabo en el Municipio de Campoalegre.

Equipos GNSS, Una Estación Total y sofware para cálculos

Dia 04 Mes 02 Año 2025

Clima soleado

Personal: Topografia
1) Cadenero Primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método, estático diferencial de los dos mojones de referencia del proyecto, GPS-1 GPS-2 los cuales sirven como Vertices de amarre para el control horizontal y Vertical del proyecto Ubicado en la Vereda El Porvenir en el municipio de Palermo y la vereda los Palmos en el Municipio de Santa Maria.

Equipos: GNSS, Estación Total y sofware para cálculos

Dia 05 Mes 02 Año 2025

Clima. soleado

Personal: Topografo
1) Cadenero Primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de los dos mojones de referencia del proyecto, GPS-1 y GPS-2, los cuales sirven como vertices de amarre para el control horizontal y vertical del proyecto ubicado en la Vereda Termopilas del municipio de Rivera, Vereda Las Bisas, Libano, Kiosko, Perdiz, Guabalejo y Argelia en el municipio de Algeciras.

Equipos: GNSS, Estación Total y sofware para calculos.

Dia 06 Mes 02 Año 2025

Clima soleado

Personal: Topografo
1) Cadenero Primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de los dos Mojones de referencia del proyecto, GPS-1 y GPS-2, los cuales sirven como Vertices de amarre para el control horizontal y Vertical del proyecto ubicado en la vereda Upar T_1 y T_2 en el municipio de Yaguará, la vereda La Unión en el municipio de Argentina, la vereda Alto del retiro en el municipio de la plata

Dia 07 Mes 02 AÑO 2025

Clima: Soleado

Personal: Topografo
1) Cadenero Primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de los dos mojones del referencio del proyecto, GPS-1 y GPS-2 los cuales sirven como Vertices de amarre para el control Vertical y horizontal del proyecto ubicado en la Vereda San Francisco y Lomo de la cruz en el Municipio de Iquira y la Vereda La Mina en el Municipio de Tesel.

EQUIPOS: GNSS, Estación Total y Sofware para cálculos.

Dia 08 Mes 02 AÑO 2025

Clima: Soleado

Personal Topografo
1) Cadenero Primero
1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de los mojones de referencia del proyecto, GPS-1 y GPS-2 los cuales sirven como Vertices de amarre para el control Vertical y horizontal del proyecto ubicado en la Vereda Santa Ana, San Marcos, Bernaza, San Pedro, San Ambrosio en el municipio de Colombia y Vereda Soto en el Municipio de Boraya.

Equipos: GNSS, Estación Total y Sofware para calculos.

Dia 09 Mes 02 AÑO 2025

Clima: Soleado

Personal: Topografo

1) Cadenero Primero

1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de las coordenadas de referencia del proyecto GPS-1 y GPS-2 los cuales sirven como Vertices de amarre para el control Vertical y horizontal del proyecto ubicado en la Vereda (Santa Ana) San Francisco Nazareth, El Hacreo en el municipio de Iquira.

Equipos: GNSS, Estación Total y Sofware para cálculos.

Dia 11 Mes 02 Año 2025

Clima: Soleado

Personal: Topografo


1) Cadenero Primero

1) Cadenero Segundo

Actividad: Posicionamiento por el método estático diferencial de las coordenadas de referencia del proyecto GPS-1 y GPS-2, los cuales sirven como Vertices

de anclaje para el control vertical y horizontal del Proyecto Ubicado en la Vereda Santa Ana Tz en el municipio de Colombia

Equipos: GNSS, Estación Total y software para calculos



Dia 12 Mes 02 Año 2025

Clima: soleado


Personal: Topografo

1) Cadenero primero

1) Cadenero segundo

Actividad: Posicionamiento por el metodo estatico diferencial de los mojones de referencia del proyecto GPS-1 y GPS-2 los cuales sirven como vertices de anclaje para el Control Vertical y horizontal del proyecto ubicado La Mesa y el triunfo en el municipio de Natagá

Equipos: GNSS, Estación Total y Software para calculos



Dia 13 Mes 02 Año 2025

Clima: Soleado

Personal. Topografo — Topografo Interventor

Residente de Obra — Inspector Interventor

Inspector de obra

Encargado de obra

Cadenero Topografico

Actividad: Replanteo del tramo de Placa Huella en la Vereda Alto del Retiro en el Municipio de la Plata se instalan estacas de referencia en el eje longitudinal y los margenes de la via con las estructuras existentes

Equipos: Estación Total, Nivel de precisión.





Dia 14 Mes 02 Año 2025

Clima: Soleado

Personal: Topografo — Topografo Interventor

Residente de Obra — Inspector Interventor

Inspector de obra

Encargado de obra


Cadenero Topografico

Actividad: Replanteo del tramo de Placa Huella en la Vereda los Llanitos en el Municipio de Rivera se instalan


Estacas de referencia en el eje longitudinal y sobre los margenes de la via, localización de las estructuras existentes en el tramo a intervenir.
Equipos: Estación Total, Nivel de precisión.




Dia 15 Mes 02 Año 2025
Clima soleado
Personal: Topografo — Topografo Interventor
Residente de obra — Residente Interventor
Inspector de obra — Inspector interventor
Encargado de obra
Cadenero Topografia
Actividad: Replanteo del tramo de placa Huella en la Vereda Termopilas en el Municipio de Rivera, se trazan estacas de referencia sobre el eje longitudinal y en los margenes de la via, localizando las estructuras existentes en el tramo a intervenir.
Equipos: Estación Total, Nivel de precisión



Dia 17 Mes 02 Año 2025
Clima: Soleado Frente: Los Llanitos (Rivera)
Personal: Residente de obra — Residente Interventor
Inspector de obra — Inspector Interventor
Encargado de obra
1) Oficial de construcción
1) Operador de Maquinaria Pesada
2) Ayudantes
Actividad: Excavación Mecánica (explanación) desde la K85 K+000 - K+010



Dia 18 Mes 02 Año 2025
Clima: Soleado Frente: Los Llanitos (Rivera)
Personal
Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
1) Oficial de obra
1) Operadores Maquinaria Pesada
2) Ayudantes
Actividad: Excavación Mecánica (explanación) desde la K85 K+010 - K+020 y Conformación de la sub rasante.



19/02/2025

Clima: Soleado Frente: Los Llanitos (Rivera)

Personal:

Inspector de Obra

Encargado de Obra

1) Oficial de Construcción

2) Operadores Maquinaria Pesada

2) Ayudantes

Actividad: Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación de Subbase Granular ABS Km0+000 - Km0+080

20/02/2025

Clima: Nublado (Lluvias Intermitentes) Frente: Los Llanitos

Personal: Residente Obra — Residente Interventor

Inspector obra — Inspector Interventor

Topografo obra — Topografo Interventor

Encargado obra

1) Oficial obra

2) Operadores Maquinaria Pesado

2) Ayudantes

Actividad: Nivelación y compactación Subbase ABS Km0+80 - Km0+100

21/02/2025

Clima: Nublado (Lluvias Intermitentes) Frente: Termopilas (Rivera)

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Topografo obra — Topografo Interventor

Encargado obra

2) Cadeneros Topografia

Actividad: Excavación Mecánica (Explanación) desde la ABS Km0+000 - Km0+100

Frente: Los Llanitos (Rivera)

Personal

Inspector Obra — Inspector Interventor

Encargado obra

1) Oficial

1) Ayudantes obra

Actividad: Excavación Manual Para Vigas Riostras y Bordillos ABS Km0+000 - Km0+030 & Instalación de aceros vigas.

22/01/2025 Clima: Nublado Lluvias Intermitentes | Alto Retiro

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventoría
Encargado obra
2) Oficiales obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Excavación mecánica (explanación) desde las ABS Kot200 - Kot300 y compactación de las subrasantes.
Extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de subbase Granular ABS - Kot000 - Kot100

Clima: Nublado frente: Los Llanitos (Rivera)

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
8) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero de refuerzo para placas, Riostras, ABS Kot000 - Kot040


frente: Terrapilas (Rivera)

Personal: Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
2) Operadores Maquinaria Pesada

Actividad: Extendido, Nivelación, Humedecimiento y compactación de subbase Granular ABS Kot080 - Kot000

Excavación Mecánica (Explanación) ABS Kot200 - Kot180






24/01/2025 Clima: Lluvias fuertes frente: Alto Retiro

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
2) Operadores Maquinaria Pesada
1) Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Excavación mecánica (explanación) ABS Kot1000 - Kot180 y compactación de la Subrasante






Clima: Soleado frente: Los Llanitos (Rivera)

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
7) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: placas, muertos ABS Kot000 - Kot015





Clima: soleado Frente: Termopilas (Rivera)


Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

2) Operadores Maquinaria Pesada

Actividad: Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación de Subbase Granular. Abs Km180 - Km180



26/07/2025 Clima: Soleado Frente: Los Ubaitos (Rivera)

Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra


Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para Placas Huellas

Abs Km016 - Km030

Instalación de acero de refuerzo para Placas Huellas Abs Km040 - Km050



Frente: Termopilas Rivera

Actividad: Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación de Subbase Granular Abs Km080 - Km180

Observación: Se realiza reunión entre la interventoria del contrato 1590 de 2024, el contratista del contrato 849 de 2024, la interventoria y contratista del contrato de construcción de la Bocatoma en la vereda Termopilas y Empresas Publicas de Rivera para socializar con respecto al paso por la via a intervenir con la construcción de la placa-Huella debido a que es la unica via de acceso hacia la vereda termopilas y que retrasaria la construcción de la bocatoma.



Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Lluvias Intermitentes

Personal:


Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

6 Ayudantes obra

Actividad: Excavación manual para Vigas Hastiales, bordillos Abs Km180 - Km250 e instalación de aceros vigas.



Frente: La Unión (Argentina) Clima: Lluvias Intermitentes

Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra
Oficial obra
2) Operadores Maquinaria Pesada
Actividad: Excavación Mecánica (Exploración) ABS Katodo - Katodo




Frente: Termopilas (Riviera)
Observación: Se realiza reunión entre la interventoría del Contrato 1590 de 2024, El contratista del contrato 819 de 2024, la supervisión por parte de la gobernación y la interventoría y contratista del proyecto de Boca toma para concluir que se suspenden actividades en el tramo de placa huella de Termopilas para darle prioridad a la construcción de la Boca Toma.



26/12/2025 Frente: Las Llanadas Clima: Soleado Personal


Inspector de Obra — Interventoría
Encargado obra
Oficial obra
2) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos. ABS Katodo - katodo
Excavación manual para losa de transición ABS katodo



Frente: La unión (Argentina) Clima: Nublado (Lluvias)
Personal

Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
3) Ayudantes obra
2) Operadores Maquinaria Pesada
Actividad: Excavación Mecánica (Exploración) ABS Katodo Katodo



Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado (Lluvias)
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: Placas, hiostos ABS Kot100 - Kot075

27/02/2025 Frente: Los Hornitos Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
4) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero de refuerzo para losado Transición ABS Kot000 y para Cunetas-Bordillos ABS Kot030 - Kot015

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado (Lluvias)
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
3) Ayudantes obra
2) Operadores Maquinaria Pesada

Actividad: Excavación Mecánica (Explanación) ABS Kot 200 - Kot 300

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado (Lluvias)
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: placas, hiostros. ABS Kot075 - Kot065

28/02/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de Concreto para: Cunetas - bordillos, ABS K0+000 - K0+015



Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado

Personal: Inspector Interventor


Encargado obra

Oficial obra

3) Ayudantes obra

2) Operadores Maquinaria pesada

Actividad: Extendida, Nivelación, Humedecimiento y Compactación desabbase granular ABS K0+000 - K0+150



Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado

Personal: Residente obra — Residente Interventor

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de aceros para: cunetas - bordillos ABS K0+000 - K0+030



01/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Soleado

Personal: Residente obra — Residente Interventor

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de Concreto para: Losa de transición, ABS K0+000 y para Cunetas - Bordillos ABS K0+015 - K0+015.



Frente: La Unión (Argentina) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

3) Ayudantes obra

Actividad: Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación de subbase granular. ABS Kot160 - Kot250





Frente: Alto Hetiro (La Plata) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor


Encargado obra

Oficial obra

2) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: cunetas-bordillos. ABS Kot000 - Kot020





03/03/2023 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor


Encargado obra

Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de Concreto para: Placas, Aletas ABS Kot030 - Kot043





Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado

Personal:


Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación de subbase granular. ABS Kot250 - Kot300





Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado

Personal:


Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: bordillos-cunetas. ABS K0+000 - K0+015





04/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Nublado


Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra


Oficial obra


7) Ayudantes obra



Actividad: Instalación de acero de refuerzo (Para losa de tran) Para: Placas y Vigas Riostras K0+045-K0+061.

Excavación Manual en material seco Para Vigas Riostras y cunetas-Bordillos ABS K0+015-K0+061.





Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado (Lluvias)

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

6) Ayudantes obra

Actividad: Excavación manual en material seco para vigas Riostras y cunetas-Bordillos ABS K0+000-K0+015





Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado (Lluvia)

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

2) Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Suministro e instalación de concreto ciclópeo ABS K0+000 - K0+015

Instalación de acero para Placas, Riostras. ABS K0+065 K0+030





05/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: soleado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Suministro e Instalación de concreto ciclópeo. ABS K0+000 - K0+018
Instalación de acero de refuerzo para cunetas-bordillos ABS K0+045 - K0+051.

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado (Lluvias)
Personal

Inspector Interventor
Oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Se suspenden actividades por lluvias.

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado (Lluvias)
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
2) Oficial obra
7) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para: Placas, vigas riostras. ABS K0+030 - K0+045
Instalación de concreto para. Bordillos-cunetas. ABS K0+015 - K0+021.

06/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
4) Ayudantes obra

Actividad: Suministro e instalación de concreto ciclópeo. ABS K0+018 - K0+030.

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Lluvia

Personal.

Inspector Interventor

Oficial obra

3) Ayudantes

Actividades: se suspenden por lluvias

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

2) oficiales obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Suministro e Instalación de concreto ciclópeo. ABS K0+013 - K0+021

Instalación de acero para cunetas - bordillos. ABS K0+030 - K0+045

07/05/2025 frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Nublado

Personal:

Inspector Obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

4) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: Placas y vigas riostras. ABS K0+045 - K0+055

Instalación de acero de refuerzo para: cunetas - bordillos. ABS K0+054 - K0+066

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para: Placas, vigas riostras cunetas - bordillos. ABS K0+000 - K0+015

Frente: Alto Natiro (La Plata) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra Inspector Interventoria


Encargado obra

Oficial obra

7) Ayudantes obra

Actividad: Suministro e Instalación de concreto ciclo-
Pco ABS. K0+021 - K0+030

Excavación manual en material seco Para: Vigas Riostras
y cunetas - Bordillos. ABS K0+045 - K0+051.




Frente: El Triunfo (Natagá) Clima: Soleado

Personal: Residente Obra Residente Interventor

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

Actividad: Localización y Replanteo y Socialización
a la comunidad sobre el tramo a intervenir



06/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

4) Ayudantes obra

Actividades: Instalación de acero de refuerzo para
Cunetas - Bordillos. ABS K0+024 - K0+066

Excavación manual en material seco para vigas riostras
y Cunetas - Bordillos. ABS K0+064 - K0+073



Frente: La Unión (Argentina) Clima: Soleado

Personal:


Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

3) Ayudantes obra

Actividades: Excavación manual en material seco para
Cunetas - bordillos ABS K0+015 - K0+024



Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: placas, vigas

Muestras. ABS K0+021 – K0+030



2/05/2025 Frente: Los Linitos (Rivera) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

4) Ayudantes obra

Actividad: Suministro e instalación de concreto Ciclópeo

ABS K0+018 – K0+030



Frente: La Unión (Argentina) Clima: Lluvia

Personal:


Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

3) Ayudantes obra

Actividad: Por motivo de lluvia se suspenden actividad



Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor


Encargado obra

Oficial obra

6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: Cunetas-

Bordillos. ABS K0+021 – K0+030



Frente: Los Llanitos (Chivera) 11/03/2025 Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

1) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: placas y vigas Riostros, ABS K0+055 - K0+065

Instalación de acero de refuerzo para placas y vigas Riostras: ABS K0+061 - K0+070

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Lluvias

Obra suspendida

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Lluvia

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

6) Ayudantes obra

Actividad: Excavación manual en material seco para: Vigas Riostras y cunetas - Bordillos ABS K0+051 - K0+060

12/03/2025 Frente: Los Llanitos (Chivera) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra


1) Ayudantes obra


Actividad: Suministro e Instalación de concreto ciclopeo ABS K0+030 - K0+042

Frente: La unión (Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para cunetas-bordillos ABS Km000 - Km015





Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra


Actividad: Instalación de concreto para placas, vigas riostras. ABS Km020 y Km042



13/03/2025 Frente: Los Llanitos (Riesgo) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
7) Ayudantes Obra

Actividad: Excavación manual en material en seco
Para: vigas Riostras, cunetas-bordillas. ABS Km015 - Km062
Instalación de concreto para: cunetas-bordillos Km015 - Km030





Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado
Personal:


Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para: placas y vigas riostras ABS Km015 - Km021

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para: Placas y vigas Riostras. ABS K0+045 - K0+057



15/03/2025 Frente: Los Llanitos (Invierno) Clima: Nublado
Personal:

Inspector de obra — Inspector Interventoría
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra


Actividad: Instalación de concreto para: Placas, vigas Riostras, y Cunetas-Bordillos K0+030 - K0+045



Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
3) Ayudantes obra


Actividad: Excavación manual en material en seco Para vigas Riostras y Cunetas-Bordillos K0+033 - K0+037.



Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado
Personal:

Inspector Obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de Acero para: Cunetas-Bordillos ABS K0+045 - K0+057



16/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Nublado
Personal:

Inspector Obra — Inspector Interventor
Oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: Placas y Vigas Riostras ABS Kot082 - Kot093

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para: cunetas-bordillo ABS Kot015 - Kot030

Frente: La Plata (Alto Beltrán) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para: cunetas-bordillo ABS Kot043 - Kot057

17/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Oficial obra
3) Ayudantes obra

Instalación de concreto para: Placas y Vigas Riostras ABS Kot093 - Kot106

Excavación manual en material en seco para: losa de transición ABS Kot100

17/03/2025 Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Excavación Manual en material en seco para: Cunetas-bordillos y Vigas Riostras ABS Kot030 - Kot043.

Frente: La Plata (Alto Retiro) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra Inspector Interventor
Encargado obra
oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Suministro e instalación de concreto ciclópeo ABS K0+030 - K0+042

18/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Soleado
Personal:

Inspector obra Inspector Interventor
oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero y concreto para: Losa de transición, ABS K0+100
Instalación de concreto para Cunetas-bordillos, ABS K0+015 - K0+060

Frente: La unión (Argentina) Clima: Lluvia
Personal:

Inspector Obra Inspector Interventor
Encargado obra
oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Excavación manual en material en seco para: filtro, ABS K0+040 - K0+047

Frente: La Plata (Alto Retiro) Clima: Lluvia
Personal:

Inspector obra Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: cunetas-bordillos ABS K0+036 - K0+045

19/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Soleado
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: Cunetas-Bordillos. ABS K0+060 - K0+080

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Lluvia
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Excavación manual en material en seco para filtro: ABS K0+047 - K0+060

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Lluvias
Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de concreto para: cunetas-Bordillos. ABS K0+045 - K0+050

Frente: Porvenir (Palermo)
Socialización en la vereda Porvenir del municipio de Palermo donde participaron: La interventoria, el contratista, El alcalde y la comunidad en general donde se trataron temas relacionados con la obra a construir, la conformación de la Veeduria y la interferencia en tiempos de ejecución con otro tramo de Placa-Huella que se esta construyendo.

21/03/2025 Frente: Los Llanitos (Rivera) Clima: Nublado
Personal:

Inspector Obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
3) Ayudantes obra

Actividad: Instalación de acero para cunetas-bordillos. ABS Km0+090 - Km0+098
Suministro e instalación de concreto ciclopeo. ABS Km0+042 - Km0+060.



Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado
personal

Inspector Obra — Inspector Interventoria
Encargado obra
Oficial obra
6) Ayudantes

Instalación de Concreto para: Placas y Vigas hiostrás. ABS. Km0+000 - Km0+015



Frente. Alto Motiro (La Plata) Clima: Nublado
Personal:

Inspector Interventor
Encargado obra
Ofical Obra
3) Ayudantes


Instalación de acero Para: Cunetas - Bordillos. ABS Km0+57 Km0+070



Frente: Los Llanitos 21/03/2025 Clima: Soleado
Personal:

Inspector Obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
3) Ayudantes

Suministro e instalación de Concreto Ciclopeo. ABS Km0+060 - Km0+080



Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: soleado

Personal:

Encargado obra — Inspector Obra e Interventoria

Oficial obra

3) Ayudantes

Instalación de concreto para: Cunetas - Bordillos, ABS. Kot057 - Kot069





Frente: La Unión (Argentina) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

oficial obra

6) Ayudantes

Instalación de concreto para: Cunetas - Bordillos ABS Kot000 - Kot018





25/03/2025 Los Llanitos (Rivera) Clima: soleado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

3) Ayudantes

Suministro e instalación de concreto ciclopeo, ABS Kot080 - Kot090

Instalación de concreto para: Cunetas - Bordillos ABS. Kot080 - Kot090





Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: soleado

Personal


Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

2) Ayudantes

Instalación de concreto para: cunetas - bordillos, ABS Kot015 - Kot060





Frente: La Unión (Argentina) Clima: soleado

Personal:

Encargado obra — Inspector Interventor

Oficial obra

4) Ayudantes

Instalación de Concreto Para: cunetas - bordillos. ABS

Kot018 - Kot027

26/03/2025 Los Hornos (Rivera) Clima: soleado

Personal:

Inspector obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

3) Ayudantes obra

Instalación de Concreto Para: Cunetas- Bordillos ABS

Kot090 - Kot100

Suministro e instalación de concreto ciclópeo. ABS Kot090 - Kot100

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: soleado

Personal:

Inspector Obra — Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

2) Ayudantes

Excavación manual en material en seco para: cunetas

Bordillo. ABS Kot070 - Kot080

Frente: La Unión (Argentina) Clima: soleado

Personal:

Encargado obra — Inspector Interventor

Oficial obra

1) Ayudantes

Instalación de Concreto Para: Placas y vigas Riostra

ABS Kot025 - Kot037

27/03/2025 Los Llanitos (Rivera) Clima: Soleado

Personal:

Inspector Obra Inspector Interventor

Es necesario construir una cuneta adicional en la margen izquierda de longitud 35,00m para desviar las aguas de escorrentía de la vía y de un distrito de riego. Para evitar la erosión del terreno adyacente a la placa-huella

Frente: Alto Retiro (La Plata) Clima: Nublado

Personal:

Inspector Obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

Al Ayudantes

Instalación de acero Para: Placas y Vigas Riostra Kot 057 - Kot067

Suministro e instalación de Concreto Ciclópeo ABS Kot042 - Kot048

Frente: La Unión (Argentina) Clima: Soleado

Personal

Inspector Obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

Al Ayudantes

Excavación Manual en material en seco Para: Cunetas-Bordillos y Vigas Riostras. ABS Kot015 - Kot054

Frente: La Mina 1 (Teruel) Clima: Soleado

Personal: Residente obra Residente Interventor

Inspector Obra


Encargado Obra


Oficial obra

- Operador Maquinaria Pesada


Excavación mecánica (Explanación) desde la ABS Kot000 - Kot100


Frente: La Mina 2 (Teruel). Clima: soleado
Excavación mecánica (explanación) desde la ABS Kot 00 - Kot 100





frente: La Mina 3 (Teruel) Clima: Soleado
Excavación mecánica (explanación) desde la ABS Kot 00 - Kot 100







28/03/2025 frente: La Mina 1 (Teruel) Clima: Soleado
Personal:


Inspector obra — Inspector Interventor
Encargado obra
Oficial obra
Operador Maquinaria Pesada


Vibro compactación de la subrasante. ABS Kot 000 - Kot 100



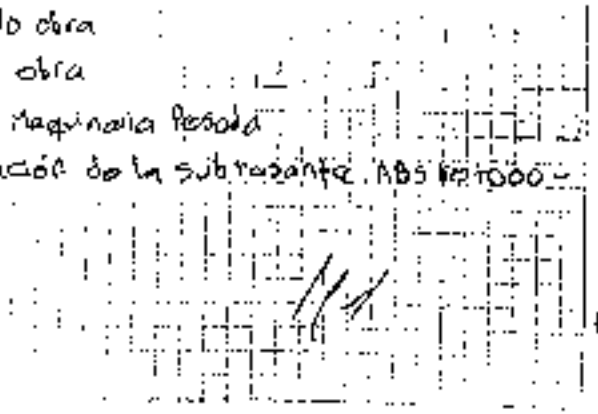



Frente: La Mina 2 (Teruel) Clima: soleado
Vibro compactación de la subrasante. ABS Kot 000 - Kot 100






Frente: La Mina 3 (Teruel) Clima: Soleado
Vibro compactación de la subrasante. ABS Kot 000 - Kot 100





Frente: Alto Horno (La Plata) Clima: Nublado
Personal: Inspector Interventor
Encargado obra
1 Oficial obra
1 Ayudantes obra
Instalación de acero para: cunetas - bordillos. ABS Kot 070 - Kot 085
Instalación de concreto para: placas, vigas muestras. ABS Kot 042 - Kot 064





Frente: La Unión (Argentina) Clima: Sabado

Personal:

Inspector obra — Inspector Inventariado

Encargado obra

Oficial obra

4] Ayudantes

Suministro e instalación de cerrojo cilíndrico. ABS Kot001 - Kot015





28/03/2025 Frente: Alto hatiro (La Plata) Clima: Soleado

Personal:


Inspector obra — Inspector Inventariado


Encargado obra

Oficial obra

4 Ayudantes obra

Suministro e instalación de cerrojo cilíndrico ABS Kot046 - Kot054





Frente: La Unión (Argentina) Clima: Soleado

Personal:


Inspector Inventariado

Encargado Obra

Oficial obra

3] Ayudantes

Suministro e instalación de cerrojo cilíndrico. ABS Kot015 - Kot024



31/03/2025 Frente: Alto hatiro (La Plata) Clima: Soleado

Personal

Inspector obra — Inspector Inventariado


Encargado obra

Oficial obra

4] Ayudantes

Excavación manual en material en seco para: cunetas y bordillos ABS Kot080 - Kot090

Instalación de acero para: cunetas - bocallS. ABS Kot080 Kot090





Frente: La Unión (Argentina) Clima: soleado

Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

Oficial obra

4) Ayudantes

Suministro e instalación de concreto ciclópeo. AB5

Koto15 - Koto30

ANEXO No. 5

- **COMITÉ DE OBRA No.6**
- **COMITÉ DE OBRA No.7**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 6	Página 1 de 10
	CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024** INTERVENTORIA: **CONSORCIO INTERVENTORES 2030** **CONTRATO 1590 DE 2024** OBJETO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	**FECHA:** **Dia: 07** **Mes:03** **Año: 2025**

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES	SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE	RL. CONSORCIO INTERVENTORES 2030 - INTERVENTORIA	
JAMES ANDRADE ZAMBRANO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	
FRANCISCO JAVIER ESTUPIÑAN	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE MAURICIO DURAN	INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION
CRISTIAN DELGADO	INGENIERO APOYO CONTRATISTA

OBJETO DE LA REUNION:

Seguimiento al contrato de obra 879 de 2024 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes
   Lectura y aprobación de actas de comité No.4
2. Avance de trabajos corroboración diseños.
3. Presentación de la programación por parte del Contratista de obra según condiciones actualizadas y plan de contingencia.
4. Estado avance tramite convenio Invias - Gobernación
5. Presentación del balance de obra
6. Proposiciones y varios.

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes

Toma la palabra el Ing. JAMES ANDRADRE, Coordinador de la interventoria indicando que teniendo en cuenta el compromiso del comité No.5 del 21 de febrero de 2025, el dia de hoy 07 de marzo de 2025 a las 9:00 am en las oficinas de la Secretaria de Vias e Infraestructura hacen presencia la supervisora de interventoría la Ing. ANGELA ZAMBRANO, el Ing. JOSE MAURICIO DURAN, profesional de apoyo a la supervisión, en representación del contratista de obra el Ing. FRANCISCO ESTUPIÑAN, Director de obra; el cual cuenta con el poder para la toma de las decisiones en los comités técnicas de obra que se desarrollen en el cumplimiento del objeto contractual del contrato de obra No. 879 de 2024; por su parte la interventoría externa, hace presencia el Ing. JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE, representante legal de la Interventoria, el Ing. JAMES ANDRADE ZAMBRANO, Coordinador General de Interventoria; y el Ing LUIS CARLOS FONSECA Director de interventoria. Es decir, se concluye que se encuentran todos los profesionales para adelantar el presente comité técnico de obra.

2. Avance del contrato 879 de 2024

Toma la palabra el ingeniero James Andrade Zambrano, quien agradece la asistencia al comité de obra; y una vez verificado el cuórum se da inicio al comité técnico de obra No.6 para la revisión del estado del contrato de obra 879 de 2024 y de los compromisos adquirido en el comité técnico de obra No.5 del 21 de febrero de 2025.

El Ing. Luis Fonseca menciona que el proyecto del acta 4 fueron enviadas a los correos de la supervisión y del contratista de obra para revisión, al no recibir ninguna observación por parte de las partes se trae impresa para su firma de aprobación, se procede a la firma por parte de los involucrados, y se deja constancia en la presente acta de su aprobación, esta acta serán compartidas en el informe mensual presentado por la Interventoria.

El ing. Luis Fonseca recuerda el compromiso al Contratista acerca de la verificación de los diseños de los muros, se hace énfasis que a través de nuestro comunicado CI 2030-24 del 13 de febrero de 2024 y en el comité de obra No.5 se hizo el recuento de los requerimientos para la verificación y de los tramos donde

están estipulados:

MUNICIPIO	TRAMO	CANTIDAD	LONGITUD MURO (m)
YAGUARA	UPAR 150	1	H=3,5 L=6,0
SANTA MARIA	LAS PALMAS	1	H=4,5 L=9,0
ALGECIRAS	LAS BRISAS	1	H=2,5 L=9,0
CAMPOALEGRE	ALTO BEJUCAL	1	H=4,5 L=4,0
PALERMO	PORVENIR	2	H=4,5 L=8,0 H=4,0 L=9,0 H=3,5 L=8,0

Toma la palabra el Ing. James Andrade solicitando al Contratista de un recuento del avance de lo solicitado por esta Interventoria y el compromiso que el mismo adquirió sobre los estudios de suelo en los puntos mencionados y el concepto del especialista.

El Ing. Francisco Estupiñan menciona que ya se está adelantando el proceso técnico con los estudios de suelos en la vereda de alto bejucal del municipio de Campoalegre en los puntos del muro contemplado en los estudios y diseños y en el otro punto donde se presenta perdida de banca de la vía por la erosión generada por la escorrentia.

El Ing José Mauricio menciona que este tema se viene trabajando desde el comité anterior y solicita que el día de hoy se dejen fechas estipuladas para la entrega de estos productos debido a la importancia de estos como soporte dentro del balance del contrato de obra.

El Ing James menciona que ya se ha avanzado en dejar contempladas estas cantidades dentro del balance de obra según las especificaciones de la cartilla de obras menores del INVIAS lo que estamos esperando es en confirmar estos diseños, y se encuentra totalmente de acuerdo con el Ing. José Mauricio en que se deben dejar el día de hoy fechas reales para la entrega de lo solicitado.

El Ing. Francisco indica que conforme a los avances que se llevan a la fecha se prevé que el 24 de marzo se tengan los resultados de laboratorio y para el 31 marzo el concepto técnico del especialista para remitir esta información a la Interventoria. El Ing José Mauricio que con esta situación se programe comité el 1 de abril de 2025 para la revisión de la documentación.

Pasando al siguiente punto sobre el avance de la ejecución de las obras el Ing. Luis Fonseca manifiesta su preocupación por el desempeño que ha tenido el contratista y el poco avance en general de la obra, a continuación, se presenta el avance por cada uno de los municipios y su evaluación con respecto al flujo de

caja aprobado actualmente:

MUNICIPIO	PRESUPUESTO	EJECUTADO
COLOMBIA	$ 1.050.948.373	
YAGUARA	$ 544.464.531	
LA ARGENTINA	$ 409.306.972	$ 88.971.962
TERUEL	$ 565.850.822	
LA PLATA	$ 129.214.315	$ 88.971.962
SANTA MARIA	$ 273.743.180	
RIVERA	$ 335.317.076	$ 72.186.737
BARAYA	$ 154.027.219	
ALGECIRAS	$ 1.333.491.107	
CAMPO ALEGRE	$ 625.415.010	
IQUIRA	$ 356.592.056	
NATAGA	$ 410.356.716	
PALERMO	$ 829.210.275	
	$ 7.017.937.652	$ 194.154.793
AVANCE		**2.767%**

FECHA DE INICIO	13/01/2025	AVANCE
CORTE	02/03/2025	
DIAS	48	
AVANCE EN TIEMPO	16%	
PROGRAMACION MES 1	$ 739.949.915	10,36%
PROGRAMACION MES 2	$ 860.438.387	
PROGRAMACIO 02/03	$ 1.428.300.625	19,99%
VALOR CONTRATO	$ 7.143.319.446	

Se ha avanzado en la construcción de estructura de placa huella en los frentes de la Plata se lleva una ejecución de 70 metros, en Rivera de 40 metros, estos dos cada uno de un total de 100m, el municipio de La Argentina se tiene conformada la vía e instalada la capa de subbase.

El Ing Luis Fonseca aclara que esta evaluación del avance se hace con respecto al flujo de caja inicial entregado debido al incumplimiento del contratista en la entrega a tiempo de la programación de obra conforme a las condiciones actuales del proyecto.

Toma la palabra el Ing. Cristian Delgado mencionando que el día de hoy tienen los documentos de la

programación y si se lo permiten va a exponer las fechas de inicio de cada tramo pero que se han presentado algunas condiciones especiales lo cual se debe realizar un nuevo ajuste, como por ejemplo lo sucedido en el tramo las Juntas de Rivera, en Nataga en la vereda de la Mesa no se ha podido acceder por temas de seguridad y las condiciones especiales en Algeciras:

LA ARGENTINA	VEREDA LA UNIÓN	300	13/02/2025
LA PLATA	VEREDA ALTO DEL RETIRO	100	13/02/2025
RIVERA	VEREDA LLANITOS	100	13/02/2025
COLOMBIA	VEREDA SAN MARCOS	300	13/03/2025
TERUEL	LA MINA TRAMO 1 ESCUELA	100	13/03/2025
PALERMO	PORVENIR	500	13/03/2025
YAGUARA	VEREDA UPAR	150	13/03/2025
TERUEL	LA MINA TRAMO 2	100	13/03/2025
YAGUARA	VEREDA UPAR	200	07/04/2025
NATAGA	EL TRIUNFO	200	01/04/2025
COLOMBIA	VEREDA SAN MARCOS TRAMO 1	30	14/04/2025
TERUEL	LA MINA TRAMO 3 VIA A LA ARMENIA	100	14/04/2025
COLOMBIA	VEREDA SANTA ANA	110	02/05/2025
CAMPOALEGRE	VEREDA BUENA VISTA A LAS TORRES DE TELECOM - 2 TRAMOS	100	05/05/2025
NATAGA	VEREDA LA MESA 2 TRAMOS	100	01/04/2025
SANTA MARIA	VEREDA LAS PALMAS - FINCA DE MIGUEL	100	05/05/2025
BARAYA	VEREDA SOTO	100	05/05/2025
CAMPOALEGRE	VEREDA EL GUAYABO - I.E. LA ESPERANZA SEDE AGRO MUJERES	100	05/05/2025
COLOMBIA	VEREDA LA BERNAZA	100	03/06/2025
COLOMBIA	CRUCE SAN ABROSIO - VERSALLES	100	03/06/2025
CAMPOALEGRE	VEREDA ALTO BEJUCAL - I.E ALTO BEJUCAL	122	05/05/2025
IQUIRA	VIA A LA LOMA DE LA CRUZ	40	03/06/2025
COLOMBIA	VEREDA SAN PEDRO	100	03/06/2025
RIVERA	TERMOPILAS QUE CONDUCE A LAS JUNTAS	180	01/07/2025
ALGECIRAS	QUEBRADA PERDIZ	100	07/07/2025
ALGECIRAS	ARGELIA	85	14/07/2025
ALGECIRAS	GUADUALEJA	150	21/07/2025

ALGECIRAS	LAS BRISAS	140	01/08/2025
ALGECIRAS	LIBANO	120	15/10/2015
ALGECIRAS	ROSAD	100	15/10/2015
IQUIRA	VEREDA JORDAN PASANDO EL PUENTE DE VALDIVIA	0	04/11/2015

El Ing. Cristian recalca los inconvenientes que se han tenido en el municipio de Teruel debido a las constantes lluvias que han afectado las rutas de acceso y no han dejado iniciar la intervención.

El Ing. Francisco complementa que los frentes de Algeciras fueron programados para que se ejecularán en los últimos tres meses de contrato debido a las exigencias del personal de la zona sobre la intervención ininterrumpida y simultanea de la totalidad de los tramos.

El Ing James Andrade recuerda al contratista que dentro del contrato de obra 879 de 2024 existe el rubro de los imprevistos el cual puede utilizarse en estos casos y en temas de ampliaciones para el tránsito de la comunidad en los sectores que se pueda hacer, para que no haya ningún impedimento para que se pueda cumplir con las obras en el inicio y plazo contemplado y que a la fecha se han venido aprobando los desembolsos del anticipo de materiales de cantera y maquinaria para que el contratista tenga el flujo necesario para trabajar.

Con respecto a lo mencionado por el contratista y los comentarios de la Interventoria el Ing. José Mauricio solicita se establezca la fecha de entrega de la programación y del plan de contingencia.

El Ing. Francisco se compromete a la entrega el día jueves 13 de marzo de 2025 a la Interventoria para que esta pueda revisarla.

El Ing James Andrade confirma que si se cumple con esa entrega por parte del contratista para el día viernes 14 de marzo de 2025 se remitiría la programación junto con el plan de contingencia a la Supervisión de Interventoria.

Toma la palabra el Ing. Luis Fonseca para explicar el tema del balance de obra y los dos escenarios que se tienen conforme a los tramos que ya se encuentran construidos, el primer escenario contemplando los tramos ya construidos y el segundo sacando estas cantidades:

Escenario No.1:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

MUNICIPIO	PRESUPUESTO	BALANCE	DIFERENCIA	Columna1
COLOMBIA	$ 1.050.948.373	$ 1.542.341.739	-$ 491.393.366	INVIAS
YAGUARA	$ 544.464.531	$ 528.235.485	$ 16.229.046	
LA ARGENTINA	$ 409.306.972	$ 396.990.483	$ 12.316.489	
TERUEL	$ 565.850.822	$ 569.281.602	-$ 3.430.780	
LA PLATA	$ 129.214.315	$ 125.792.780	$ 3.421.535	
SANTA MARIA	$ 273.743.180	$ 268.620.053	$ 5.123.127	
RIVERA	$ 335.317.076	$ 325.670.086	$ 9.646.990	
BARAYA	$ 154.027.219	$ 150.101.188	$ 3.926.031	INVIAS
ALGECIRAS	$ 1.333.491.107	$ 1.204.750.959	$ 128.740.148	
CAMPO ALEGRE	$ 625.415.010	$ 714.657.722	-$ 89.242.712	INVIAS
IQUIRA	$ 356.592.056	$ 333.630.562	$ 22.961.494	
NATAGA	$ 410.356.716	$ 400.310.252	$ 10.046.464	
PALERMO	$ 829.210.275	$ 800.269.212	$ 28.941.063	
	$ 7.017.937.652	$ 7.360.652.123	-$ 342.714.471	

Escenario No.2:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

MUNICIPIO	PRESUPUESTO	BALANCE	DIFERENCIA	Columna1
COLOMBIA	$ 1.050.948.373	$ 1.542.341.739	-$ 491.393.366	INVIAS
YAGUARA	$ 544.464.531	$ 528.235.485	$ 16.229.046	
LA ARGENTINA	$ 409.306.972	$ 396.990.483	$ 12.316.489	
TERUEL	$ 565.850.822	$ 569.281.602	-$ 3.430.780	
LA PLATA	$ 129.214.315	$ 125.792.780	$ 3.421.535	
SANTA MARIA	$ 273.743.180	$ 268.620.053	$ 5.123.127	
RIVERA	$ 335.317.076	$ 325.670.086	$ 9.646.990	
BARAYA	$ 154.027.219	$ 150.101.188	$ 3.926.031	INVIAS
ALGECIRAS	$ 1.333.491.107	$ 1.204.750.959	$ 128.740.148	
CAMPO ALEGRE	$ 625.415.010	$ 598.603.815	$ 26.811.195	INVIAS
IQUIRA	$ 356.592.056	$ 97.288.425	$ 259.303.631	
NATAGA	$ 410.356.716	$ 400.310.252	$ 10.046.464	

PALERMO	$ 829.210.275	$ 800.269.217	$ 28.941.063
	$ 7.017.937.652	$ 7.360.652.123	$ 9.681.573

Toma la palabra el Ing. James Andrade con respecto a los dos escenario explicados anteriormente como se va a abordar el tema con regalías sobre los tramos que ya se encuentran construidos si este recurso se puede utilizar para otros tramos, pero según lo trabajado en otros proyectos no es aceptada esa opción y lo más posible es que se deba devolver este recurso.

La Ing. Angela Zambrano indica que este tema ya se está abordando con el personal de Regalías del Departamento lo más posible es que se programe una reunión para el dia martes 11 de marzo de 2025 y poder establecer como es el procedimiento que se debe seguir.

El Ing Luis Fonseca hace la pregunta a la supervisión acerca del estado en que se encuentra el trámite del convenio entre la Gobernación del Huila y el INVIAS para poder ejecutar los tramos que se encuentran en competencia del INVIAS. La Ing. Ángela Zambrano responde que este trámite ya se encuentra en manos de la oficina de Contratación de la Gobernación debido a que la Subdirección del INVIAS solicito unos estudios adicionales para poder seguir con el trámite.

Toma la palabra el Ing. James Andrade, solicitando los buenos oficios a la Supervisión sobre el trámite de la creación del convenio y de la respuesta de Regalías para poder definir la solicitud de posible ajuste del proyecto y la pronta intervención de los tramos.

Toma la palabra el Ing. Luis Fonseca solicitando al contratista la presencia del personal técnico profesional en obra para la toma de decisiones técnicas y el cumplimiento del plan de calidad. PMT y PAGA.

3. Proposiciones y varios

La Ing Angela menciona que para la siguiente semana se tiene programada una visita al municipio de Colombia, esta se puede aprovechar para realizar la socialización de los tramos a ejecutar y llevar esta reunión a cabo en las oficinas de la alcaldía y con esto se puede solicitar al municipio el mejoramiento de la vía de acceso a San Pedro.

El Ing James Andrade complementa que es bueno que se hable con la comunidad sobre los cierres de las vías y cuadrar con ellos como se va a trabajar y que plazos se tiene en la ejecución de cada tramo y así evitar posibles inconvenientes.

COMPROMISOS PACTADOS:

Verificación diseños muros (24/03/2025 estudios suelos, 31/03/2025 concepto especialista)	Contratista
Reprogramación de obra 13/03/2025	Contratista
Plan de contingencia 13/03/2025	Contratista
Balance	Contratista e Interventoria
Inicio ejecución nuevos tramos	Contratista
Reunión Regalias	Supervisión

COMENTARIOS:

Hace parte integral del presente comité técnico de obra No. 6, el listado de asistencia.

PROXIMA REUNION

- Fecha
- Hora:
- Lugar:





GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA No 879 DE 2024

COMITÉ TECNICO DE OBRA DEL CONTRATO 879-2024

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ TECNICO OBRA No. 6

DIA: 07-03-2025
HORA. 9:00 AM
SITIO: SECRETARIA VIAS E INFRAESTRUCTURAS

NOMBRE	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 7	Página 1 de 8
	CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024** INTERVENTORIA: **CONSORCIO INTERVENTORES 2030** **CONTRATO 1590 DE 2024** OBJETO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	FECHA: Día: 29 Mes:03 Año: 2025

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE	R.L. CONSORCIO INTERVENTORES 2030	
JAMES ANDRADE ZAMBRANO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	
FRANCISCO JAVIER ESTUPIÑAN	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CRISTIAN DELGADO	INGENIERO APOYO CONTRATISTA

OBJETO DE LA REUNION:

Seguimiento al contrato de obra 879 de 2024 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes
2. Estado de entrega documentación.
3. Revisión cumplimiento programación de obra y de plan de contingencia.
4. Revisiones parte técnica ejecución tramos (inconformidades encontradas y soluciones dada por la interventoría)
5. Revisión balance de obra

6. Avance resultados de laboratorio verificación muros y conceptos especialista
7. Proposiciones y varios.

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes

Toma la palabra la Ing. JAMES ANDRADRE Z., Coordinador de la interventoría indicando que teniendo en cuenta la invitación enviada por esta Interventoria por medio de correo electrónico el día 28 de marzo de 2025, el día de hoy 29 de marzo de 2025 a las 8:00 am en las oficinas de la Interventoria hacen presencia, en representación del Consorcio Vial Iquira 2024 el Ing. FRANCISCO ESTUPIÑAN, Director de obra, por su parte la interventoría externa, hace presencia el Ing. JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE, R.L. CONSORCIO INTERVENTORES 2030, Ing. JAMES ANDRADE ZAMBRANO, Coordinador General de Interventoría; y el Ing LUIS CARLOS FONSECA Director de Interventoría y el Ing. CRISTIAN DELGADO, apoyo del contratista. Es decir, se concluye que se encuentran todos los profesionales para adelantar el presente comité técnico de obra.

2. Avance del contrato 879 de 2024

Toma la palabra el ingeniero James Andrade Zambrano, quien agradece la asistencia al comité de obra y una vez verificado el cuórum se da inicio al comité técnico de obra No.7 para la revisión del estado del contrato de obra 879 de 2024 y de los pendientes por entregar.

El Ing. Luis Fonseca toma la palabra; para manifestar que de acuerdo con lo solicitado mediante nuestro comunicado CI 2030-31 del 20 de febrero de 2025 se enviaron observaciones de la entrega de la documentación inicial, pero que a la fecha a un no ha sido remitida toda la documentación solicitada y parte incompleta. Lo primero es la programación de obra, ya se ha trabajado en conjunto con el contratista, pero este no la ha remitido de forma física y firmada por el representante legal. El Ing. Cristian menciona que está a la espera de que el representante legal se encuentre en la ciudad para la firma, y una vez se tenga se remitirá firmada a la Interventoria. Se solicita por parte de Interventoria el documento en formato Project, pdf y Excel y adjunto el flujo de caja correspondiente a la programación.
Otro punto pendiente es la calibración de los equipos de laboratorio no se han presentado, igualmente la caracterización de los materiales; están desactualizados y los diseños de mezcla faltantes, no se ha recibido ninguna respuesta por parte del contratista a los requerimientos.

Toma la palabra el Ing. James, mencionando que estos temas son reiterativos, pregunta al Ing Francisco cual es el inconveniente de esta información que es muy sencilla y no ve excusa que a la fecha se esté insistiendo en lo mismo; por esta falta de entrega de información es posible el inicio de un proceso de incumplimiento de acuerdo a lo reglado por el contrato de obra No. 879 de 2024.

El Ing. Francisco menciona que ha tenido inconvenientes con la entrega de la información por parte del laboratorista ya todos los ensayos se han realizado, pero está a la espera que se entreguen los documentos.

Toma la palabra el Ing Luis Fonseca, menciona que está pendiente permisos de disposición final, actas de vecindad y resolución de conformación de veeduría.

El Ing. James solicita que dentro de la propuesta y en pliegos de condiciones está el personal encargado de realizar todas las gestiones con los municipios; entonces no es excusa para decir que la demora se debe a los municipios.

El ing. Francisco comenta que se tiene ya el personal trabajando en todas esas gestiones.

Toma la palabra el Ing. Luis Fonseca sobre la entrega de los informes PAGA y PMT, que aunque se ha entregado parte de la documentación faltan los soportes del presupuesto que se ha invertido en cada tramo.

El Ing. Francisco indica que se está recopilando esta información de facturas, cuentas de cobro y demás soportes que se irán presentando para revisión; puede ser una vez se tramite el acta parcial.

El Ing. James solicita la entrega de toda la documentación pendiente el día 05 de abril de 2025 como último plazo para el contratista.

Ing. Luis Fonseca, se pasa al siguiente punto que es la revisión de la programación y avance de obra:

La Argentina: inicio el 13 de febrero con finalización el 24 de mayo, ya se llevan 40 metros de placa huella construida y la construcción del filtro, la última semana se han tenido inconvenientes con el avance por problemas con los proveedores de la zona que no han cumplido.

Ing Francisco, manifiesta que la interacción con la comunidad; ha sido muy complicada, pero nos han parado muchos procesos, ya me he apersonado del tema y he solucionado con los líderes de la zona. En tiempo y rendimiento estamos bien esperamos terminar en el tiempo esperado.

Ing Luis Fonseca menciona que van varios días que no se ha avanzado en la construcción de filtro por falta de materiales, solicita se adelanten los trámites correspondientes para reiniciar esta actividad. Se menciona también que el valor ejecutado a la fecha es de aproximadamente 100 millones, pero el programado es de 160 millones.

El Ing. Francisco menciona que ya se ha comprado el material que está a la espera de la entrega del proveedor Homecenter para reiniciar con las actividades.

El Ing James solicita al contratista que se adelanten labores adicionales para poder nivelar la ejecución con la programación porque según los datos informados están en atraso.

La Plata: el Ing. Fonseca menciona que el tramo se encuentra prácticamente terminado, falta la construcción de las cunetas a los costados; finalizando el tramo de la placa huella, para conducir el agua que baja de las dos placas huellas y llevarlas a la alcantarilla.

El Ing. Francisco menciona que, aunque en el diseño está establecida el drenaje por medio de cuneta hay que ajustarla a las condiciones del terreno, entonces se deben construir una a cada costado de a próximamente 30 ml, se debe construir para recoger tanto el agua de la cuneta como la que se filtra por el costado

El Ing James Andrade autoriza esta propuesta y solicita que se implemente el diseño estructural de la cuneta, con los espesores y el despiece del acero como están en las especificaciones del proyecto.

Rivera: El Ing. Luis Fonseca menciona que se encuentra terminada la placa huella hace falta la construcción de una cuneta adicional al costado posterior del bordillo; para manejar el agua del distrito de Riego y que este no afecte la estructura de la placa huella.

El Ing. James Andrade da la aprobación y menciona que, como el caso de La Plata, se debe respetar las especificaciones de los diseños y dejarle un dentellón al inicio en el encoles para evitar la socavación, en espera que se terminen estos pendientes y se empiece a organizar la obra y demás documentos para el recibo del tramo por parte de la comunidad; especialmente la veeduría ciudadana.

Colombia: Fecha de inicio 25 de marzo en el tramo de la vereda de San Pedro, el Ing. Francisco manifiesta que se están subiendo los materiales de construcción, la maquinaria se encuentra haciendo los trabajos de ampliación y excavación del tramo.

Teruel: Fecha de inicio el 25 de marzo; por temas de lluvia se ha presentado atrasos en la ejecución. El Ing. Cristian menciona que por inconvenientes con la ampliación de la calzada en el tramo 3 lo más pertinentes es la implementación de muros de contención para garantizar el ancho de la calzada de diseño, en el tramo 1 debido a que se encuentra una casa en un costado y en el otro un poste de energía se debe construir una estructura para que confine el relleno de la estructura de la placa huella y garantice el ancho de diseño. Las alcantarillas del tramo 2 y 3 no pueden construirse debido a que se encuentra en el sector

de una casa, por niveles queda enterrada la alcantarilla y los pobladores de ese sector no dejan descargar el agua en sus predios.

Toma la palabra el Ing. Luis Fonseca que en el tramo tres se ha realzado la revisión por parte de la Interventoria, donde se hizo un acercamiento con el propietario del predio para la ampliación de la calzada y este está dispuesto a dejar excavar si se le garantiza la restitución de la cerca por tal motivo no son necesarias las estructuras de contención, para el tramo 1 si es necesario una estructura que confine el material de relleno y la estructura de la placa huella para garantizar la estabilidad de la obra y el ancho de la vía, por tal razón se deben adelantar por parte del contratista todo el tema técnico para la viabilidad.
Sobre el tema de las alcantarillas técnicamente no se pueden construir en los tramos 2 y 3 entonces se debe soportar por parte del contratista la no construcción igualmente se debe adelantar el proceso de las actas de vecindad.

Palermo: El Ing. James Andrade toma la palabra mencionando que en este tramo se tiene el inconveniente de la ejecución de la otra placa huella por parte de otro contratista; por lo que no se puede cerrar el tramo de este proyecto hasta que ellos no acaben, en conversación con la Ing. Angela indico que se comunicó con el contratista y ellos iban a acelerar el concreto para terminar en la primera semana de abril.

Toma la palabra el Ing. Luis Fonseca indicando que se debía iniciar el 25 de marzo y a la fecha no se ha iniciado con la intervención del tramo. El Ing Francisco mención que esto se debe a que se tenía contratada la maquinaria con una persona de Teruel; pero por la no apertura del tramo que se encuentra en intervención esta no se transportó; razón por la cual se está contratando con otra persona y ya inicia la siguiente semana.

El Ing James Andrade solicita que se inicie de inmediato la construcción del tramo ya no hay más plazo para no iniciar; se puede adelantar trabajos de ampliación, conformación e instalación de material de mejoramiento, así como la construcción de la alcantarilla y el muro.

Yaguara: La vereda Upar se cuenta con dos tramos, se deben iniciar el primer tramo este lunes 31 de marzo, El Ing. Francisco comenta que se tiene inconvenientes con la comunidad por lo valores de la contratación, de transporte y mano de obra; pretenden que se pague un precio muy elevado, ya tenemos la maquinaria en el pueblo y estamos resolviendo este asunto, esperamos el lunes poder subir a intervenir.

El Ing James Andrade comenta que si no se logra resolver esto se puede pedir la intervención de las autoridades municipales y de la supervisión, esperemos que el lunes salga todo bien.

Nataga: La fecha de inicio es para el 7 de abril de 2025, ya se ha iniciado con la limpieza y ampliación; se

está adelantando en este momento un mejoramiento del paso alterno; paso que viene solicitando la comunidad como condición para el cierre total de la vía.

El Ing Fonseca; manifiesta que el siguiente punto es la entrega de los ensayos de laboratorio para la revisión de los diseños de los muros, según compromiso del comité No. 6; debía realizarse el 24 de marzo y el concepto del especialista el 31 de marzo para entrega a la Gobernación el primero de abril de 2024 lo cual no se ha cumplido.

El Ing Francisco comenta que ya se han adelantado en los sectores donde se pueden construir pero no se puede acceder al muro de Santa Maria, por seguridad de la zona.

El Ing James menciona que no se puede seguir en los mismos retrasos, toda esta documentación es necesaria para poder soportar el acta de justificación para la aprobación del nuevo balance presentado, se necesita la celeridad en esto.

Toma la palabra el Ing. Juan camilo Polania que ante todos estos incumplimientos por parte del contratista de la parte administrativa; en tal sentido se necesita que esta parte la maneje un personal con la suficiente experiencia un proyecto de 7 mil millones no se puede permitir tener todos estos incumplimientos de temas tan sencillos; entonces se requiere al contratista para que de manera inmediata implemente el personal ofertado y la dedicación solicitada en el proceso, para que de una vez por todas cumpla con los compromisos adquiridos por parte del contratista en todos los comités técnicos de obra; como también en lo reglado por el contrato.

El Ing. Luis Fonseca, solicita el cumplimiento al contratista del control de calidad de los procesos constructivos en obra como lo son la utilización de la maquinaria adecuada, acompañamiento de la topografía, compactación, toma de densidades y toma de cilindros para la muestra de los concretos; recalcando que si se encuentran deficiencias no se recibirán las obras y se deberán tomar las medidas correspondientes y toco será a cargo del contratista sin posibilidad de reconocimiento alguno por parte de esta interventoría.

3. Proposiciones y varios

Se le recuerda al contratista que se cuenta con un 2% del valor del contrato para el tema de imprevistos, estos para ser reconocidos deben ser soportados y se debe presentar dentro del informe mensual la relación de los mismos; por tal razón si se presentan inconvenientes se puede utilizar este rubro para poder dar agilidad a la ejecución de la obra y cumplir el objeto contractual dentro del plazo establecido.

COMPROMISOS PACTADOS:

Entrega de programación 05/04/2025	Contratista
Entrega de toda la documentación pendiente 05/04/2025	Contratista
Entrega de laboratorios y concepto revisión diseños muros 05/04/2025	Contratista
Elaboración de' anteproyecto de la presente acta de comité.	Inteerventoria

COMENTARIOS:

Hace parte integral del presente comité técnico de obra No. 7, el listado de asistencia.

PROXIMA REUNION

- Fecha: 07/04/2025
- Hora: 9:00 am
- Lugar: Oficina de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO





GOBERNACION DEL HUILA	COMITÉ TECNICO DE OBRA DEL CONTRATO 879-2024
CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ TECNICO OBRA No. 7

DIA: 29-03-2025
HORA. 9:00 AM
SITIO: INTERVENTORIA

NOMBRE	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 DIEGO A MEDINA L.	1081191490	diego.medina@interventoriaDECOBA.co		

ANEXO No. 6

- **SOCIALIZACIONES**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

GOBERNACIÓN DEL HUILA	REUNIÓN DEL CONTRATO 879-2024
CONTRATO DE OBRA N° 879 DE 2024	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN

DÍA: 4 de Abril 2024
HORA: 10:00 a.m.
SITIO: Vereda Portal, Municipio Palermo

NOMBRE	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA
Juan Angela Reyes	3102241135	Palermo	
Nubia Lilia Romero	3163167002	Palermo	
Jesus Leonardo C	3153779484	Palermo	
Fanny Chaparro	3186968047	Palermo	
Cristian Rueda S.	3158764049	Palermo	
Oscar Sanchez	3132576612	Palermo	
Jose Palmeros	3135514806	Palermo	
Mary Sabas Chaparro	3652523889	Palermo	
Andres Losada	3145322036	Palermo	
Julian Mauricio Rubio	3132967940	Palermo	
Hermides Rivas	3112697604	Palermo	
Armando Ayala	3144236549	Palermo	

GOBERNACIÓN DEL HUILA	REUNIÓN DEL CONTRATO 879-2024
CONTRATO DE OBRA N° 879 DE 2024	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ÓRDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN

DIA: 19 de Marzo 2025
HORA: 11:00 AM
SITIO: Vereda Porvenir, Municipio Palermo

NOMBRE	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA
Carlos C. Delgado L	3045573[illegible]	Porvenir	
Luis Pablo Tapia	3187411674	Porvenir	
Diego Medina Losada	3135619413	Porvenir	Diego Medina L.
Francisco Estupiñan	3176402140	Porvenir	
Alex Pantoja	3122341283	Porvenir	
Yolanda Trujillo Arteaga	318.0934[illegible]	Porvenir	Yolanda Trujillo Arteaga
Adriana Maria Rodriguez	3272972334	Porvenir	Adriana Maria Rodriguez
Yeny Nibia Ramirez	3138142731	Porvenir	
Erlenis Lozano	3154[illegible]	Porvenir	
Jose Carlos [illegible]	3236[illegible]	Porvenir	
[illegible]	[illegible]	Porvenir	
[illegible]	4722576	Porvenir	
Yesica Escobar Hoyos	3142643657		
Jhon F Yanez	3105402460	Porvenir	
Maria Ospina	3183426904[illegible]	Palo Derila Porvenir	
Angie Ospina	3188506858	Porvenir	
Diana Ramirez	3162314514	Concepcion Pavuta	
Blanca Quintero	3212304127	Alcalde Palermo	

ANEXO No. 7

- **VEEDURIA LA PALERMO**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Palmito, el día 19 de Marzo de 2024, en el la Placa vereda Palmito. En esta reunión participan: la Junta de Acción Comunal JAC del Palmito, comunidad en general, equipo; con el objeto de Constituir la Veeduría Ciudadana del contrato 019 de 2024 de las obras ejecutadas en el municipio de Palmito de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Nacional y la Ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES

1. Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

2. Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

3. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de esta y la prestación de los servicios públicos".

4. Que Las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

5. Como funciones de la Veeduría se establecieron las siguientes:

Powered by CamScanner

PERIODO DE VIGENCIA DE LA VEEDURÍA: La veeduría tendrá vigencia durante el periodo de ejecución del contrato 6 M de 2024.

ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA VEEDURÍA: La veeduría ejerce su gestión de vigilancia en el ámbito Municipal.

ORGANIZACIÓN OBJETO DE VEEDURÍA: Junta de Acción Comunal Villa Nueva El Porvenir.

DOMICILIO DE LA VEEDURÍA: parcela el cesar. Municipio Palermo. Departamento Huila.

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES:

CORREO ELECTRÓNICO: [illegible]

TELÉFONO: 3197606427

TERCERO: Que para presidir o coordinar la Asamblea fue elegido (a) el (la) señor (a) Benjamin Lavao, como vicepresidente fue elegido (a) el León Berty Bejas G. y como Secretario (a) fue elegido (a) el (la) señor (a) Omaira Alejandra D.

CUARTO: Instalada la Asamblea o reunión, los participantes democráticamente votaron y decidieron elegir los miembros de la veeduría mediante la votación pública por los que decidieron postularse.

QUINTO: Que las personas que resultaron elegidas fueron las siguientes:

Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Dirección	Teléfono	Municipio
León Berty Bejas G.	83235662	Finca la Libertad	3152936941	Palermo
Benjamin Lavao	1080293432	Porvenir	3154077275	Palermo
Omaira A. Dussan	1080291031	Porvenir	3197606427	Palermo.

Powered by CamScanner

- Vigilar procesos de planeación
- Vigilar la asignación de presupuestos
- Vigilar procesos de contratación
- Fiscalizar la ejecución de obras e inversiones
- Recibir informes y sugerencias
- Solicitar información que permita verificar el cumplimiento
- Comunicar a la ciudadanía avances de procesos en desarrollo
- Remitir a las autoridades informes de control y vigilancia
- Denunciar hechos o actuaciones irregulares de funcionarios públicos

6. Que se realizó convocatoria a la comunidad para conformar veeduría ciudadana con el fin de ejercer control social al contrato 019 de 2019 de la Inspección del Valle

DECLARAN

PRIMERO: Que en la hora y lugar antes mencionados se reunieron los ciudadanos cuyos nombres e identificación se mencionan a continuación:

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección	Teléfono
León Berty Rojas Gutierrez	83235662	Finca la Libertad	3152936941
Benjamin Lavao	1080293432	Porvenir	3154077275
Omaira Alejandra Dussan	1080291031	Porvenir	3197606427

SEGUNDO: Con la finalidad de constituirse de manera autónoma e independiente en una veeduría ciudadana para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 850 de 2003 y 1757 de 2015, la cual tendrá las siguientes características:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Veeduría obras vereda el Porvenir

OBJETO DE LA VEEDURÍA: Vigilancia a la ejecución del contrato 019 2019 de las obras ejecutadas en el municipio de Vereda el Porvenir, Putumayo

Powered by CamScanner

SEXTO: Que la Veeduria Ciudadana tendrá los siguientes miembros directivos:

Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Dirección	Teléfono	Cargo
Leon Berly Rojas Gutierrez	85235662	Finca la libertad	3152036491	Coordinador
Benjamin Lavao	1090243432	Pamplona	3154077275	Vicepresidente
Omaira Alejandra Duarte	1090291651	Pamplona	3197606927	Secretario

SÉPTIMO: Que la presente veeduria se rige por lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, dando estricto cumplimiento a los principios de representatividad, democratización, autonomia, transparencia, igualdad, responsablilidad, neutralidad, legalidad, oportunidad y solidaridad.

OCTAVO: Que la constitución de esta veeduria ciudadana se registrará ante la Personeria Municipal.

NOVENO: Que una vez registrada la veeduría se procederá a elaborar los estatutos y el respectivo plan de acción.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 10:50 am horas.

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los representantes de la veeduría (presidente, secretario u otros)

Leon Berly Rojas G

Nombre

Cc: 85.235.662

Cargo: COORDINADOR

Powered by CamScanner

Nombre Benjamin Rafael Cuao S

Cc: 1 080 293 932

Cargo: Vicepresidente

Nombre Cristina Alejandra Arroyo

Cc: 1080291031

Cargo: Secretaria

Powered by CamScanner

ANEXO No. 8

• OTRAS REUNIONES


NO SE PRESENTARON EN EL PRESENTE PERIODO

ANEXO No. 9


- **REGISTRO FOTOGRAFICO**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

TRAMO: LA PLATA – ALTO RETIRO

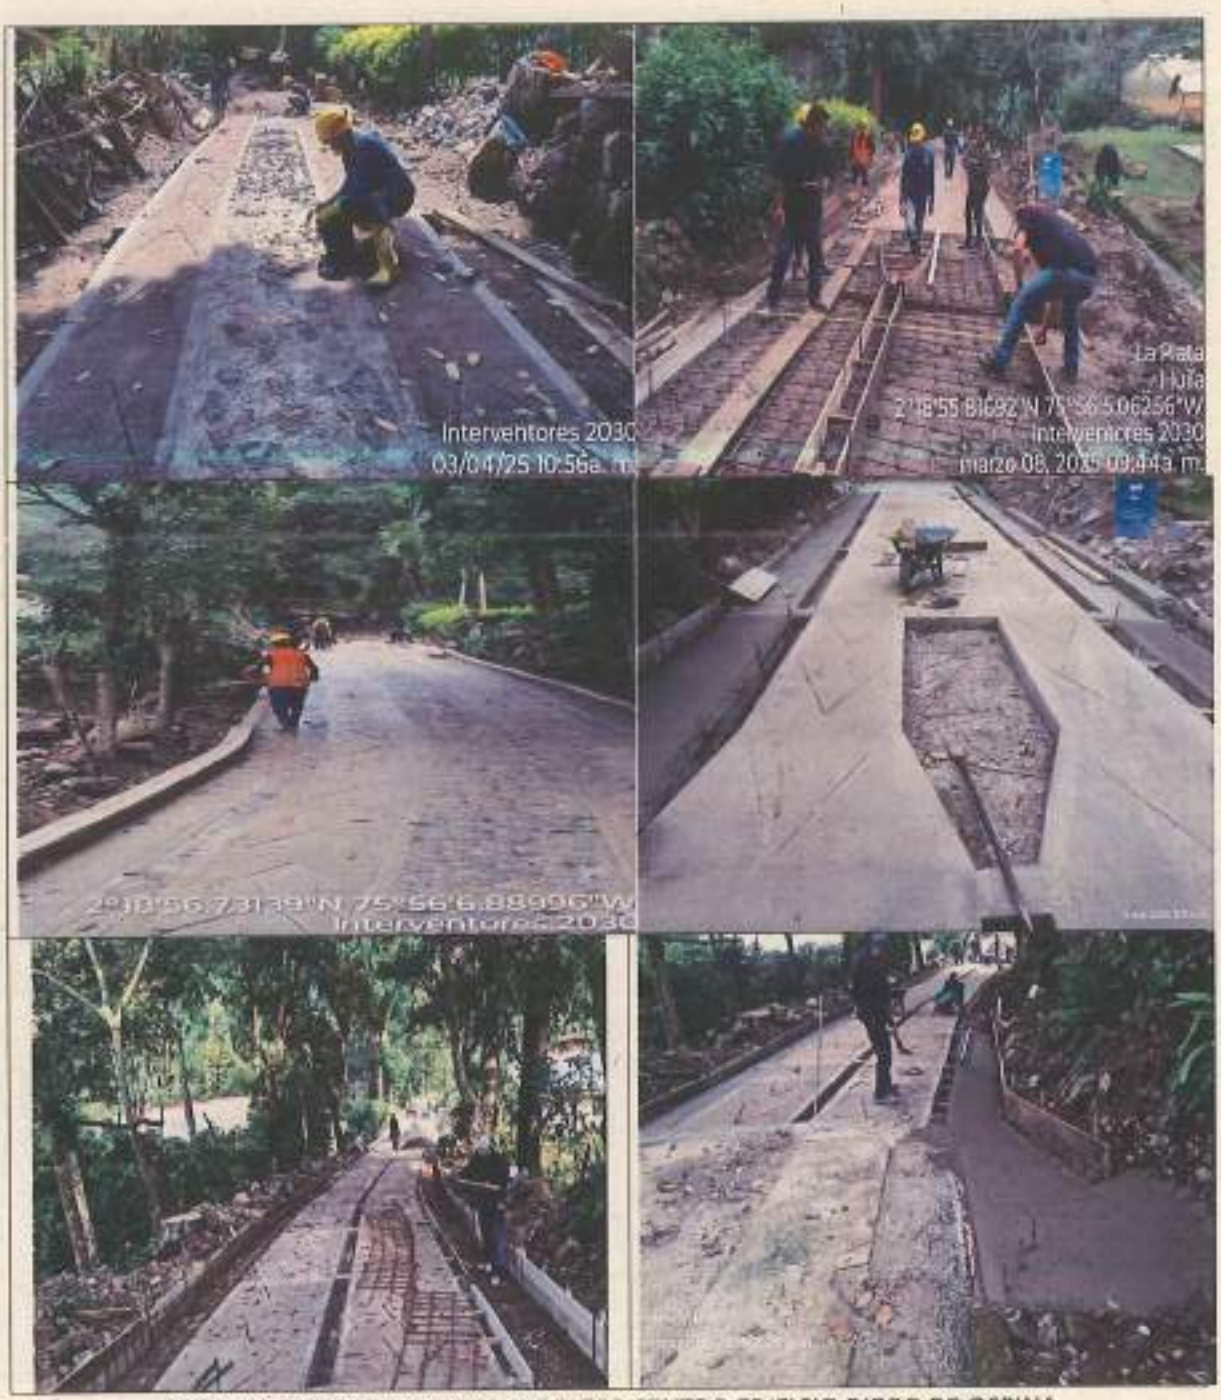

TRAMO: LA ARGENTINA – LA UNION

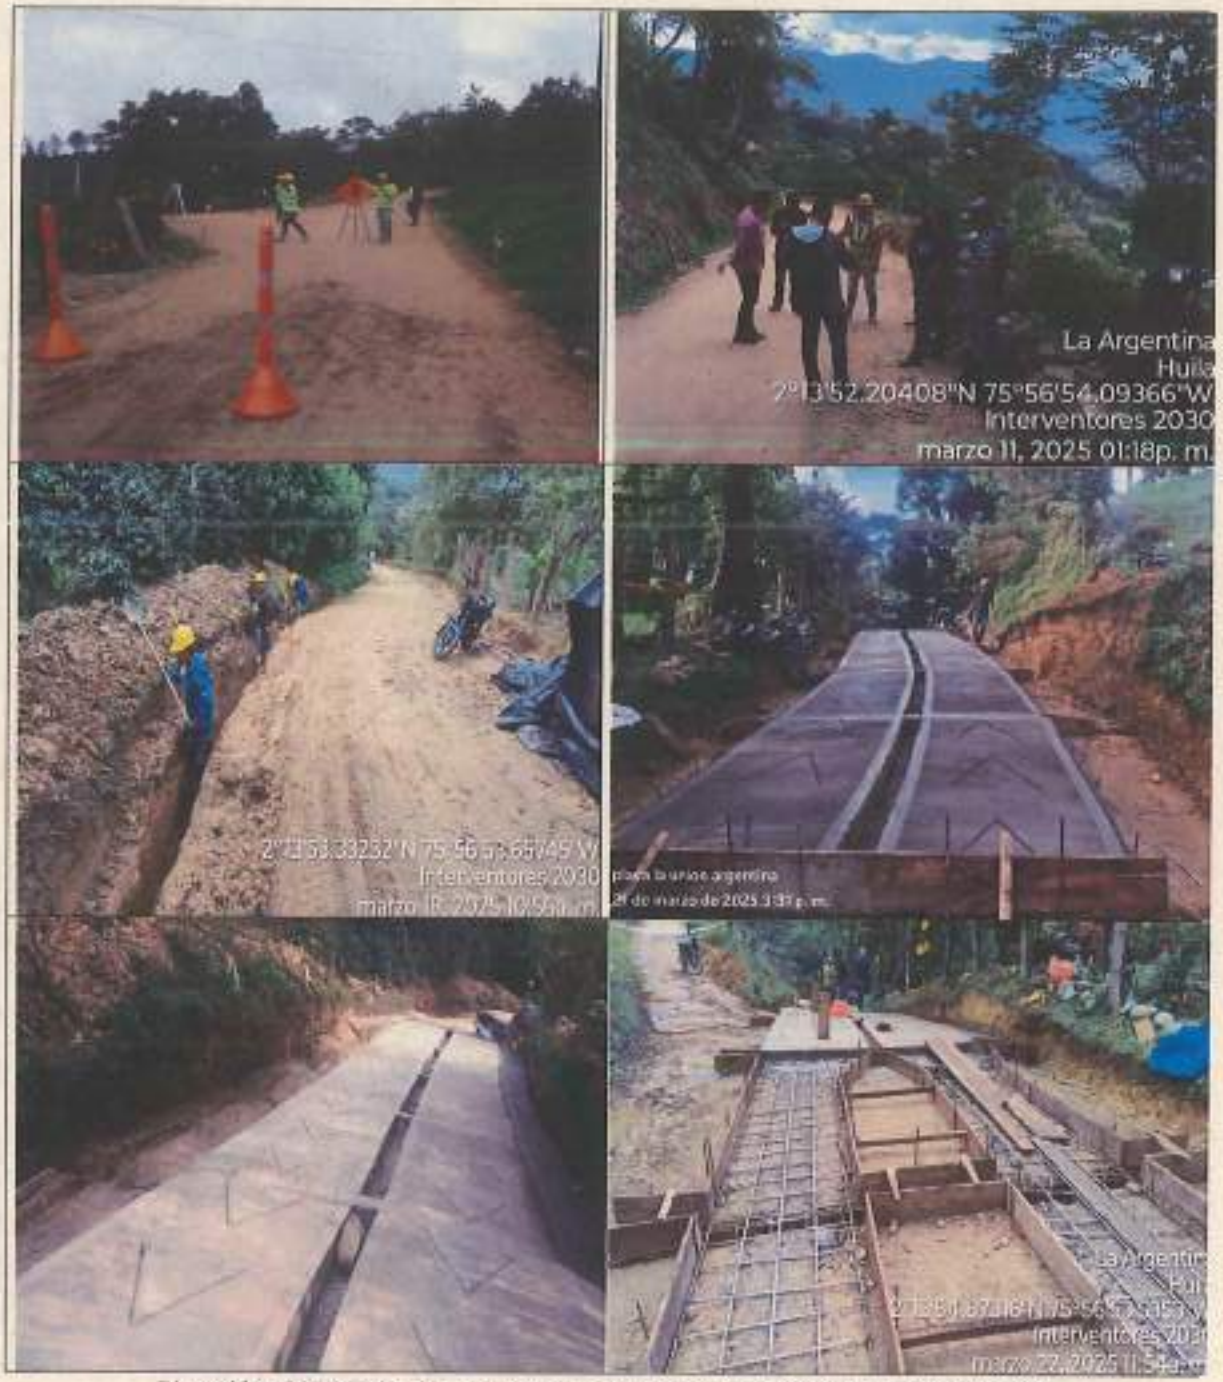

TRAMO: RIVERA – LLANITOS





TRAMO: TERUEL – LA MINA






CONTROL DE CALIDAD



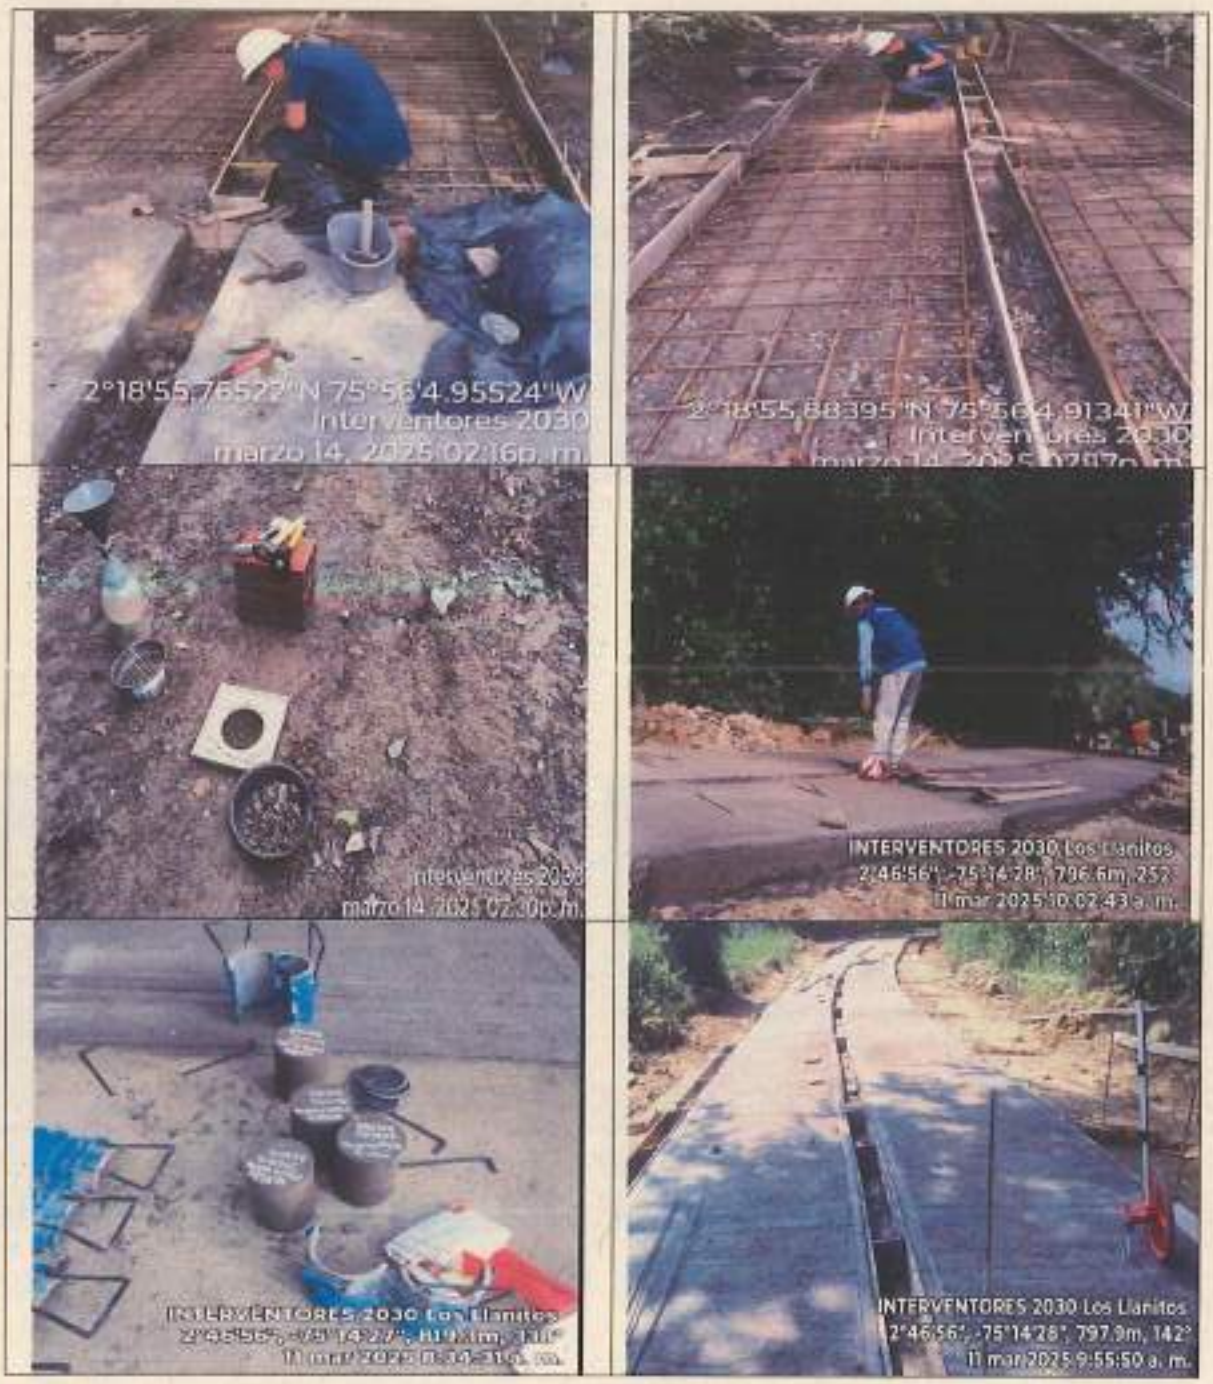


2°18'55.76522"N 75°56'4.95524"W
Interventores 2030
marzo 14, 2025 02:16p. m.
2°18'55.88395"N 75°56'4.91341"W
Interventores 2030
INTERVENTORES 2030 Los Llanitos
2°46'56", -75°14'28", 796.6m, 252°
11 mar 2025 10:02:43 a. m.
INTERVENTORES 2030 Los Llanitos
2°46'56", -75°14'28", 797.9m, 142°
11 mar 2025 9:55:50 a. m.


INTERVENTORES 2030 Los Limites
2°46'56", -75°14'28", 808.2m, 359°
10 mar 2025 2:01:52 p. m.
INTERVENTORES 2030 Los Limites
2°46'54", -75°14'22", 808.3m, 285°
10 mar 2025 9:37:38 a. m.
INTERVENTORES 2030 Los Limites
INTERVENTORES 2030 Los Limites
2°46'54", -75°14'27", 816.3m, 352°
15 mar 2025 10:09:51 a. m.

COMITÉ TECNICO No.6



COMITÉ TECNICO No.7



SOCIALIZACION PALERMO 19 DE MARZO 2025



ANEXO No. 10

- **PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA**
- **PLANIILLAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Nelva – Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 - MAYOR DE 200 COTIZANTE	NEIVA	[illegible]	NEIVA - H	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
2025-04	2025-04	[illegible]	[illegible]	E	2025-04-15	2025-04-09	BANCOLOMBIA	18	$12,626,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSIÓN				SALUD				CCF					RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Tipo Cotizante	Nombre																								Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aportes	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (31 Aportes)																											$4,778,400	$573,400		$4,778,400	$573,400															
Centro de Trabajo: HORMIGUITA (31 Aportes)																											$14,834,400	$1,780,100		$14,834,400	$1,780,100															
Ciudad: NEIVA Casos: Todos (31 Aportes)																											$14,834,400	$1,780,100		$14,834,400	$1,780,100															
1	CC	[illegible]	[illegible]	E																						01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
2	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
3	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
4	CC	[illegible]	[illegible]	E																						01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
5	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
6	CC	[illegible]	[illegible]	E																						01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
7	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
8	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
9	CC	[illegible]	[illegible]	E																						01/01	1	$49,500	$5,900	01/01	1	$49,500	$5,900	01/01	1	$49,500	4.000%	$1,900	01/01	1	$49,500	4.000%	$1,900	1	$49,500	$7,900	0	$7,900
10	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
11	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
12	CC	[illegible]	[illegible]																							01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400
13	CC	[illegible]	[illegible]	E																						01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	$178,000	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	01/01	30	$1,483,500	4.000%	$59,300	30	$1,483,500	$237,400	0	$237,400

2025/04/29 04:09 PM
