INFORME DE ACTIVIDADES CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA S.A.S

ABRIL 2026

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA O TECHO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE GIRALDO DENTRO DEL PLAN DE DEARROLLO 2024·2027 GIRALDO SOCIALE INCLUYENTE 202500000047749.”


TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZANCIÓN.....4
2.2. UBICACIÓN 4
3. INFORMACIÓN GENERAL.....7
4. AVANCE Y TERMINACIÓN DEL CONTROL.....7
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....7

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de mínima cuantía No MC 027-2026, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Giraldo y la Empresa CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA S.A.S, se llevó a cabo el proyecto de “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA O TECHO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE GIRALDO DENTRO DEL PLAN DE DEARROLLO 2024·2027 GIRALDO SOCIALE INCLUYENTE 202500000047749.”. Este proyecto tuvo como objetivo principal mejorar y y mantener la infraestructura de la alcaldía del municipio de Giraldo, en condiciones confortables para los funcionarios y la comunidad que visita la alcaldía por sus diferentes diligencias.

LOCALIZANCIÓN

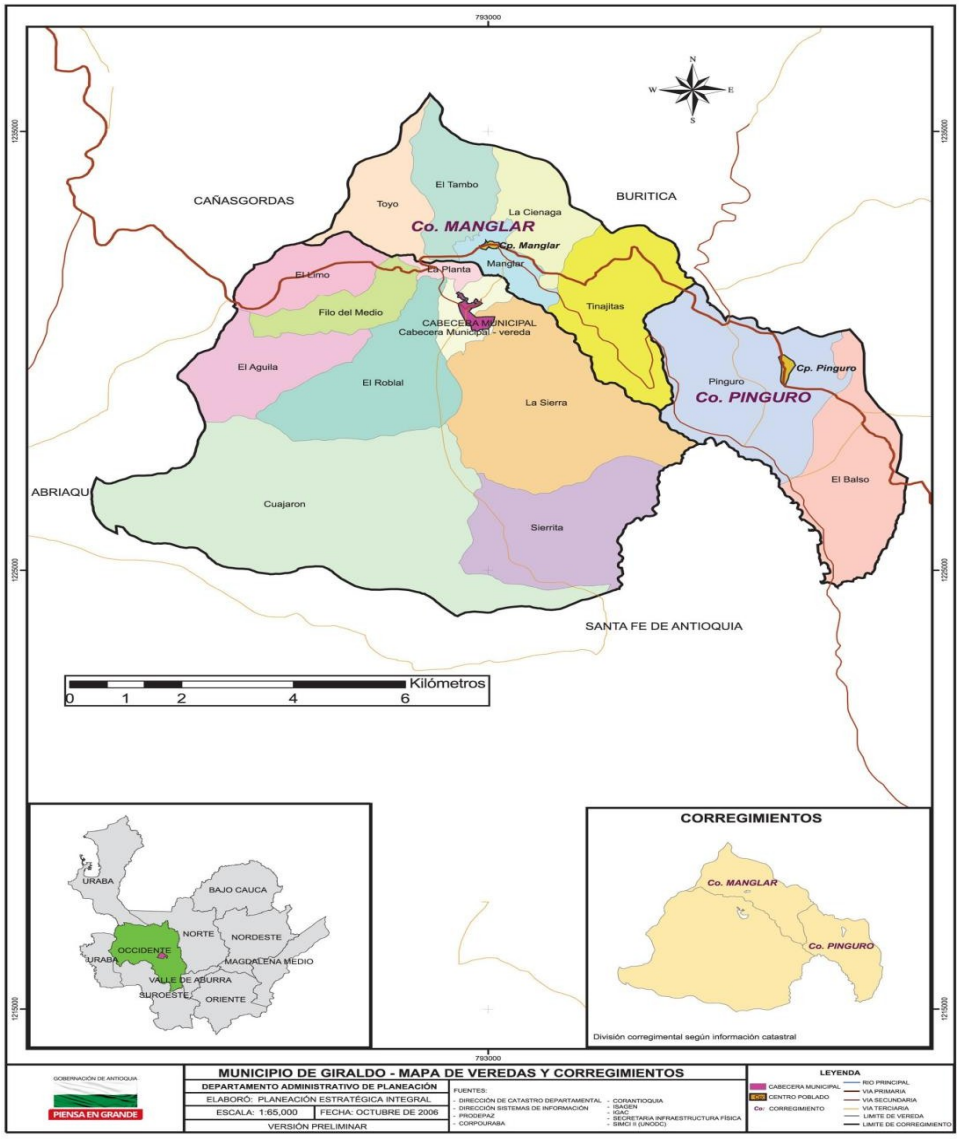

LOCALIZACION DE OBRA A EJECUTAR



ACTIVIDADES REALIZADAS

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

- **DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO EXISTENTE, EN ALTO GRADO DE DETERIORO, SE DEBE MANIPULAR CON CUIDADO PARA MATENER INTACTA LA MAYOR CANTIDAD.**









- **DESMONTE DE MANTO ASFALTICO EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIOS AUTORIZADOS PARA RESIDUOS RESPEL**








- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TELA ASFÁLTICA BASE POLIÉSTER PERMOFIT, INCLUYE LA EMULSION ASFALTICA, SOPLETE DE GAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**









- **REINSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO EXISTENTE, EN ALTO GRADO DE DETERIORO, SE DEBE MANIPULAR CON CUIDADO PARA MANTENER INTACTA LA MAYOR CANTIDAD, INCLUYE MORTERO DE PEGA ENTRE TEJAS**

ENCOROZADO EN TEJAS	ENCOROZADO EN TEJAS
	
	
	

ADICIONALMENTE SE REALIZRON ACTIVIDADES COMO CERRAMIENTO DE FRENTE PARA PROTECCION DE LA COMUNIDAD Y CERRAMIENTO EN PLACA ADJUNTA PARA AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA


	
Cerramiento con malla para separar cubierta de alcaldía de placa lateral	Cerramiento para protección de transeúntes que ingresan a la alcaldía.

Presentado por:



Samuel Barrera Caballero
Representante legal contratista

Revisado por:



Henry johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT
