ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-034
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	**FECHA**	jueves, 26 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**9**	DEL	**19-mar-26**	AL	**26-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1524- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	59 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	59 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

- Se realiza comite de seguimiento quincinal N.4 del 25 de marzo de 2026
- Se realizo vista técnica de la comisión de topografía por parte del contratista para continuar con la verificación de información,
- Se realiza visita técnica por parte del contratista para verificar el espacio de acopio de material y los requerimientos del punto SAU
- Se realizó la Implantación de las secciones de diseño en los planos
- El avance programado acumulado es del 12% que corresponde a $ 941.207990,76 el avance ejecutado acumulado del 12% que corresponde a $ 941.207990,76 esto respecto a la programación V5 correspondiente a la aprobación de la ampliación de la etapa preconstructiva en un plazo de 15 días calendario.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-075-2026 del 19 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-060, relacionada con la entrega del informe de revisión de estudios y diseños existentes, emitiendo conceptos del componente de geotecnia y pavimentos en el marco del contrato ICCU-CTO-1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-076-2026 del 19 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta a los comunicados OFC-ICCU-1586-2025-067 y OFC-ICCU-1586-2025-068, relacionados con las condiciones de estabilidad de taludes y laderas en zonas aledañas al proyecto (K0+890 y K1+195), en el marco del contrato ICCU-CTO-1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-077-2026 del 19 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. alcance al comunicado DON-1624-ICCU-065-2026, referente a la respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-062 sobre el informe técnico No. 1 y sus observaciones, en el marco del contrato ICCU-CTO-1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-078-2026 del 19 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-057, relacionado con la solicitud de ajustes finales del SG-SST V3.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-079-2026 del 19 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. requerimiento para la puesta en funcionamiento y equipamiento del punto SAU.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-080-2026 del 20 de marzo de 2026 remitió a la entidad el informe semanal N.8 de las actividades realizadas del 12 de marzo de 2026 al 19 de marzo de 2026.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-081-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-074, correspondiente a la entrega del informe SST No. 1, incluyendo observaciones al informe mensual SST N°1.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-082-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a la entidad el informe semanal N.7 de las actividades realizadas del 5 de marzo de 2026 al 12 de marzo de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-083-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-070, relacionada con observaciones al contrato de obra N.1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-084-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. llamado de atención por incumplimiento en la entrega del documento PAGA.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-085-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. alcance al comunicado DON-1624-ICCU-083-2026, relacionado con la respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-070, incluyendo aclaraciones al contrato de obra N.1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-086-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-071, correspondiente a la solicitud de cambio del profesional ingeniero residente, emitiendo aprobación en el marco del contrato de obra N.1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-087-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado relacionado con la entrega del informe técnico No. 1 V2, emitiendo aprobación en el marco del contrato de obra N.1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-088-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-060, correspondiente a la entrega del informe de revisión de estudios y diseños existentes, emitiendo aprobación en el marco del contrato de obra N.1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-089-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-077, relacionado con la entrega del concepto técnico del estudio de hidrología, hidráulica y socavación aportado por la entidad.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-090-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-080, relacionado con el dimensionamiento de losas en el K0+000 del corredor vial Vergara – Nocaima, incluyendo observaciones en el marco del contrato de obra N.1586-2025.
'- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-091-2026 del 24 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-082, correspondiente a la entrega del diseño de pavimento V2, en el marco del contrato de obra N.1586-2025.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-092-2026 del 25 de marzo de 2026 remitió a la entidad el manual SG-SST V1 de interventoría.
- CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-093-2026 del 26 de marzo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. la revisión y firma del acta de comité N.3 del 11 de marzo de 2026.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-076 del 18 de marzo de 2026, remitió el estudio geotécnico y de estabilidad de taludes.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-077 del 18 de marzo de 2026, remitió el concepto técnico del estudio de hidrología, hidráulica y socavación aportado por la entidad.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-078 del 18 de marzo de 2026, remitió información relacionada con el transporte de materiales y acceso al sitio de obra.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-079 del 18 de marzo de 2026, remitió las fórmulas de trabajo de materiales tratados.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-080 del 18 de marzo de 2026, remitió el dimensionamiento de losas en el K0+000 del corredor vial Vergara – Nocaima.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-081 del 18 de marzo de 2026, remitió el estudio de tránsito.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-082 del 18 de marzo de 2026, remitió el diseño de pavimento V2.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-083 del 24 de marzo de 2026, remitió la justificación de la no apropiación geotécnica, en respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-075-2026, relacionada con la no apropiación de pavimentos.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-084 del 24 de marzo de 2026, remitió respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-075-2026.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-085 del 24 de marzo de 2026, remitió la solicitud de reconocimiento económico de la actividad de corte de pavimento para la construcción de cunetas.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-086 del 24 de marzo de 2026, remitió la solicitud de revisión de las condiciones de funcionamiento del alcantarillado entre las abscisas K0+000 a K0+140, cabecera municipal.
- La Dirección de Consulta Previa mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-087 del 24 de marzo de 2026, remitió solicitud de verificación de presencia de comunidades étnicas.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-088 del 24 de marzo de 2026, remitió el informe del diseño de señalización.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-092 del 25 de marzo de 2026, remitió el plan de adaptación de la guía ambiental – P.A.G.A V3.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-093 del 25 de marzo de 2026, remitió la solicitud de cambio del profesional especialista en geotecnia ajustado, en respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-085-2026.
- El contratista mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-094 del 25 de marzo de 2026, remitió notificación y entrega de los oficios de respuesta enviados por la Alcaldía Municipal de Vergara.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124) - 1.1-EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	20-abr-26	19-jun-26	61			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124) -TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	15-may-26	10-jun-26	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124) -RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	13-may-26	2-jul-26	51			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)- AFIRMADO	26-may-26	2-jul-26	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	16-jul-26	17-sep-26	64			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-SUBBASE GRANULAR	3-jul-26	4-sep-26	64			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-RIEGO DE IMPRIMACIÓN	17-ago-26	23-sep-26	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	25-ago-26	7-oct-26	44			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	17-jul-26	7-oct-26	83			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	17-sep-26	26-oct-26	40			no iniciado	no iniciado	no iniciado

11	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-TOPE DEFENSA METÁLICA	7-oct-26	26-oct-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	7-oct-26	26-oct-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-DEFENSA METÁLICA	17-sep-26	26-oct-26	40			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	17-sep-26	26-oct-26	40			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	30-sep-26	26-oct-26	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
18	TRAMO 2 (K0+325 - K2+124)-LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	21-oct-26	26-oct-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
							no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 190 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,82%	0,84%	0,01%
Durante el periodo	0,14%	0,14%	0,00%
Acumulado Actual	0,97%	0,98%	0,01%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	60,00	212 días	0,04

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 65.255.927	$ 66.330.731	102%
Durante el periodo	$ 76.771.678	$ 77.846.482	101%
Acumulado Actual	$ 142.027.605	$ 144.177.213	102%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

2%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- El dìa 24 de Marzo la interventoría realiza y allega al contratista mediante comunicado DON-1624-ICCU-084-2026, llamado de atención derivado de la no subsanación de observaciones y entrega del PAGA en su nueva versión. Lo anterior sustentado en que, desde 10 de marzo de 2026, se remitieron al contratista las observaciones al documento PAGA V2 mediante comunicado DON-1624-ICCU-062-2026; los días 13 y 16 de marzo se desarrollaron mesas de trabajo fin de unificar criterios; durante comité ambiental y social realizado el 16 de marzo se estableció compromiso por parte del contratista de entrega con plazo máximo para el día 20 de marzo, fecha para la cual aún no se había recibido la atención solicitada.
- La Interventoría participó en el Comité Integral de Seguimiento realizado el día 25 de marzo de 2026, espacio en el cual se presentaron los avances correspondientes al componente ambiental durante la semana en curso, así como el estado de los instrumentos ambientales requeridos para el proyecto.
- El 25 de marzo de 2026, el contratista remite a la interventoría mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-092, el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – P.A.G.A V3 y a la fecha de elaboración del presente informe se encuentra en revisión técnica por parte de interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales:
El 24 de marzo de 2026 la interventoría remitió al contratista el comunicado DON-1624-ICCU-084-2026 con llamado de atención por la no entrega del documento PAGA V3. A lo anterior, el 25 de marzo de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-092 con el documento PAGA V3, el cual se encuentra en revisión e interventoría.

Programa de información y divulgación:
La interventoría informa que el arte del aviso del punto SAU fue remitido por la oficina de prensa del ICCU, el 19 de marzo de 2026 y remitido al contratista para la impresión correspondiente.

Programa de servicio a la ciudadanía
La interventoría informa que a la fecha no se ha recibido PQRSD.
El 18 de marzo de 2026, la interventoría realizo visita a campo evidenciándose que el punto SAU no se encuentra adecuado ni equipado para la atención a la comunidad. Situación que fue notificada y requerida formalmente al contratista, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-079-2026. A lo anterior, el director del contratista informo en comité integral, el 25 de marzo de 2026, que gestionó con el balneario de Casa Palma el arriendo de un espacio mas acorde para la puesta en funcionamiento del SAU, el cual se encuentra en adecuación para su funcionamiento**.**

Programa de manejo a la infraestructura de predios y servicios públicos:
La interventoría informa que a la fecha se han levantado 14 actas de vecindad para el tramo 1 y 2 (hasta el muero del tramo 2) quedando pendiente 20 actas de vecindad aproximadamente, a la espera de la definición de algunas actividades de obra que se encuentran pendientes.

Otras:
El 24 de marzo de 2026, la interventoría recibió del contratista copia del comunicado OFC-ICCU-1586-2025-087, a través del cual se hizo consulta al ministerio del interior frente a la verificación de presencia de comunidades étnicas en el AID del proyecto.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Reporte de Accidentalidad: Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

Personal de interventoría: En proceso de vinculación del personal – fase preliminar.

Personal de contratista: A la fecha aún no se recibe documentación de vinculación del personal contractual para revisión y aprobación.

- El dia 20 de marzo de 2026, siendo las 8:00 am se programó y desarrolló el segundo comité integral SST, en el cual participaron contratista, interventoría y supervisión del ICCU.
- La Interventoría participó en el Comité Integral de Seguimiento realizado el día 25 de marzo de 2026, espacio en el cual se presentaron los avances correspondientes al componente SST durante la semana en curso
El 19 de marzo de 2026, mediante comunicado DON-1624-ICCU-078-2026, la interventoría emitió solicitud de ajustes finales al documento SG-SST, con el fin de que el contratista realice la consolidación definitiva del sistema y se pueda proceder con su aprobación formal. A la fecha de elaboración del presente informe la interventoría no recibe ajustes solicitados al contratista.
- El día 24 de marzo de 2026, mediante comunicado DON-1624-ICCU-081-2026, la interventoría realiza observaciones al informe mensual Nº1 del contratista.
- Derivado del ítem anterior, el 24 de marzo de 2026, se programa y desarrolla mesa de trabajo SST entre contratista e interventoría a fin de acordar modificaciones y condiciones de presentación de los informes mensuales.
- El 25 de marzo de 2026 la interventorìa radica mediante comunicado DON-1624-ICCU-092-2026, al ICCU el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SGSST de interventoria

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante la semana se presentaron las siguientes situaciones probelmaticas:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

El contratista no ha presentado los ajustes solicitados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, retrasando su aprobación

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante visita de campo se evidenció que el punto de atención a la comunidad no se encuentra habilitado ni equipado, afectando el componente social del proyecto

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
ENTREGA DELPLAN SST	CONTRATISTA	26/03/2026
REVISIÓN PUNTO SAU	CONTRATISTA	26/03/2026

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- La interventoría ha realizado seguimiento permanente a las actividades desarrolladas por el contratista, verificando el cumplimiento de los compromisos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en los documentos contractuales.
- El avance programado acumulado es del 10% que corresponde a $ 7.843.399.923 el avance ejecutado acumulado del 10% que corresponde a $ 7.843.399.923 esto respecto a la programación V5 correspondiente a la aprobación de la amplición de la etapa preconstrctiva en un plazo de 15 dias calendario.
- En el componente ambiental, el documento PAGA en su versión 2 no cumple con los requisitos técnicos mínimos establecidos, por lo que no es viable su aprobación, quedando el contratista comprometido a presentar una nueva versión ajustada conforme a las observaciones realizadas por la interventoría.
- Se identifican incumplimientos y aspectos pendientes por parte del contratista, especialmente en la entrega oportuna de documentación contractual (como el SG-SST y soportes de vinculación del personal), así como en la atención de requerimientos técnicos, lo cual ha requerido la emisión de solicitudes formales y mesas de trabajo para su respectiva subsanación.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Equipo de topogrfia en campo

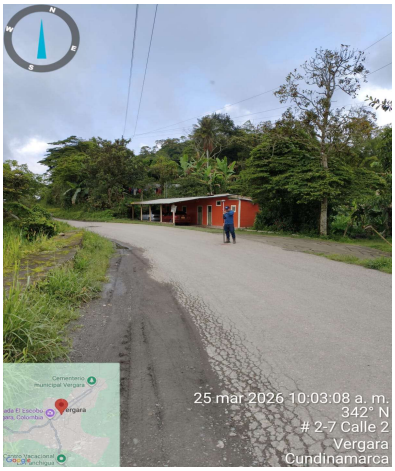


Imagen 2. Equipo de topogrfia en campo



Imagen 3. Equipo de topogrfia en campo



Imagen 4. Equipo de topogrfia en campo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JUAN DIEGO ARENAS
