

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO DE ALCANTARILLADO - CONSORCIO LOS POZOS 2025**	**258,75 días**	**vie 28/11/25**	**lun 17/08/26**
2		**FIRMA ACTA DE INICIO**	**1 día**	**vie 28/11/25**	**sáb 29/11/25**
3		Visita en campo y Remisión de Informe 0	15 días	vie 28/11/25	sáb 13/12/25
4		**Suspensión No. 1**	**27,75 días**	**mar 16/12/25**	**vie 16/01/26**
5		**Suspensión No. 2**	**17,13 días**	**sáb 17/01/26**	**mar 3/02/26**
6		**Ejecución contrato**	**196,13 días**	**mar 3/02/26**	**lun 17/08/26**
7		**ALCANTARILLADO EL DORADO**	**33,13 días**	**mié 4/02/26**	**lun 9/03/26**
8		**1. PRELIMINARES EL DORADO**	**17 días**	**mié 4/02/26**	**sáb 21/02/26**
9		1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	2 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26
10		1.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	4 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26
11		1.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	9 días	sáb 7/02/26	lun 16/02/26
12		1.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	3 días	jue 12/02/26	dom 15/02/26
13		1.5 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	2 días	dom 15/02/26	mar 17/02/26
14		1.6 DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN CONCRETO HASTA E = 12 CM.(INCLUYE CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE HASTA 5KM.)	3 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26
15		1.7 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	2 días	jue 19/02/26	sáb 21/02/26
16		1.8 ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	9 días	dom 8/02/26	mar 17/02/26
17		1.9 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	5 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26
18		**2. ALCANTARILLADO EL DORADO**	**14 días**	**dom 8/02/26**	**dom 22/02/26**
19		2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 24"	9 días	vie 13/02/26	dom 22/02/26
20		2.2 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	5 días	sáb 14/02/26	jue 19/02/26
21		2.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	2 días	vie 13/02/26	dom 15/02/26
22		2.4 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	6 días	mar 10/02/26	lun 16/02/26
23		2.5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	3 días	dom 8/02/26	mié 11/02/26
24		2.6 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	3 días	sáb 14/02/26	mar 17/02/26
25		2.7 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"	1 día	sáb 14/02/26	dom 15/02/26
26		2.8 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	2 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26
27		**3. RELLENOS EL DORADO**	**7 días**	**jue 19/02/26**	**jue 26/02/26**
28		3.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	3 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26
29		3.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26
30		3.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	1 día	mié 25/02/26	jue 26/02/26
31		**4. PAVIMENTO Y ANDENES EL DORADO**	**3 días**	**jue 26/02/26**	**dom 1/03/26**
32		4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	3 días	jue 26/02/26	dom 1/03/26
33		**5. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL EL DORADO**	**1 día**	**vie 27/02/26**	**sáb 28/02/26**
34		5.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES.(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
35		**6. MANTENIMIENTO EL DORADO**	**2 días**	**sáb 21/02/26**	**lun 23/02/26**
36		6.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR	2 días	sáb 21/02/26	lun 23/02/26
37		**7. NO PREVISTOS EL DORADO**	**21,13 días**	**lun 16/02/26**	**lun 9/03/26**
38		3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	15 días	dom 22/02/26	lun 9/03/26
39		3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUES DE 5 KM).	15 días	lun 16/02/26	mar 3/03/26
40		2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26
41		8.01.09 PRADIZACION (PASTO)	2 días	jue 26/02/26	sáb 28/02/26
42		NP-5 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	5 días	mar 17/02/26	dom 22/02/26
43		2.04.29 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M.	2 días	mié 18/02/26	vie 20/02/26
44		**HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO EL DORADO**	**0 días**	**lun 9/03/26**	**lun 9/03/26**
45		**ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS**	**79 días**	**lun 9/03/26**	**mié 27/05/26**
46		**7. PRELIMINARES PRADOS DE SAN LUIS**	**25 días**	**lun 9/03/26**	**vie 3/04/26**
47		7.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	3 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26
48		7.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	10 días	mié 11/03/26	sáb 21/03/26
49		7.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	12 días	vie 13/03/26	mié 25/03/26
50		7.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	8 días	lun 23/03/26	mar 31/03/26
51		7.5 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	3 días	mar 31/03/26	vie 3/04/26
52		7.6 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	9 días	dom 15/03/26	lun 30/03/26
53		7.7 ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	9 días	dom 15/03/26	sáb 28/03/26
54		7.8 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	9 días	sáb 14/03/26	sáb 28/03/26
55		**8. ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS**	**25 días**	**vie 13/03/26**	**mar 7/04/26**
56		8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	11 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26
57		8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	10 días	mié 25/03/26	sáb 4/04/26
58		8.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	8 días	sáb 14/03/26	dom 22/03/26
59		8.4 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	15 días	mié 18/03/26	jue 2/04/26
60		8.5 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	3 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26
61		8.6 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M (3.50< h < 4.70) (INCLUYE ARO Y TAPA).	5 días	jue 2/04/26	mar 7/04/26
62		8.7 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	6 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26
63		8.8 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	9 días	lun 23/03/26	sáb 4/04/26
64		8.9 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"	9 días	lun 23/03/26	sáb 4/04/26
65		8.10 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	9 días	lun 23/03/26	sáb 4/04/26
66		**9. RELLENOS PRADOS DE SAN LUIS**	**63 días**	**sáb 21/03/26**	**sáb 23/05/26**
67		9.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO	6 días	sáb 21/03/26	vie 27/03/26
68		9.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	15 días	vie 8/05/26	sáb 23/05/26
69		9.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA	3 días	mié 20/05/26	sáb 23/05/26
70		**10. PAVIMENTO Y ANDENES PRADOS DE SAN LUIS**	**6 días**	**jue 21/05/26**	**mié 27/05/26**
71		10.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE	6 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
72		**11. SUMIDEROS PRADOS DE SAN LUIS**	**12 días**	**mié 18/03/26**	**lun 30/03/26**
73		11.1 SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN POLIPROPILENO	6 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26
74		11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	3 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26
75		**12. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PRADOS DE SAN LUIS**	**9 días**	**dom 5/04/26**	**mar 14/04/26**
76		12.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES.(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	9 días	dom 5/04/26	mar 14/04/26
77		**13. MANTENIMIENTO PRADOS DE SAN LUIS**	**6 días**	**lun 30/03/26**	**dom 5/04/26**

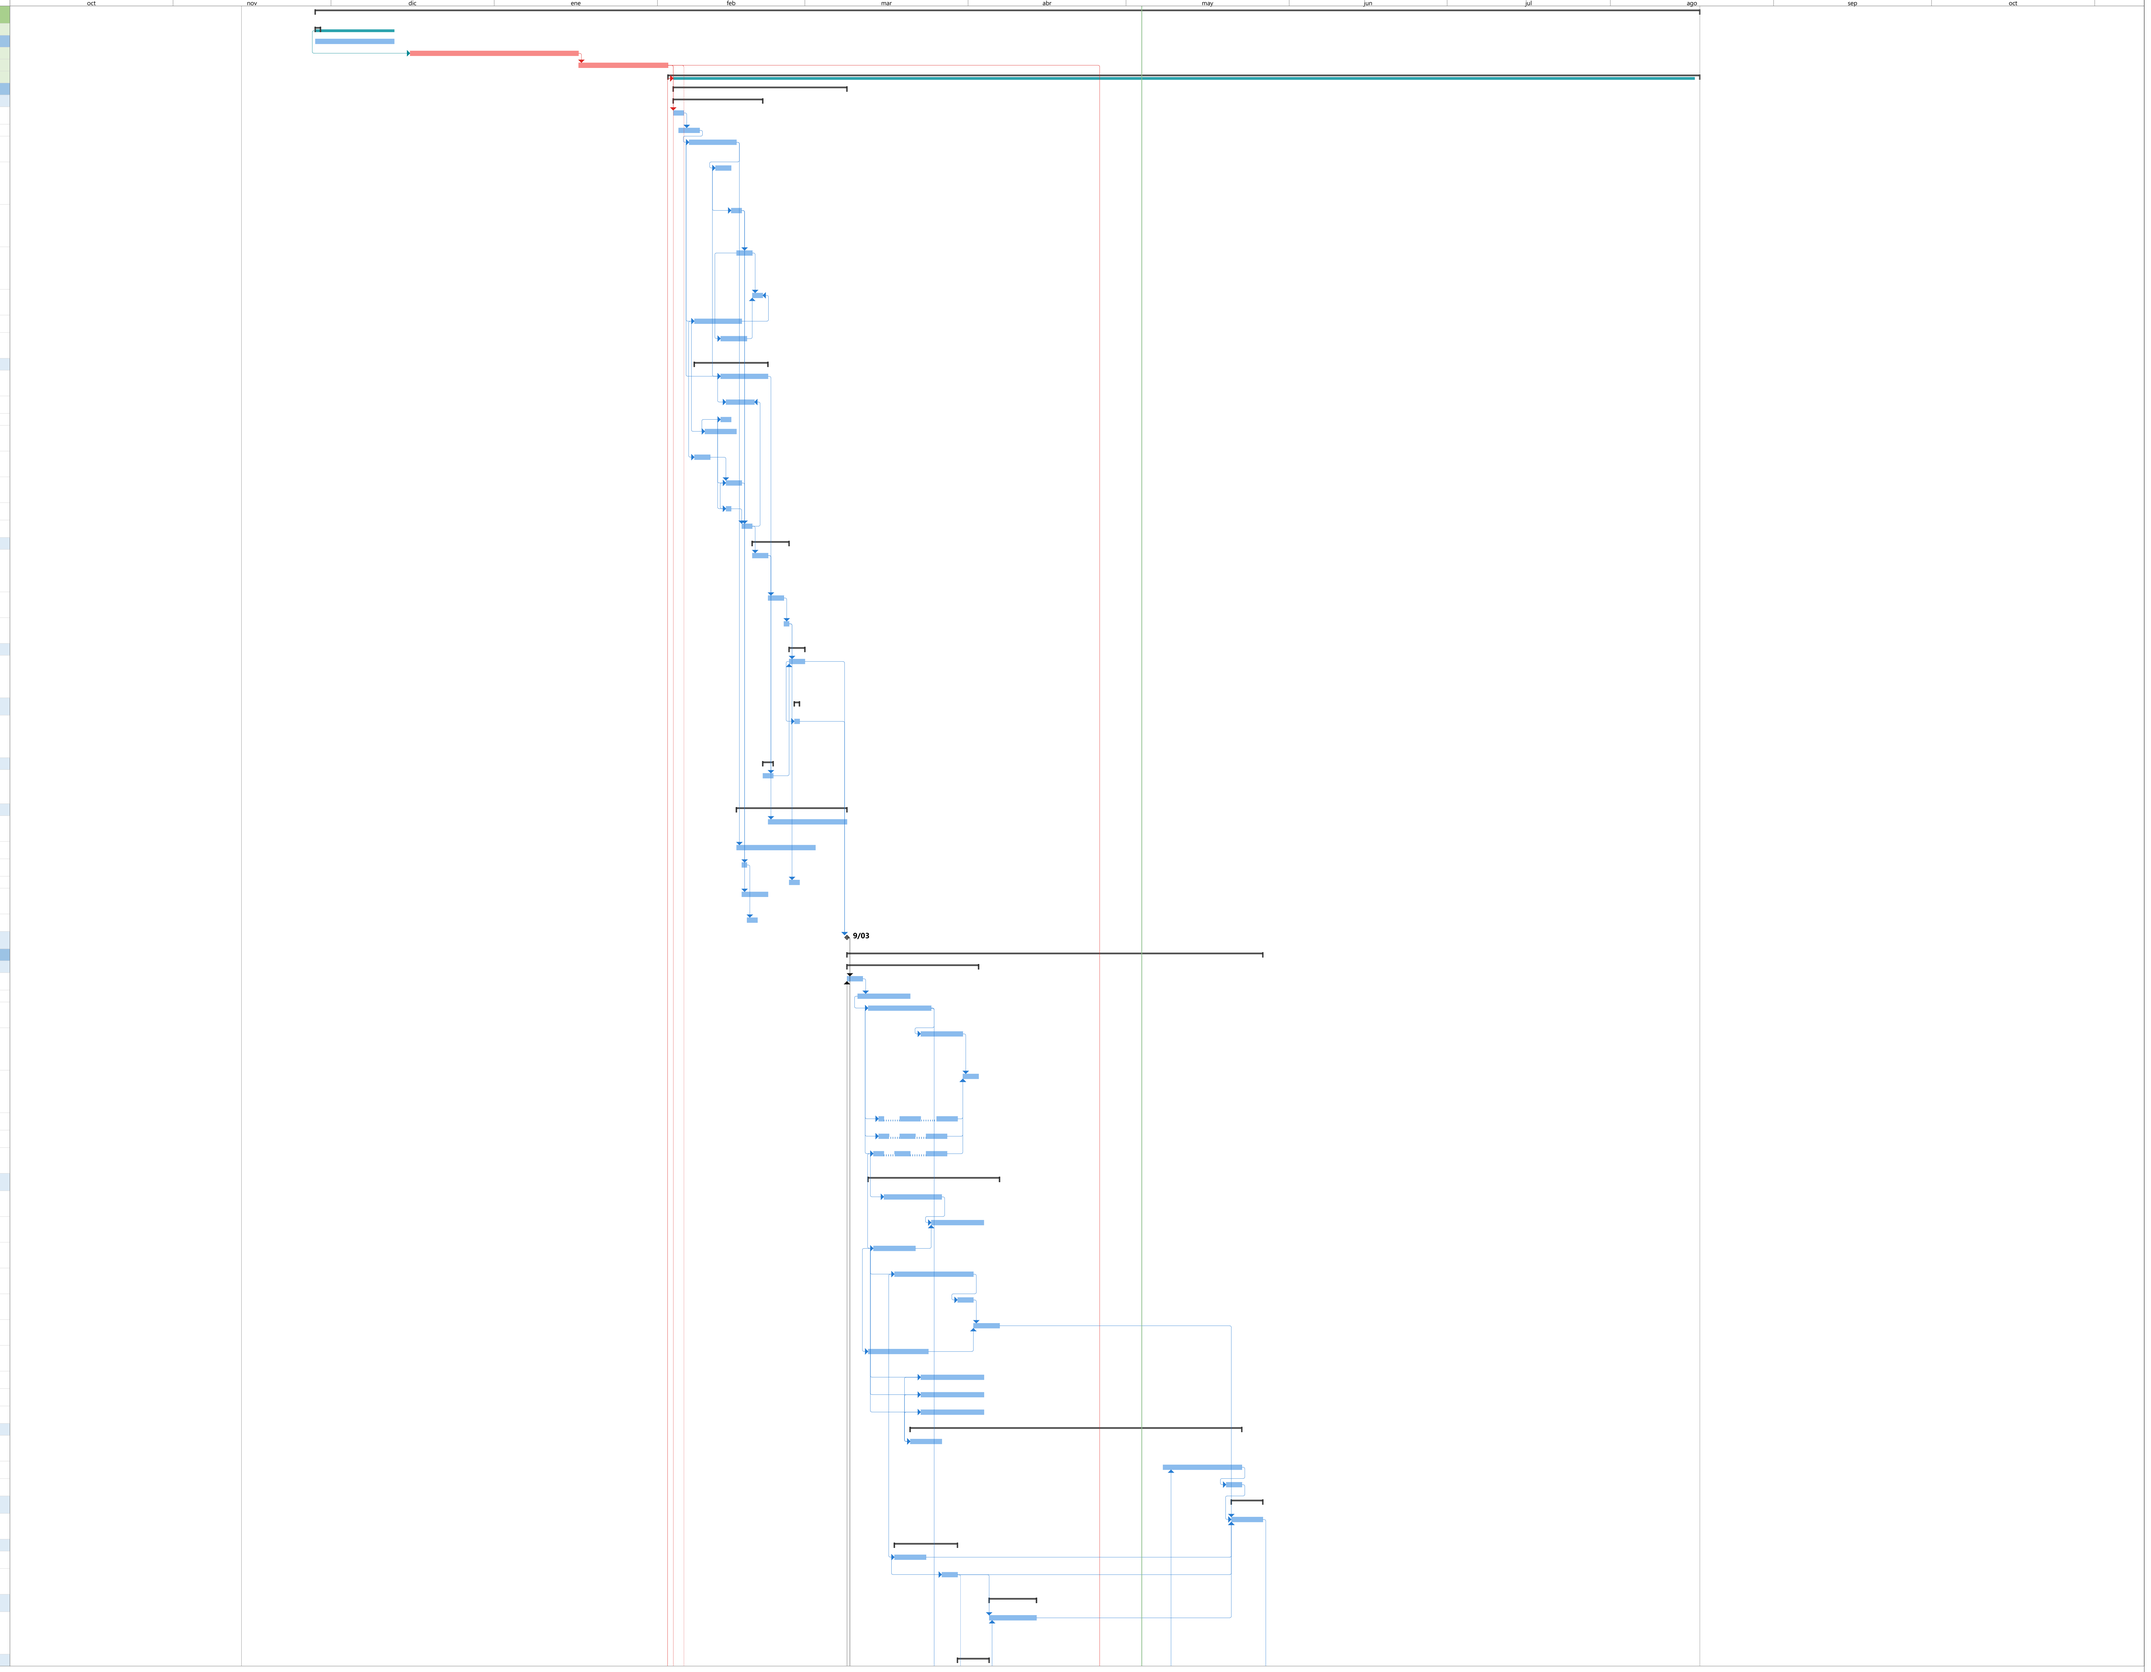


Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
Fecha: lun 4/05/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
78		13.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR	6 días	lun 30/03/26	dom 5/04/26
79		**14. NO PREVISTOS SAN LUIS**	**45 días**	**mié 25/03/26**	**sáb 9/05/26**
80		3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	20 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
81		3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	23 días	mié 25/03/26	vie 17/04/26
82		5.02.07 DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	23 días	mié 25/03/26	vie 17/04/26
83		ENTIBADO EN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO CAJÓN ALTURA HASTA 5.20 (INCLUYE TRANSPORTE Y EQUIPO DE IZAJE)	45 días	mié 25/03/26	sáb 9/05/26
84		**HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS**	**0 días**	**mié 27/05/26**	**mié 27/05/26**
85		**ALCANTARILLADO SANTA CATALINA**	**38 días**	**lun 9/03/26**	**jue 16/04/26**
86		**14. PRELIMINARES SANTA CATALINA**	**23 días**	**lun 9/03/26**	**mié 1/04/26**
87		14.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	3 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26
88		14.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	7 días	mié 11/03/26	mié 18/03/26
89		14.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	11 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26
90		14.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	10 días	dom 22/03/26	mié 1/04/26
91		14.5 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	3 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26
92		14.6 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	9 días	dom 15/03/26	mar 31/03/26
93		14.7 ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	9 días	dom 15/03/26	mar 31/03/26
94		14.8 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	6 días	sáb 14/03/26	vie 27/03/26
95		**15. ALCANTARILLADO SANTA CATALINA**	**32 días**	**vie 13/03/26**	**mar 14/04/26**
96		15.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	15 días	lun 16/03/26	mar 31/03/26
97		15.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	12 días	jue 26/03/26	mar 7/04/26
98		15.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	31 días	sáb 14/03/26	mar 14/04/26
99		15.4 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	5 días	lun 30/03/26	sáb 4/04/26
100		15.5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	7 días	vie 13/03/26	sáb 4/04/26
101		15.6 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	10 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26
102		15.7 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"	10 días	sáb 28/03/26	vie 10/04/26
103		15.8 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	10 días	sáb 28/03/26	vie 10/04/26
104		**16. RELLENOS SANTA CATALINA**	**18 días**	**vie 20/03/26**	**mar 7/04/26**
105		16.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	5 días	jue 2/04/26	mar 7/04/26
106		16.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	18 días	vie 20/03/26	mar 7/04/26
107		16.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	3 días	sáb 4/04/26	mar 7/04/26
108		**17. PAVIMENTO Y ANDENES SANTA CATALINA**	**6 días**	**mar 7/04/26**	**lun 13/04/26**
109		17.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	6 días	mar 7/04/26	lun 13/04/26
110		**18. SUMIDEROS SANTA CATALINA**	**17 días**	**sáb 21/03/26**	**mar 7/04/26**
111		18.1 SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN POLIPROPILENO	7 días	sáb 21/03/26	lun 6/04/26
112		18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	11 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
113		**19. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL SANTA CATALINA**	**25 días**	**lun 16/03/26**	**vie 10/04/26**
114		19.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	12 días	lun 16/03/26	vie 10/04/26
115		**20. MANTENIMIENTO SANTA CATALINA**	**11 días**	**vie 27/03/26**	**mar 7/04/26**
116		20.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
117		**21. NO PREVISTOS SANTA CATALINA**	**23 días**	**mar 24/03/26**	**jue 16/04/26**
118		3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	20 días	mar 24/03/26	lun 13/04/26
119		3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	23 días	mar 24/03/26	jue 16/04/26
120		5.02.07 DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	23 días	mar 24/03/26	jue 16/04/26
121		5.01.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	2 días	vie 27/03/26	dom 29/03/26
122		2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	mar 24/03/26	mié 25/03/26
123		2.04.29 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M.	2 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26
124		**HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO SANTA CATALINA**	**0 días**	**jue 16/04/26**	**jue 16/04/26**
125		**ALCANTARILLADO PATRIOTAS**	**25 días**	**mié 4/02/26**	**dom 1/03/26**
126		**21. PRELIMINARES PATRIOTAS**	**14 días**	**mié 4/02/26**	**mié 18/02/26**
127		21.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	2 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26
128		21.2 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	7 días	jue 5/02/26	jue 12/02/26
129		21.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4 días	mié 11/02/26	dom 15/02/26
130		21.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5	2 días	vie 13/02/26	dom 15/02/26
131		21.5 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	3 días	dom 15/02/26	mié 18/02/26
132		21.6 ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	7 días	dom 8/02/26	mié 18/02/26
133		21.7 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	5 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26
134		**22. ALCANTARILLADO PATRIOTAS**	**14,25 días**	**dom 8/02/26**	**lun 23/02/26**
135		22.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	10 días	vie 13/02/26	lun 23/02/26
136		22.2 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	7 días	dom 8/02/26	dom 15/02/26
137		22.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	6 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
138		22.4 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	4 días	dom 8/02/26	dom 15/02/26
139		22.5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	3 días	mar 17/02/26	sáb 21/02/26
140		22.6 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"	4 días	sáb 14/02/26	jue 19/02/26
141		22.7 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	4 días	dom 15/02/26	vie 20/02/26
142		**23. RELLENOS PATRIOTAS**	**6 días**	**jue 19/02/26**	**mié 25/02/26**
143		23.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	2 días	jue 19/02/26	sáb 21/02/26
144		23.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	4 días	sáb 21/02/26	mié 25/02/26
145		23.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26
146		**24. SUMIDEROS PATRIOTAS**	**4 días**	**vie 20/02/26**	**mar 24/02/26**
147		24.1 SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN POLIPROPILENO	3 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26
148		24.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	4 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26
149		**25. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PATRIOTAS**	**4 días**	**mié 25/02/26**	**dom 1/03/26**
150		25.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	4 días	mié 25/02/26	dom 1/03/26

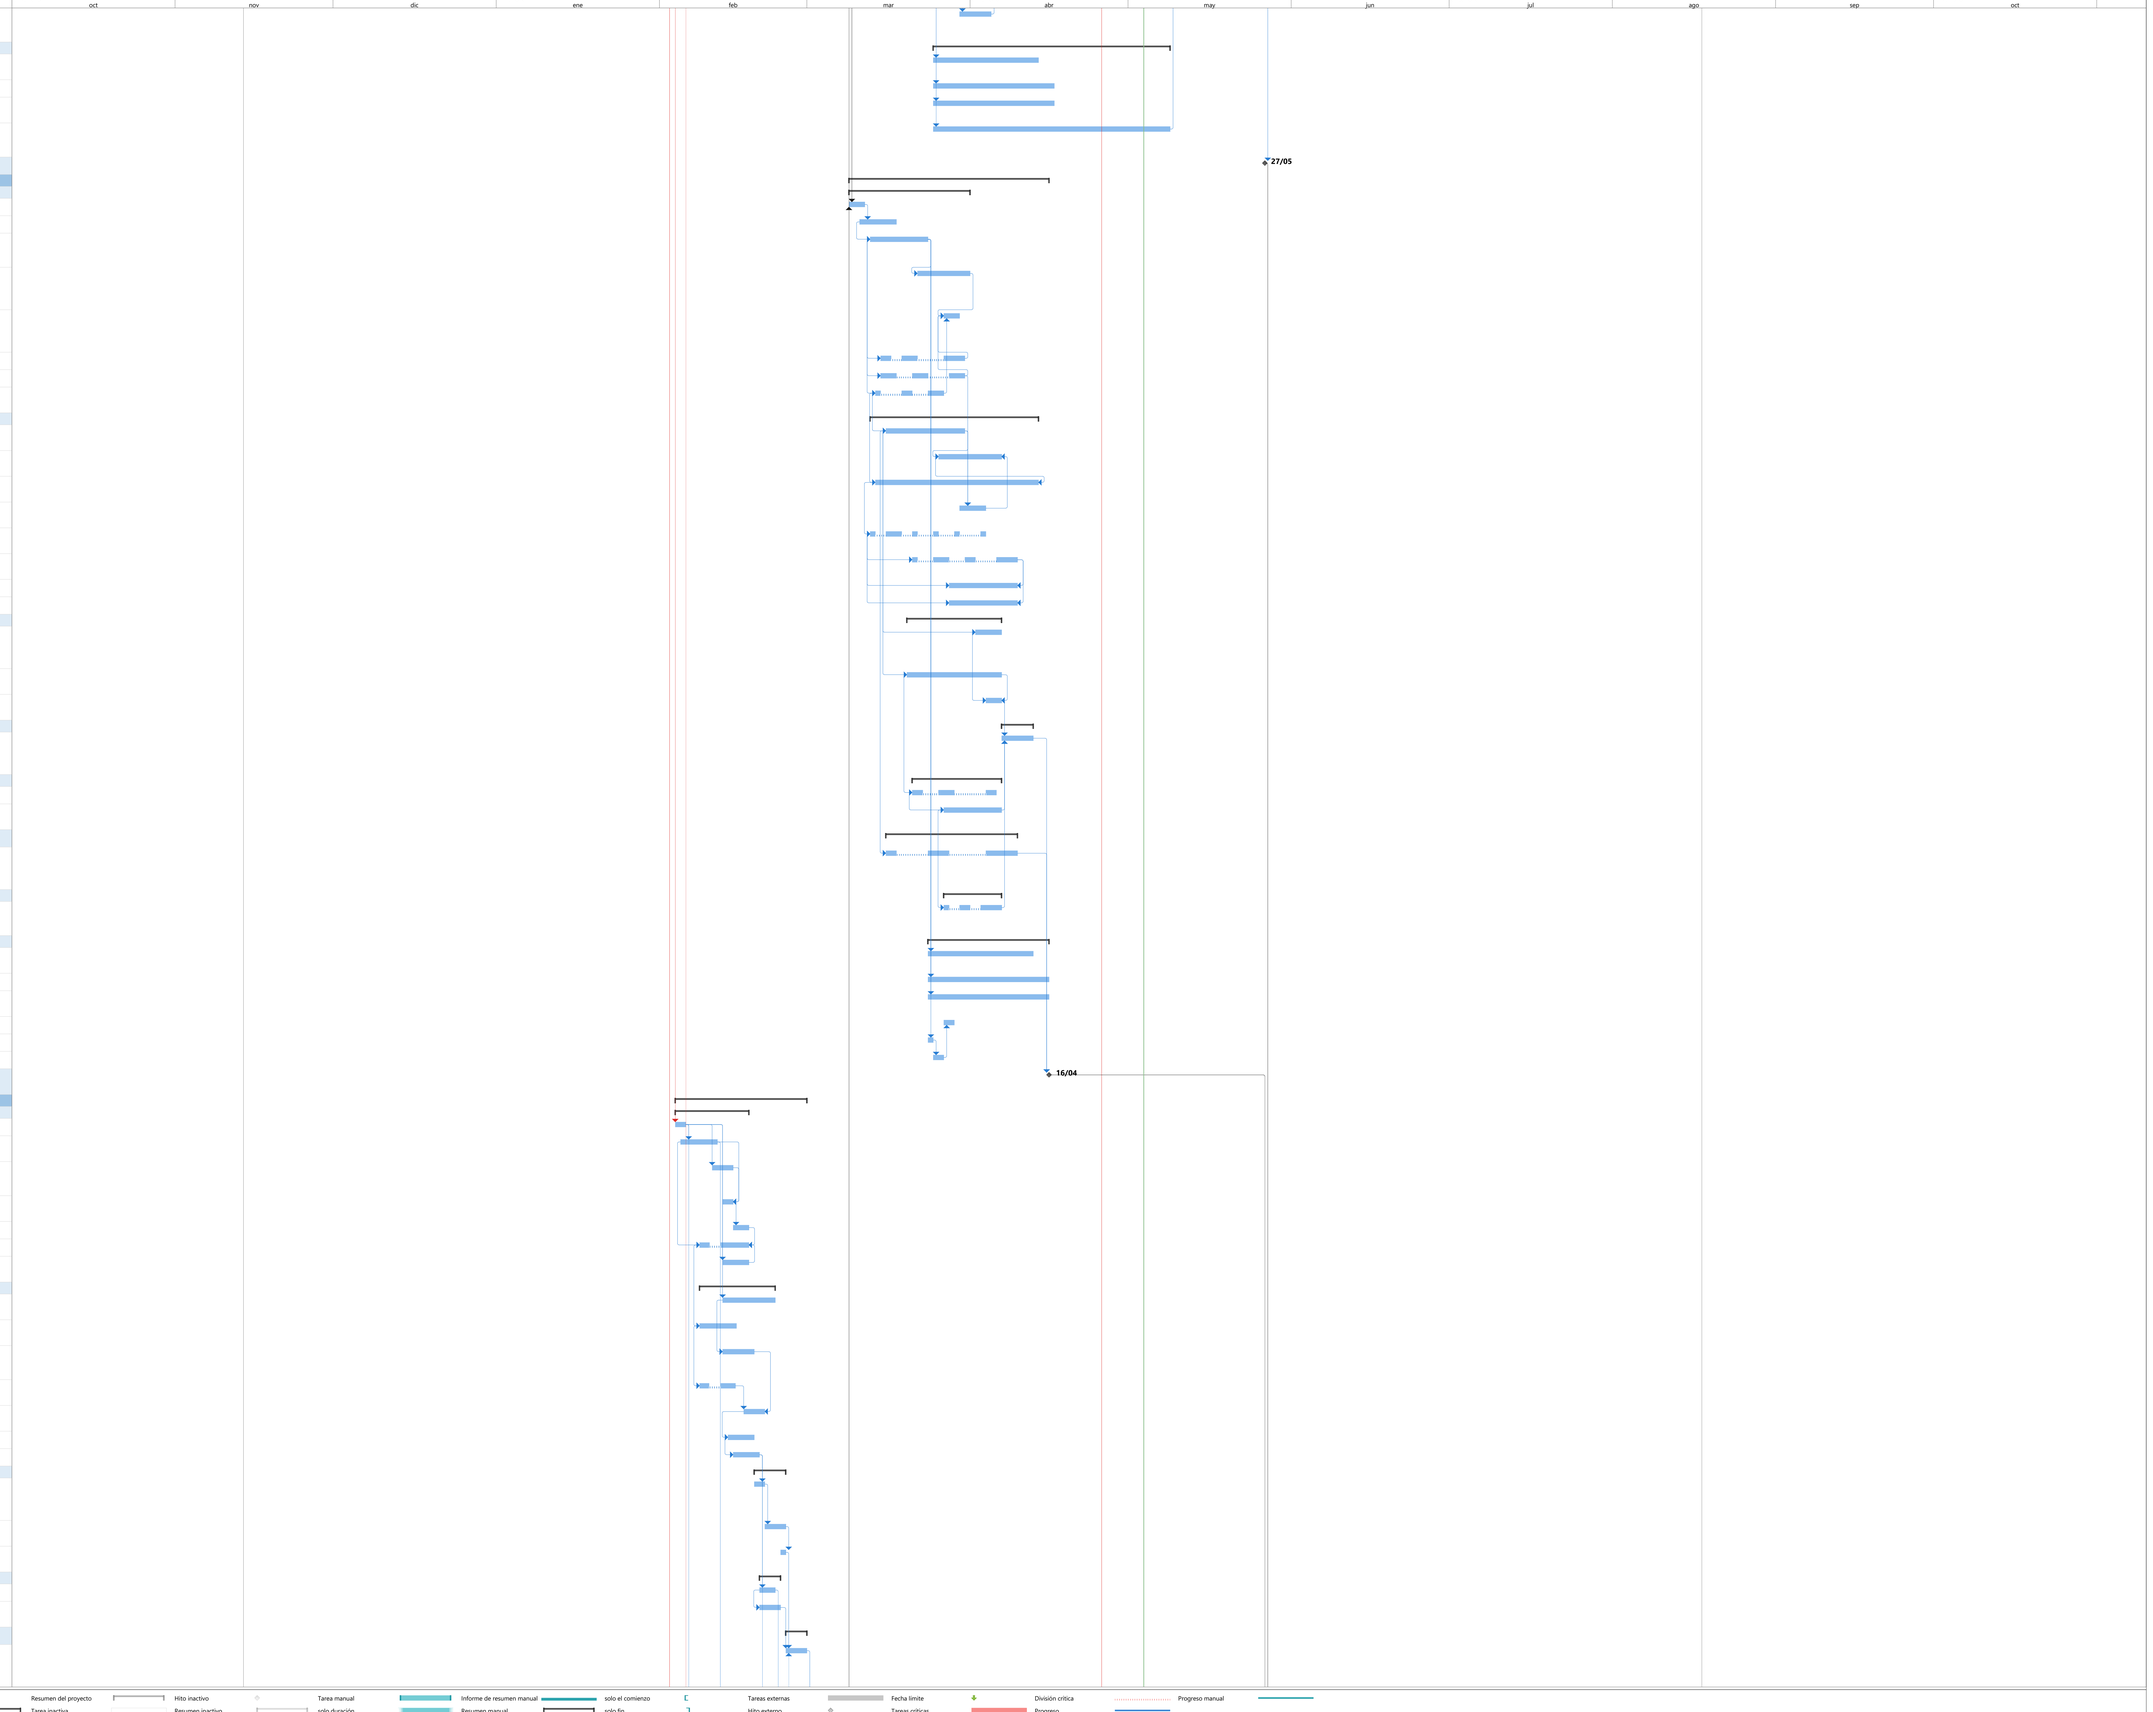

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
151		**26. MANTENIMIENTO PATRIOTAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**
152		**26.1** INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26
153		**27. NO PREVISTOS PATRIOTAS**	**21 días**	**vie 6/02/26**	**vie 27/02/26**
154		APU 1.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	2 días	vie 6/02/26	dom 8/02/26
155		3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	7 días	vie 20/02/26	vie 27/02/26
156		3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	13 días	jue 12/02/26	mié 25/02/26
157		**HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO PATRIOTAS**	**0 días**	**dom 1/03/26**	**dom 1/03/26**
158		**ALCANTARILLADO VILLA BACHUE**	**54 días**	**mié 27/05/26**	**lun 20/07/26**
159		**27. PRELIMINARES VILLA BACHUE**	**28 días**	**mié 27/05/26**	**mié 24/06/26**
160		**27.1** LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	3 días	mié 27/05/26	sáb 30/05/26
161		**27.2** CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	8 días	jue 28/05/26	vie 5/06/26
162		**27.3** EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	14 días	sáb 30/05/26	sáb 13/06/26
163		**27.4** EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	11 días	sáb 13/06/26	mié 24/06/26
164		**27.5** EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	3 días	dom 21/06/26	mié 24/06/26
165		**27.6** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	9 días	lun 1/06/26	lun 15/06/26
166		**27.7** ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	9 días	lun 1/06/26	dom 21/06/26
167		**27.8** SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	6 días	dom 31/05/26	dom 14/06/26
168		**28. ALCANTARILLADO VILLA BACHUE**	**24 días**	**mar 2/06/26**	**vie 26/06/26**
169		**28.1** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	11 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26
170		**28.2** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	13 días	sáb 13/06/26	vie 26/06/26
171		**28.3** POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	6 días	mar 2/06/26	lun 8/06/26
172		**28.4** POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (INCLUYE ARO Y TAPA).	17 días	lun 8/06/26	jue 25/06/26
173		**28.5** CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	19 días	mié 3/06/26	lun 22/06/26
174		**28.6** CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	11 días	dom 7/06/26	mié 24/06/26
175		**28.7** PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"	14 días	lun 8/06/26	jue 25/06/26
176		**28.8** BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	12 días	lun 8/06/26	jue 25/06/26
177		**29. RELLENOS VILLA BACHUE**	**19 días**	**dom 7/06/26**	**vie 26/06/26**
178		**29.1** RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4 días	dom 21/06/26	jue 25/06/26
179		**29.2** RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	19 días	dom 7/06/26	vie 26/06/26
180		**29.3** RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	3 días	mar 23/06/26	vie 26/06/26
181		**30. PAVIMENTO Y ANDENES VILLA BACHUE**	**7 días**	**vie 26/06/26**	**vie 3/07/26**
182		**30.1** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE	7 días	vie 26/06/26	vie 3/07/26
183		**31. SUMIDEROS VILLA BACHUE**	**18 días**	**lun 8/06/26**	**vie 26/06/26**
184		**31.1** SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN POLIPROPILENO	8 días	lun 8/06/26	vie 26/06/26
185		**31.2** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	11 días	lun 15/06/26	vie 26/06/26
186		**32. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL VILLA BACHUE**	**10 días**	**lun 15/06/26**	**jue 25/06/26**
187		**32.1** CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	8 días	lun 15/06/26	jue 25/06/26
188		**33. MANTENIMIENTO VILLA BACHUE**	**3 días**	**lun 15/06/26**	**jue 18/06/26**
189		**33.1** INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR	3 días	lun 15/06/26	jue 18/06/26
190		**34. NO PREVISTOS VILLA BACHUE**	**37 días**	**sáb 13/06/26**	**lun 20/07/26**
191		3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	25 días	jue 25/06/26	lun 20/07/26
192		3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	25 días	sáb 13/06/26	mié 8/07/26
193		**HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO VILLA BACHUE**	**0 días**	**lun 20/07/26**	**lun 20/07/26**
194		**POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE**	**28 días**	**lun 20/07/26**	**lun 17/08/26**
195		**34. PRADOS DEL NORTE**	**28 días**	**lun 20/07/26**	**lun 17/08/26**
196		**34.1** LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	3 días	lun 20/07/26	jue 23/07/26
197		**34.2** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017)	15 días	mar 21/07/26	mié 5/08/26
198		**34.3** CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	14 días	lun 3/08/26	lun 17/08/26
199		**34.4** SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	6 días	lun 3/08/26	dom 9/08/26
200		**HITO FINALIZACIÓN POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE**	**0 días**	**lun 17/08/26**	**lun 17/08/26**
201		**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)**	**192,88 días**	**vie 6/02/26**	**lun 17/08/26**
202		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)**	**114 días**	**dom 26/04/26**	**lun 17/08/26**
203		**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**lun 17/08/26**	**lun 17/08/26**

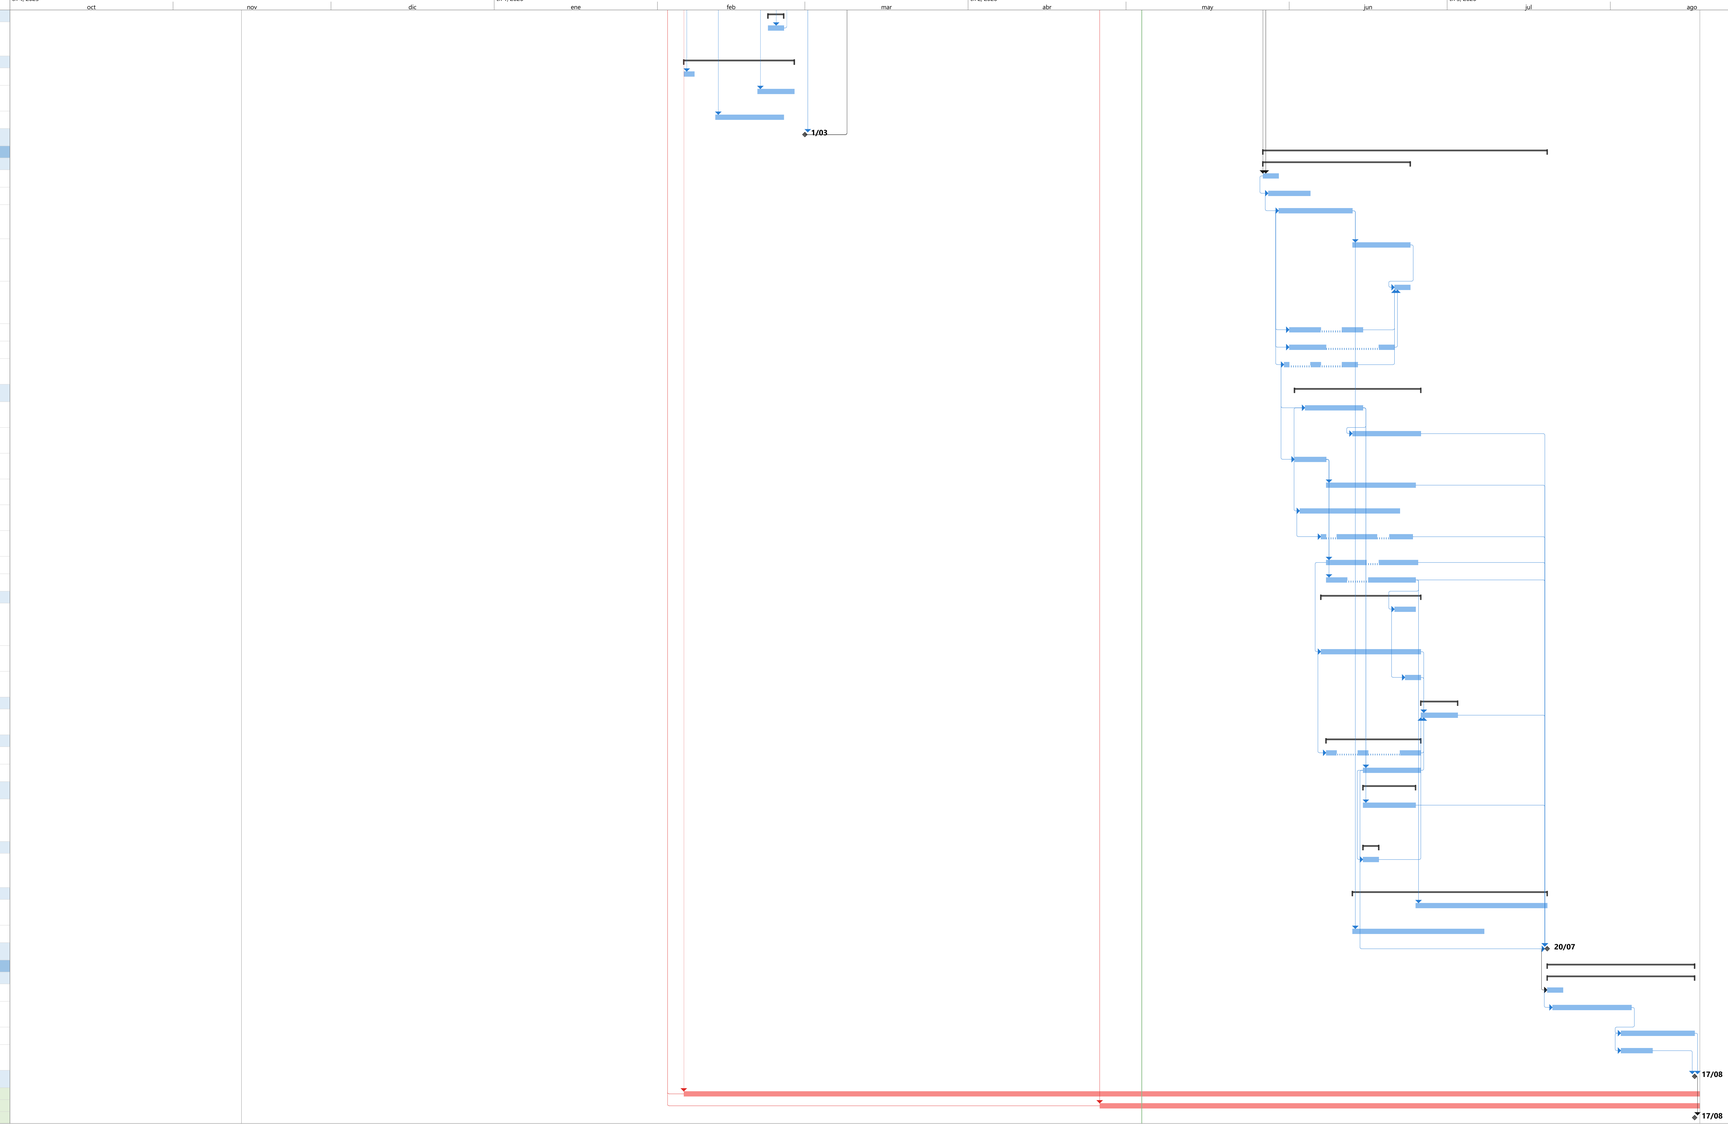

CARLOS ANDRES SANCHEZ ALBAN
R/L CONSORCIO LOS POZOS 2025
NIT 902004824

INTERVENTORIA
LUIS ALEJANDRO MORENO NUMPAQUE
