EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 4

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0805 DE 2025

DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0797 DE 2025

DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

R/L LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA

DICIEMBRE DE 2025

Contenido

1. GENERALIDADES 5

1.1. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA No 797 DE 2025 5

1.2. GENERALIDADES CONTRATO DE CONSULTORIA NO 0805 DE 2025 6

1.3. LOCALIZACION DEL GENERAL 7

1.2.1. LOCALIZACION ESPECIFICA 7

2. ASPECTOS TECNICOS 8

2.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 9

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO 9

2.3. DESARROLLO DEL PROYECTO 10

2.4. PRESUPUESTO CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 805 DE 2025 11

2.5. PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA No 797 DE 2025 11

2.5.3. Inconvenientes técnicos y determinaciones 33

2.6. METAS FISICAS EJECUTADAS 34

2.7.1. Metas físicas contrato de Obra No 797 de 2025 34

2.7.2. Metas físicas contrato de Interventoría No 805 de 2025 35

2.7. ESQUEMA FÍSICO DE LA INTERVENTORÍA 37

2.8. Bitácora de Obra 37

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 38

3.1. RESUMEN DE ACTAS 39

3.1.2. Actas suscritas del contrato de interventoría No 805 de 2025 39

3.2. PERSONAL 39

3.2.2. Personal Contrato de interventoría 39

3.3. ACTUACIONES 40

3.3.1. Correspondencia Enviada 40

3.3.2. Correspondencia Recibida 40

3.4. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 40

3.4.2. Seguridad social contrato de Interventoría No 805 de 2025 40

3.4.3. Estampillas Contrato de Obra No 797 de 2025 41

De acuerdo a la anterior información, se adjunta el pago de estampillas del contrato en el capítulo de anexos 41

3.4.4. Estampillas Contrato de Interventoría No 805 de 2025 41

3.4.5. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de Interventoría No 735 de 2025 41

3.4.6. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de obra No 797 de 2025 42

4. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 44

4.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 45

4.1.1. Balance Financiero contrato de Obra No 797 de 2025 45

Nota: A la fecha no se ha realizado el trámite para anticipo 46

4.2.2. Plan de Inversión de Anticipo contrato de Interventoría No 805 de 2025 47

Nota: En el presente mes se inició con el trámite para anticipo 47

5. SEGUIMIENTO JURIDICO 48

5.1. CONTROL DE POLIZAS 49

5.1.2. Control de Pólizas de Obra 49

5.1.3. Control de Pólizas de Interventoría 53

6. CONCLUSIONES 57

INTRODUCCION

Mediante Resolución No 013 La alcaldía del municipio de Aguazul, adjudico el proceso de licitación pública No MA-LP-SI-005-2025, con objeto MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, al CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025, con Nit. 901.981.507-9, Representado inicialmente por **NESTOR STIVEN ROA MARTINEZ** e identificado con cedula de ciudadanía No 1.116.547.336 de Aguazul, y mediante acta No 1 de asamblea general los miembros del consorcio proponen como nuevo Representante legal a la **Arquitecta LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA** identificada con cedula de ciudadanía No 1.116.5446.919 de Aguazul. Suscribiendo el contrato de obra pública No 0797 del 12 de septiembre de 2025., por valor de QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($520.800.049,00) M/CTE, con un plazo de TRES (3) MESES.

Así mismo, mediante Resolución No 025 del 15 de septiembre de 2025, se adjudicó el proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos No. MA-CMA-SI-010-2025 con el objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, a EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ con cedula No 79.799.614, de Bogotá, suscribiendo el contrato de consultoría No 0805 del 15 de septiembre del 2025, por un valor de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($50.649.554,00), con un plazo de ejecución de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, en el cual se ejercerá la función de representar a la secretaria de infraestructura, en la supervisión y control de las acciones del contratista de obra, verificando de que se cumpla con las especificaciones y normas técnicas, las actividades respecto al componente técnico, administrativo, financiero, legal y contable, establecidos en las reglas de participación y en el contrato celebrado por la entidad.

El presente **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4** correspondiente al periodo del **1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, refleja las actividades realizadas por parte de la interventoría, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal y contable.

1. GENERALIDADES

1.1. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA No 797 DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAGUAZUL
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA
N.I.T.	901.981.507-9
CONTRATO DE OBRA No.	0797 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO (MESES)	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	20 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	19 DE ENERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($520.800.049,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO 30%	$ 156.240.014,70
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.2. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0805 DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
INTERVENTOR	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT/ C.C	79.799.614
CONTRATO DE COSULTORÍA N°	0805 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO (MESES)	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($50.649.554,00).
VALOR SIN IVA	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42.562.650,00)
VALOR IVA (19%)	OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS. M/CTE ($8.086.904,00)
VALOR DE ANTICIPO (50%)	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($25.324.777,00)

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


1.3. LOCALIZACION DEL GENERAL

El municipio de Aguazul se encuentra en las estribaciones de la cordillera oriental, en la zona de transición con las sábanas, el denominado piedemonte llanero, el cual comprende el borde este de la cordillera oriental y el límite oeste de la cuenca de los llanos orientales.

El Municipio de Aguazul posee una Extensión total: 148 Km2, distribuidos de la siguiente manera: extensión área urbana: 4.23 Km2, extensión área rural: 143.77 Km2 y con una altitud de la cabecera municipal es de 300 (metros sobre el nivel del mar): y una temperatura media:27C

1.2.1. LOCALIZACION ESPECIFICA

Las actividades del proyecto se realizarán carrera 10 con calle 19 Esquina Cancha Sintética San Carlos, Barrio San Carlos del Municipio de Aguazul Departamento de Casanare

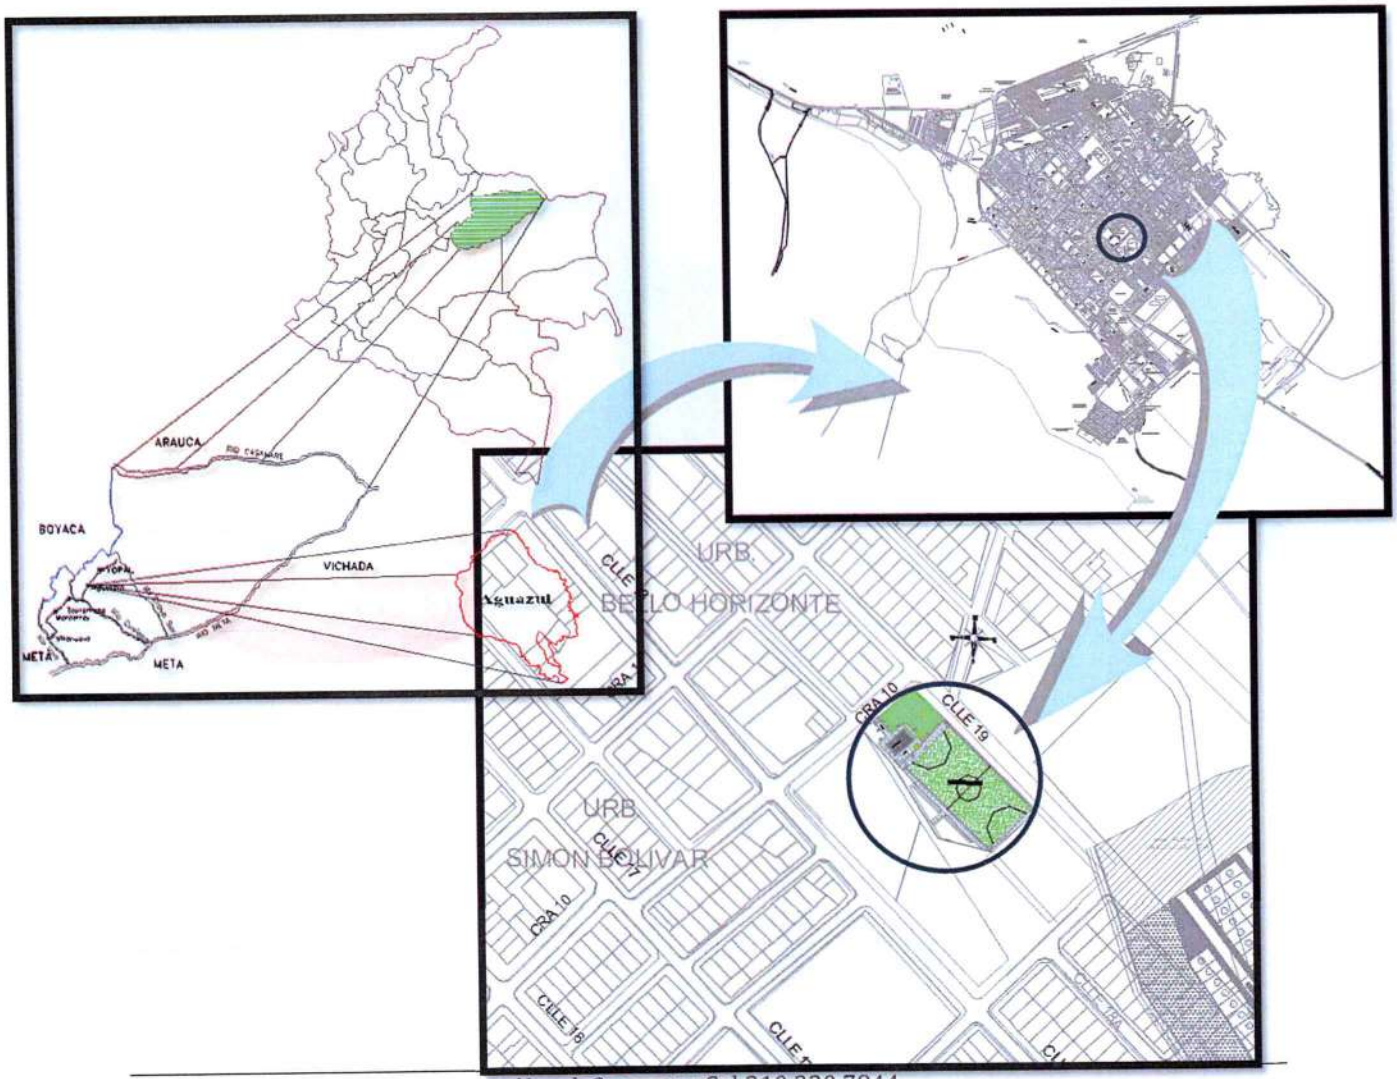

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

2. ASPECTOS TECNICOS

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

2.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El contrato de obra No 0797, suscrito entre el Municipio de Aguazul y El CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025 con objeto **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"** con un valor de QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 520.800.049,00). El proyecto consiste en El mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva es crucial para garantizar su funcionamiento óptimo y la seguridad de quienes los utilizan. Sin embargo, es común observar un deterioro gradual debido a la falta de atención adecuada. Por ejemplo, en el caso se realizará mantenimiento al escenario deportivo Cancha Sintética "Unión San Carlos" el cual cuya función es ofrecer un servicio para el deporte. Es fundamental contar con una infraestructura física robusta y bien mantenida para proteger estos bienes, ya que cualquier deterioro en las instalaciones podría comprometer su integridad, ocasionando pérdidas económicas y afectando la capacidad del municipio para responder eficientemente a sus necesidades deportivas.

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como propósito principal realizar el mantenimiento integral de la Cancha Sintética San Carlos, ubicada en el municipio de Aguazul, Casanare, con el fin de preservar y optimizar las condiciones físicas y funcionales del escenario deportivo, garantizando así su adecuada utilización por parte de la comunidad. Este espacio constituye un punto de encuentro y esparcimiento para niños, jóvenes y adultos, promoviendo el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración social en condiciones seguras y confortables.

Dentro del alcance del mantenimiento se contemplan diversas actividades orientadas a mejorar tanto la infraestructura deportiva como los sistemas complementarios necesarios para su óptimo funcionamiento. Entre estas se destacan:

- Cambio de aparatos sanitarios en las zonas de servicio, buscando optimizar las condiciones higiénicas y de salubridad de los usuarios.
- Instalación de nueva grama sintética, acorde con las especificaciones técnicas y deportivas vigentes, que permita mejorar la superficie de juego y prolongar su durabilidad frente a las condiciones climáticas y el uso continuo.
- Instalación de malla de cerramiento lateral en el perímetro de la cancha, con el objetivo de reforzar la seguridad de los jugadores y espectadores, y evitar la pérdida o salida del balón durante las prácticas o competencias.
- Ejecución de instalaciones eléctricas para el área deportiva, incluyendo acometidas, postes metálicos, canalización mediante ductos tipo Conduit,

empalmes, sistema de puesta a tierra y bajantes de apantallamiento, todo ello en cumplimiento de la normatividad eléctrica vigente y garantizando la seguridad y funcionalidad del sistema de iluminación.

El día 12 de septiembre de 2025, se suscribe el contrato de obra No. 0797 de 2025, entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL identificada con Nit. 891.855.200-9 el cual está representado legalmente por NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO identificado con cedula de ciudadanía No. 74.183.343 expedida en Sogamoso y el contratista CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025 con Nit. 901.981.507-9 y representado legalmente por NESTOR STIVEN ROA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.116.547.336 de Aguazul. quien cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones publicado en el SECOP II dentro del proceso de selección publica No **MA-LP-SI-005-2025.**

2.3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo del contrato de obra No 797 de 2025, está dividido en 4 capítulos:

ITEM	DESCRIPCIÓN
100	PRELIMINARES
200	INSTALACIONES SANITARIAS
300	CANCHA Y CERRAMIENTO
400	INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

2.4. PRESUPUESTO CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 805 DE 2025

ITEM	ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	CANTIDAD	VALOR ACTIVIDAD
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL**		**$ 2.182.700,00**
1.1	Revisión y verificación de documentación precontractual	1	$ 1.091.350,00
1.2	Visita de reconocimiento de la zona objeto del estudio	1	$ 545.675,00
1.3	Revisión y aprobación del cronograma, plan de cargas de ejecución de la obra	1	$ 545.675,00
2	**ETAPA DE EJECUCION**		**$ 40.379.950,00**
2.1	Función Técnica	1	$ 22.263.540,00
2.2	Función Ambiental	1	$ 4.474.535,00
2.3	Función Administrativa	1	$ 4.801.940,00
2.4	Función Financiera	1	$ 2.946.645,00
2.5	Función Contable	1	$ 2.946.645,00
2.6	Función Jurídica	1	$ 2.946.645,00
SUBTOTAL			**$ 42.562.650,00**
IVA (19%)			$ 8.086.904,00
TOTAL			**$ 50.649.554,00**

2.5. PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA No 797 DE 2025

100		**PRELIMINARES**	
101	2.1.13	Desmonte aparatos sanitarios	UND
102	10.1.6	Desmonte estructuras existentes canchas	UND
200		**INSTALACIONES SANITARIAS**	
201	2.9.13	Sanitario acuacer dos piezas incluye grifería completa y asiento. Suministro e instalación	UND
202	2.9.38	Ducha conjunto individual tipo cromada, con registro full paso de 1/2"	UND
203	2.12.15	Lavamanos de incrustar san lorenzo blanco con grifería sencilla nogal de corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)	UND

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

204	10.7.1	Orinal mediano con entrada superior con grifería tipo push, Suministro e Instal.	UND
300		**CANCHA Y CERRAMIENTO**	
301	**APU**	Tubería estructural Redonda de 4" - 4,0 mm. Suministro e instalación.	M
302	2.5.1	Grama sintética tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcación. Suministro e Instal.	M2
303	3.3.1	Malla para cerramiento lateral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	M2
400		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
401	**APU**	Poste Metálico Cónico De 16m De Altura Libre, Incluye Cruceta, Peldaños Y Argollas, Incluye Base En Concreto 4000psi Para Instalación.	UND
402	10.6.33	Caja De Inspección AP-280	UND
403	8.2.10	Caja De Inspección CS-274	UND
404	**APU**	Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	M
405	8.6.14	Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG concéntrico 600 v 90°c XLPE-PVC. Suministro e Instalación.	M
406	**APU**	Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600V (3xNO. 10 AWG).	M
407	8.4.3	Puesta a tierra para terminal de ramal en baja tensión en acero inoxidable, incluye apertura de hueco, Suministro e Instalación.	UND
408	8.5.1	Proyector LED de 400W. Suministro e Instalación	UND
409	8.7.5	Empalme de baja tensión 91-b-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalación.	UND
410	**APU**	Protección termomagnética bipolar de 20 a 30A, 10KA, Suministro e instalación.	UND
411	**APU**	BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN. Alambrón en aluminio de 8 mm para bajante de apantallamiento. incluye: tubo galvanizado EMT 3/4". suministro e instalación.	UND
412	**APU**	Sistema de apantallamiento y puesta a tierra (incluye varillas copperweld 5/8"x2.4 m, cable de cobre awg #2, soldadura exotérmica y suelo artificial). suministro e instalación.	GLB
413	10.6.24	Punta captora en aluminio 5/8" x 0.6 m con base. Suministro e instalación.	UND
414	1.4.20	Excavación a mano en material común.	M3

415	4.1.26	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3
416	10.6.29	Desinstalación de interruptor sencillo existente e instalación de nuevo interruptor sencillo línea decorativa. Suministro e instalación.	UND
417	8.2.8	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x8 + 1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°c. Suministro e instalación.	M

2.5.1. Actividades de obra ejecutadas

100	**PRELIMINARES**					
101	Desmonte aparatos sanitarios	UND	7,00	$ 23.562,00	$ 164.934,00	0,03%
102	Desmonte estructuras existentes canchas	UND	20,00	$ 114.764,00		
	Subtotal				**$ 164.934,00**	**0,03%**
200	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
201	Sanitario acuacer dos piezas incluye grifería completa y asiento. Suministro e instalación	UND	2,00	$ 490.077,00	$ 980.154,00	0,19%
202	Ducha conjunto individual tipo cromada, con registro full paso de 1/2"	UND	2,00	$ 187.057,00	$ 374.114,00	0,07%
203	Lavamanos de incrustar san lorenzo blanco con grifería sencilla nogal de corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)	UND	2,00	$ 528.975,00	$ 1.057.950,00	0,20%
204	Orinal mediano con entrada superior con grifería tipo push, Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 937.002,00	$ 937.002,00	0,18%
	Subtotal				**$ 3.349.220,00**	**0,64%**
300	**CANCHA Y CERRAMIENTO**					
301	Tubería estructural Redonda de 4" - 4,0 mm. Suministro e instalación.	M	154,80	$ 160.902,00		0,00%
302	Grama sintética tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcación. Suministro e Instal.	M2	1.930,95	$ 157.394,00		0,00%
303	Malla para cerramiento lateral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	M2	1.548,80	$ 51.885,00		0,00%

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

413	Punta captora en aluminio 5/8" x 0.6 m con base. Suministro e instalación.	UND	2,00	$ 224.590,00	$1.347.540,00	0,26%
414	Excavación a mano en material común.	M3	78,49	$ 72.692,00		0,00%
415	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	78,49	$ 54.117,00		0,00%
416	Desinstalación de interruptor sencillo existente e instalación de nuevo interruptor sencillo línea decorativa. Suministro e instalación.	UND	5,00	$ 43.610,00	$ 218.050,00	0,04%
417	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x8 + 1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°c. Suministro e instalación.	M	32,00	$ 46.145,00		0,00%
	Subtotal				**$ 89.598.844,00**	
				SUBTOTAL OBRAS	**$93.112.998,00**	**17,88%**

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

	Subtotal				**$ 0,00**	**0,00%**
400	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
401	Poste Metálico Cónico De 16m De Altura Libre, Incluye Cruceta, Peldaños Y Argollas, Incluye Base En Concreto 4000psi Para Instalación.	UND	2,00	$ 16.983.373,00	$ 33.966.746,00	6,52%
402	Caja De Inspección AP-280	UND	1,00	$ 606.971,00		
403	Caja De Inspección CS-274	UND	1,00	$ 1.354.386,00	$ 1.354.386,00	0,26%
404	Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	M	45,00	$ 71.252,00		0,00%
405	Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG concéntrico 600 v 90°c XLPE-PVC. Suministro e Instalación.	M	20,00	$ 48.076,00		0,00%
406	Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600V (3xNO. 10 AWG).	M	180,00	$ 29.528,00	$ 5.315.040,00	1,02%
407	Puesta a tierra para terminal de ramal en baja tensión en acero inoxidable, incluye apertura de hueco, Suministro e Instalación.	UND	2,00	$ 766.563,00	$ 1.533.126,00	0,29%
408	Proyector LED de 400W. Suministro e Instalación	UND	8,00	$ 3.527.246,00	$ 28.217.968,00	5,42%
409	Empalme de baja tensión 91-b-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalación.	UND	18,00	$ 159.898,00	$ 2.878.164,00	0,55%
410	Protección termomagnética bipolar de 20 a 30A, 10KA, Suministro e instalación.	UND	4,00	$ 79.789,00	$ 319.156,00	0,06%
411	BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN .Alambrón en aluminio de 8 mm para bajante de apantallamiento. incluye: tubo galvanizado EMT 3/4". suministro e instalación.	UND	6,00	$ 403.257,00	$ 2.419.542,00	0,46%
412	Sistema de apantallamiento y puesta a tierra (incluye varillas copperweld 5/8"x2.4 m, cable de cobre awg #2, soldadura exotérmica y suelo artificial). suministro e instalación.	GLB	1,00	$ 12.029.126,00	$ 12.029.126,00	2,31%

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

2.5.2. Procedimiento constructivo de las actividades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA MES DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO MES DICIEMBRE
100	PRELIMINARES						
101	Desmonte aparatos sanitarios	Und	7	$ 23.562,00	$ 164.934,00	7	$ 164.934

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verifica y supervisa que las actividades de desmonte de los aparatos sanitarios se ejecuten de manera adecuada, garantizando el retiro correcto de las conexiones hidrosanitarias y asegurando que dichas labores se realicen sin ocasionar daños a las redes existentes ni a los elementos estructurales y arquitectónicos del área intervenida.

REGISTRO FOTOGRAFICO

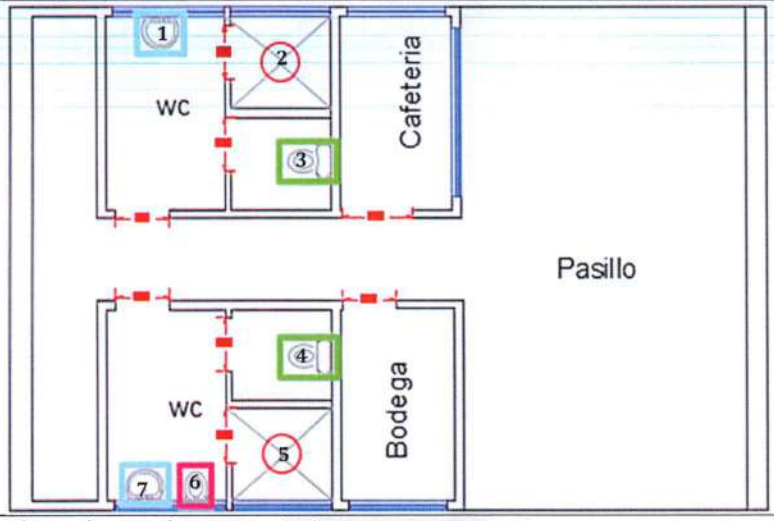


Foto 1: Plano de localización para desmonte de aparatos sanitarios



Foto 2: Desmonte de lavamanos



Foto 3: Desmonte de aparatos sanitarios

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Foto 4: Desmonte de orinal



Foto 5: Desmonte de sanitarios



Foto 6: Desmonte de lavamanos



Foto 7: Desmonte de lavamanos

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

200	**INSTALACIONES SANITARIAS**						
201	Sanitario acuacer dos piezas incluye grifería completa y asiento. Suministro e instalación.	Und	2	$ 490.077,00	$980.154,00	2	$ 980.154,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verifica que el sanitario Acuacer de dos piezas, con grifería y asiento, cumpla con las especificaciones, esté bien instalado, sin fugas, correctamente conectado, funcionando adecuadamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

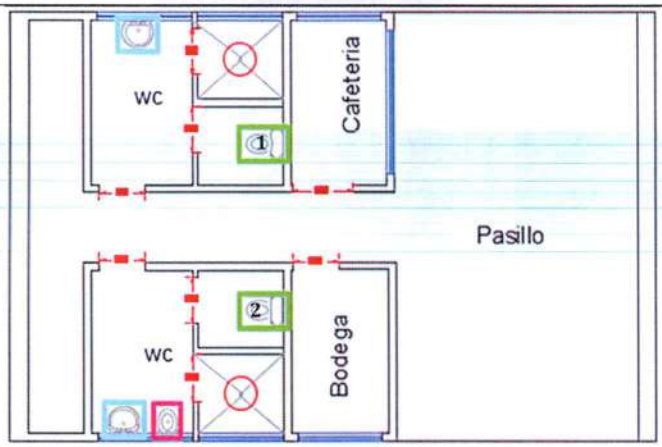


Foto 8: Plano de localización instalación de aparatos sanitarios



Foto 9: Instalación de aparato sanitario área cafetería



Foto10: Instalación de aparato sanitario área Bodega

202	Ducha conjunto individual tipo cromada, con registro full paso de ½".	Und	**2**	$ 187.057,00	$374.114,00	2	$374.114,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verifica que la Ducha individual tipo cromada, cumpla con las especificaciones, esté bien instalado, sin fugas, correctamente conectado, funcionando adecuadamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

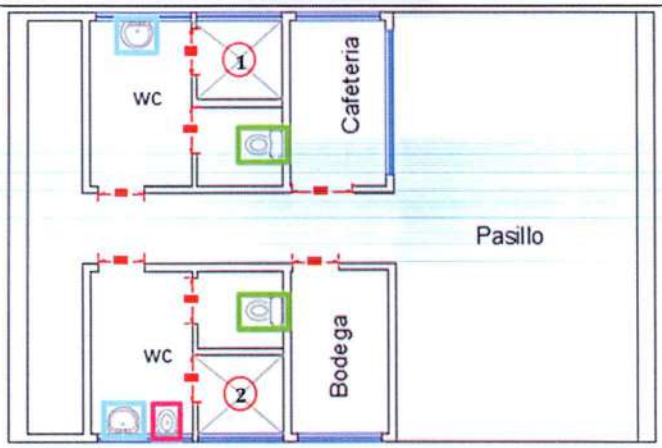


Foto 11: Plano de localización instalación de aparatos sanitarios



Foto 12: Instalación de ducha área de bodega



Foto 13: Instalación de ducha área de cafetería

203	Lavamanos de incrustar san Lorenzo blanco con grifería sencilla nogal de corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)	Und	2	$528.975,00	$ 1.057.950,00	2	$ 1.057.950,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría revisa que el lavamanos y sus accesorios sean los correctos, que la instalación esté bien hecha, no presente fugas, funcione correctamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

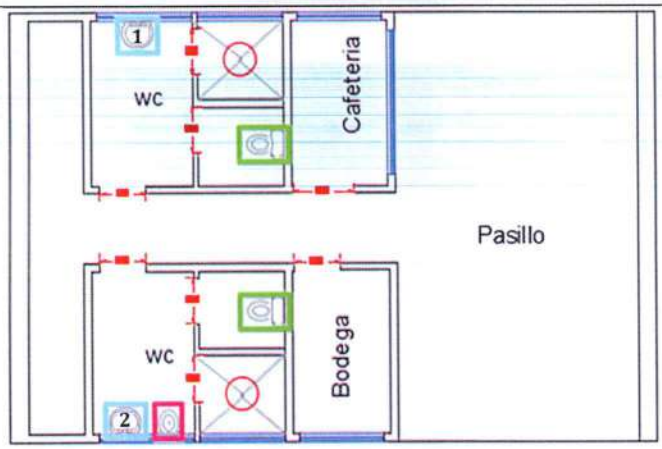


Foto 14: Plano de localización instalación de lavamanos



Foto 15: Instalación de ducha área de Bodega



Foto 16: Instalación de lavamanos área de cafetería

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

204	Orinal mediano con entrada superior con grifería tipo push, Suministro e instal.	Und	1	$ 937.002,00	$ 937.002,00	1	$ 937.002,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verificó la correcta instalación, funcionamiento y cumplimiento de especificaciones técnicas del orinal y sus accesorios.

REGISTRO FOTOGRAFICO

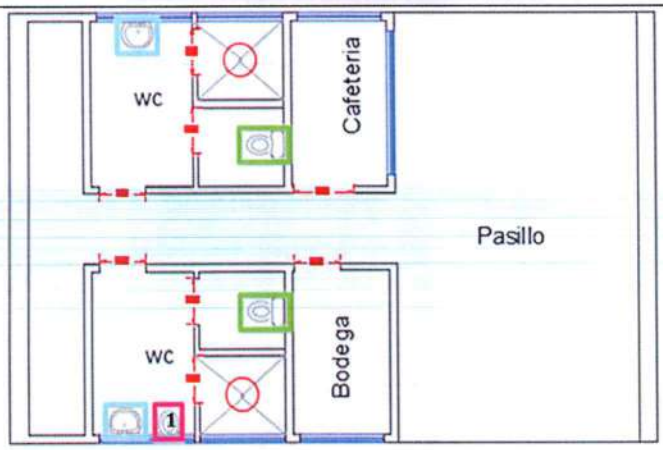


Foto 17: Plano de localización instalación de orinal



Foto 18: Instalación de orinal ubicado en el área de bodega

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

400	INSTALACIONES ELECTRICAS						
401	Poste metálico cónico de 16 m de altura libre, incluye cruceta, peldaños y argollas, incluye base en concreto 4000 psi para instalación.	Und	2	$16.983.373	$33.966.746,00	2	$33.966.746,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verificó la preparación y compactación del terreno, excavación y conformación de la base de concreto 4000 psi, control de dimensiones, instalación y anclaje del poste metálico, montaje de cruceta, peldaños y argollas, y realizó la inspección final de estabilidad estructural, tolerancias y cumplimiento de normas técnicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 19: Instalación de poste metálico



Foto 20: Instalación de poste metálico



Foto 21: Instalación de poste metálico



Foto 22: Instalación de poste metálico

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Foto 23: Instalación de poste metálico



Foto 24: Instalación de poste metálico

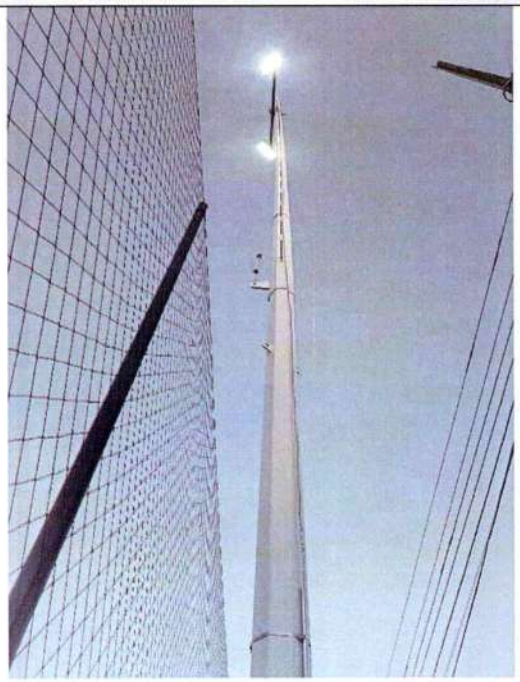


Foto 25: Instalación de poste metálico

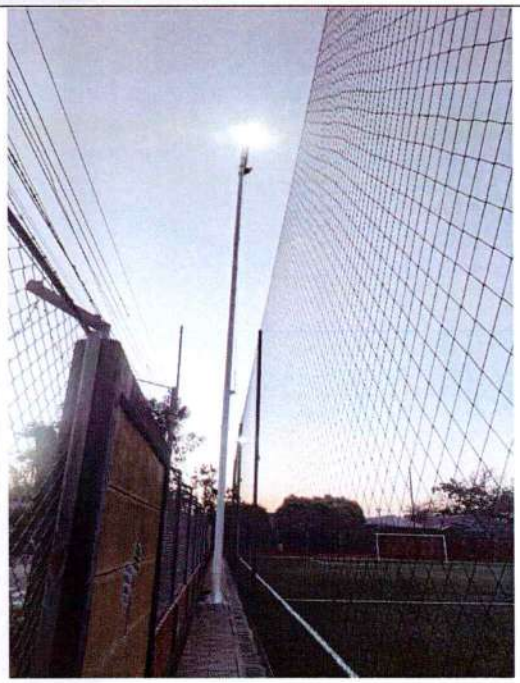


Foto 26: Instalación de poste metálico

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

403	Caja de inspección CS-274	Und	1	$ 1.354.386,00	$ 1.354.386,00	1	$ 1.354.386,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verificó la correcta ubicación, nivelación y excavación para la caja de inspección, revisión de la base, alineación y conexión de tuberías, sellado y acabado, y realizó inspección final de funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 27: caja de inspección

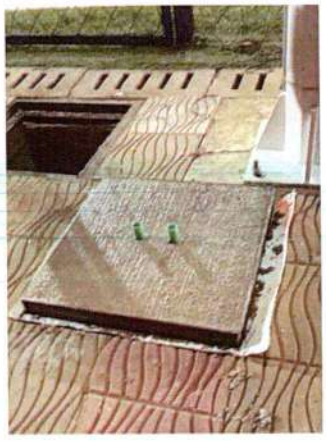


Foto 28: caja de inspección

406	Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600 V (3 x No. 10 AWG	M	180	$ 29.528,00	$ 5.315.040,00	180	$ 5.315.040,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verifica el suministro e instalación del cable THW 600 V (3 x No. 10 AWG), inspeccionando el trazado, fijación, conexiones, continuidad eléctrica.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 29: Cableado de circuitos



Foto 30: Cableado de circuitos

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Foto 31: Cableado de circuitos



Foto 32: Cableado de circuitos

407	Puesta a tierra para terminal de ramal en baja tensión en acero inoxidable, incluye apertura de hueco. Suministro e Instalación.	M	2	$766.563,00	$ 1.533.126,00	2	$ 1.533.126,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verificó la correcta ubicación y apertura del hueco, instalación del terminal de ramal en baja tensión en acero inoxidable, conexión a tierra.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 33: Puesta a tierra para terminal de ramal de baja tensión

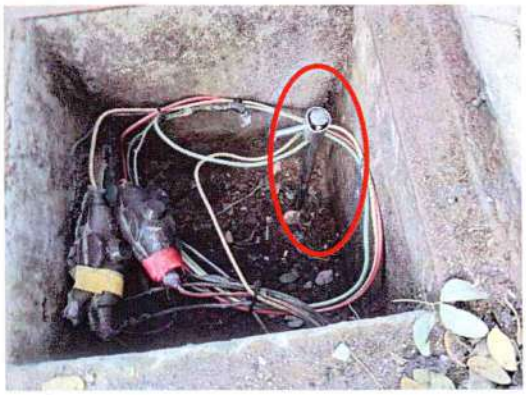


Foto 34: Puesta a tierra para terminal de ramal de baja tensión

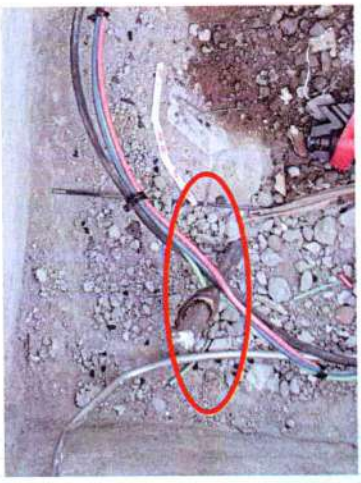


Foto 35: Puesta a tierra para terminal de ramal de baja tensión



Foto 36: Puesta a tierra para terminal de ramal de baja tensión

408	Proyector LED de 400 W. Suministro e instalación.	Und	8	$ 3.527.246, 00	$ 28.217.968,00	8	$ 28.217.968,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría realizó el seguimiento, verificación y control a la actividad correspondiente al suministro e instalación de proyectores LED de 400 W, constatando que los equipos instalados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, en cuanto a potencia nominal, tecnología LED, eficiencia energética y condiciones de operación.

Durante la inspección en campo, se verificó que los proyectores fueron instalados en los puntos definidos en el diseño eléctrico, asegurando una correcta fijación mecánica, adecuada orientación y direccionamiento del flujo luminoso, con el fin de garantizar una iluminación uniforme y eficiente del área intervenida. Asimismo, se comprobó la correcta conexión eléctrica, el uso de conductores apropiados, protecciones eléctricas y sistemas de puesta a tierra, conforme a la normatividad técnica vigente y buenas prácticas de instalación.

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, se evidenció el adecuado encendido y operación de los equipos, sin presentar fallas visibles ni afectaciones al sistema eléctrico existente.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 37: Instalación de proyector LED

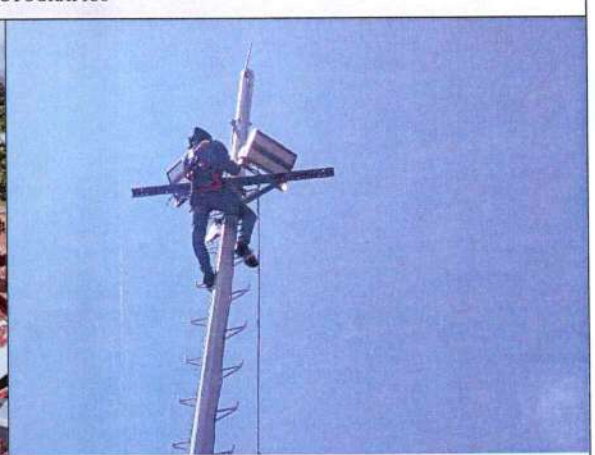


Foto 38: Instalación de proyector LED

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

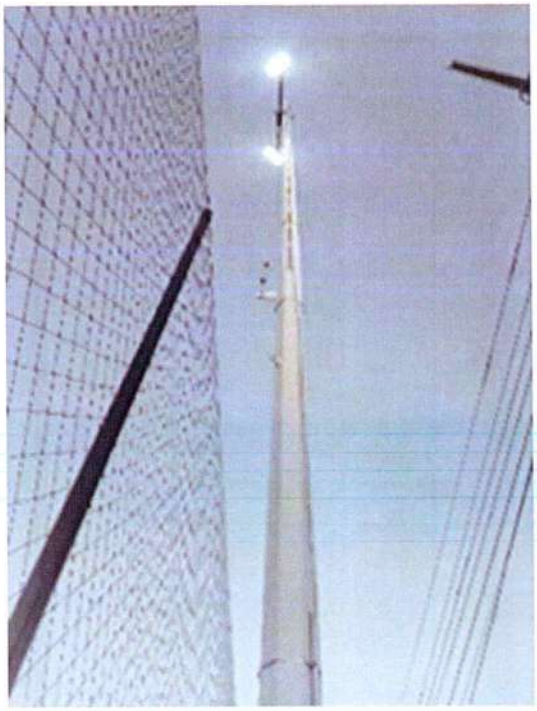


Foto 39: Instalación de proyector LED



Foto 40: Instalación de proyector LED

409	Empalme de baja tensión 91-b-1, 8-14 derivación. Suministro e instalación	Und	18	$ 159.898, 00	$ 2.878.164,00	18	$ 2.878.164,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría realizó la revisión y seguimiento a la actividad correspondiente al suministro e instalación del empalme de baja tensión tipo 91-B-1, derivación 8-14, verificando que los materiales empleados cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto y son aptos para su uso en sistemas de distribución en baja tensión.

Durante la inspección en campo, se constató que el empalme fue ejecutado de manera correcta, garantizando la continuidad eléctrica y mecánica de los conductores, así como una adecuada aislación y protección del punto de conexión, minimizando riesgos de sobrecalentamiento, fallas eléctricas o pérdidas de energía.

Asimismo, se verificó que la derivación se realizó respetando los calibres establecidos (8-14 AWG), utilizando conectores y accesorios certificados, y cumpliendo con las normas técnicas y buenas prácticas de instalación aplicables a redes de baja tensión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

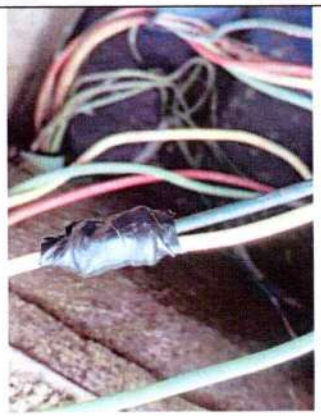


Foto 41: Empalme de baja tensión

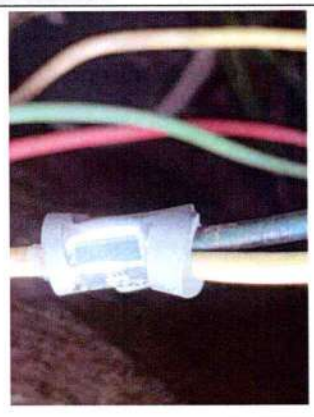


Foto 42: Empalme de baja tensión



Foto 43: Empalme de baja tensión



Foto 44: Empalme de baja tensión

410	Protección termomagnética bipolar de 20 a 30 A, 10 KA, suministro e instalación.	Und	4	$ 79.789, 00	$ 319.156,00	4	$ 319.156,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría efectuó la revisión y seguimiento a la actividad correspondiente al suministro e instalación de la protección termomagnética bipolar con capacidad nominal entre 20 y 30 A y poder de corte de 10 kA, verificando que el dispositivo instalado cumple con las especificaciones técnicas del proyecto y es adecuado para su aplicación en sistemas eléctricos de baja tensión.

Durante la inspección en campo, se constató que el interruptor termomagnético fue correctamente instalado en el tablero correspondiente, asegurando una adecuada fijación, correcta conexión de conductores y correcta identificación del circuito protegido. Se verificó que la capacidad de corriente y el poder de interrupción del dispositivo son compatibles con la carga conectada y con el nivel de cortocircuito del sistema, garantizando la protección frente a sobrecargas y fallas por cortocircuito.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 45: Protección termomagnética bipolar



Foto 46: Protección termomagnética bipolar

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

411	BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN. Alambrón en aluminio de 8 mm para bajante de apantallamiento. Incluye: tubo galvanizado EMT ¾". Suministro e instalación.	Und	6	$ 403.257,00	$ 2.419.542,00	6	$ 2.419.542,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría realizó la verificación y control de la actividad correspondiente al suministro e instalación del bajante de apantallamiento en aluminio, ejecutado mediante alambrón de aluminio de 8 mm de diámetro, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a la normatividad vigente para sistemas de protección eléctrica.

Durante la inspección en campo, se constató que el conductor de bajante fue instalado de manera continua, asegurando una adecuada sujeción y recorrido, protegido mecánicamente mediante tubería galvanizada EMT de ¾", lo cual garantiza la integridad del conductor frente a impactos, corrosión y agentes externos. Asimismo, se verificó la correcta conexión del bajante con el sistema de apantallamiento y su adecuada continuidad hacia el sistema de puesta a tierra, minimizando riesgos asociados a descargas eléctricas y sobretensiones.

La interventoría comprobó que los materiales utilizados cumplen con las características técnicas requeridas y que la instalación se ejecutó conforme a las buenas prácticas de ingeniería eléctrica, asegurando condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad del sistema.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 47: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm



Foto 48: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm

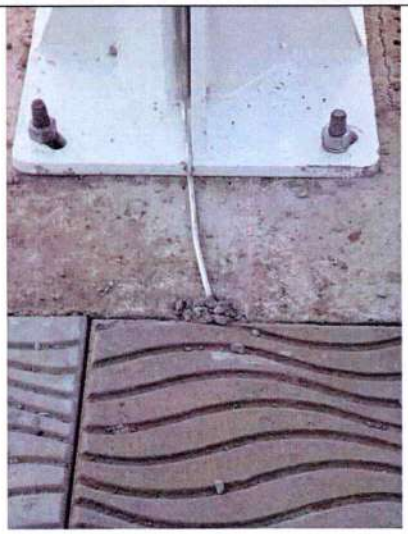


Foto 49: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm



Foto 50: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

412	Sistema de apantallamiento y puesta a tierra (incluye varillas copperweld 5/8" x 2.4 m, cable de cobre AWG #2, soldadura exotérmica y suelo artificial). Suministro e instalación.	GLB	1	$ 12.029.126,00	$ 12.029.126,00	1	$ 12.029.126,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría verificó el suministro e instalación del sistema de apantallamiento y puesta a tierra, incluyendo varillas Copperweld 5/8" x 2.4 m, cable de cobre AWG #2, soldadura exotérmica y suelo artificial, inspeccionando la correcta ubicación de las varillas, conexiones, continuidad eléctrica, resistencia de puesta a tierra, cumplimiento de normas técnicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 51: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra



Foto 52: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra



Foto 53: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra



Foto 54: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Foto 55: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra



Foto 56: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra

413	Punta captora en aluminio 5/8" x 0.6m con base. Suministro e instalación.	Und	6	$ 224.590,00	$ 1.347.540,00	6	$ 1.347.540,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación de la actividad correspondiente al suministro e instalación de la punta captora en aluminio de 5/8" de diámetro y 0,60 m de longitud, con su respectiva base, destinada al sistema de apantallamiento y protección contra descargas atmosféricas.

Durante la inspección en campo, se constató que la punta captora fue instalada en la ubicación definida en el diseño, garantizando una adecuada fijación mecánica, correcta verticalidad y estabilidad, así como una conexión eléctrica eficiente con el conductor de bajante, asegurando la continuidad del sistema.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 57: Punta captora en aluminio

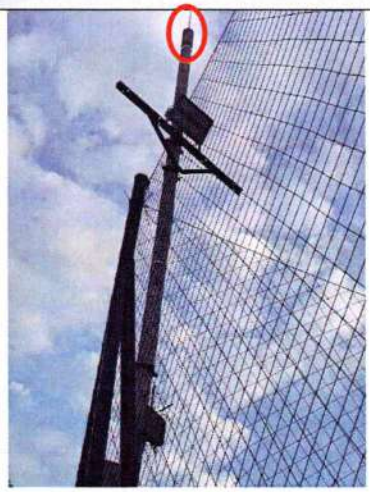


Foto 58: Punta captora en aluminio

416	Desinstalación de interruptor sencillo existente e instalación de nuevo interruptor sencillo línea decorativa. Suministro e instalación.	Und	5	$ 43.610,00	$ 218.040,00	5	$ 218.040,00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La interventoría realizó el seguimiento y verificación de la actividad correspondiente a la desinstalación del interruptor sencillo existente y el suministro e instalación de un nuevo interruptor sencillo de línea decorativa, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Durante la inspección en campo, se constató que la desinstalación del elemento existente se efectuó de manera adecuada, garantizando la seguridad del personal y la integridad de las instalaciones eléctricas, sin generar afectaciones a los conductores ni a los dispositivos asociados. Posteriormente, se verificó la correcta instalación del nuevo interruptor, asegurando una adecuada fijación, correcta conexión eléctrica y funcionamiento acorde con el circuito intervenido.

Asimismo, la interventoría comprobó que el dispositivo instalado cumple con las características técnicas requeridas, presenta un acabado adecuado y corresponde a una línea decorativa compatible con el entorno arquitectónico del proyecto, manteniendo las condiciones de seguridad y operatividad del sistema eléctrico.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 59: Desinstalación de interruptor



Foto 60: Desinstalación de interruptor



Foto 61: Desinstalación de interruptor



Foto 62: Instalación de interruptor



Foto 63: Instalación de interruptor



Foto 64: Instalación de interruptor

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

2.5.3. Inconvenientes técnicos y determinaciones

Durante el mes de diciembre de 2025 se dio continuidad a las actividades correspondientes a las instalaciones eléctricas del proyecto.

En relación con el ítem 405 "Acometida en baja tensión en conductor concéntrico 2x8 + 8 AWG, 600 V, 90 °C, XLPE–PVC", se tenía inicialmente contemplada la ejecución de una acometida bifásica.

No obstante, durante la verificación técnica en sitio realizada por los profesionales del contratista de obra y la interventoría, se evidenció que la acometida existente del escenario deportivo es de tipo trifásico y se encuentra en adecuadas condiciones técnicas y operativas para suplir la demanda eléctrica del proyecto.

En virtud de lo anterior y considerando los principios de funcionalidad, seguridad eléctrica, eficiencia del sistema y optimización de recursos, en conjunto por parte de obra e interventoría de determino la conveniencia de conservar la acometida trifásica existente, por lo cual no se hizo necesaria la ejecución del ítem correspondiente a la acometida bifásica inicialmente prevista.

Esta decisión técnica no afecta el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas proyectadas y garantiza la compatibilidad del sistema con las condiciones reales de suministro eléctrico del inmueble.

2.6. METAS FISICAS EJECUTADAS

2.6.1. Metas físicas contrato de Obra No 797 de 2025

Durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Escenario deportivo realizo las actividades de ejecución de obra, de los capítulos 1, 2, 4 el cual se evidencia en el cuadro resumen del numeral 2.5.1. actividades ejecutadas, para el presente informe se tiene un porcentaje programado de 49,95%, con un porcentaje ejecutado de 17,88%.

MES	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
oct-25	1,21%	1,21%	0%	0%
nov-25	36,76%	37,97%	81,82%	81,82%
dic-25	49,95%	87,91%	17,88%	99,70%



EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

2.6.2. Metas físicas contrato de Interventoría No 805 de 2025

Para el mes de diciembre de 2025, las actividades de la interventoría fueron ejecutadas al 100%, como se evidencia en la siguiente tabla.

AVANCE POR ETAPA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**PORCENTAJE POR ACTIVIDAD**	**% EJECUTADO**
1	ETAPA PRECONTRACTUAL	$ 2.597.413,00	5,13%	100%
2	ETAPA DE EJECUCION DE OBRA	$ 48.052.141,00	94,87%	100%
VALOR TOTAL		**$ 50.649.554,00**	**100,00%**	

Para el presente mes la interventoría ejecuto un 31,62% con un programado del 31,62%.



Para el presente mes la interventoría presenta un avance acumulado de ejecución del 100 %.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE FISICO EJECUTADO MES A MES			
MES EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUTADO	ACUMULADO
sep-25	5,13%	2,56%	2,56%
oct-25	31,62%	34,19%	34,19%
Nov-25	31,62%	31,62%	31,62%
Dic-25	31,62%	31,62%	31,62%
TOTAL ACUMULADO			100%

La tabla presenta el avance físico ejecutado mes a mes del proyecto, comparando lo programado frente a lo realmente ejecutado y su respectivo acumulado durante el periodo evaluado (septiembre a diciembre de 2025).

Para el mes de septiembre de 2025, se tenía un avance programado del 5,13%, sin embargo, el avance ejecutado fue del 2,56%, evidenciando un cumplimiento inferior a lo previsto, lo cual se refleja igualmente en el acumulado para ese periodo (2,56%).


En octubre de 2025, alcanza un 34,19% frente a un programado de 31,62%, lo que indica un sobrecumplimiento de la meta mensual y un incremento significativo en el acumulado (34,19%).

Para el mes de noviembre de 2025, el avance ejecutado fue del 31,62%, coincidiendo exactamente con lo programado para ese periodo, manteniendo una ejecución conforme a la planificación establecida.

En diciembre de 2025, igualmente se registra un avance ejecutado del 31,62%, en concordancia con el valor programado.

Finalmente, el total acumulado del proyecto alcanza el 100%, lo que indica que las actividades contractuales fueron ejecutadas en su totalidad dentro del periodo establecido y cumpliendo con las metas físicas establecidas.

2.7. ESQUEMA FÍSICO DE LA INTERVENTORÍA

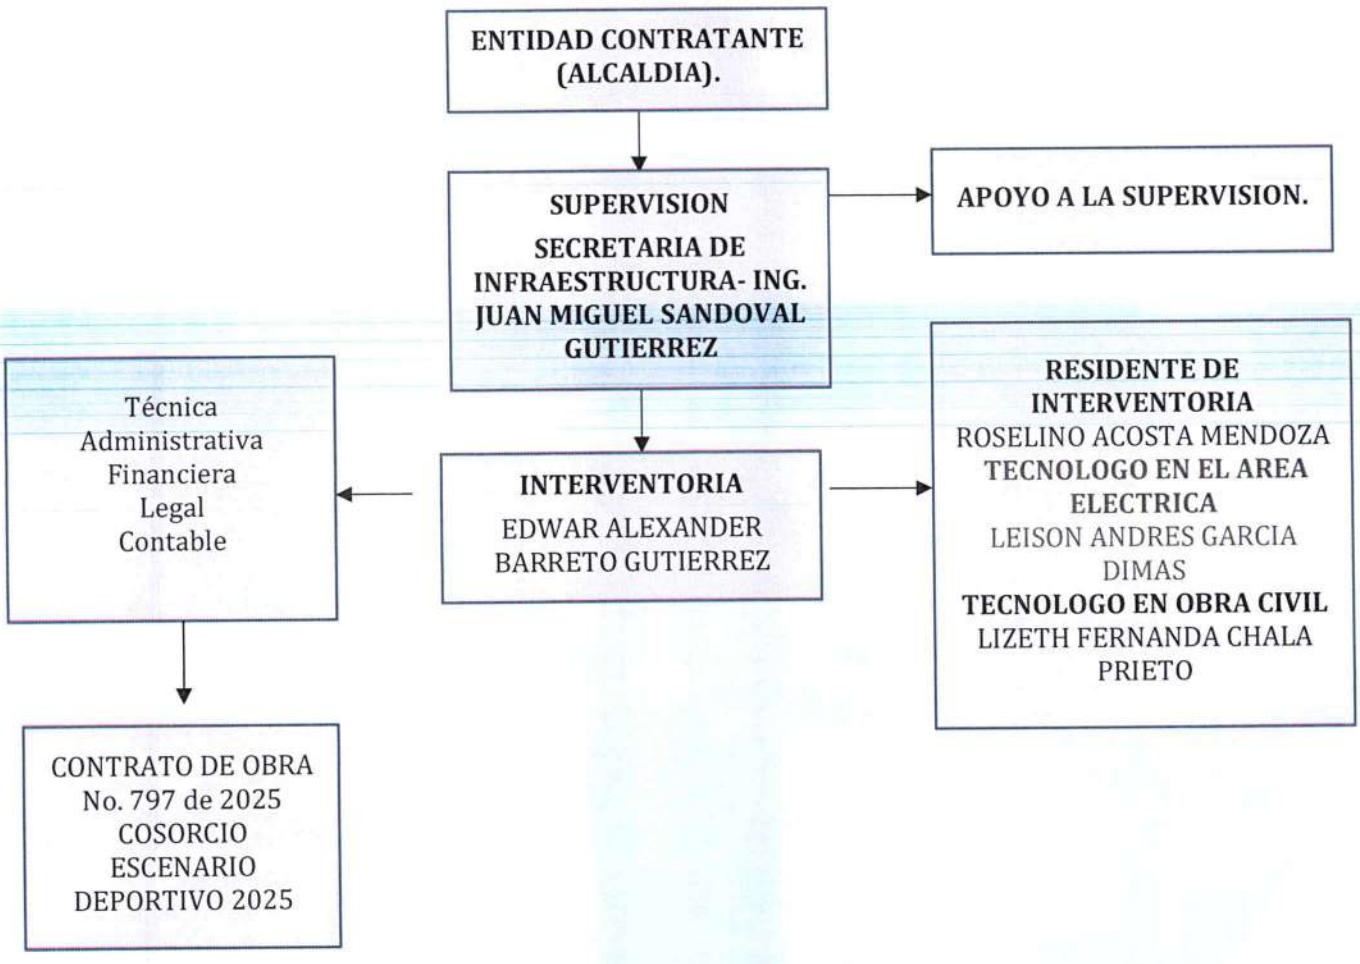

2.8. Bitácora de Obra

Para el presente mes se presenta bitácora de obra del periodo comprendido a partir del 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. RESUMEN DE ACTAS

3.1.1. Actas suscritas del contrato de obra No 797 de 2025

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
No. 1 INICIO	20/10/2025	N.A.
No 2. DE ANTICIPO	01/12/2025	$156.240.014,70
No 3. DE TERMINACION	31/12/2025	N.A.

3.1.2. Actas suscritas del contrato de interventoría No 805 de 2025

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
No. 1 INICIO	17/09/2025	N.A.
No 2. DE ANTICIPO	25/11/2025	$25.324.777,00
No 3. DE TERMINACION	31/12/2025	N.A.

3.2. PERSONAL

3.2.1. Personal contrato de obra

PERSONAL CONTRATO DE OBRA				
No.	**CEDULA**	**TARJETA PROFESIONAL**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**
1	1.116.546.919	-	Leidy Lizeth Liévano	Representante Legal
2	74.752.830	2520282930 CND	Fernando Garzón Bernal	Director de obra
3	1.116.544942	154202-373617 NTS	Jesús Alberto Pinzón Ruiz	Ingeniero Residente de Obra

3.2.2. Personal Contrato de interventoría

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
No.	**CEDULA**	**TARJETA PROFESIONAL**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**
1	74.752.762	25202091074 CND	Roselino Acosta Mendoza	Residente de Interventoría
2	1.116.554.85	MTE/No 1116544085-61323 A1 Resolución No 123967	Lesión Andrés García Dimas	Tecnólogo en el área eléctrica

3	1.006.441.978	1.006.441.978	Lizeth Fernanda Chala Prieto	Tecnólogo en obra Civil

3.3. ACTUACIONES

3.3.1. Correspondencia Enviada

No de Radicado	FECHA	ENVIADA	DEPENDENCIA	ASUNTO
010-INTERV.0805-2025	5/12/2025	Leidy Lizeth Liévano Sanabria	Consorcio Escenario Deportivo	Solicitud entrega de informe mes de noviembre de 2025

3.3.2. Correspondencia Recibida

No de Radicado	FECHA	RECIBIDO	DEPENDENCIA	ASUNTO

3.4. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

3.4.1. Seguridad social contrato de obra No 797 de 2025

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	No EMPLEADOS	CONTRATISTA	VALOR	No PLANILLA
2025-10	2025-11	11	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO	$ 2.538.700	9496797046

3.4.2. Seguridad social contrato de Interventoría No 805 de 2025

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	No EMPLEADOS	CONTRATISTA	VALOR	No PLANILLA
2025-12	2026-01	3	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	$1.763.400	9497870546

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta la planilla de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo reportado del mes de diciembre de 2025.

3.4.3. Estampillas Contrato de Obra No 797 de 2025

Para la legalización del contrato de obra se realizaron los siguientes pagos:

CONCEPTO	COMPROBANTE DE INGRESO TRIBUTARIO Y No TRIBUTARIO	FECHA	VALOR	No DE CONFIRMACION BANCO BBVA
PRO ADULTO MAYOR	No. CIT2025014490	02/10/2025	$22.394.402,00	000024740
PROCULTURA	No. CIT2025014491	02/10/2025	$5.208.000,00	000022739
PRODEPORTE	No. CIT2025014492	02/10/2025	$13.020.001,00	000000963
IMPUESTO TIEMBRE	No. CIT2025014489	02/10/2025	$2.604.000,00	000077079

De acuerdo a la anterior información, se adjunta el pago de estampillas del contrato en el capítulo de anexos

3.4.4. Estampillas Contrato de Interventoría No 805 de 2025

CONCEPTO	COMPROBANTE DE INGRESO TRIBUTARIO Y No TRIBUTARIO	FECHA	VALOR	No DE CONFIRMACION BANCO BBVA
PRO ADULTO MAYOR	No. CIT2025013745	15/09/2025	$1.830.194,00	000024579
PROCULTURA	No. CIT2025013746	15/09/2025	$425.627,00	000022578
PRODEPORTE	No. CIT2025013747	15/09/2025	$1.064.066,00	000000923

Para la legalización del contrato de obra se realizaron los siguientes pagos:

De acuerdo a la anterior información, se adjunta el pago de estampillas del contrato en el capítulo de anexos.

3.4.5. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de Interventoría No 805 de 2025

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. CODIGO DE RUBRO	2.2.43.4301.1604.2024582100026
	NOMBRE RUBRO	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA

		SALUDABLE EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AFUAZUL CASANARE
	FECHA DE CERTIFICADO	2025/07/24
	FECHA DE VENCIMIENTO	2025/12/31
	NOMBRE DE LA FUENTE	SUPERAVIT TASA PRO DEPORTE
	VALOR	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS ($50.649.554,00) M/CTE
	OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3.4.6. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de obra No 797 de 2025

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. CODIGO DE RUBRO	2.2..43.4301.1604.2024582100026
	FECHA	9 de julio de 2025
	VALOR	QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($520.800.049,00) M/CTE
	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3.4.7. Actividades Administrativas

Durante el presente periodo, el equipo de interventoría ha llevado a cabo una serie de actividades administrativas clave, orientadas a garantizar el adecuado seguimiento, control y soporte técnico del proyecto en la etapa II ejecución de obra. Las principales acciones ejecutadas incluyen:

Gestión y control de la correspondencia: Se gestionó y controló toda la correspondencia generada entre el contratista de obra, la interventoría y la supervisión del proyecto.

Participación en comités técnicos: Se asistió activamente a comités técnicos convocados por la supervisión, donde se trataron temas estratégicos relacionados con el avance técnico de las obras.

Coordinación del avance del proyecto: Se realizó un seguimiento integral al cumplimiento del cronograma de la etapa según acta de inicio.

Elaboración de actas y reportes técnicos: Se elaboraron actas de reunión, reportes de avance.

Apoyo en la gestión de requerimientos institucionales: Se brindó acompañamiento al contratista de obra.

Archivo técnico y documental: Se organizó y mantuvo actualizado el archivo técnico y administrativo del proyecto, garantizando el respaldo documental de todas las actuaciones relacionadas con la etapa II ejecución de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

4. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

4.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

4.1.1. Balance Financiero contrato de Obra No 797 de 2025

El Contrato de Obra cuenta con un valor total de QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($520.800.049).

En este sentido, se presenta el cuadro comparativo de la ejecución financiera, en el cual se evidencia que, para el período evaluado, el valor programado corresponde a DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($260.113.995,68), mientras que el valor ejecutado asciende a NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($93.112.998,00).

Lo anterior refleja un nivel de ejecución financiera con respecto al valor total del contrato, situación que se encuentra asociada al avance real de las actividades de obra ejecutadas a la fecha de corte del presente informe.



4.1.2. Plan de inversión de Anticipo

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO:

El municipio entregara al contratista a título de anticipo la suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, el cual equivale a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CATORCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($156.240.014,70)

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO (30%)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.800.049,00	$ -	$156.240.014,70

Nota: El anticipo que con fecha de aprobación el día 1 de diciembre de 2025

CODIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
1	Compra Materiales		**$ 156.240.014,70**
	TOTAL		**$ 156.240.014,70**
Retención	Contribución especial por contrato de obra pública AGUAZUL	5%	$ 7.812.000,00
	VALOR TOTAL		**$148.428.014,70**

Nota: se anexa comprobante de egreso generado por la secretaria de hacienda del municipio de aguazul.

4.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.2.1. Balance Financiero contrato de Interventoría No 805 de 2025


El Contrato de Interventoría cuenta con un valor total de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($50.649.554,00).

En el mes de diciembre de 2025, el valor programado asciende a $16.017.380,33, mientras que el valor ejecutado corresponde a $16.017.380,33.

De manera consolidada, el total ejecutado acumulado del contrato de interventoría es de $50.649.554,00, lo cual permite evidenciar un avance financiero progresivo y acorde con las actividades de seguimiento, control y verificación desarrolladas por la interventoría durante los periodos reportados.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

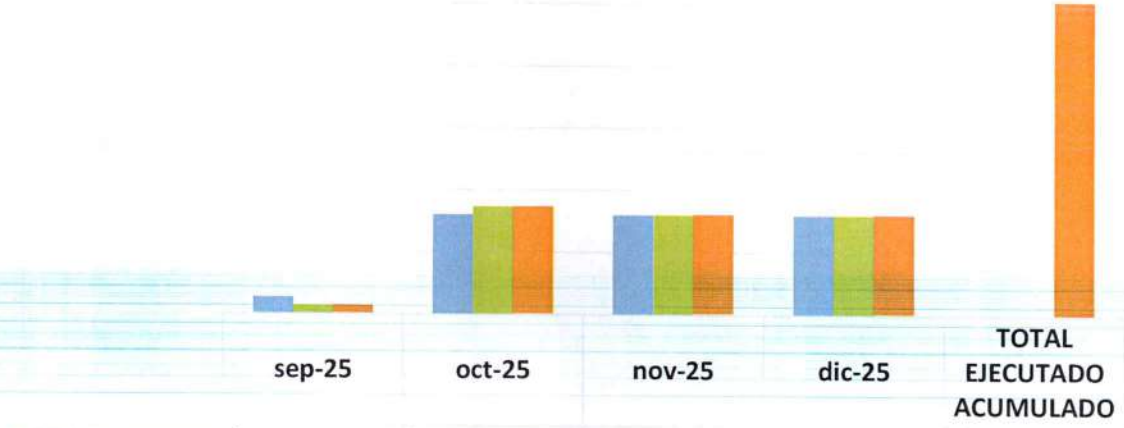

PROGRAMADO	$2.597.413,00	$16.017.380,33	$16.017.380,33	$16.017.380,33
EJECUTADO	$1.298.706,50	$17.316.086,83	$16.017.380,33	$16.017.380,33
ACUMULADO	$1.298.706,50	$17.316.086,83	$16.017.380,33	$16.017.380,33	$50.649.554,00

4.2.2. Plan de Inversión de Anticipo contrato de Interventoría No 805 de 2025

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO:

El municipio entregara al contratista a título de anticipo la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, el cual equivale a VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($25.324.777,00)

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO (50%)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.649.554,00	$ -	$25.324.777,00

PLAN DE INVESION DEL ANTICIPO			
CODIGO.	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE**
1	**SALARIO PROFESIONALES**		
1.1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$25.324.777,00	100,0%
	TOTAL		**100,00%**

Nota: El acta de anticipo quedo aprobado con fecha del 25 de noviembre de 2025

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

5. SEGUIMIENTO JURIDICO

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

5.1. CONTROL DE POLIZAS

5.1.2. Control de Pólizas de Obra

CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA					
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - ANEXO 0					
GARANTIAS	**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA**		**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-44-101007938**	12/09/2025	12/06/2026	52.080.004,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A		12/09/2025	12/06/2026	$ 156.240.014,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A		12/12/2025	12/12/2030	$ 26.040.002,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		12/12/2025	12/12/2030	$ 156.240.014,70
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-40-101003589**	12/09/2025	12/12/2025	$ 284.700.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			15/09/2025	31/12/2028	$ 2.532.477,70
CALIDAD DEL SERVICIO			31/12/2025	31/12/2030	$ 5.064.955,40

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - ANEXO 1- DE MODIFICACION

GARANTIAS	NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA		VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-44-101007938**	12/09/2025	12/12/2030	52.080.004,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A		12/09/2025	12/12/2030	$ 156.240.014,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A		12/09/2025	12/12/2030	$ 26.040.002,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		12/09/2025	12/12/2030	$ 156.240.014,70

Se traslada vigencia a partir del acta del 20/10/2025 según acta de inicio

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 1 DE MODIFICACION

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-40-101003589**	12/09/2025	12/12/2025	$ 284.700.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			15/09/2025	31/12/2028	$ 2.532.477,70
CALIDAD DEL SERVICIO			31/12/2025	31/12/2030	$ 5.064.955,40

Se traslada vigencia a partir del acta del 20/10/2025 según acta de inicio

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA					
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - ANEXO 2- TRASLADO DE VIGENCIA					
GARANTIAS	**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA**		**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-44-101007938**	20/10/2025	20/07/2026	$52.080.004,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A		20/10/2025	20/07/2026	$ 156.240.014,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A		20/10/2025	19/01/2029	$ 26.040.002,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		19/01/2026	19/01/2031	$ 156.240.014,70
Se traslada vigencia a partir del acta del 20/10/2025 según acta de inicio					
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2 DE TRASLADO DE VIGENCIA					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-40-101003589**	20/10/2025	19/01/2026	$ 284.700.000,00
Se traslada vigencia a partir del acta del 20/10/2025 según acta de inicio					

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA					
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - ANEXO 3- NO CAUSA PRIMA					
GARANTIAS	**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA**		**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-44-101007938**	20/10/2025	20/07/2026	$52.080.004,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A		20/10/2025	20/07/2026	$ 156.240.014,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A		20/10/2025	19/01/2029	$ 26.040.002,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		19/01/2026	19/01/2031	$ 156.240.014,70
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2 DE TRASLADO DE VIGENCIA					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**N° POLIZA 57-40-101003589**	20/10/2025	19/01/2026	$ 284.700.000,00

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

5.1.3. Control de Pólizas de Interventoría

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 0

GARANTIAS	COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100006744	15/09/2025	30/09/2026	$ 5.064.955,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			15/09/2025	30/09/2026	$25.324.777,70
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			15/09/2025	31/12/2028	$ 2.532.477,70
CALIDAD DEL SERVICIO			31/12/2025	31/12/2030	$ 5.064.955,40

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABIULIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 0

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001705	15/09/2025	31/12/2025	$284.700.00,00
PATRONAL			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00

Aprobación de póliza: 15-09-2025

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 1					
GARANTIAS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100006744	15/09/2025	30/06/2026	-$ 5.064.955,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			15/09/2025	30/06/2026	-$25.324.777,70
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			15/09/2025	31/12/2028	-$ 2.532.477,70
CALIDAD DEL SERVICIO			31/12/2025	31/12/2030	-$ 5.064.955,40
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABIULIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 1					
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001705	15/09/2025	31/12/2025	$284.700.00,00
PATRONAL			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 2 ACTUALIZACION VIGENCIAS - ACTA DE INICIO					
GARANTIAS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100006744	17/09/2025	02/07/2026	$ 5.064.955,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			17/09/2025	02/07/2026	$25.324.777,70
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			17/09/2025	02/01/2029	$ 2.532.477,70
CALIDAD DEL SERVICIO			02/01/2026	02/01/2031	$ 5.064.955,40
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABIULIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 1					
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001705	15/09/2025	31/12/2025	$284.700.00,00
PATRONAL			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			15/09/2025	31/12/2025	$85.410.000,00
Aprobación de póliza 06/11/2025					

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 3 MODIFICACION DE POLIZAS					
GARANTIAS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100006744	17/09/2025	02/07/2026	$ 5.064.955,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			17/09/2025	02/07/2026	$25.324.777,70
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			17/09/2025	02/01/2029	$ 2.532.477,70
CALIDAD DEL SERVICIO			02/01/2026	02/01/2031	$ 5.064.955,40
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABIULIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATO INTERVENTORIA – ANEXO 3 MODIFICACION DE POLIZAS					
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001705	17/09/2025	03/01/2026	$284.700.00,00
PATRONAL			17/09/2025	03/01/2026	$85.410.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			17/09/2025	03/01/2026	$85.410.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			17/09/2025	03/01/2026	$85.410.000,00

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de diciembre de 2025, la interventoría realizó el seguimiento técnico permanente a las actividades ejecutadas en el componente de instalaciones eléctricas, verificando su desarrollo conforme a las condiciones contractuales.

En relación con el ítem 405 "Acometida en baja tensión", se concluye que, tras la revisión técnica en sitio, se identificó que la acometida existente del escenario deportivo es de tipo trifásico y se encuentra en adecuadas condiciones para atender la demanda eléctrica del proyecto. En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la funcionalidad, la seguridad del sistema y el uso eficiente de los recursos, se determinó de manera conjunta entre obra e interventoría conservar dicha acometida, razón por la cual no fue necesaria la ejecución de la acometida bifásica inicialmente programada.

La interventoría considera que esta decisión técnica no genera afectaciones al correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas proyectadas y, por el contrario, asegura la compatibilidad del sistema con las condiciones reales de suministro del inmueble, manteniendo el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos exigidos para el proyecto.

La interventoría continuará acompañando el proceso y realizando el seguimiento técnico, y administrativo necesario, hasta el proceso de liquidación ya que las actividades correspondientes al contrato de obra 797 de 2025 ya fueron ejecutadas en su totalidad.

ING. ROSELINO ACOSTA MENDOZA
Residente de Interventoría

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORMES SEMANALES

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 7
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA *No.* 7

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 7 del : 1/12/2025 al 7/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 días

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 50.649.554,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA $ 520.800.049,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Ejecucion (%)	7,91%	76,28%
Valor obra programada:	$ 4.004.345,08	$ 38.636.518,75

OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	5,22%	87,04%
Valor de la obra ejecutada:	$ 27.161.202,00	$ 453.279.762,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 805 del 2025

Contrato No.	805 del 2025
Valor Inicial:	$ 50.649.554,00
Plazo Inicial:	Tres (3) meses y quince (15) dias
Fecha de Iniciación:	miércoles, 17 de septiembre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	miércoles, 31 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA: 797 del 2025

Contrato No.	797 del 2025
Valor Inicial:	$ 520.800.049,00
Plazo Inicial:	tres (3) meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 20 de octubre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	lunes, 19 de enero de 2026

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 7
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La ejecución de obra en la semana fue la siguiente:

101 - Desmonte aparatos sanitarios

201 - Sanitario acuacer dos piezas incluye grifería completa y asiento. Suministro e instalación

202 - Ducha conjunto individual tipo cromada, con registro full paso de 1/2"

203 - Lavamanos de incrustar san lorenzo blanco con grifería sencilla nogal de corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)

204 - Orinal mediano con entrada superior con griferia tipo push, Suministro e Instal.

403 - Caja De Inspección CS-274

406 - Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600V (3xNO. 10 AWG).

407 - Puesta a tierra para terminal de ramal en baja tensión en acero inoxidable, incluye apertura de hueco, Suministro e Instalación.

409 - Empalme de baja tensión 91-b-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalación.

410 - Protección termomagnetica bipolar de 20 a 30A, 10KA, Suministro e instalacion.

412 - Sistema de apantallamiento y puesta a tierra (incluye varillas copperweld 5/8"x2.4 m, cable de cobre awg #2, soldadura exotérmica y suelo artificial). suministro e instalación.

416 - Desinstalación de interruptor sencillo existente e instalación de nuevo interruptor sencillo línea decorativa. Suministro e instalación.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana No. 7, la interventoría realizó el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas por el contratista en el marco del proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura del escenario deportivo "Cancha Sintética San Carlos", evidenciando lo siguiente:

Se efectuó el desmonte de aparatos sanitarios existentes (Ítem 101), verificando la correcta retirada de los elementos sin afectación a las redes hidráulicas y sanitarias existentes.

En cuanto a la instalación de nuevos equipos sanitarios, se constató el suministro e instalación de sanitario de dos piezas con grifería completa (Ítem 201), duchas individuales cromadas con registro de 1/2" (Ítem 202), lavamanos de incrustar con grifería y accesorios completos (Ítem 203), y orinales con sistema de descarga tipo push (Ítem 204), verificando su correcta fijación, nivelación, conexión a redes y funcionamiento hidráulico.

Respecto a las obras complementarias, se evidenció la construcción de caja de inspección (Ítem 403) conforme a especificaciones técnicas, asegurando condiciones adecuadas de acceso y funcionalidad para el sistema.

En el componente eléctrico, la interventoría verificó el tendido de cableado de circuitos ramales (Ítem 406) para iluminación de sendero y cancha sintética en conductor THW 600V calibre No. 10 AWG, comprobando correcta canalización, identificación y continuidad eléctrica. Asimismo, se supervisó la ejecución de la puesta a tierra para terminales de baja tensión (Ítem 407) y el sistema de apantallamiento y puesta a tierra (Ítem 412), incluyendo instalación de varillas copperweld, conductor de cobre y uniones mediante soldadura exotérmica, garantizando cumplimiento de normas técnicas de seguridad eléctrica.

De igual manera, se realizó el seguimiento al empalme de baja tensión (Ítem 409), instalación de protecciones termomagnéticas bipolares (Ítem 410) y la instalación de punta captora en aluminio (Ítem 413), verificando su correcta integración al sistema eléctrico y de protección contra descargas atmosféricas.

Finalmente, se evidenció la desinstalación de interruptores existentes e instalación de nuevos interruptores sencillos (Ítem 416) comprobando su adecuado funcionamiento y cumplimiento de especificaciones de la línea decorativa instalada.

En general, las actividades ejecutadas durante la semana se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas del proyecto cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y funcionalidad requeridos, sin evidenciarse no conformidades relevantes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA

302 Grama sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcacion. Suministro e Instal.

REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 3	de 7	
DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	12	2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 76: Desmonte de aparatos sanitarios



Foto No 77: Desmonte de lavamanos



Foto No 78: Desmonte de sanitarios



Foto No 79: Desmonte de orinal



Foto No 80: Desmonte de lavamanos



Foto No 81: Instalación de aparato sanitario

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	4	de 7
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 82: Instalación de ducha



Foto No 83: Instalación de lavamanos área de Bodega



Foto No 84: Instalación de lavamanos área de cafetería



Foto No 85: Instalación de orinal ubicado en el área de bodega

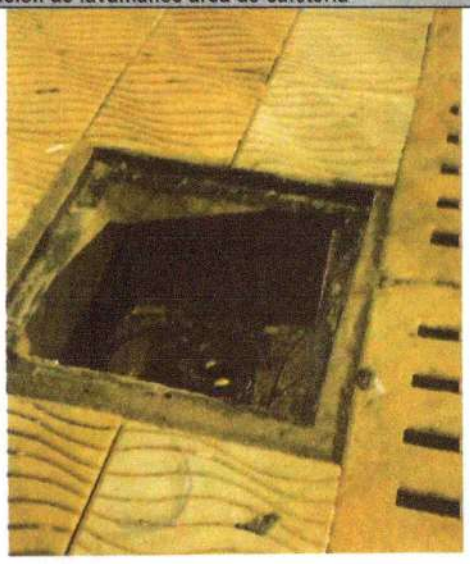


Foto No 86: Caja De Inspección CS-274

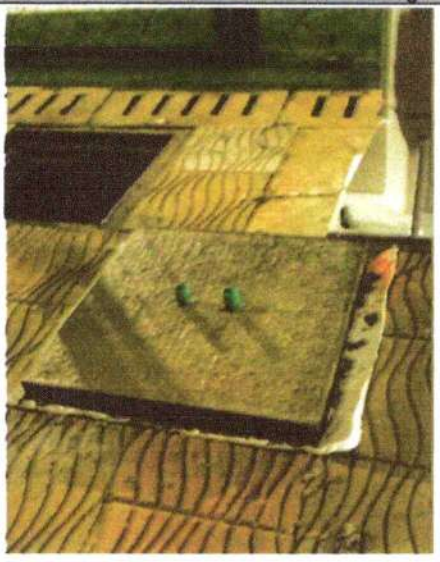


Foto No 87: Caja De Inspección CS-274

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	5	de 7
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 88: Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600V (3xNO. 10 AWG)



Foto No 89: Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600V (3xNO. 10 AWG)

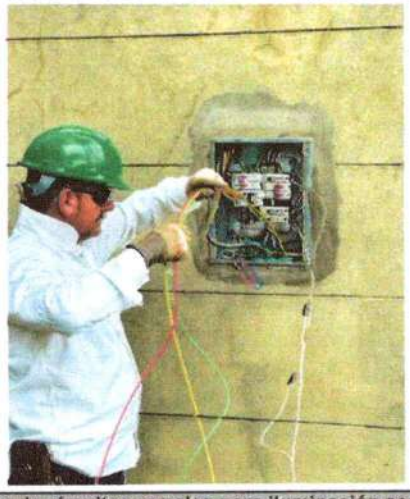


Foto No 90: Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600V (3xNO. 10 AWG)



Foto No 91: Cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintética en cable THW, 600V (3xNO. 10 AWG)

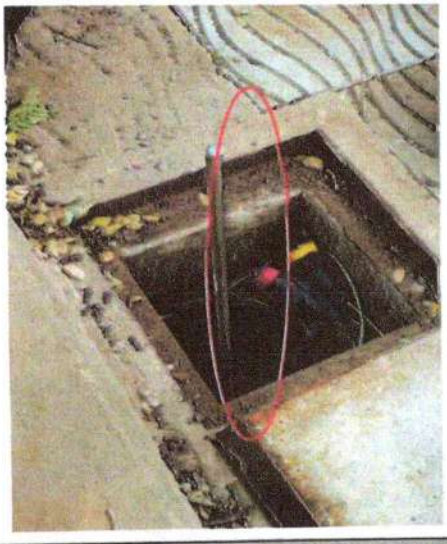


Foto No 92: Puesta a tierra para terminal de ramal de baja tensión

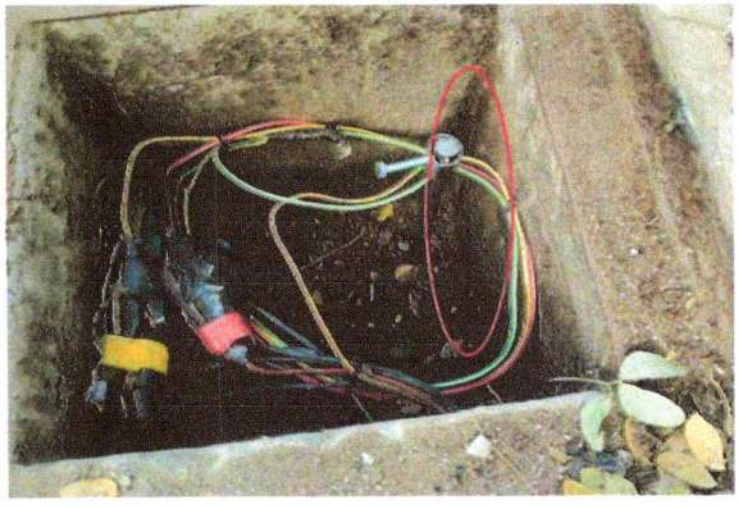


Foto No 93: Puesta a tierra para terminal de ramal de baja tensión

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	6	de 7
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 53: Puesta a tierra para terminal de ramal de baja tensión

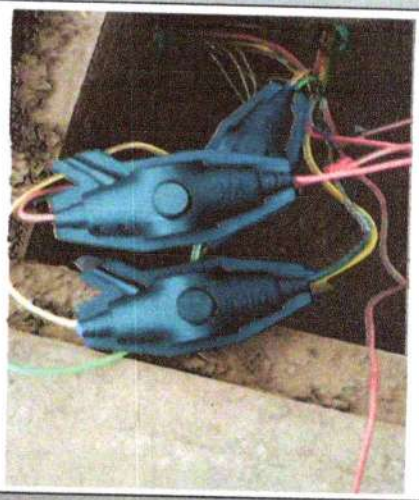


Foto No 54:Protección termomagnética bipolar de 20 a 30 A, 10 KA, suministro e instalación.



Foto No 94: Protección termomagnetica bipolar de 20 a 30A, 10KA

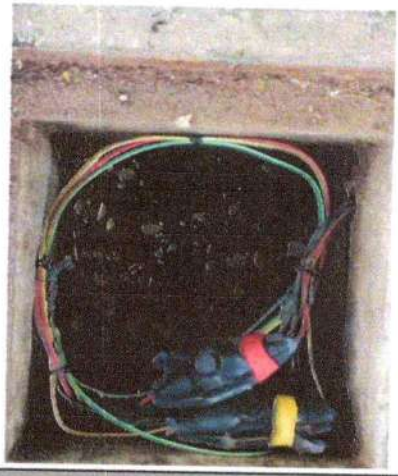


Foto No 95:Empalme de baja tensión



Foto No 96: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra



Foto No 97: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra

REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 7	de 7
DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	12	2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 98: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra



Foto No 99: Sistema de apantallamiento y puesta a tierra



Foto No 100:Punta captora en aluminio

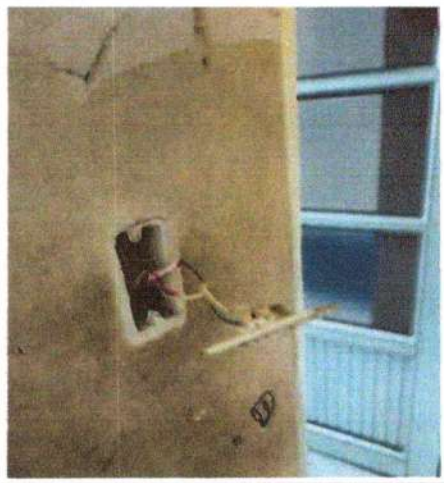


Foto No 101: Desinstalación de interruptor

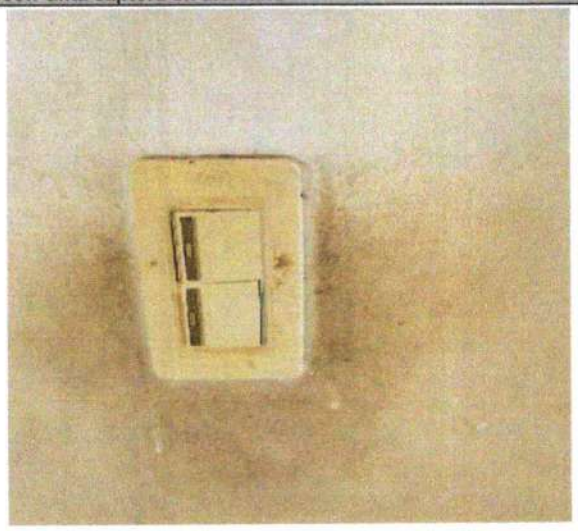


Foto No 102: Desinstalación de interruptor

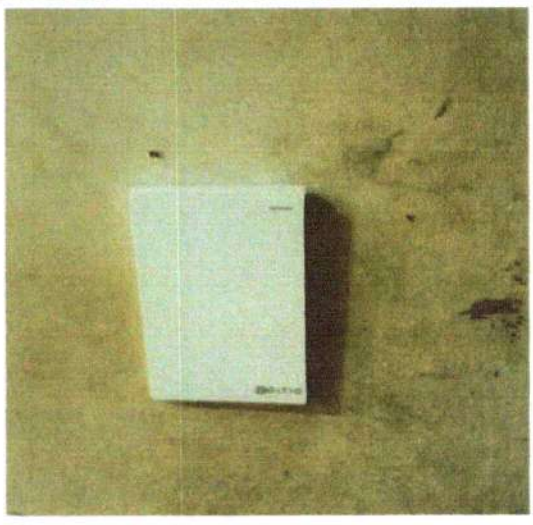


Foto No 103: Instalación de interruptor

ING. ROSELINO ACOSTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. FERNANDA CHALA PRIETO
TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

ING. FERNANDO GARZON BERNAL
DIRECTOR DE OBRA

ING. JESUS ALBERTO PINZON
RESIDENTE DE OBRA

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	15	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA *No.* 8

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 8 del : 8/12/2025 al 14/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 52 días

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ **50.649.554,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA $ **520.800.049,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Ejecucion (%)	7,91%	84,19%
Valor obra programada:	$ 4.004.345,08	$ 42.640.863,83

OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	12,66%	99,70%
Valor de la obra ejecutada:	$ 65.951.796,00	$ 519.231.558,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	805 del 2025
Contrato No.	805 del 2025
Valor Inicial:	$ 50.649.554,00
Plazo Inicial:	Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha de Iniciación:	miércoles, 17 de septiembre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	miércoles, 31 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA:	797 del 2025
Contrato No.	797 del 2025
Valor Inicial:	$ 520.800.049,00
Plazo Inicial:	tres (3) meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 20 de octubre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	lunes, 19 de enero de 2026

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	15	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La ejecución de obra en la semana fue la siguiente:

401 - Poste Metalico Conico De 16m De Altura Libre, Incluye Cruceta, Peldaños Y Argollas, Incluye Base En Concreto 4000psi Para Instalacion.

408 - Proyector LED de 400W. Suministro e Instalacion

411 - BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN .Alambrón en aluminio de 8 mm para bajante de apantallamiento. incluye: tubo galvanizado EMT 3/4". suministro e instalación.

413 - Punta captora en aluminio 5/8" x 0.6 m con base. Suministro e instalación.

RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la presente semana, la interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación de las actividades correspondientes a la instalación del sistema de iluminación y apantallamiento, evidenciando la culminación total de los ítems contractuales asociados, así:

Ítem 401 – Poste metálico cónico de 16 m de altura libre:
Se verificó la correcta instalación del poste metálico cónico, incluyendo sus elementos complementarios como cruceta, peldaños y argollas. Asimismo, se constató la ejecución, validando dimensiones, alineación, verticalidad y adecuado, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto.

Ítem 408 – Proyector LED de 400W:
La interventoría evidenció el suministro e instalación de los proyectores LED de 400W, verificando su correcta fijación sobre la estructura, orientación adecuada para cobertura lumínica, conexiones eléctricas seguras y funcionamiento óptimo del sistema de iluminación de la cancha sintetica.

Ítem 411 – Bajante de apantallamiento:
Se realizó la inspección del sistema de bajante de apantallamiento en alambrón de aluminio de 8 mm, incluyendo su canalización mediante tubería galvanizada EMT de 3/4". Se verificó la continuidad eléctrica, fijación adecuada y cumplimiento de las normas técnicas aplicables para sistemas de protección contra descargas atmosféricas.

Ítem 413 – Punta captora:
Se constató el suministro e instalación de la punta captora en aluminio de 5/8" x 0.6 m con su respectiva base, verificando su correcta ubicación en el punto más alto de la estructura, garantizando su funcionalidad dentro del sistema de apantallamiento. Con base en las verificaciones realizadas en campo, la interventoría deja constancia de que las actividades correspondientes a los ítems descritos fueron ejecutadas en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, planos y condiciones contractuales establecidas en el contrato de obra No. 797 de 2025.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA

Se evidencia la culminación de las actividades contractuales asociadas al sistema instalado, quedando sujetas únicamente a procesos de recibo final y/o liquidación del contrato, según corresponda.

REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de	4
DEPARTAMENTO DE CASANARE	15	12		2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805		2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 104: Instalación Poste metálico cónico de 16 m de altura libre



Foto No 105: Instalación Poste metálico cónico de 16 m de altura libre



Foto No 106: Instalación Poste metálico cónico de 16 m de altura libre



Foto No 107: Instalación Poste metálico cónico de 16 m de altura libre



Foto No 108: Instalación de proyector LED



Foto No 109: Instalación de proyector LED

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 4	de	4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	15	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 110: Instalación de proyector LED

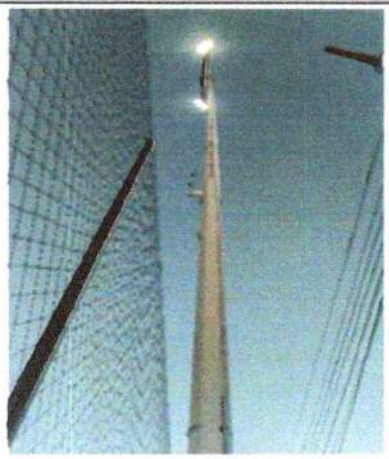


Foto No 111: Instalación de proyector LED

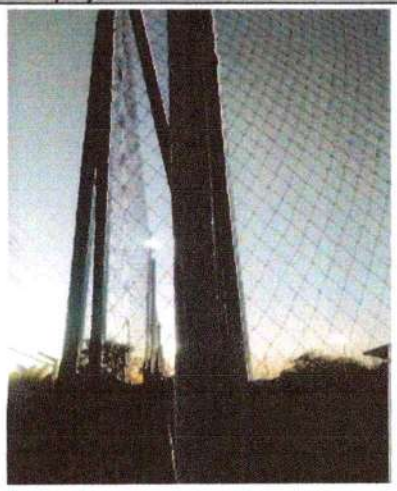


Foto No 112: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm



Foto No 113: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm



Foto No 114: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm



Foto No 115: Bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio de 8mm

ING. ROSELINO ACOSTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. FERNANDA CHALA PRIETO
TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

ING. FERNANDO CARZON BERNAL
DIRECTOR DE OBRA

ING. JESUS ALBERTO PINZON
RESIDENTE DE OBRA

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1	de	1
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	22	12	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805	DE 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA *No.* 9

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 9 del : 15/12/2025 al 21/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 días

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 50.649.554,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA $ 520.800.049,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Ejecucion (%)	7,91%	92,09%
Valor obra programada:	$ 4.004.345,08	$ 46.645.208,92

OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)		99,70%
Valor de la obra ejecutada:		$ 519.231.558,31

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	805 del 2025
Contrato No.	805 del 2025
Valor Inicial:	$ 50.649.554,00
Plazo Inicial:	Tres (3) meses y quince (15) dias
Fecha de Iniciación:	miércoles, 17 de septiembre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	miércoles, 31 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA:	797 del 2025
Contrato No.	797 del 2025
Valor Inicial:	$ 520.800.049,00
Plazo Inicial:	tres (3) meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 20 de octubre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	lunes, 19 de enero de 2026
Nueva fecha de Terminación:	miércoles, 31 de diciembre de 2025

RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la presente semana, la interventoría verificó la culminación total de las actividades contempladas en el contrato de obra, cuyo valor contractual fue de $520.800.049, correspondiente a la ejecución de los capítulos de preliminares, instalaciones sanitarias, obras de cancha y cerramiento, e instalaciones eléctricas. Este valor incluyo el suministro de materiales, mano de obra, equipos y costos indirectos necesarios para la adecuación integral del escenario deportivo.

Con base en la revisión en campo y los valores ejecutados, se establece que el contrato alcanzó un avance físico y financiero del 99,70 %, equivalente a $519.231.558,31, evidenciándose la ejecución de la totalidad de las actividades contractuales.

En consecuencia, la interventoría deja constancia de la finalización de las obras, quedando el proyecto en etapa de cierre administrativo, recibo final y proceso de liquidación contractual, conforme a lo establecido en las condiciones del contrato.

ING. ROSELINO ACOSTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ARQ. FERNANDA CHALA PRIETO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL
ING. FERNANDO GARZON BERNAL DIRECTOR DE OBRA	ING. JESUS ALBERTO PINZON RESIDENTE DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1	de	1
DEPARTAMENTO DE CASANARE		31	12	2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM	AA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	805		DE 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA *No.* 10

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 10 del : 22/12/2025 al 31/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 69 días

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 50.649.554,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA $ 520.800.049,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Ejecucion (%)	7,91%	100,00%
Valor obra programada:	$ 4.004.345,08	$ 50.649.554,00

OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)		99,70%
Valor de la obra ejecutada:	$ -	$ 519.231.558,31

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	805 del 2025
Contrato No.	805 del 2025
Valor Inicial:	$ 50.649.554,00
Plazo Inicial:	Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha de Iniciación:	miércoles, 17 de septiembre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	miércoles, 31 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA:	797 del 2025
Contrato No.	797 del 2025
Valor Inicial:	$ 520.800.049,00
Plazo Inicial:	tres (3) meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 20 de octubre de 2025
Estado Actual:	En ejecución
Fecha de Terminación:	lunes, 19 de enero de 2026
Nueva fecha de Terminación:	miércoles, 31 de diciembre de 2025

RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO

Con base en la revisión en campo y de Valores Ejecutados, se establece que el contrato alcanzó un avance físico y financiero del 99,70 %, equivalente a $519.231.558,31, evidenciándose la ejecución de la totalidad de las actividades contractuales.

Así mismo, se deja constancia de que se suscribió el acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad, así como el acta de terminación del contrato, debidamente firmada el día 31 de diciembre de 2025, en razón a que las actividades fueron ejecutadas antes del plazo inicialmente previsto. Es importante señalar que el contrato tenía como fecha de finalización el día 19 de enero de 2026; no obstante, debido al cumplimiento anticipado de las obligaciones contractuales, se procedió a formalizar su terminación de manera anticipada.

En consecuencia, el proyecto se encuentra en etapa de cierre administrativo y proceso de liquidación contractual, conforme a lo establecido en las condiciones del contrato.

ING. ROSELINO ACOSTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ARQ. FERNANDA CHALA PRIETO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL
ING. FERNANDO GARZON BERNAL DIRECTOR DE OBRA	ING. JESUS ALBERTO PINZON RESIDENTE DE OBRA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO A LA GUIA DE MANEJO AMBIENTAL Y HSE

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y HSE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0805 DE 2025

DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0797 DE 2025

DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

R/L LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA

DICIEMBRE DE 2025

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN

La Interventoría Ambiental es la responsable directa por la supervisión, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica para el proyecto en construcción MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, así como también de verificar, controlar las medidas de manejo contenidas en la Guía de Manejo Ambiental y el programa HSE presentado para el proyecto en cuanto a licencia, concesiones o permisos autorizados que se pueden derivar dentro de un proyecto específico.

El presente informe describe las acciones ambientales realizadas por el contratista de obra dentro del periodo del 01 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025, previa presentación de un informe técnico a la interventoría con sus debidos soportes, la presente consultoría verifica y evidencia que se cumpla con las actividades ambientales propuestas en la Guía de Manejo Ambiental y el programa HSE del proyecto cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo fin es realizar seguimiento y control ambiental del contrato de Obra No. 0797 de 2025.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría ambiental tiene por objeto general, Verificar, controlar y hacer que se cumpla la implementación del GMA del proyecto E MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, haciendo énfasis en las siguientes funciones:

- Hacer un seguimiento detallado del Guía de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.
- Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Guía de Manejo Ambiental.
- Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el Guía de Manejo Ambiental.
- Colaborar con el contratista para la correcta implementación del Guía de Manejo Ambiental.
- Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades.
- Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
- Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas.
- Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista de construcción y que impliquen un cambio a lo establecido en el Guía de Manejo Ambiental del proyecto.
- Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local.
- Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del Guía de Manejo Ambiental.
- Informe mensual de control y manejo ambiental.
- Informe Periódico según lo exija la autoridad ambiental competente.
- Elaborar reportes de No conformidad sobre los aspectos ambientales que ameriten medidas correctivas.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

De acuerdo al Guía de manejo ambiental del proyecto, junto con el reporte mensual correspondiente al periodo presentado por el CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025 contratista de obra, la interventoría junto con la información tomada, verificada in situ y Área Directa de ejecución de las actividades contractuales del proyecto; se presenta a continuación, las actividades de cumplimiento por el contratista de obra en materia ambiental de acuerdo a la estructura de la GMA:

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL EN LA OBRA

Nombres y Códigos de los programas de manejo ambiental del PMA				
PROGRAMA	No-	**Nombre Proyecto**	**Código**	**Aplica**
Programa de gestión social	1.1	Atención, información a la comunicación a comunidades y autoridades municipales	PGS-01	Si
	1.2	Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente	PGS-02	Si
Programa actividades constructivas	2.1	Manejo integral de materiales de construcción	PAC-03	Si
	2.2	Manejo De Excavaciones, Rellenos Y Movimientos De Tierra.	PAC-04	Si
	2.3	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	PAC-05	2.5
Programa de gestión del recurso hídrico	3.1	Manejo, tratamiento de residuos líquidos	PGH-06	Si
	3.2	Protección del recurso hídrico	PGH-07	Si
Programa de protección de recursos naturales	4.1	Protección de fauna y flora	PRN-08	Si

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO # 1: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESA INTERVENTORA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

RESPONSABLE: ROSELINO ACOSTA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

PERIODO DE REPORTE: 01 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se realizaron reuniones con la comunidad con anterioridad al inicio, durante la ejecución de las obras		X	No aplica para el periodo reportado.
2	En las reuniones se explicó el proyecto, el alcance y la forma de negociación de la servidumbre, así como las posibilidades reales de empleo y las formas de vinculación.		X	No aplica para el periodo reportado.
3	Se tomaron en cuenta las recomendaciones generales para la correcta definición y trazado de accesos	X		Se evidencia que en la obra existe Un buen trazado de Accesos.
4	Existe por parte del contratista un programa de señalización	X		Se evidencia en obra que hay buena señalización y buen manejo vial.
5	Presentó el contratista el Programa de Salud Ocupacional	X		Se evidencia la implementación del programa de salud ocupacional.
6	Presentó el contratista los listados de asistencia de los trabajadores a los cursos de inducción ambiental	X		Todos los trabajadores involucrados en el proyecto reciben capacitación ambiental.
7	Conoce el contratista la Licencia Ambiental otorgada al proyecto por parte de la autoridad ambiental competente?		X	No requiere de licencias ambientales para el desarrollo del proyecto. No Aplica.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO # 2: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES

EMPRESA INTERVENTORA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

RESPONSABLE: ROSELINO ACOSTA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

PERIODO DE REPORTE: 01 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se han construido obras para el control de erosión (trinchos provisionales, recuperación con vegetación)		X	No aplica para el proyecto
2	Se han seleccionado las áreas de acopio de material sobrante de excavación, las cuales se encuentran lejos de los cuerpos de agua	X		El contratista cumple con la actividad.
3	El despeje de elementos arbóreos y arbustivos se ha realizado estrictamente en el área prevista para colocar la estructura de apoyo		X	No aplica para el periodo reportado.
4	¿Se realizó la prospección y excavación arqueológica antes de iniciar las obras?		X	No aplica debido que es un área ya explotada por obras civiles.
5	Se realizó la empradización y recuperación del sitio de apoyo		X	No aplica para el periodo reportado.
6	En líneas urbanas, se coordinó con las autoridades viales para definir rutas alternas para el flujo vehicular		X	Para el periodo reportado no Aplico, debido al mínimo tráfico para la obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO # 3: SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

EMPRESA INTERVENTORA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ — RESPONSABLE: ROSELINO ACOSTA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

PERIODO DE REPORTE: 01 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se evidencia cumplimiento del programa PGS-01 Atención, información a la comunicación a comunidades y autoridades municipales		X	No aplico para el mes reportado.
2	Se evidencia cumplimiento del programa PGS-02 Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente	X		Se evidenciaron las listas afiliaciones del personal de obra, igualmente, se verifico que el HSE de obra realizara las respectivas verificaciones pre operacionales de la maquinaria y equipos utilizados durante el periodo reportado; además se evidencio la realización de charlas de tipo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y Registro fotográfico.
3	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-03 Manejo integral de materiales de construcción.	X		Registro fotográfico, Soporte licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010.
4	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-04 Manejo De Excavaciones, Rellenos Y Movimientos De Tierra	X		Registro fotográfico, Soporte licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010.
5	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-05 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	X		Se evidencia el almacenamiento adecuado de las bolsas de cemento para su disposición final.
6	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-06 Manejo, tratamiento de residuos líquidos.	X		Se evidencia la presencia de unidades sanitarias fijas en el lugar de ejecución del proyecto.
9	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-07 Protección del recurso hídrico.	X		Planillas Asistencia Capacitación, registro fotográfico y Soportes de la empresa suministradora de agua potable
10	Se evidencia cumplimiento del programa PRN-8 Protección de fauna y flora	X		Planillas Asistencia Capacitación, Registro fotográfico

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONCLUSIONES

- Durante el período evaluado, las actividades ejecutadas en el proyecto se desarrollaron bajo condiciones controladas, aplicando los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (HSE), lo que permitió reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes y afectaciones ambientales.

- El seguimiento al cumplimiento de los programas ambientales permitió evaluar la efectividad de las medidas de mitigación, determinando su pertinencia y, cuando fue necesario, ajustarlas para lograr mejores resultados ambientales.

- La supervisión ambiental permanente garantizó que los contratistas y el personal operativo actuaran de manera responsable, promoviendo el respeto por el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos.

- Los informes y registros generados durante el seguimiento constituyeron una herramienta clave para la toma de decisiones, la trazabilidad de las acciones implementadas y la rendición de cuentas ante las autoridades ambientales y la entidad contratante.

- En conclusión, el seguimiento de la Guía de Manejo Ambiental fue fundamental para asegurar una ejecución de la obra civil ambientalmente sostenible, permitiendo anticipar, controlar y minimizar los impactos, y garantizando el cumplimiento de los objetivos ambientales del proyecto.

Cordialmente,


ROSELINO ACOSTA MENDOZA
INGENIERO CIVIL
Anexo ( ) folios

Elaboró	Residente de interventoría	**Revisó**	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

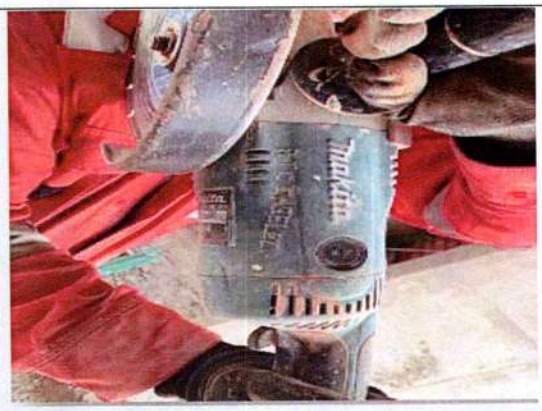Foto No. 1 Verificación del punto ecológico de obra.	Foto No. 2 Verificación de almacenamiento de material de obra.
	
Foto No. 3 Revisión del tanque de almacenamiento de agua para actividades de obra.	Foto No. 4 Realización de inspección diaria de equipos y maquinaria.
	
4Foto No. 5 Verificación del buen uso de EPP.	Foto No. 6 Verificación de punto de hidratación para personal de obra.
	

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto No. 7 Verificación de realización de capacitaciones a personal de obra	Foto No. 8 Verificación de aseo y limpieza de unidades sanitarias.
	
Fuente. Autor	

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO NO. 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901981507	9	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOD 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	CLL 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3138043348	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9496797046	9496797046	E	2026/01/05	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$2,538,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS (11 Afiliados)						$10,344,100	$1,655,600			$10,344,100	$414,200			$10,344,100	$414,200			$10,344,100	$54,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO (11 Afiliados)						**$10,344,100**	**$1,655,600**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$54,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (11 Afiliados)						**$10,344,100**	**$1,655,600**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$54,700**		**$0**	**$0**
1	CC	1109387906	ALMANZA LUIS	230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
2	CC	1094249172	CRISTANCHO YODYMAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	4179365	FAJARDO OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	1116542368	FIGUEREDO STEVEN	25-14	8	$379,600	$60,800	EPSC25	8	$379,600	$15,200	CCF69	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	$2,000	8	$0	$0
5	CC	74752830	GARZON FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	24227440	GARZON SORI	230301	7	$332,150	$53,200	EPSC25	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$332,150	$1,800	7	$0	$0
7	CC	1006442275	GAUCHA ANDRES	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF69	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$3,000	12	$0	$0
8	CC	1006443321	GUALDRON CESAR	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
9	CC	1116546919	LIEVANO LEIDY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
10	CC	1116544942	PINZON JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
11	CC	1006442791	SANCHEZ LIBARDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$800	3	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$10,344,100**	**$1,655,600**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$54,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901981507	9	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOD 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	CLL 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3138043348	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9496797046	9496797046	E	2026/01/05	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$2,538,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,655,600	$0	$0	$1,655,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$288,600	$0	$0	$288,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,367,000	$0	$0	$1,367,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$54,700	$0	$0	$54,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$54,700	$0	$0	$54,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$414,200	$0	$0	$414,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$414,200	$0	$0	$414,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$414,200	$0	$0	$414,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$28,500	$0	$0	$28,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$121,600	$0	$0	$121,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,100	$0	$0	$36,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				11	$2,538,700	$0	$0	$2,538,700

2025/12/23 10:06 AM

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO NO. 3 VERIFICACIÓN DIARIA DE CONDICIONES FÍSICAS DE EQUIPOS.

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA
CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025	Codigo	Version	oct-25
	HSE-F-05	0	PAGINA 1 de 1

OBRA: Cancha Sintetica San Carlos INSPECCIONADO POR: Sori Constanza Garzón

SEMANA DEL 01 AL 06 MES Diciembre AÑO 2025

HERRAMIENTA	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palines	3	X		X		X		X		X		X	
Palas	3	X		X		X		X		X		X	
Barras	2	X		X		X		X		X		X	
Picas	2	X		X		X		X		X		X	
Hachetas	2	X		X		X		X		X		X	
Puntero	1	X		X		X		X		X		X	
taladro Martillo	1	X		X		X		X		X		X	
Extensiones Electricas	3	X		X		X		X		X		X	
Flexometro	1	X		X		X		X		X		X	
Decametro	1	X		X		X		X		X		X	
Pulidora	2	X		X		X		X		X		X	
Carretilla	2	X		X		X		X		X		X	
pala plana	1	X		X		X		X		X		X	
Escobones	2	X		X		X		X		X		X	
Nivel	1	X		X		X		X		X		X	
Pallustre	1	X		X		X		X		X		X	
Boquillera	1	X		X		X		X		X		X	

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Sori Constanza G.	
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	Código: HSE-F-010 Versión: 00 Fecha Aprobación: Octubre 2025

PROYECTO N°	0797-2025	**MARCA**	Makita
PULIDORA N°:	1	**SERIE:**	MK-01
SEMANA DEL	01 DE Diciembre	**AL**	07 DE Diciembre

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X				✓		✓				✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X				✓		✓				✓			
Estado del accesorio portadiscos	X				✓		✓				✓			
Estado del mango	X				✓		✓				✓			
Estado del cuerpo	X				✓		✓				✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X				✓		✓				✓			
Estado general de la guía y la guarda	X				✓		✓				✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X				✓		✓				✓			
Condiciones de orden y aseo	X				✓		✓				✓			
OTROS														

INSPECCIONADO POR:	Cesar Cevallos	**FIRMA**	Cesar Cevallos

OBSERVACIONES:

Yodymeer Cevallos
FIRMA DE SUPERVISOR HSE

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA oct-25
CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025	Codigo HSE-F-05	Version 0	PAGINA 1 de 1

OBRA: Cancha Sintetica San Carlos INSPECCIONADO POR: Sori Constanza Garzón

SEMANA DEL 8 AL 13 MES Diciembre AÑO 2025

HERRAMIENTA	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Barras	2	X		X		X		X		X		X	
Palas	3	X		X		X		X		X		X	
Pala Plana	1	X		X		X		X		X		X	
Polines	3	X		X		X		X		X		X	
Picas	2	X		X		X		X		X		X	
Hacetas	2	X		X		X		X		X		X	
Puntero	1	X		X		X		X		X		X	
Palustre	1	X		X		X		X		X		X	
Flexometro	1	X		X		X		X		X		X	
Decametro	1	X		X		X		X		X		X	
Alicate	1	X		X		X		X		X		X	
Boguillera	1	X		X		X		X		X		X	
Nivel	1	X		X		X		X		X		X	
Pulidora	1	X		X		X		X		X		X	
Carretilla	2	X		X		X		X		X		X	

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Sori Constanza G.	
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Código: HSE-F-010 Versión: 00 Fecha Aprobación: Octubre 2025

PROYECTO N°	0797-2025	MARCA	Makita
PULIDORA N°:	1	SERIE:	ME-07

SEMANA DEL 08 DE Diciembre AL 14 DE Diciembre

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			✓				✓				✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓				✓				✓			
Estado del accesorio portadiscos			✓				✓				✓			
Estado del mango			✓				✓				✓			
Estado del cuerpo			✓				✓				✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			✓				✓				✓			
Estado general de la guía y la guarda			✓				✓				✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓				✓				✓			
Condiciones de orden y aseo			✓				✓				✓			
OTROS														

INSPECCIONADO POR:	Cesar Gualdron	FIRMA	Cesar Gualdron

OBSERVACIONES:

Yadymeel Cristancho
FIRMA DE SUPERVISOR HSE

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS		FECHA
CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025	Codigo	Version	oct-25
	HSE-F-05	0	PAGINA 1 de 1

OBRA: Cancha Sintetica San Carlos INSPECCIONADO POR: Sori Constansa Garzon

SEMANA DEL 15 AL 20 MES Diciembre AÑO 2025

HERRAMIENTA	CANT.	LUN		MAR		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palines	3	X		X									
palas	3	X		X									
pala Plana	1	X		X									
Barras	2	X		X									
Picas	2	X		X									
Macetas	2	X		X									
Flexometro	1	X		X									
Decametro	1	X		X									
Extensiones electricas	3	X		X									
Puntero	1+1	X		X									
Alicate	1	X		X									
Pulidora	1	X		X									
Carretillas	2	X		X									

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

Sori Constansa G.	
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Código: HSE-F-010
		Versión: 00
		Fecha Aprobación: Octubre 2025

PROYECTO N°	0797 - 2025	MARCA	Makita
PULIDORA Nº:	1	SERIE:	MF-01

SEMANA DEL 15 DE Diciembre AL 21 DE Diciembre

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓				✓									
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓									
Estado del accesorio portadiscos	✓				✓									
Estado del mango	✓				✓									
Estado del cuerpo	✓				✓									
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓				✓									
Estado general de la guía y la guarda	✓				✓									
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓				✓									
Condiciones de orden y aseo	✓				✓									
OTROS														

INSPECCIONADO POR: Cesar Gualtron FIRMA Cesar Gualtron

OBSERVACIONES:

Yadymeel Cristancho
FIRMA DE SUPERVISOR HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO NO. 4 PLANILLAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN.

	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA oct-25
	Codigo HSE-F-16	Versión 0	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	Diciembre 1º de 2025
TEMA	Primeros auxilios
DURACIÓN	15 Minutos

INSTRUCTOR	Yadymar Cristancho	CARGO	Profesional HSE

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
Andrés Caveha	1006442272	Ayudante de obra		
Alejandro Sánchez	1006442791	Ayudante de obra		
Luis Carlos Almanza	1109 389 906	Ayudante de obra		Luis Carlos Almanza
Cesar David Gualdron	1006 443 321	Ayudante de obra		
Daniel Felipe Montaño	1057 978 891	Ayudante de obra		
Steven Figueredo	1116. 542 368	Ayudante de obra		Steven F
Felix Barbosa	3920 179	Ayudante de obra		
Jose Constanso Corzo	24227440			

	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA oct-25
	Codigo HSE-F-16	Versión 0	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	08 DIC 2025
TEMA	Buenas practicas
DURACIÓN	15 Minutos

INSTRUCTOR	Yadymar Cristancho	CARGO	Profesional HSE

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
Cesar David Gualdron	1006.443.321	Ayudante		
Luis Carlos Almanzo	1109387906	Ayudante		
Andrés Gaucha	1006.442.275	Ayudante		
Breiner Gelves	1116.542.981	Ayudante		
Sorf Constanza Garzon	24227.440	Inspectora.		

	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA oct-25
	Codigo HSE-F-16	Versión 0	Pagina 1 DE 1

INDUCCION ESPECIFICA	
REINDUCCIÓN	
CHARLAS	X
CAPACITACIÓN	
REUNIÓN INFORMATIVA	
OTROS	

FECHA	15 Diciembre 2025
TEMA	Cuidado de Nuestro Entorno
DURACIÓN	15 Minutos

INSTRUCTOR	Yadymar Cristancho	CARGO	Profesional HSE

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN (Aplica solo para capacitación)	FIRMA
Cesar David Gualdron		Ayud Obra	Cesar Gualdron	
Luis Carlos Almanza		Ayud. Obra	Luis Carlos Almanza	

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO NO. 5 SOPORTES EMPRESA EL CAUCE

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

	CONTROL ENTREGA DE AGUA	FECHA	
		oct-25	
		Codigo	Pagina
		HSE-F-17	1 DE 1

ENTREGA DE AGUA POTABLE

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FERNANDEZ MESA URIEL ANTONIO	NIT	74.181.005

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LUGAR DE ENTREGA	OBRA	MES	NOVIEMBRE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
Botellon	2	12/11/2025	Uriel.
Botellón	2	14/11/2025	Uriel 3.
Botellon	2	19/11/2025	Uriel 3.
Botellón	2	25/11/2025	Uriel 3
Botellón	2	27/11/2025	Uriel. (3)
Botellon	2	29/11/2025	Uriel (3).
Botellón	3	02/12/2025	Uriel (4)
Botellon	3	09/12/2025	Uriel
Botellon	2	13/12/2025	Uriel (5)

AQUALIM

AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORÍAS S.A.S.
NIT. 901.823.957-3

IDEAM LABORATORIO ACREDITADO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD LABORATORIO AUTORIZADO

INFORME DE RESULTADOS DE ALIMENTOS
2124-25

Datos del Solicitante	
Cliente	Uriel Antonio Fernández Mesa/Refrescos El Cause
NIT/C.C.	74181005
Dirección	Calle 15 No. 11 - 82
Municipio	Aguazul
Teléfono	3118081654

Datos de la Muestra	
Municipio de Recolección	Aguazul
Dirección de Toma de Muestra	Calle 15 No. 11 - 82
Lugar de Toma de Muestra	Producción
Tipo de Alimento	Agua Potable Tratada
Cantidad y/o Presentación	5L
Marca del Producto	El Cauce
Registro Sanitario	RSA-0024676-2023
Lote	0225
Fecha de producción	2025-12-16
Fecha de Vencimiento	2026-01-15
Recolectada por	Cliente; Uriel Fernandez (Información suministrada por el cliente)
Plan y Procedimiento de Muestreo	No reporta; No reporta
Fecha y Hora de Recolección	2025-12-16 14:00
Fecha y Hora de Recepción	2025-12-16 16:00
Fecha y hora de Emisión del Resultado	2025-12-23 11:30

Análisis de Laboratorio

Fecha de Análisis	Parámetro	Resultado	Unidades	Método	Técnica	Norma Agua Envasada Res. 1407:2022
2025-10-15	Mesofilos	5	UFC/mL	SM 9215	Recuento en Placa	-
2025-10-15	Pseudomonas Aeruginosa	<1	NMP/100mL	SM 9213 F MODIFICADO	Sustrato Enzimático Multiceldа	<1
2025-10-15	Escherichia Coli	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1
2025-10-15	Coliformes Totales	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1

Parámetro no Acreditado, * Parámetros Acreditados por el IDEAM; • Parámetros Subcontratados; •* Parámetros Subcontratados Acreditados ; (ISC): Corresponden a información suministrada por el cliente; SM: Standard Methods for the Examination of Water And Wastewater.

LCM: Límite de cuantificación del método; NMP: Número Más Probable; UFC: Unidades Formadoras de Colonias

OBSERVACIONES:

Cotización 158-25V1; Item 1

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita por AQUALIM, Los resultados son válidos únicamente para las muestras analizadas en el laboratorio AQUALIM. El laboratorio no es responsable del origen o la fuente de donde han sido extraídas las muestras y de la información que sea suministrada por el cliente (ISC) que pueda afectar la validez de los resultados.
AQUALIM se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 0229 de 19 de febrero de 2024 para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.



SEBASTIAN FLECHAS FIGUEROA
DIRECTOR DEL LABORATORIO
Revisó y Aprobó

Fin del Resultado

LABORATORIO AMBIENTAL
LABORATORIO AMBIENTAL

Carrera 23 No. 19 - 15 Yopal - Casanare
Cel.: 310 349 0629 - 320 301 7075
gerencia@aqualim.com - cotizaciones@aqualim.com
www. aqualim.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

BITACORA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

26

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

4000 psi el cual fue fundido con verificación del interventor, se generaron sus debidas tomas de muestras.

Jesus Alberto Pinzon
Residente de Obra

Roselino Acosta
Residente de Inter

Yadymar Cristancho
HSE Obra

Fernando Garzón
Director de Obra

Fernanda Chala
Inspectora de Inter.

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 04 de Diciembre del 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Electrico Obra, Residente Electrico Interventoria, Residente de Interventoria, HSE Obra, Inspectora Interventoria, 6 Ayudantes de Obra

EQUIPOS: Herramienta Menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

HORA DE INICIO: 7:00 am

Inicamos actividades realizando la instalación de Puesta a tierra para terminal de ramal en baja tensión, en acero inoxidable, se realizó la respectiva instalación, adicionalmente se realizan 10 Empalmes de baja tension 91-b-1, 8-14 derivación cumpliendo con las normativas electricas, se realiza la instalación de los aparatos sanitarios; 2 inodoros para las baterias sanitarias

Jesus Alberto Pinzon
Residente de Obra

Roselino Acosta
Residente de Inter

Yadymar Cristancho
HSE Obra.

CONTRATO DE OBRA Nº 797 DE 2025

FECHA: 05 de Diciembre del 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Inter, Residente Electrico Interventoria y Obra, HSE Obra, Inspectora Interventoria, 6 Ayudantes de Obra.

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

HORA DE INICIO: 7:00 am

Inician actividades de Obra continuando con la instalacion de cableado de circuitos, posteriormente se realizan los 8 empalmes de baja tension faltantes, se realiza la instalacion de la proteccion termomagneticas bipolares de 20 a 30 amperios, se termina la jornada con aseo a las instalaciones

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Roselino Acosta
Residente de Inter

Yodymar Gutierrez
Yodymar Gutierrez
HSE Obra

CONTRATO DE OBRA Nº 797 DE 2025

FECHA: 06 de Diciembre del 2025.

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Inter, Residente Electrico Obra e Interventoria, HSE Obra, Inspectora de Interventoria, 5 Ayudantes de Obra.

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

HORA DE INICIO: 7:00 am

Se da inicio a las actividades del dia con la instalación de un aparato sanitario (orinal) y la instalación de 2

28

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

duchas para las baterias sanitarias, adicionalmente se realiza la instalación de lavarillas de copperweld 5/8" X 2.4m y se realizo la respectiva soldadora exotermica

Jesus Alberto Pinzon
Residente de Obra

Yadymar Cristancho
HSE Obra

Roselino Acosta M
Residente de Inter.

Oscar Fajardo
Residente Electrico Obra.

Fernanda Chala
Inspectora Inter.

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 07 de Diciembre del 2025

DIA NO LABORAL

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 08 de Diciembre del 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Electrico de Obra e Interventoria, Residente de Interventoria, HSE Obra, Inspectora de Interventoria, 5 Ayudantes de Obra.

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

HORA DE INICIO: 7:00 am

Inician actividades en obra con la instalación de proyector LED de 400 W en los postes existentes que estaran ubicados alrededor dela cancha sintetica, se realiza la instalacion de dos proyectores, se realiza la instalación de punta captard en aluminio 5/8" x 0.6m se instalan 2 unidades adicionalmente se inicia la instalación de la

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

bajante de apantallamiento en Alambrón en aluminio de 8mm el cual incluye tuberia EMT

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Yadymar Cristancho
Yadymar Cristancho
HSE Obra

Roselira Acosta
Roselira Acosta
Residente de Inter

Oscar Tajardo
Residente Electrico Obra

LEISON ANDRES G
Leison Andres Garcia
Residente Electrico Inter

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 09 de Diciembre del 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Electrico de Obra e Interventoria, HSE Obra, Inspectora de Interventoria, 4 Ayudantes de Obra.

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

HORA DE INICIO: 7:00 am

Se da inicio a las actividades del dia con instalación de elementos del capitulo de electricidad; se continua con la instalación de punta captora en aluminio 5/8" x 0.6m se instalan 2 unidades en los postes existentes, tambien se instalo la bajante de apantallamiento en alambrón en aluminio en los postes donde se instalán los proyectores LED.

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Yadymar Cristancho
Yadymar Cristancho
HSE Obra

Oscar Tajardo
Residente Electrico Obra

30

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 10 de Diciembre de 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Electrico de Obra e Interventoria, HSE Obra, Inspectora de Interventoria, 4 Ayudantes de Obra.

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

HORA DE INICIO: 7:00 am

Se realizan actividades en obra con la fundición de la tapa de la caja de inspección CS-274, se continua con la instalación de Proyector LED de 400w tipo estadio par iluminar la cancha sintetica, se instalaron 2 luminarias, adicionalmente se realiza la instalación de punta captora en aluminio 5/8" x 0.6m.

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Yadymar Cristancho
Yadymar Cristancho
HSE Obra

Roselino Acosta
Roselino Acosta
Residente de Inter

Oscar Fajardo
Residente Electrico Obra

LEISON ANDRES G
Leison Andres Garcia
Residente Electrico Inter

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 11 de Diciembre de 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Electrico Obra e Interventoria, HSE Obra, Inspectora Interventoria, 5 Ayudante de Obra

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

CONTRATO DE OBRA Nº 797 DE 2025

FECHA: 11 de Diciembre de 2025.

Iniciamos actividades con la instalación de los Postes metalicos conicos de 16 m, se realiza instalacion de los Proyector LED de 400 w en los nuevos postes metalicos, se realizan actividades de limpieza en la cancha sintetica.

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Yodymar Cristancho
HSE Obra

Roselino Acosta
Residente de Inter

CONTRATO DE OBRA Nº 797 DE 2025

FECHA: 12 de Diciembre de 2025.

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Interventoria HSE Obra, Inspectora de Interventoria, Residente Electrico Obra e Interventoria, 5 Ayudantes de Obra.

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

HORA DE INICIO: 2:00 pm

Inician actividades en obra dando continuidad a la instalacion de los postes metalicos conicos de 16 m las cuales por su tamaño fue necesario hacer uso de camión grua para su respectiva instalación, se continua con actividades de limpieza al rededor de la cancha.

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Oscar Tajardo
Residente Electrico
Obra.

Yodymar Cristancho
Yodymar Cristancho
HSE Obra

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 13 de Diciembre del 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Interventoria, HSE Obra, Residente Electrico Obra e Interventoria, Inspectora Interventoria, 5 Ayudantes de Obra

Equipos: Herramienta menor

Estado del tiempo: Soleado

Hora de inicio: 7:00 am

Inician actividades de obra del capitulo de instalaciones electricas con la instalacion de bajante de apantallamiento para los postes metalicos conicos de 16 m de altura, se realiza la instalacion de cableado de circuitos ramales para iluminación sendero y cancha sintetica en cable THW, 600 V (3X No 10 AWG).

Jesus Alberto Pinzón	Yadymoor Cristancho	Roselino Acosta
Residente de Obra	HSE Obra	Residente Interventoria

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 14 de Diciembre del 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Interventoria, HSE Obra, Residente Electrico Obra e Interventoria, Inspectora Interventoria, 5 Ayudantes de Obra

Equipos: Herramienta menor

Estado del tiempo: Soleado

Hora de inicio: 7:00 am

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

Se inician actividades dando continuidad a la instalacion del ultimo poste metalico conico de 16 m de altura, el cual se le hace instalación de 2 luminarias tipo Proyector LED de 400w los cuales suministraran iluminacion en la zona central de la cancha sintetico

Jesus Alberto Pinzon
Residente de Obra

Yadymar Cristancho
HSE Obra

Roselino Acosta
Residente Inter

Fernanda Chala
Inspectora Interventoria

Oscar Fajardo
Residente Electrico Obra.

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA : 15 de Diciembre del 2025.

PERSONAL : Director de Obra , Residente de Obra, Residente de Inter, HSE Obra, Residente Electrico Obra e Interventoria, Inspectora Interventoria, 6 Ayudante de Obra.

EQUIPOS : Herramienta menor

ESTADO DEL TIEMPO : Soleado.

HORA DE INICIO : 7:00 am

Iniciamos actividades realizando la inspeccion de las actividades ejecutadas, luego de finalizado el capitulo de instalaciones electrica se termina de realizar la limpieza alrededor de la cancha sintetica para continuar con la instalacio de la laveta prefabricada la cual fue retirada al inicio del proyecto para realizar las instalaciones electricas.

34

CONTRATO DE OBRA Nº 797 DE 2025

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Yadymar Cristancho
Yadymar Cristancho
HSE Obra

Fernanda Ch
Fernanda Chaparro
Inspectora Inter

Roselino Acosta
Roselino Acosta
Residente de Interventoria

LEISON ANDRES G
Leison Andres Garcia
Residente Electrico Inter

CONTRATO DE OBRA Nº 797 DE 2025

FECHA: 16 de Diciembre de 2025

PERSONAL: Residente de Obra, Director de Obra, Residente de Interventoria HSE Obra, Residente Electrico de Obra e Interventoria, Inspector Interventoria, 3 Ayudantes de Obra.

Equipos: Herramienta menor

Estado del tiempo: Soleado

Hora de inicio: 7:00 am

Se inician actividades dando continuidad al orden en la obra, mediante jornadas de aseo para la posterior entrega del equipamiento deportivo, adicionalmente se inicia la instalación de las losetas prefabricadas faltantes en el anden perimetral de la cancha sintetica.

Jesus Alberto Pinzón
Residente de Obra

Roselino Acosta
Residente de Inter

Yadymar Cristancho
Yadymar Cristancho
HSE Obra

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 17 de Diciembre de 2025

PERSONAL: Residente de Obra, Director de Obra, Residente de Interventoria, Inspectora interventoria, 4 Ayudante de Obra

Equipos: Herramienta Menor

Estado del tiempo: Soleado

Hora de INICIO: 7:00am

Iniciamos actividades dando continuidad a actividades de aseo, retiro de materiales sobrantes de la obra, adicionalmente se realizo la instalacion de las losetas prefabricadas faltantes del anden perimetral, se realiza aseo en las baterias de los baños para caballeros.

Jesus Alberto Pinzón	Roselino Acosta	Yadymar Cristancho
Residente de Obra	Residente de Inter	HSE Obra

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

FECHA: 18 de Diciembre de 2025

PERSONAL: Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Inter, Inspectora de Interventoria. Residente Electrico de Obra e Interventoria, 2 Ayudantes de Obra.

EQUIPOS: Herramienta menor

ESTADO DE TIEMPO: Soleado.

HORA DE INICIO: 7:00 am

Se inician actividades realizando la verificación en conjunto con la interventoria de las actividades ejecutadas en la cancha sintetica San Carlos

CONTRATO DE OBRA N° 797 DE 2025

se conto con presencia de la interventoria para verificar la entrega de la obra

Jesus Alberto Pinzo
Residente de Obra

Yadymar Gustancho
Yadymar Gustancho
HSE Obra

Roselino Acosta
Residente de Inter

Oscar Fajardo
Residente Electrico Obra

LEISON ANDRES G.
Leison Andres Garcia
Residente Electrico Inter

Yadymar Gustan
Yadymar Gustan
HSE Obra

Fernando Garzón
Director de Obra

Se finalizo la Obra el dia 19 de Diciembre del 2025

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ESTADO DEL TIEMPO

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

CUADRO DE CONTROL DIARIO EN OBRA DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA No 797 DE 2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATO INTERVENTORIA No 805 DE 2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ESTADO DEL TIEMPO MES DE DICIEMBRE DE 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L

MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D.L	D.L	D.L	D.L											

MIERCOLES
31

CONVENCIONES

SOL	NUBLADO	LLUVIA MODERADA	LLUVIA INTENSA

		CANTIDAD
D.L=	DIA LABORADOS	18
D	DESCANSO O FESTIVO	1

PORCENTAJE ESTADO DEL TIEMPO		%
DIA SOLEADO	18	100
NUBLADO	0	0
LLUVIA MODERADA	0	0
LLUVIA INTENSA	0	0
TOTAL PORCENTAJE		100

Acosta

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que el contrato de obra No. 797 del 2025. Cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."**

Que el CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025 identificado con NIT. No. 901.981.507-9 luego de examinar la contabilidad y demás documentación, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, se ha realizado el pago de los siguientes aportes, según se indica en la planilla soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la misma durante los meses de octubre noviembre y diciembre , de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

No. PLANILLA	PERIODO		IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF	VALOR TOTAL APORTE
9496797046	2025 -12	2026-01	$10.344.100	$414.200	$1.655.600	$54.700	$414.200	$2.538.700

1) Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

- ✓ Sistema de salud
- ✓ Riesgos profesionales
- ✓ Pensiones
- ✓ Caja de compensación

2) **"CERTIFICO"** el cumplimiento legal y oportuno a todas las obligaciones con el sistema integral de seguridad social.

3) **CERTIFICO** que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos profesionales y caja de compensación y que se encuentran exonerados del pago de los parafiscales, en ejecución del contrato

En constancia de lo anterior se expide en Aguazul, Casanare a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025, a solicitud del interesado con destino a "FINES PERTINENTES" y es válida únicamente con la fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, de lo contrario carece de toda validez.

LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA
R/L C.I. 1.116.546.919

LEIDY VIVIANA HINO MORENO
C PUBLICO TP No. 274301-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0864439F3C4F75B5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY VIVIANA NIÑO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116544218 de AGUAZUL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 274301-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

CERTIFICADO CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

274301-T

LEIDY VIVIANA
NIÑO MORENO
C.C. 1116644218
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296441 308677



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse a la UAE (571) 644 4550 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores, Cra 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

Firma



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.544.218

APELLIDOS NIÑO MORENO

NOMBRES LEIDY VIVIANA



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1987
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-SEP-2006 AGUAZUL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

COPIA PARA CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901981507	9	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOD 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	CLL 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3138043348	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9496797046	9496797046	E	2026/01/05	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$2,538,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS (11 Afiliados)						$10,344,100	$1,655,600			$10,344,100	$414,200			$10,344,100	$414,200			$10,344,100	$54,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO (11 Afiliados)						**$10,344,100**	**$1,655,600**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$54,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (11 Afiliados)						**$10,344,100**	**$1,655,600**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$54,700**		**$0**	**$0**
1	CC	1109387906	ALMANZA LUIS	230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
2	CC	1094249172	CRISTANCHO YODYMAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	4179365	FAJARDO OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	1116542368	FIGUEREDO STEVEN	25-14	8	$379,600	$60,800	EPSC25	8	$379,600	$15,200	CCF69	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	$2,000	8	$0	$0
5	CC	74752830	GARZON FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	24227440	GARZON SORI	230301	7	$332,150	$53,200	EPSC25	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$332,150	$1,800	7	$0	$0
7	CC	1006442275	GAUCHA ANDRES	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF69	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$3,000	12	$0	$0
8	CC	1006443321	GUALDRON CESAR	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
9	CC	1116546919	LIEVANO LEIDY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
10	CC	1116544942	PINZON JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
11	CC	1006442791	SANCHEZ LIBARDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$800	3	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$10,344,100**	**$1,655,600**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$414,200**			**$10,344,100**	**$54,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901981507	9	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOD 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	CLL 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3138043348	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	9496797046	9496797046	E	2026/01/05	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$2,538,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,655,600	$0	$0	$1,655,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$288,600	$0	$0	$288,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,367,000	$0	$0	$1,367,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$54,700	$0	$0	$54,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$54,700	$0	$0	$54,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$414,200	$0	$0	$414,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$414,200	$0	$0	$414,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$414,200	$0	$0	$414,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$28,500	$0	$0	$28,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$121,600	$0	$0	$121,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,100	$0	$0	$36,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				11	$2,538,700	$0	$0	$2,538,700

2025/12/23 10:06 AM

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NOMINA DE OBRA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2025

NIT. 901.981.507-6

NOMINA DEL 01 AL 19DE DICIEMBRE 2025

No.	NOMBRE	No. CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR DIA	SALARIO BASICO	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTOS EMPLEADOS		NETO A PAGAR	FIRMA
											SALUD(4%)	PENSION(4%)		
1	ANDRES FELIPE GAUCHA SANDOVAL	1.006.442.275	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	12	47.450	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	603.848	
2	ALEJANDRO SANCHEZ BENAVIDES	1.006.442.791	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	3	47.450	142.350	80.000	222.350	5.694	5.694	210.962	
3	CARLOS ANDRES HOLGUIN RODRIGUEZ	1.007.449.970	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	11	60.000	660.000	80.000	740.000	26.400	26.400	660.000	
4	CESAR DAVID GUALDRON CORDOBA	74.752.830	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	19	47.450	901.550	80.000	981.550	36.062	36.062	909.426	
5	DANIEL FELIPE PEREZ MONTAÑA	1.057.978.891	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	11	47.450	521.950	80.000	601.950	20.878	20.878	560.194	
6	FELIX BARBOSA	1.930.170	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	4	47.450	142.350	80.000	222.350	5.694	5.694	210.962	
7	LUIS CARLOS ALMANZA AMAYA	1.109.387.008	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	19,5	47.450	925.275	130.000	1.055.275	37.011	37.011	981.253	
8	STETIVEN FIGUEREDO	1.118.842.368	AYUDANTE DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	8	47.450	379.600	53.333	432.933	15.184	15.184	402.565	
9	SORI CONSTANSA GARZON AVILES	24.227.440	INSPECTORA DE OBRA	01/12/2025	19/12/2025	7	47.450	332.150	46.667	378.817	13.286	13.286	352.245	
	TOTAL									5.284.625	182.985	182.985	4.891.455	

ELABORO

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2025

NIT. 901.981.507-6

NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2025

No.	NOMBRE	No. CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR DIA	SALARIO BASICO	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTOS EMPLEADOS		NETO A PAGAR	FIRMA
											SALUD(4%)	PENSION(4%)		
1	FERNANDO GARZON BERNAL	74.758.830	DIRECTOR DE OBRA	20/10/2026	30/12/2025	30	47.450	1.423.500	200.000	**1.623.500**	56.940	56.940	**1.509.620**	
2	LEIDY LIZETH LIEVANO	1.116.546.919	REPRESENTANTE LEGAL	10/11/2025	30/12/2025	30	47.450	1.423.500	200.000	**1.623.500**	56.940	56.940	**1.509.620**	
3	JESUS ALBERTO PINZON RUIZ	1.116.544.942	RESIDENTE DE OBRA	10/11/2025	30/12/2025	30	47.450	1.423.500	200.000	**1.623.500**	56.940	56.940	**1.509.620**	
4	YODYMAR CRISTANCHO GELVES	1.094.249.172	PROFESIONAL HSE	10/11/2025	30/12/2025	30	47.450	1.423.500	200.000	**1.623.500**	56.940	56.940	**1.509.620**	
5	OSCAR RENE FAJARDO RINCON	4.179.365	RESIDENTE ELECTRICO	03/11/2025	30/12/2025	30	47.450	1.423.500	200.000	**1.623.500**	56.940	56.940	**1.509.620**	
	TOTAL									8.117.500	284.700	284.700	7.548.100	

ELABORO

APROBO

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**34**

Nombre: **SORI CONSTANZA GARZON AVILES**
Identificación: **24227440**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	7.00	$ 332,150.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	7.00	$ 46,666.00
Total Ingresos		**$ 378,816.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0.0	$ 13,286.00
Fondo de pensión	0.0	$ 13,286.00
Total Deducciones		**$ 26,572.00**

NETO A PAGAR **$ 352,244.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**35**

Nombre: **FERNANDO GARZON BERNAL**
Identificación: **74752830**
Cargo: **DIRECTOR DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
	Total Ingresos	**$ 1,623,500.00**		**Total Deducciones**	**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR **$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**36**

Nombre: **JESUS ALBERTO PINZON RUIZ**
Identificación: **1116544942**
Cargo: **RESIDENTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
	Total Ingresos	**$ 1,623,500.00**		**Total Deducciones**	**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR **$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**37**

Nombre: **LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA**
Identificación: **1116546919**
Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
	Total Ingresos	**$ 1,623,500.00**		**Total Deducciones**	**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR **$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**38**

Nombre: **LUIS CARLOS ALMANZA AMAYA**
Identificación: **1109387906**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	19.00	$ 901,550.00	Fondo de salud	0.0	$ 36,062.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	19.00	$ 126,666.00	Fondo de pensión	0.0	$ 36,062.00
Total Ingresos		**$ 1,028,216.00**	**Total Deducciones**		**$ 72,124.00**

NETO A PAGAR **$ 956,092.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**39**

Nombre: **YODYMAR CRISTANCHO GELVES**
Identificación: **1094249172**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
	Total Ingresos	**$ 1,623,500.00**		**Total Deducciones**	**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR **$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**40**

Nombre: **OSCAR RENE FAJARDO RINCON**
Identificación: **4179365**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Deducciones		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR **$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**41**

Nombre: **STEVEN FIGEREDO PRIETO**
Identificación: **1116542368**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	8.00	$ 379,600.00	Fondo de salud	0.0	$ 15,184.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	8.00	$ 53,333.00	Fondo de pensión	0.0	$ 15,184.00
	Total Ingresos	**$ 432,933.00**		**Total Deducciones**	**$ 30,368.00**

NETO A PAGAR **$ 402,565.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**42**

Nombre: **ANDRES FELIPE GAUCHA SANDOVAL**
Identificación: **1006442275**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	12.00	$ 569,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	12.00	$ 79,999.00
Total Ingresos		**$ 649,399.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0.0	$ 22,776.00
Fondo de pensión	0.0	$ 22,776.00
Total Deducciones		**$ 45,552.00**

NETO A PAGAR **$ 603,847.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**43**

Nombre: **CESAR DAVID GUALDRON CORDOBA**
Identificación: **1006443321**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	19.00	$ 901,550.00	Fondo de salud	0.0	$ 36,062.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	19.00	$ 126,666.00	Fondo de pensión	0.0	$ 36,062.00
	Total Ingresos	**$ 1,028,216.00**		**Total Deducciones**	**$ 72,124.00**

NETO A PAGAR **$ 956,092.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Nit 901981507

Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**
Comprobante Número:**44**

Nombre: **LIBARDO ALEJANDRO SANCHEZ BENAVIDES**
Identificación: **1006442791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	3.00	$ 142,350.00	Fondo de salud	0.0	$ 5,694.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	3.00	$ 19,999.00	Fondo de pensión	0.0	$ 5,694.00
	Total Ingresos	**$ 162,349.00**		**Total Deducciones**	**$ 11,388.00**

NETO A PAGAR **$ 150,961.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO CON TARJETA PROFESIONAL No. 157614-T EXPEDIDA ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que EDWAR ALEXANDER BARRETO, identificado con NIT/ CC. No. 79799614, luego de examinar la contabilidad y demás documentación, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes, según se indica en la planilla soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la misma durante el periodo del mes de diciembre de 2025, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

No. PLANILLA	PERIODO	IBC	PENSION	SALUD	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA	ICBF	VALOR TOTAL APORTES
9497870546	dic-25	$5.694.000,00	$ 911.200,00	$ 227.900,00	$ 396.400,00	$ 227.900,00	Exonerado		$ 1.763.400,00
TOTALES			**$ 911.200,00**	**$ 227.900,00**	**$ 396.400,00**	**$ 227.900,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.763.400,00**

4. Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:
   Sistema de salud
   - Riesgos profesionales
   - Pensiones
   - Caja de compensación
5. CERTIFICO" el cumplimiento legal y oportuno a todas las obligaciones con el sistema integral de seguridad social.

6. CERTIFICO que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en cuanto a Salud, pensión riesgos profesionales y caja de compensación y que se encuentra exonerados del pago parafiscales, en relación con el personal requerido para el desarrollo del contrato de interventoría Nº 0805 de 17 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. En constancia de lo anterior se expide en Aguazul, Casanare, a solicitud del interesado con destino a "FINES PERTINENTES" y es válida únicamente con la fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, de lo contrario carece de toda validez.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
Interventor
Representante Legal
Contrato interventoría No. 0805 del 2025

YENNY TORRES OSPINA
CONTADOR PUBLICO
T. P. 157614-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

157614-T



YENNY YASBLEIDY
TORRES OSPINA
C.C. 1057574604
RESOLUCION INSCRIPCION 107 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 168069

FIRMA DEL TITULAR 83456

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E0EEC8861FB75E5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY YASBLEIDY TORRES OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057574604 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 157614-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CANCHA	trv 16 8 b 82	TAURAMENA-CASANARE	3177761223	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2097435352	9497870546	E	2026/01/06	2026/01/20	BANCOLOMBIA	14	$1,778,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	74752762	ACOSTA ROSELINO		X																230301	30	EPS037	30	CCF69	30	14-11	30	30	Si
2	CC	1006441978	CHALA LIZETH		X																230201	30	EPS005	30	CCF69	30	14-11	30	30	Si
3	CC	1116544085	GARCIA LEISON		X																230301	30	EPS005	30	CCF69	30	14-11	30	30	Si
Total	**Afiliados(3)**																												

2026/01/20 02:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CANCHA	trv 16 8 b 82	TAURAMENA-CASANARE	3177761223	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2097435352	9497870546	E	2026/01/06	2026/01/20	BANCOLOMBIA	14	$1,778,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$911,200	$7,900	$0	$919,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$683,400	$5,900	$0	$689,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$2,000	$0	$229,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$396,400	$3,400	$0	$399,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$396,400	$3,400	$0	$399,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$227,900	$2,000	$0	$229,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$227,900	$2,000	$0	$229,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$227,900	$2,000	$0	$229,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,900	$1,000	$0	$114,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
TOTAL				3	$1,763,400	$15,300	$0	$1,778,700

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NOMINA DE INTERVENTORIA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NIT/C.C. 79.799.614

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	AUX TRANSPORTE	DEVENGADO PLANILLA	DESCUENTOS SALUD PENSION RIESGOS								TOTAL A PAGAR	TOTAL PLANILLA	FIRMA
								SALUD 4%	TOTAL SALUD	PENSION 4%	PENSION PATRONO 12%	TOTAL PENSION	RIESGOS P. 6.960%	CONFACASANARE 4%	TOTAL PARAFISCALES			
1	ROSELINO ACOSTA MENDOZA	74.752.762	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2.847.000	30	200.000	3.047.000	113.880	113.880	113.930	341.640	455.570	106.151	113.880	113.880	2.819.190	881.481	
2	LEISON ANDRES GARCIA DIMAS	1.118.545.040	TECNOLOGO EN EL AREA ELECTRICA	1.423.500	30	200.000	1.423.500	56.940	56.940	56.990	170.820	227.810	99.076	56.940	56.940	1.509.570	440.766	
3	LIZETH FERNANDA CHALA PRIETO	1.006.441.978	TECNOLOGO EN OBRA CIVIL	1.423.500	30	200.000	1.423.500	56.940	56.940	56.990	170.820	227.810	99.076	56.940	56.940	1.509.570	440.766	
TOTAL							5.894.000	227.760	227.760	227.910	683.280	911.190	396.303	227.760	227.760	5.838.330	1.763.013	

YENNY TORRES OSPINA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 157614-T

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Interventor /Representante Legal
Cto de Interventoria No 805 de 2025

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
No. 1988

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:

POSTE ALUMBRADO PÚBLICO

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado y Comercializado por:

INGEMETAL W.F SAS

NIT: 900.647.576 – 2
KM 22 MAS 250 VÍA FACATATIVÁ LOS ALPES, Facatativá, Colombia

Es conforme con los requisitos de:

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), Resolución 180540 de marzo 30 de 2010 y sus modificaciones, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía (MINENERGIA) Sección 390.2.

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada
8. Este certificado reemplaza y anula en su totalidad al certificado 1450 en su versión 2.

Fecha de aprobación:	20 de diciembre de 2024
Fecha del primer seguimiento:	Antes del 20 de diciembre de 2025
Fecha del segundo seguimiento:	Antes del 20 de diciembre de 2026
Fecha de vencimiento:	20 de diciembre de 2027

Autorizado por

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2024.12.20 13:58:22 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

Producto Certificado
Certecnica

ANEXO 1. REFERENCIAS CERTIFICADAS

ÍTEM	PRODUCTO	FAMILIA DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	REFERENCIAS	LONGITUDES
1	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 1 - POSTE CILÍNDRICO DE 2" Y 2" 1/2"	PCI1-00	3 metros a 6 metros
2	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 2 - POSTE CILÍNDRICO DE 3" A 6"	PCI2-00	4 metros a 12 metros
3	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 3 - POSTE CARDO	PCC3-00	3 metros a 12 metros
4	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 4 - POSTE GINSUM	PGI4-00	3 metros a 12 metros
5	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 5 - POSTE MEMO	PME5-00	3 metros a 12 metros
6	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 6 - POSTE TURAO	PTU6-00	3 metros a 12 metros
7	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 7 - POSTE ROLE	PRO7-00	3 metros a 12 metros
8	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 8 - POSTE YACADO	PYA8-00	3 metros a 12 metros
9	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 9 - POSTE NORCALINE	PNO9-00	3 metros a 12 metros
10	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 10 - POSTE TRONCO- CONICO	PTC10-00	3 metros a 16 metros
11	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 11 - POSTE CUADRADOS Y RECTANGULARES.	PCR11-00	3 metros a 12 metros
12	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 12 - POSTE FIRAO	PFI12-00	3 metros a 12 metros
13	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 13 - POSTE FALIA	PFA13-00	3 metros a 12 metros
14	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 14 - POSTE ELI	PEL14-00	3 metros a 12 metros
15	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 15 - POSTE BISLOA	PBI15-00	3 metros a 12 metros
16	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 16 - POSTE MUNAL	PMU16-00	3 metros a 12 metros
17	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 17 - POSTE ELANOR	PEL17-00	3 metros a 12 metros
18	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 18 - POSTE EXTANTE	PEX18-00	3 metros a 12 metros
19	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 19 - POSTE EXTANTA	PEX19-00	3 metros a 12 metros
20	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 20 - POSTE LYTHIA	PLH20-00	3 metros a 12 metros
21	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 21 - POSTE MANBRA	PMA21-00	3 metros a 12 metros
22	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 22 - POSTE BOOMERANG	PBO22-00	3 metros a 12 metros
23	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 23 - POSTE JINX	PJI23-00	3 metros a 12 metros
24	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 24 - POSTE DECORATIVO TIPO 1	PDE24-00	3 metros a 12 metros
25	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 25 - POSTE DECORATIVO TIPO 2	PDE25-00	3 metros a 12 metros
26	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 26 - POSTE OTI	POT26-00	3 metros a 12 metros
27	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 27 - POSTE IKARO	PIK27-00	3 metros a 14 metros
28	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 28 - POSTE TRYNDA	PTR28-00	3 metros a 14 metros
29	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 29 - POSTE SECCIONADOS	PSE29-00	3 metros a 16 metros
30	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 30 - POSTE MÁSTIL SECCIONADO	PMSE30-00	8 metros a 45 metros
31	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 31 - POSTE MÁSTILES TRONCO-CONICOS	PMTC31-00	8 metros a 45 metros

Producto Certificado
Certecnica

32	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 32 - POSTE MÁSTILES POLIGONAL	PMP32-00	8 metros a 45 metros
33	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 33 - POSTE TRONCOCÓNICO POLIGONAL	PPO33-00	3 metros a 20 metros
34	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 34 - POSTE INGEMETAL TIPO 1 ABATIBLE	PINGM34-00	3 metros a 14 metros
35	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 35 - POSTE INGEMETAL TIPO 2 PANEL SOLAR	PINGM35-00	3 metros a 14 metros
36	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 36 - POSTE INGEMETAL TIPO 3 PANTALLAS Y AVISOS	PINGM36-00	3 metros a 20 metros
37	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO PCCO	BIP37-00	-
38	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO CORONILLA	BICO38-00	-
39	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO TRYNDA	BIT39-00	-
40	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO GINSUM	BIG40-00	-
41	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO INGEMETAL 1	BIINGM41-00	-
42	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO INGEMETAL 2	BIINGM42-00	-
43	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO INGEMETAL 3	BIINGM43-00	-
44	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 44 - POSTE POSTE CODENSA (ET204)	PTC44-00	8 metros a 16 metros
45	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 45 - POSTE POSTE CODENSA (ET207)	PTC45-00	6 metros
46	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 46 - POSTE POSTE CODENSA (ET211)	PTC46-00	12 metros a 21 metros
47	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 47 - POSTE POSTE CODENSA (ET212)	PTC47-00	6 metros
48	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 48 - POSTE POSTE CODENSA (ET214)	PTC48-00	27 metros
49	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 49 - POSTE POSTE CODENSA (ET220)	PTC49-00	9 metros
50	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 50 - POSTE POSTE CODENSA (ET222)	PTC50-00	18 metros a 30 metros
51	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO CODENSA (AP800-1)	BIC51-00	-
52	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO CODENSA (AP806)	BIC52-00	-
53	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO CODENSA (AP806-1)	BIC53-00	-
54	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO CODENSA (AP806-2)	BIC54-00	-
55	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO CODENSA (ET832)	BIC55-00	-
56	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 57 - POSTE INGEMETAL PRIMERO	PIMP56-00	3 metros a 14 metros
57	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 58 - POSTE INGEMETAL SEGUNDO	PIMP57-00	3 metros a 14 metros
58	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 59 - POSTE INGEMETAL TERCERO	PIMP58-00	3 metros a 14 metros
59	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 60 - POSTE INGEMETAL CUARTO	PIMP59-00	3 metros a 14 metros
60	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO EPM (RA5-106)	PBIE60-00	-
61	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO EPM (RA5-204)	PBIE61-00	-
62	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	BRAZO DE ILUMINACIÓN TIPO EPM (RA5-207)	PBIE62-00	-
63	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 63 - POSTE SECCIONADO REDONDO	PSR63-00	3 metros a 16 metros
64	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 64 - PSOTE TRONCOCONICO POLIGONAL	PTP64-00	3 metros a 16 metros

Producto Certificado
Certecnica

65	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 65 - POSTE SECCIONADO TRONCOCÓNICO REDONDO	PSTR65-00	3 metros a 16 metros
66	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 66- POSTE MÁSTIL SECCIONADO REDONDO	PMSR66-00	8 metros a 45 metros
67	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 67 - POSTE MÁSTIL TRONCOCÓNICO POLIGONAL	PMTP67-00	8 metros a 45 metros
68	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 68 - POSTE MÁSTIL SECCIONADO TRONCOCÓNICO REDONDO	PMST68-00	8 metros a 45 metros
69	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 69 - POSTE MASTIL ABATIBLE	PMA69-00	8 metros a 45 metros
70	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 70 - POSTE MASTIL ABATIBLE TRONCOCÓNICO OCTOGONAL	PMAO70-00	8 metros a 45 metros
71	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 71 - POSTE MASTIL ABATIBLE TRONCOCÓNICO REDONDO	PTAR71-00	8 metros a 45 metros
72	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 72 - PSOTE MASTIL ABATIBLE CUADRADO	PMAC72-00	8 metros a 45 metros
73	POSTE ALUMBRADO PÚBLICO	GAMA 73 - POSTE MASTIL ABATIBLE REDONDO	PMAR73-00	8 metros a 45 metros

****

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2024.12.20 13:58:05 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66 -11, Bogotá D.C., Colombia

SYLVANIA

Proyector LED

LED SYLFLOOD 400W CW 45°

P27763



El nuevo **LED Sylflood** es una completa gama de proyectores para exterioriores para reemplazar los tradicionales reflectores de HID , diseño moderno y robusto con driver de alto desempeño. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad
Chasis en aluminio extruido
Lentes en material de alta transmitancia >90% en el espectro visible
Driver dimerizable 0-10V

APLICACIONES

Perfecto para iluminación de áreas deportivas
Estadios y coliseos
Areas logisticas exteriores, parqueaderos al aire libre


LED | 23 años de vida (Uso 6 horas al día) | Tecnología Amigable con el medio ambiente | Ultra Robusta | CE | ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS


Temperatura de color	5000K (CW)
Flujo luminoso	71200 lm
Ángulo de apertura	45°
Tipo de distribución	Directa asimétrica
Reproducción de color (IRC)	≥70
Vida útil	100000h *
Eficacia	178 lm/W
Tipo chip LED	SMD5050
Número de Chips LED	252 pcs
Consistencia de color	SDCM < 5

***Vida util LED L70 LM80 TM21**


MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

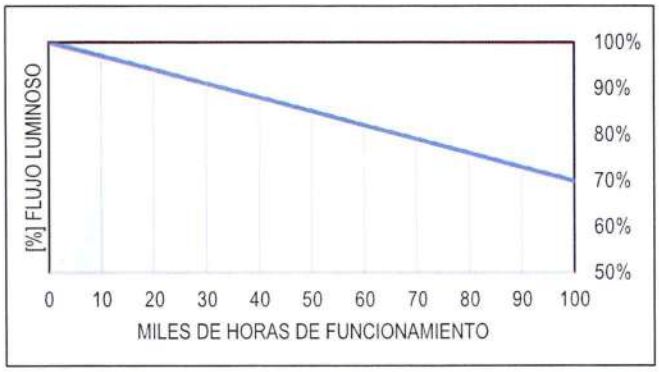

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

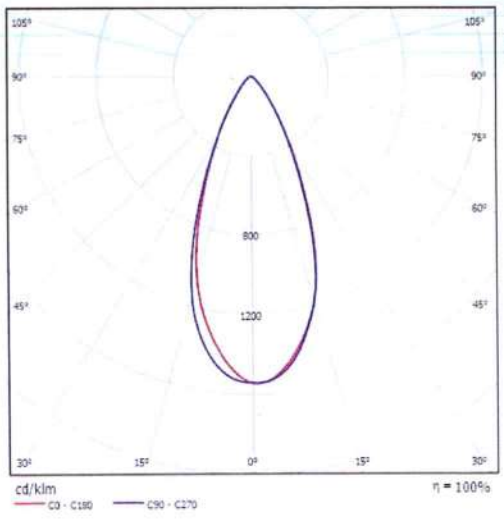

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA - DIAGRAMA CÓNICO

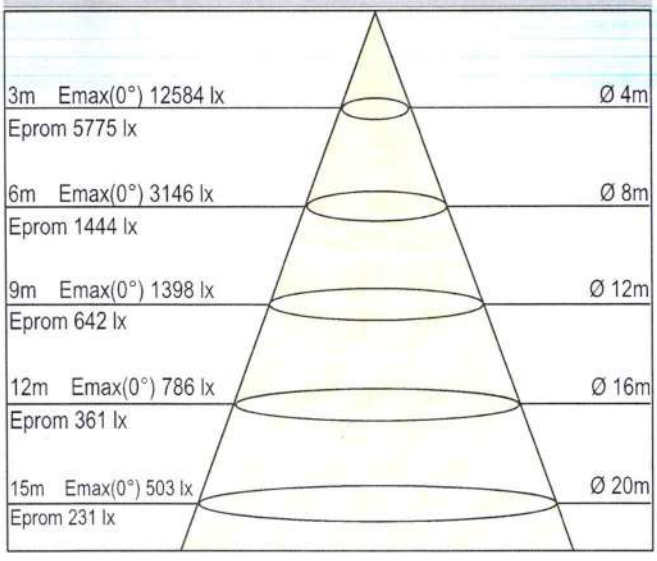

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 06/23.

Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.


SYLVANIA

Proyector LED


LED SYLFLOOD 400W CW 45°

P27763

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

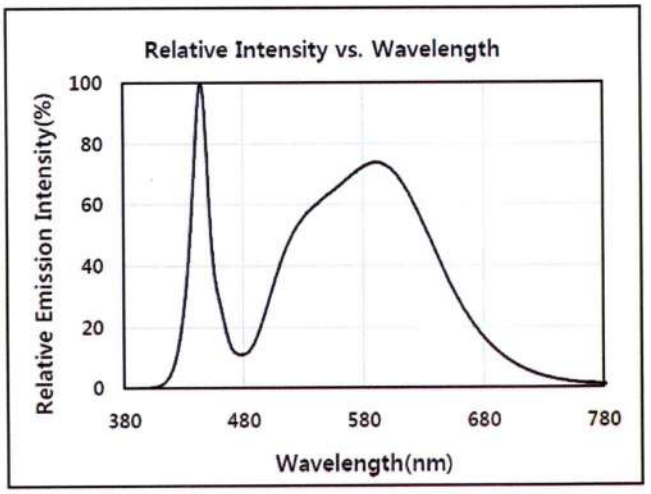


ESQUEMA PRODUCTO

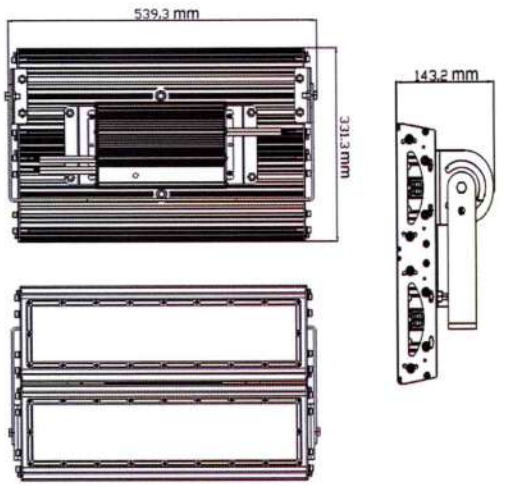

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	400 W
Tensión de operación	120-277V 50/60Hz
Corriente de entrada	2.02 A @ 220 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente constante
Atenuable	Si (0-10V)
Eficiencia driver	93% (x1)
Protección integrada driver	3kV (L-L), 6kV (L-T)
Tensión de salida DC	24~36VDC
Corriente de salida DC	7.44A

ACCESORIO DE MONTAJE (BRACKET)

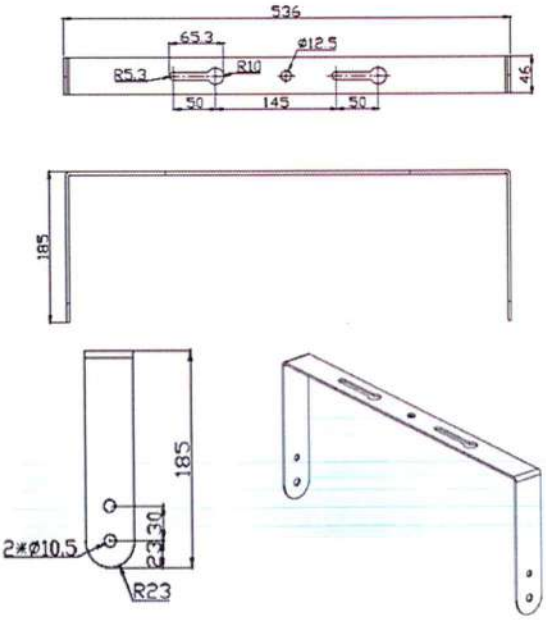


DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7042
Grado de protección IP | IK	IP66 | IK08
Dimensiones (LxWxH)	593x331x143 mm
Peso (kg)	11.3 Kg
Tipo de montaje	Soporte orientable
Chasis	Aluminio extruido
Material óptica	Lente PMMA
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C

DATOS DE EMPAQUE

Unidades por caja	1
EAN-13	770204827763X
EAN-14	1770204827763X

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Notas

Si no utiliza dimerización 0-10V el cable Dim + no debe conectarse.

Cable auxiliar :12VDC 200mA (el cable vaux de cada dirver NO debe conectarse en paralelo)

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 06/23.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº. CS-LCO-16714-2024/493

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
LUMINARIAS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A

IMPORTADOR
Calle 57B Sur # 72 A – 23, Bogotá D.C.
NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016. Numerales 320, 322 y 310.9, 305

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de producto se encuentran detalladas en los documentos Anexos que hacen parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página

Fecha de emisión: 4 de Diciembre de 2024
Fecha de expiración: 3 de Diciembre de 2027
Fecha próximo seguimiento: 3 de Diciembre de 2025**

Vigencia: tres (3) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada.

Director de Certificación

LEONARDO MARIÑO ANGARITA

Firmado digitalmente por LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2024.12.04 11:31:04 -05'00'

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

ANEXO No. 1 Certificado de producto Nº. CS-LCO-16714-2024/493 LUMINARIAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	LED REFLECTOR JETA POTENCIAS 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 16W, 17W, 18W, 19W, 20W, 21W, 22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W, 41W, 42W, 43W, 44W, 45W, 46W, 47W, 48W, 49W 50W, 52W, 54W, 55W, 56W, 58W, 60W, 62W, 64W, 65W, 66W, 68W, 70W, 72W, 74W, 75W, 76W, 78W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 105W, 110W, 115W, 120W, 125W, 130W, 135W, 140W, 145W, 150W, 155W, 160W, 165W, 170W, 175W, 180W, 185W, 190W, 195W, 200W TENSIONES 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V, 85-265V, 220-240V TEMPERATURA DE COLOR RGB 2700-3000K(WW), 4000-4100K(NW), 5000-5700K(CW), 6000-6500K(DL) IP 65	LED REFLECTOR JETA
2	LED BATTEN POTENCIAS 4W, 5W, 6W, 7W, 8W, 9W, 10W, 11W, 12W, 13W, 14W TENSIONES 120V, 100-240V, 100-277V, 110-240V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED BATTEN
3	LED OUTDOOR AREA POTENCIAS DESDE 30W HASTA 100W TENSIONES 185-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED OUTDOOR AREA
4	TOLEDO HIGH WATTAGE POTENCIAS 18W, 20W, 25W, 28W, 30W, 35W, 38W, 40W, 45W, 48W, 50W, 55W, 58W, 60W, 65W, 68W, 70W, 75W, 78W, 80W, 85W, 88W, 90W, 95W, 100W, 105W, 108W, 110W, 115W, 118W, 120W TENSIONES 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V, 85-265V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) BASE E27/E40, E27, E40	TOLEDO HW
5	LED CINTA SMART/RGB POTENCIAS DESDE 5W HASTA 24W	LED CINTA SMART

FIN DEL ANEXO No. 1

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

CERTIFICADO DE CALIDAD

CC FOR 21 Ver 05 09 22

Matriz:
Km. 10.5 vía Daule, Guayaquil. Ecuador
Teléfono: 593-4-2110260 Fax: 593-4-2110951
www.ipac-acero.com
Sistema de Gestión Certificado bajo normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

Certificado: 100000000081013
ocumento #: 8500001718
liente: AGOFER SAS
irección: CALLE 12A N 38 - 45 BOGOTA - COLOMBIA
bservación: ODC 105059
ódigo interno: AGOF C002 07 25

N° Factura E.: 001002000028048
Pedido: 1300003461
Fecha: 02/07/2025

P. NANDINA: 7308.40.00.000000;7306.61.00.100000;7306.30.99.300

Descripción de producto	Unidades/ Peso	Lote	Norma tolerancia	Calidad de material	Tipo material	No pedido interno	Colada Acero MP	Esf. Ts Ft (Mpa)	Esf. Ys Fy (Mpa)	% Elong
TUBERIA RED. TIPO POSTE LC										
T.P. 2 (60.30X1.50X6000) mm LC	183.000	9007126-01	NTE INEN 2415, NTC 4526,	JIS G 3132 SPHT-1	LC	4800001162	ZC3964	349	224	43
T.P. 3 (88.90X2.00X6000) mm LC	14.000	9006054-01	NTE INEN 2415, NTC 4526,	JIS G 3132 SPHT-1	LC	4800000508	3642405	364	240	44
T.R.P. (2 1/2") 73X2.30X6000 mm LC.	19.000	9005595-01	NTE INEN 2415, NTC 4526,	JIS SPHT1	LC	4800000201	SB69732	340	214	46
T.R.P. (2 1/2") 73X3.00X6000 mm LC.	14.000	9006520-01	NTE INEN 2415, NTC 4526,	ASTM A 36	LC	4800001006	321660903600	438	330	37.5
T.R.P. (2") 60.3X2.30X6000 mm LC.	50.000	9006544-01	NTE INEN 2415, NTC 4526,	JIS G 3132 SPHT-1	LC	4800001061	34219749	372	296	48
T.R.P. (4") 114.3X3.00X6000 mm LC.	38.000	9007198-01	NTE INEN 2415, NTC 4526,	ASTM A 36	LC	4800001163	316954301201	430	317	38
T.R.P. (4") 114.3X3.60X6000 mm LC.	38.000	9007200-01	NTE INEN 2415, NTC 4526,	ASTM A 36	LC	4800000842	24412CB0240	436	308	40.5

Descripción de producto	COMPOSICIÓN QUÍMICA %								TOLERANCIAS DIMENSIONALES mm				ATRIBUTOS/ENSAYOS					
	C	Mn	Si	S	P	Fe	Si eq	Ceq	Espesor (mm)	Medida A	Longitud	Escuadra	Presion Hidrostatica	Abocardado	Aplastado	Prueba Preece	Asp. Superficial	Rotulado
TUBERIA RED. TIPO POSTE LC																		
T.P. 2 (60.30X1.50X6000) mm LC	0.05	0.24	0.02	0.008	0.011	99.671	0.05	0.09	-0.15+0.15	-0.45+0.45	-6.00+13.0	N/A	N/A	75.37	+20.1	N/A	N/A	N/A
T.P. 3 (88.90X2.00X6000) mm LC	0.05	0.28	0.01	0.004	0.02	99.636	0.06	0.10	-0.20+0.20	-0.67+0.67	-6.00+13.0	N/A	N/A	111.1	+29.6	N/A	N/A	N/A
T.R.P. (2 1/2") 73X2.30X6000 mm LC.	0.0364	0.185	0.006	0.0063	0.0084	99.7579	0.03	0.07	-0.23+0.23	-0.55+0.55	-6.00+13.0	N/A	N/A	91.25	+24.3	N/A	N/A	N/A
T.R.P. (2 1/2") 73X3.00X6000 mm LC.	0.13	0.49	0.01	0.013	0.02	99.337	0.06	0.21	-0.30+0.30	-0.55+0.55	-6.00+13.0	N/A	N/A	91.25	+24.3	N/A	N/A	N/A
T.R.P. (2") 60.3X2.30X6000 mm LC.	0.05	0.34	0.01	0.011	0.017	99.572	0.05	0.11	-0.23+0.23	-0.45+0.45	-6.00+13.0	N/A	N/A	75.37	+20.1	N/A	N/A	N/A
T.R.P. (4") 114.3X3.00X6000 mm LC.	0.14	0.52	0.01	0.012	0.015	99.303	0.05	0.23	-0.30+0.30	-0.86+0.86	-6.00+13.0	N/A	N/A	142.8	+38.1	N/A	N/A	N/A
T.R.P. (4") 114.3X3.60X6000 mm LC.	0.18	0.32	0.02	0.001	0.013	99.466	0.05	0.25	-0.36+0.36	-0.86+0.86	-6.00+13.0	N/A	N/A	142.8	+38.1	N/A	N/A	N/A

bservaciones:

.OS VALORES INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO FUERON VALIDADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y LOS MISMOS SE GUARDAN EN LOS EGISTROS DE LA COMPAÑÍA.

ECUBRIMIENTO Cañerías / Tub. Eléctrica = 40 micras ínimo

DOBLADO = 90 a 180 °

1Mpa.= 10.2 Kg./Cm2

PLASTADO = 2/3 del diámetro nominal

1 MICRA ZINC = 7.14 g/m²

Recubrimiento de zinc en µm por cada lado


Jose Eloy Cordova Perez
Responsable de calidad

BAÑOS **CORONA** | **LAVAMANOS**

ACUACER

Lavamanos de pedestal en porcelana sanitaria


Ref. 73390



- Funcional diseño contemporáneo ideal para espacios reducidos.
- Cómodo pozo de 395 x 230 mm de longitud.
- Agujero integral de drenaje que evita el rebose.
- Agujeros insinuados que permiten escoger diferentes opciones de grifería.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLANOS TÉCNICOS

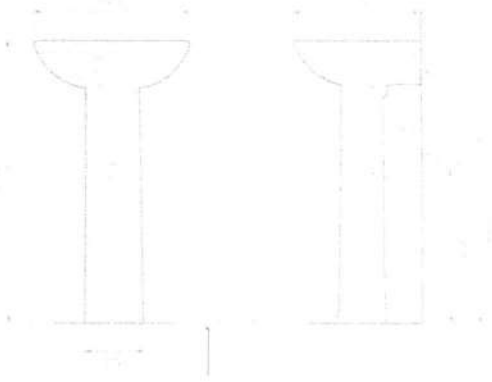

INFORMACIÓN TÉCNICA

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

Unidades: [illegible]

Cumple con la normatividad Icontec NTC 920 y ANSI ASME 112.19.2

SERVICIO TÉCNICO

CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES

GARANTÍA CORONA DE POR VIDA

corona

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

ACUACER

Lavamanos de pedestal en porcelana sanitaria

CUIDADOS Y LIMPIEZA

COLORES DISPONIBLES

100 Blanco

103 Bone

107 Beige

111 Azul cielo

116 Azul

118 Azul oscuro

155 Gris

141 Verde claro

149 Verde oscuro

129 Vino tinto

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia		Ecuador	
Bogotá		Perú	
Panamá		México	
Guatemala		Honduras	
Costa Rica			
Nicaragua		Honduras	
Salvador			

contacto_ca@corona.com.co

corona

Certificado de
GARANTÍA INTEGRAL

GRIVAL | corona

Usted acaba de adquirir un producto diseñado y fabricado bajo las más estrictas normas y especificaciones de calidad, que garantizarán un adecuado funcionamiento del mismo. A través de esta garantía, nuestra compañía le agradece haber elegido uno de nuestros productos y reconoce su confianza ofreciendo un servicio técnico especializado y una completa red de puntos de servicio autorizados.

El **Certificado de Garantía Integral** asegura que usted recibirá la respuesta oportuna si su producto llega a presentar algún defecto en la fabricación, es decir las partes estructurales del producto que no sufren desgaste por el uso diario y la manipulación, contemplando también las piezas que gozan de algún acabado estético.

Es importante que tenga en cuenta que esta garantía podrá hacerse efectiva siempre y cuando se haya cumplido con las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento recomendadas en el respectivo manual de instrucciones que acompaña el producto.

La instalación del producto exige que ésta se haya realizado bajo los parámetros técnicos de plomería que se indican en el Instructivo de Instalación que se encuentra en este documento. La presente garantía no se extiende a aquellos daños o defectos derivados de errores de instalación, uso o mantenimiento, o residuos sólidos en el sistema hidráulico. Al presentarse el reclamo por garantía, la organización podrá enviar un técnico especializado para verificar el cumplimiento de los anteriores requerimientos.

1. GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA PARA PORCELANA SANITARIA (Colombia, El Caribe y Centro América)*

La garantía de por vida cubre los productos contra defectos de fabricación, es decir, en las partes estructurales del producto, siempre y cuando se haya cumplido con las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento recomendado por el fabricante. ***Solo en México la garantía aplica durante un periodo de VEINTE (20) AÑOS.**

INCLUYE : Rajas finas y rajas gruesas, craquelado, comunicados, agujeros tapados, deformación, mal sifoneo, filtraciones, hueco malo, salpique, rebabas entre otras fallas de fabrica.

NO INCLUYE : Golpes por maltrato, accionamiento forzado.

2. GARANTÍA DE CINCO (5) AÑOS EN COMPONENTES Y ELEMENTOS FUNCIONALES

Esta no se extiende a aquellas piezas que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto, tales como válvulas de llenado, válvulas de descarga, unidades de selle, manijas, botones, componentes electrónicos y eléctricos, empaques y empaquetaduras de selle que por la manipulación y ambiente pueden desgastarse.

3. GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS EN ASIENTOS SANITARIOS

Los elementos funcionales que están sometidos a desgaste por uso tales como válvulas de llenado, válvulas de descarga, unidades de selle, manijas, botones, componentes electrónicos y eléctricos, empaques y empaquetaduras de selle tienen una garantía de **DOS (2) AÑOS** por defectos de fábrica, se excluye de la garantía todos los defectos generados por desgastes normal del producto o por desgaste acelerado por uso en ambientes extremos.

INCLUYE : Defectos de fabricación.

NO INCLUYE : Rayado en las superficies por malas prácticas en la limpieza, roturas por sobrecargas permitidas y manipulacion indebida.

4. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- La Organización no será responsable por los daños ocasionados por el cliente por terceros, ni por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o por no seguir las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.
- Esta garantía no cubre eventuales daños a personas u objetos, reparación de instalaciones, costos de materiales o de mano de obra, ni al pago o reposición de productos cuyo problema de funcionamiento o desempeño se relacione con uso inadecuado, por no seguir las instrucciones de instalación y/o almacenamiento indebido.
- La garantía de acabados no cubre la disposición del producto a sustancias que puedan ocasionar un ataque químico o que puedan rayar, quemar, sustraer o alterar su superficie de cualquier forma.
- Esta garantía no cubre fallas por daños en los herrajes del tanque causados ya sea por sedimentos generados por la falta de purga inicial de las tuberías (daño en el diafragma) o uso de cloramidas.
- Daños causados por limpiadores de porcelana/cerámica que contengan hipoclorito cálcico (cloro), ácido fluorhídrico y/u otros productos químicos.
- Fallas por daños en los herrajes del tanque / válvula de registro o por un mal funcionamiento de estos al no seguir las recomendaciones de instalación y/o mantenimiento.
- Daños que ocurran al producto durante su transporte o instalación y que no estén asociados al empaque.
- Los reclamos relativos a la estética, apariencia, forma y color deben ser presentados antes de la instalación, y estarán sujetos a validación de acuerdo a las normas técnicas que amparan dicho producto.
- Grietas o fisuras por contracción del cemento sobre la porcelana cuando se instalan con este material mal mezclado.
- Mal funcionamiento ocasionado por el no uso de brida sanitaria para la instalación.

Respaldo de MARCA corona

1. REPUESTOS ORIGINALES DE MARCA

La disponibilidad de repuestos de las partes funcionales como válvulas de llenado, válvulas de descarga, unidades de selle, empaques y empaquetaduras de selle, botones, manijas, pulsadores del producto se garantizará por el término de **CINCO (5) AÑOS** contados a partir de la fecha de descontinuación del producto.

Tenga en cuenta que de acuerdo con los términos especificados en la garantía y según aplique los repuestos tendrán un costo y los podrá adquirir dirigiéndose al **Punto de Servicio Autorizado** más cercano o contactándose con la **Línea de Atención al Cliente** de su país para recibir orientación, que se encuentras más adelante. Nuestros productos han sido diseñados para facilitar su mantenimiento; le recomendamos conservar el instructivo de instalación para dicho propósito.

2. SERVICIO DE INSTALACIÓN

Para contar con una correcta instalación del producto se recomienda solicitar el servicio de instalación en los Puntos de Servicio Autorizado o a través de la Línea de Atención al Cliente. Tenga en cuenta que este servicio tiene un costo adicional el cual será notificado en el momento de la solicitud del servicio.

3. REPOSICIÓN POR FALTANTES

Para los casos donde usted evidencie que hace falta algún componente de su producto, le solicitamos dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto para su reposición o contactarse con la **Línea de Atención al Cliente.**

4. CONDICIONES PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

1. Haber seguido las indicaciones establecidas en esta garantía y en las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento recomendadas en el respectivo manual de instrucciones que acompaña el producto.

2. No haber realizado ajustes o modificaciones al producto que alteren su adecuado funcionamiento.

3. Para cualquier reparación anterior, haber utilizado repuestos originales de **CORONA / GRIVAL.**

4. Haberse comunicado con nuestra **Línea de Atención al Cliente** vía telefónica o por correo electrónico o tener una orden de servicio oficial.

En los casos en que haya vencido la garantía o en los que esta no sea aplicable, usted podrá solicitar el servicio técnico especializado que ofrece la Organización, el cual se facturará a la tarifa vigente en nuestra red nacional de **PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® (P.S.A GRIVAL®)**o al **SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® (S.A.G GRIVAL®).** La Organización se reserva el derecho de descontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso a la red de distribución.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA
01 8000 512030
Bogotá: 404 8884

MÉXICO
8125 2000 / 800 705 1020

SUR AMÉRICA
Ecuador: 1800001065
Perú: 8005 4124

CENTRO AMÉRICA
Panamá: (507) 800 0202
Guatemala: (502)18006240109
Costa Rica: (506) 4001 4966
Nicaragua: (505) 2249 5521
Honduras (Tegucigalpa): (504)9441 1968
Honduras (San Pedro Sula): (504) 9470 9391
El Salvador: (503) 2274 4620

SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® COLOMBIA

S.A.G Montería: Cra. 3 No. 35-43, tel: 7826065 - 3135279974
S.A.G Tunja: Cra. 14 No.18-50, tel: 7440385 - 3124487058
S.A.G Cartago: Cra. 7 No. 12-26 tel: 2131390 - 3113705392
S.A.G Cúcuta: Av. 11 E No. 9N-28 tel: 5746097 - 3153806593
S.A.G San Andrés Isla: Av. 20 de Julio; Edificio del FED tel: 5123915
S.A.G Manizales: Cra. 20 No. 20 - 13 tel: 8847549 - 3207102806
S.A.G Ibagué: Jordán 4a. Etapa; Mza. 2; casa 11 tel: 2680267 - 3106280808
S.A.G Rionegro: Kilómetro 3 vía Llano Grande tel: 5372811
S.A.G Arauca: Cra. 23 - Calle 25 Esquina; Barrio Miramar, tel: 8857671
S.A.G V.vicencio: Av. 40 No. 27 - 77, Barrio 7 de Agosto, tel: 6680555 - 3103895622
S.A.G B.bermeja: Calle 52 No. 14-50, Barrio Colombia, tel: 6110530 - 3176708225
S.A.G Pasto: Cra. 11 No. 16-07, Barrio Fátima, tel: 7202259 - 313 7911604
S.A.G Tuluá: Calle 28 No. 23-52, tel: 2447989

PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® COLOMBIA

P.S.A Bogotá: Av. Caracas No. 63-63 Chapinero, tel: 3481746 - 3124440022
P.S.A Bogotá Norte: Av. Carrera 45 No, 149-09 Mazurén, tel: 6140241 - 3138697904
P.S.A Bucaramanga: Cra. 16 No. 42-89 Barrio Centro, tel: 6334754 - 3124440024
P.S.A Barranquilla: Calle 84 No. 43-49; Local 2, tel: 3735347 - 3124440023
P.S.A Cartagena: Av. Pedro de Heredia 21-83; local 3, tel: 6455806 - 3124602395
P.S.A Pereira: Calle 20 No. 9-41 tel: 3257269 - 3124440026
P.S.A Medellín: Cra. 49 No. 45-18; Junín con Amador, tel: 5114086 - 3124440021
P.S.A Envigado: El Dorado / Cra. 41 No. 39 Sur 63, tel: 3027993 - 3124604322
P.S.A Cali: Calle 10 No. 42-54, tel: 5525150 - 3124440025

CORREOS ELECTRÓNICOS: postventa@incesastd.com - contactenoscorona@corona.com.co

INGENIERIA & LABORATORIO	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	Versiòn: 3 Còdigo: R-OPE-05 Fecha de Aprobaciòn: 30/07/2012
	Carrera 17 Nº 15-61 Cel. 3112878638 - 31628554499 laboratoriowi@hotmail.com	

INTERESADO CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025

FECHA INFORME 9 de enero de 2026

PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

NORMA DE ENSAYO INV E-410-13

Muestra Nº	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Dias	Fuerza en		Diametro	Area	Esfuerzo Obtenido		Resistencia deseada		Resistencia Posible a 28 dias		% de Resistencia	Tipo de Falla	Elemento	Localizacion
				kN	lbf	mm	mm^2	lbf/pg^2	Mpa	P.S.I	Mpa	lbf/pg^2	Mpa				
1	11/12/2025	18/12/2025	7	149,31	33.566	100,0	7.854	2.757	19,01	4.000	27,6	4.070	28,1	68,9%	2	PEDESTAL	CANCHA BARRIO SAN CARLOS
2	11/12/2025	18/12/2025	7	152,28	34.234	100,0	7.854	2.812	19,39	4.000	27,6	4.138	28,5	70,3%	1		
3	11/12/2025	8/1/2026	28	222,42	50.002	100,0	7.854	4.107	28,32	4.000	27,6	----	----	102,7%	4		
4	11/12/2025	8/1/2026	28	219,74	49.400	100,0	7.854	4.058	27,98	4.000	27,6	----	----	101,4%	1		

INGENIERIA Y LABORATORIO
WLADIMIR CASTRO
Nit. 79.685.166-3
AGUAZUL CASANARE


Observaciones; Las muestras fueron tomadas y transportadas por el interesado hasta nuestras instalaciones.

WLADIMIR CASTRO
Tecnologo en Obras Civiles

Instructivo: I-OPE-05

Equipo utilizado: Máquina Digital Doble Rango PC-42D

Certificado de Calibración Nº REM-LF-441 y Nº REM-LF-437

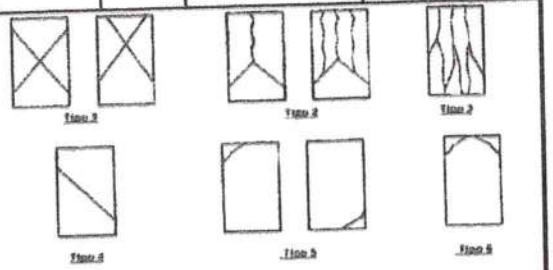

TIPOS DE FALLA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTACION ENVIADA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844

Edwwardb@hotmail.com

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Aguazul 5 de diciembre de 2025

OFICIO N° 010 | INTERV. 0805- 2025

Arquitecta:
LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA
R/L CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO
Contratista de obra
Aguazul-Casanare

Recibido:
5 de Diciembre 2025
Leidy Lievano
2:45pm

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 0805 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Solicitud entrega informe del mes de noviembre de 2025.

Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 797 de 2025, con objeto: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, queremos recordarle que es nuestra responsabilidad verificar, revisar y aprobar toda la documentación relacionada con el proyecto, asegurando así el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la minuta del contrato.

En este sentido, solicitamos de manera formal la entrega del informe correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Agradecemos de antemano su oportuna atención a la presente solicitud, toda vez que el cumplimiento de este requisito resulta esencial para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

Sin otro particular, en espera de su buena aceptación.

Atentamente;

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
Interventor
Representante Legal
Contrato interventoría No. 0805 del 202

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ACTAS GENERADAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	
	Código: M-GI-F- 04	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

Contrato Interventoría No:	805	De:	2025
Contrato Obra No:	797	De:	2025

Fecha: 31 | 12 | 2025

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	IINTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 520.800.049,00
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025 NIT: 901.981.507-9 R/L LEYDY LIZETH LIEVANO SANABRIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT/CC: 79.799.614
REPRESENTANTE COMUNIDAD	ROBINSON OLARTE - PRESIDENTE DEL BARRIO SAN CARLOS
REPRESENTANTE COMUNIDAD	
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Aguazul; a los **TREINTA Y UN** (**31**) del mes de **DICIEMBRE** de **2025** se reunieron **CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025**, en su calidad de contratista, **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, en su calidad de Supervisor, y **ROBINSON OLARTE - PRESIDENTE DEL BARRIO SAN CARLOS**, en su calidad de Representante de la COMUNIDAD DEL BARRIO SAN CARLOS, con el fin de recibir a satisfacción la obra objeto del Contrato anteriormente citado, por parte de la comunidad.

OBSERVACIONES

En las instalaciones de el escenario deportivo Cancha Sintetica "Union San Carlos", se reúnen de forma presencial el secretario de infraestructura, el Ing. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, el presidente del Barrio San Carlos el señor ROBINSON OLARTE, por parte de Interventoria el representante legal EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, el ingenirero ROSELINO ACOSTA MENDOZA como Residente de elnterventoria, por el CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025 asiste la Arq.LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA como representante legal, el Ing. FERNANDO GARZON BERNAL y el Ing. JESUS ALBERTO PINZON (director y residente de obra respectivamente), con el fin de hacer entrega de las actividades ejecutadas para el Mantenimiento y adecuacion de la infraestructura del escenario deportivo CANCHA SINTETICA SAN CARLOS.

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	
	Código: M-GI-F- 04	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Preliminares (desmonte de, aparatos sanitarios, desmonte estructuras existentes canchas)

Instalaciones Sanitarias: SE realizo las instalaciones de los aparatos sanitarios, instalacion de ducha cropmada, instalacion de lavanos.

Cancha y Cerramiento:

Instalación de grama sintética: la instalación de una nueva superficie de grama sintética acorde con las especificaciones técnicas y deportivas vigentes, con el fin de mejorar las condiciones de juego, garantizar un desempeño adecuado y prolongar la vida útil del campo frente a las condiciones climáticas y el uso continuo.

Instalación de malla de cerramiento lateral

Instalación de malla de cerramiento lateral en el perímetro de la cancha sintetica, con estructura metálica de soporte, garantizando la correcta tensión y fijación, y cumpliendo con los parámetros técnicos de resistencia y durabilidad exigidos para escenarios deportivos.

Instalación de tubería estructural redonda de 4" – 4,0 mm

Instalación de tubería estructural redonda de 4 pulgadas de diámetro y 4,0 mm de espesor, destinada a conformar la estructura de soporte para la malla de cerramiento perimetral de la cancha.

Instalaciones Electricas: se ejecutaron las instalaciones eléctricas necesarias para garantizar un servicio de iluminación seguro, eficiente y acorde con la normatividad técnica vigente, mejorando así las condiciones de uso del escenario deportivo.

Las actividades desarrolladas incluyeron la instalación de postes metálicos cónicos de 16 metros de altura libre, provistos de cruceta, peldaños y argollas, con sus respectivas bases en concreto de 4.000 psi, asegurando estabilidad estructural y durabilidad. Asimismo, se instalaron proyectores LED de 400 W, destinados a la iluminación de la cancha sintética , optimizando la visibilidad y el aprovechamiento del espacio en horarios nocturnos.

Para la adecuada conducción y protección de las redes eléctricas, se ejecutó la canalización subterránea mediante ductos conduit en PVC tipo pesado, en zonas blandas, incluyendo cinta de prevención y cama de arena lavada de río. Se realizaron acometidas en baja tensión, tanto aéreas como subterráneas, empleando conductores certificados en calibres adecuados, así como el cableado de circuitos ramales para iluminación en cable THW de 600 V.

El sistema eléctrico se complementó con la instalación de cajas de inspección, empalmes de baja tensión, protecciones termomagnéticas bipolares, y la adecuación de interruptores, garantizando un funcionamiento seguro y confiable de la red. Adicionalmente, se ejecutó el sistema de puesta a tierra y apantallamiento, que incluye bajantes, varillas copperweld, cableado en cobre, soldadura exotérmica, suelo artificial y punta captora, con el fin de proteger las instalaciones y a los usuarios frente a descargas eléctricas y sobretensiones.

Finalmente, se realizaron las labores de excavación manual y relleno con material seleccionado compactado, dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas y seguras para la comunidad.

Con la ejecución de estas actividades, el proyecto entrega a la comunidad un sistema de iluminación moderno, seguro y funcional, que contribuye al uso adecuado del escenario deportivo, al fortalecimiento de la actividad recreativa y deportiva, y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector.

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	
	Código: M-GI-F- 04	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

LOCALIZACION DEL AREA INTERVENIDA



Instalaciones sanitarias









Se observa panoramica general de la Cancha Sintetica

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	
	Código: M-GI-F- 04	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		



Se observa panoramica general de la Cancha Sintetica



Se observa panoramica general de la Cancha Sintetica



Se observa panoramica general de la Cancha Sintetica


PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	
	Código: M-GI-F- 04	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		





Se observa panoramica general de la Cancha Sintetica



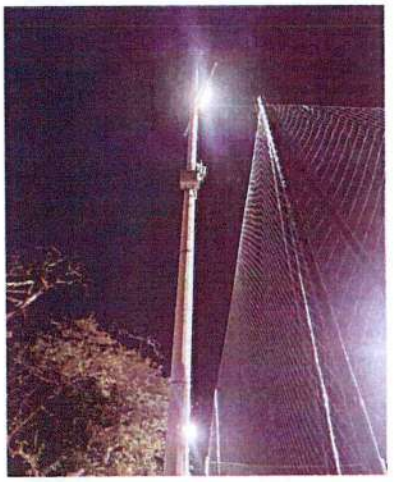

iluminación Cancha Sintetica San Carlos





Iluminacion Cancha Sintetica San Carlos

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	
	Código: M-GI-F- 04	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

Se hace entrega de las instalaciones una vez ejecutadas las actividades contractuales anteriormente mencionadas, correspondientes a la ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, con el fin de garantizar la prestación del servicio en un ambiente adecuado y en óptimas condiciones.

El mantenimiento y la adecuación de la infraestructura deportiva resultan fundamentales para asegurar su correcto funcionamiento y la seguridad de los usuarios, permitiendo preservar y optimizar las condiciones físicas y funcionales del escenario deportivo y garantizando su adecuada utilización por parte de la comunidad.

Este espacio constituye un importante punto de encuentro y esparcimiento para niños, jóvenes y adultos, promoviendo el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración social en condiciones seguras y confortables.

Las actividades ejecutadas fueron revisadas y verificadas por la interventoría, el profesional de apoyo y la supervisión del municipio, constatándose que se ajustan a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 31 dias del mes de DICIEMBRE de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	INSTITUCIÓN	FIRMA
Leidy Lizeth Llevano S.	Representante legal	Consorcio Escenario D.	
Robinson Olarte Saavedra	Presidente JAC	San Carlos	
EDWARD ALEXANDER BARRETO	R/LEGAL	INTERVENTORIA	
Juan M. Sandoval	Sec. Infraestructura	Alcaldía	
Jandro Tibisay Ber.	Gerente	IDRA (Asistio).	

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ACTAS GENERADAS CONTRATO DE OBRA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

Alcaldía de Aguazul	**ACTA ENTREGA DE ANTICIPO**	

No. 2 del 01 de Diciembre de 2025

MODALIDAD	:	LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO	:	No 0797 de 12-09-2025
PROCESO	:	MA-LP-SI-005-2025
CONTRATISTA	:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
NIT	:	901981507-9
OBJETO	:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	:	$520.800.049,00 M/TC
PLAZO	:	Tres (3) MESES
FECHA INICIO	:	20-10-2025
FECHA TERMINACION	:	19-01-2026

En el Municipio de Aguazul, Casanare al primer (1) día del mes de diciembre de 2025 se reunieron JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, quien actua en calidad de supervisor del contrato de interventoría No. 0805 de 2025, Ingeniero EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ identificado con Cedula de ciudadanía N° 79.799.614, quien actua en su calidad de interventor, y LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1116546919 de Aguazul, representante legal, del CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025 con NIT 901981507-9 con el fin de suscribir la presente acta como constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para la entrega del anticipo.

A. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES

SUSPENSIONES

B. ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$156.240.014,70	30%	$520.800.049,00

IDENTIFICACIÓN BANCARIA: Para el giro del anticipo descrito en la presente acta, los recursos entregados en calidad de anticipo se consignarán a la cuenta de ahorros No. 0550482800057747 de DAVIVIENDA de acuerdo a la certificación de apertura de la cuenta de ahorros de fecha 27 de octubre de 2025.

C. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ($)	PORCENTAJE (%)
1	Compra de materiales	$ 156.240.014,70	100%
	TOTAL	$ 156.240.014,70	100,00%

D. GARANTIA

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica el día 28/11/2025

ASEGURADORA	NUMERO PÓLIZA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TOTAL SEGURADORA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101007938	03	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	20-10-2025	20-07-2026	$52.080.004,90
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101007938	03	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	20-10-2025	20-07-2026	$156.240.014,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101007938	03	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20-10-2025	19-01-2029	$26.040.002,45
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101007938	03	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	19-01-2026	19-01-2031	$156.240.014,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	54-40-101003589	03	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20-10-2025	19-01-2026	$284.700.000,00

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron al primer (01) día del mes de diciembre de 2025, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRÍA
R/L CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025
Contratista

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Interventor R/L Cto interventoría N° 805 del 2025

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor Cto interventoría N° 805 del 2025

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

Revisó:
Nina Sofia Barreto Rosas
Profesional Contratada SIA

Elaboró:
Viviana Marcela Avila Mesa
Profesional Contratada SIA

Obra Pública

Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202504714

FECHA:	2025-12-01	VALOR	148.428.014,70
PAGADO A	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025	DOCUMENTO	901981507-9
DIRECCIÓN	KR 16 20 32	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Ciento Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Catorce Pesos Con Setenta Centavos	TELÉFONO	3105804309
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504194 ACTA 2 DE ANTICIPO 30% CONTRATO 797 DE 2025. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500820	202501188	2.2.43.4301.1604.2024850100026	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	156.240.014,70
			Total	156.240.014,70

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	148.428.014,70	0,00
11100613054	BBVA 077002084 TASA PRO DEPORTE	0,00	148.428.014,70
	SUMAS IGUALES	148.428.014,70	148.428.014,70

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL	5	156.240.014,70	7.812.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

Jessica Paola Vargas
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504194

BENEFICIARIO: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2025	**DOCUMENTO:** 901981507 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-01
MOD. SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 10 - LICITACION PUBLICA	**NÚMERO RP:** 202501188	**FECHA RP:** 2025-09-15

Concepto: ACTA 2 DE ANTICIPO 30% CONTRATO 797 DE 2025.

Detalle: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.43.4301.1604.20248 50100026	1.3.3.3.1 9	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SUPERÁVIT TASA PRO DEPORTE	156.240.014,70

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios - D	156.240.014,70	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	148.428.014,70
24402301	Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL - C	0,00	7.812.000,00
	SUMAS IGUALES	156.240.014,70	156.240.014,70

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL	5	156.240.014,70	7.812.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

ACTA No. 3 del 31 de Diciembre de 2025

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA

MODALIDAD	:	CONCURSO DE MERITOS
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO CONTRATO	:	0805
PROCESO		MA-CMA-SI-010-2025
OBJETO	:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	:	$50.649.554,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$50.649.554,00M/CTE
CONTRATISTA	:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT	:	79.799.614
PLAZO	:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIO	:	2025-09-17
FECHA TERMINACION	:	2025-12-31

05 ENE 2026

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**, Interventor y Representante Legal en su calidad de contratista, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir el Acta No 3 de TERMINACIÓN del contrato anteriormente citado, el cual termino el día 31 de diciembre del 2025.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor M.L.C.
-	-	-	- M.L.C.

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

OBSERVACIONES:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
Interventor
Representante Legal
Contrato interventoría No. 0805 del 2025

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor(a)

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
ABOGADO & INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ACTAS GENERADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Yopal, Casanare; Cel 310 320 7844
Edwwardb@hotmail.com

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE TERMINACION

ACTA No. 3 del 31 de Diciembre de 2025

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA DE AGUAZUL

MODALIDAD	:	CONCURSO DE MERITOS
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO CONTRATO	:	0805
PROCESO		MA-CMA-SI-010-2025
OBJETO	:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTETICA SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	:	$50.649.554,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$50.649.554,00M/CTE
CONTRATISTA	:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT	:	79.799.614
PLAZO	:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIO	:	2025-09-17
FECHA TERMINACION	:	2025-12-31

05 ENE 2026

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**, Interventor y Representante Legal en su calidad de contratista, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir el Acta No 3 de TERMINACIÓN del contrato anteriormente citado, el cual termino el día 31 de diciembre del 2025.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor M.L.C.
-	-	-	- M.L.C.

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto

Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION	

-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

OBSERVACIONES:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ
Interventor
Representante Legal
Contrato interventoría No. 0805 del 2025

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor(a)

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista
