

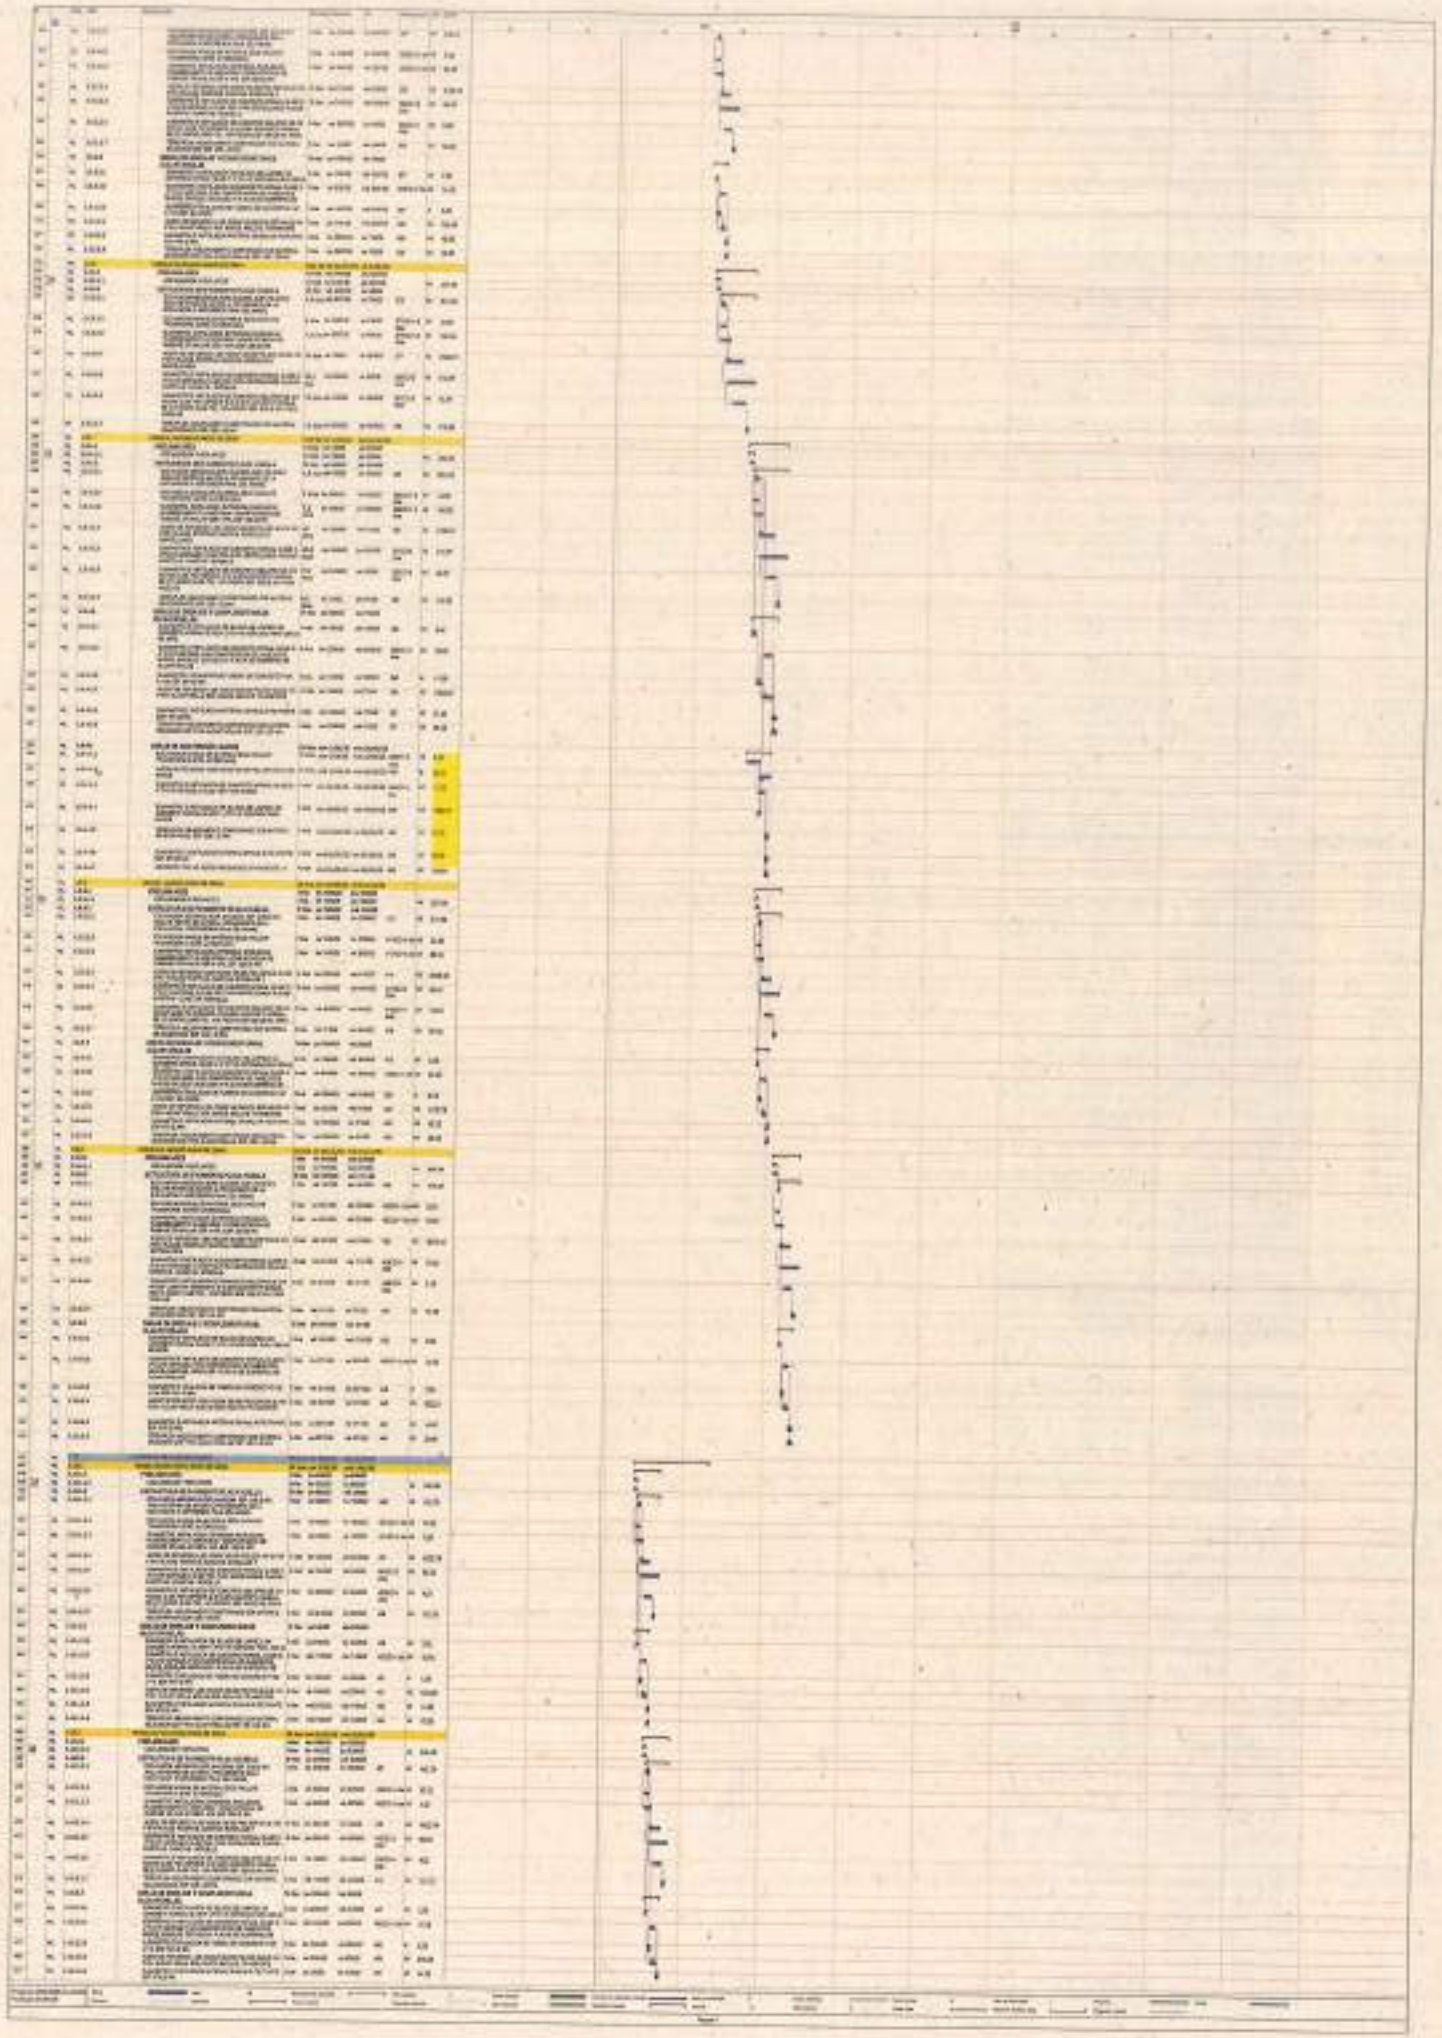


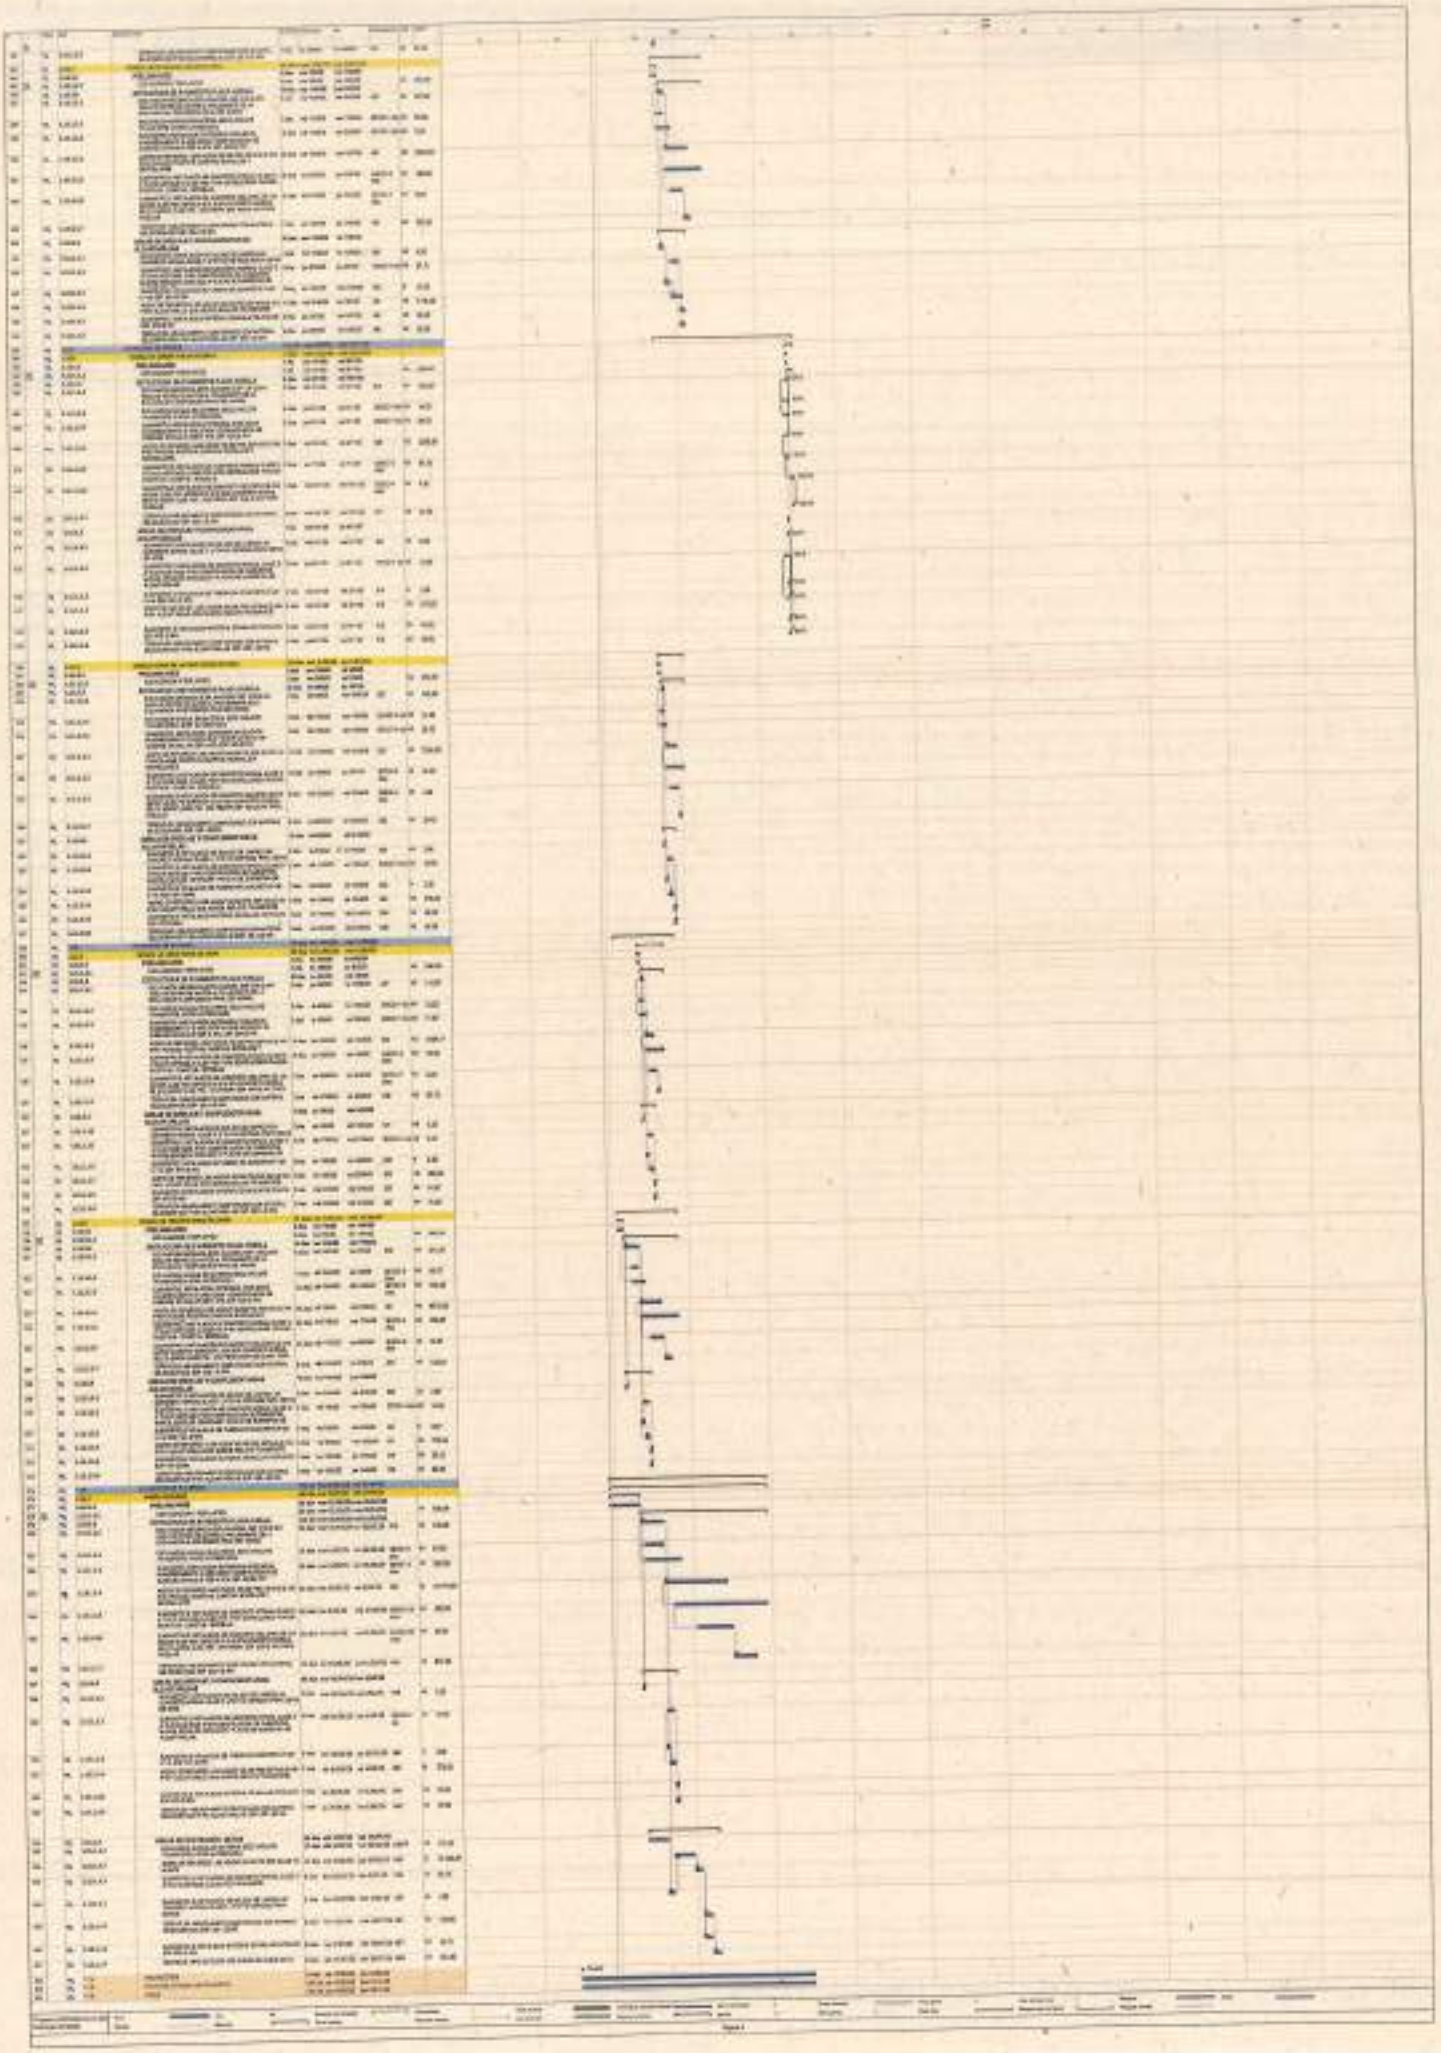

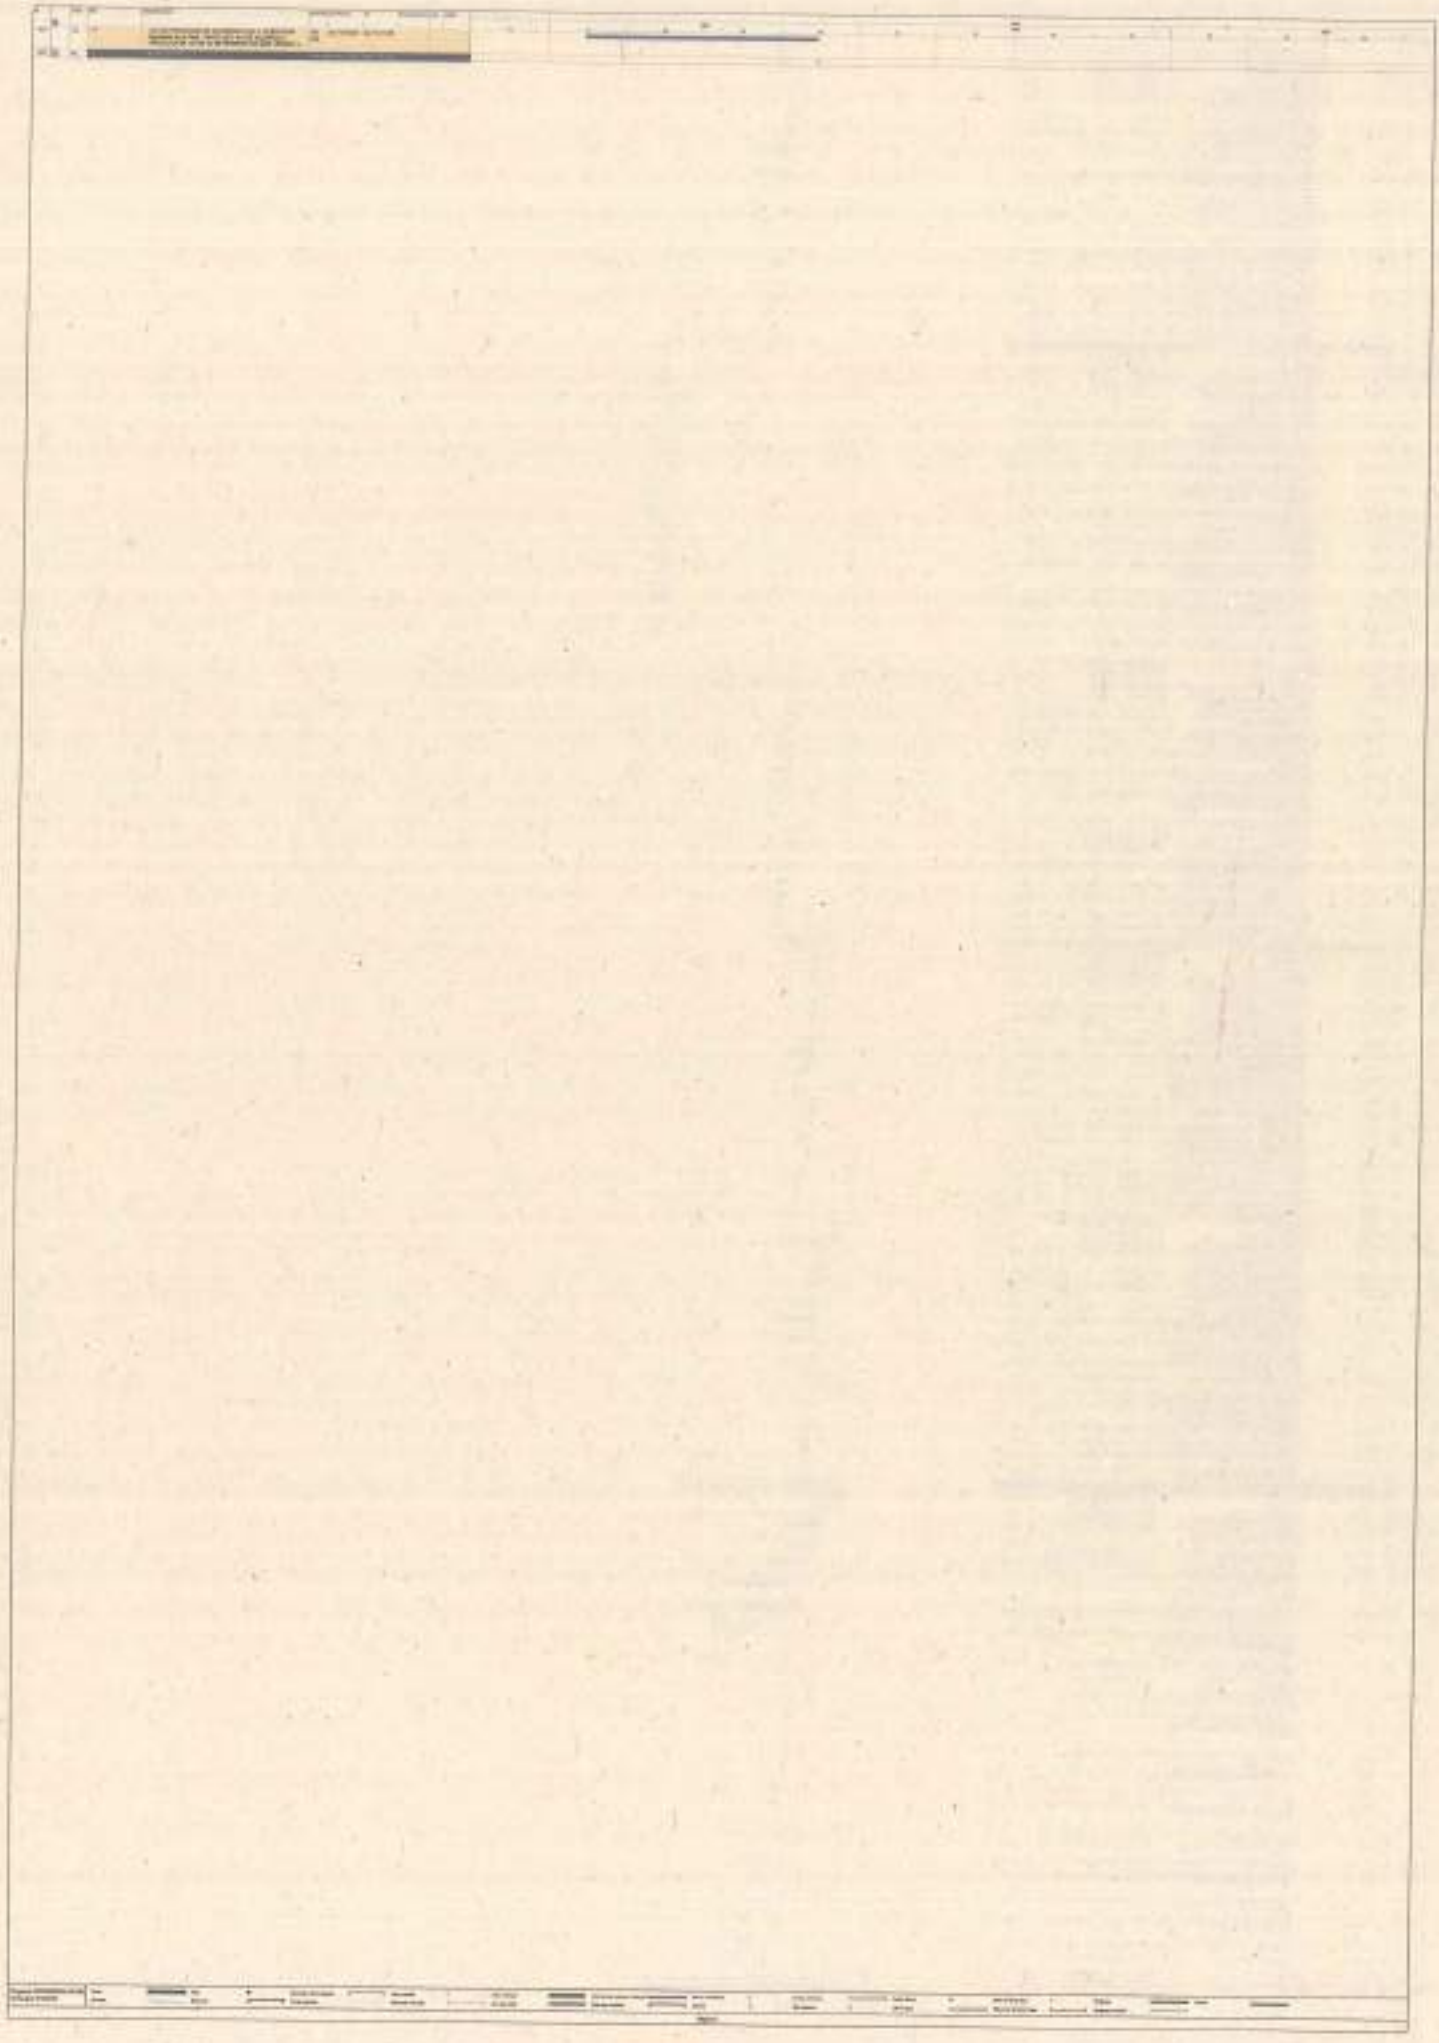

ANEXO No. 4

- **BITACORA DE OBRA PERIODO DEL 01/06/2025 AL 31/06/2025**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

DD MM AA

02/06/25 Clima: Soleado
Frente: la Unión (la Argentina)
Personal:

Encargado Obra

Inspector Interventor

Ayudantes

NO se REALIZARON LABORES

Frente: Ala Mina T3 (Tercel) Clima: Nublado
Personal:

Encargado Obra

Inspector Interventor

Ayudantes

Se replizo empaquillado para el polvillo y pejas listo para mañana. Pendiente y doble pulverización del techo.

Fdo

Fuente: San Pedro (Colombia) Clima: Húmedo
Personal:
Encargado Obra
Ayudante Inspector Supervisor

Se realizan vasos de bacilo

Fuente: El Tunjo (Natagá) Clima: Soleado
Personal:
Encargado Obra
Ayudante Inspector Supervisor

No se realizaron labores

Fuente: La Mesa (Natagá) Clima: Húmedo

Aún no hay acceso al punto fin del estado de la vía pero queremos quedar de acuerdo coordinar la vía con la administración

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Fecha: 21 Noviembre (Palacagüina) Clima: Soleado

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interesado

Se realizan labores de limpieza de acceso.

Fecha: Upe 12 (Palacagüina) Clima: Soleado

Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interesado

Se realiza limpieza de tierra

Fecha: Upe 13 (Palacagüina) Clima: Soleado

Por petición del presidente de la junta de acción comunal, se aplaza la obra.

DD MM AA

03/06/25

Tramo: La Unión (Río Negro)

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Clima: Nublado, lluvias intermitentes

Inspector interventor

Se realiza excavación manual para el pilote.

Tramo: La Mina T3 (Neuquén)

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Clima: Soleado

Inspector interventor

Se perfora 35ml de bolsillo por el costado izquierdo de la vía, desde la Abs 75 hasta abs 300 de prueba en su totalidad el tramo 3. Reporta ello conforme. Observación: posee la vía el día domingo y el día de hoy se realiza inspección visual pero no se observa ningún asentamiento a la estructura.

Tramo: San Pedro (Colombia)

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Clima: Lluvias

Inspector interventor

Se realizan lavados de bolsillo.

Norma

Scanned with CamScanner

Parada: El Trinipo (Malaga)

Personal:

Encargado Obra

Aguadero

Clima: Nublado / Lluvias intermitentes

Inspector Urbanizador

De Rabita Pasmaleta 4 Anexos de Hierro 18m.l
Hasta Pozo Ponce

Parada: La Mesa (Malaga)

Parada: Portuna (Malaga)

Personal:

Encargado Obra

Aguadero

Clima: Soleado

Inspector Urbanizador

Se realiza Excavación 4 anexos de Postes 4 Acueos
para la Hoja desde la A65 300 hasta la 480

Parada: Upa 1 (Malaga)

Fecha: Viernes 12 (Tarde) Clima: Soleado
Personal:
Inspector Obra
Encargado Obra
Ayudantes

Se realizo limpieza de Hoalla desde (A Abs 70 Hasta
la Abs 55 de 90 y Placa 3 Regillas de 20 de
placa pegada y 5 Huellas de 90 placa pegada

04/06/25
Fecha: Lunes (Día Anterior) Clima:
Personal Nublado
Encargado Obra
Inspector Supervisor
Ayudantes

De Hito principal de Gradas y Vereda de la Abs 70 /
Hasta la Abs 30, Nado izquierdo Sajaddo, de Cuneta
con la Excavación Manual para la instalación de
Pilito Planos de la Abs 130 Hasta la Abs 225
de piedra Pegada #3 y #4 para Encaje y Pegado
de alcantarilla

Fecha: Lunes Mixto (Nocturno)
Personal
Clima: Soleado
Encargado Obra
Ayudantes
Inspector Supervisor

Se realizo 115 m² de excavación manual con una altura
promedio de 35 cm.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: San Pedro (Colombia) Clima: Nublado
Personal:
Encargado Obra Inspector interventor
Ayudantes

La presencia de lluvia no permite laborar en la construcción de la placa Huella.

Frente: El Triunfo (Natagá) Clima: Nublado, lluvias intermitentes
Personal:
Encargado Obra Inspector interventor
Ayudantes

Se realizo perforación de 15ml de Huella.

Frente: La Mesa (Natagá)

Frente: Portugal (Palermo) Clima: Soleado
Personal:
Encargado Obra Inspector interventor
Ayudantes

Se perfilo 9ml de Huella por ambos lados y cuneta por ambos lados, desde la Abs 300 hasta la Abs 491 y Alcantarilla completada.

Scanned with CamScanner

Fecha: Upa T2 (Yacuiba) Clima: Soleado
Personal:
Inspector Obra
Encargado Obra
Ayudantes

Se pinto 6m de Huella de .90 y 3 Pinturas de Pintura pegada de 20 cm desde la Abs 30 hasta la Abs 35

Fecha: UPA T1 (Yacuiba)

05/06/25
Fecha: La Unión (Lo Albertina) Clima: Nublado
Personal:
Encargado Obra
Ayudantes
Inspector Interventor

Se pinto Contra la pared izquierda bajando 15 cm desde la Abs 30 hasta la Abs 65 y derecha manual para el piso.

Fecha: La Mina T1 (Obra) Clima: Nublado
Personal:
Encargado Obra
Ayudantes
Inspector Interventor

Se realiza Encargado Manual y Inspector

Scanned with CamScanner

Reside: San Pedro (Colombia) Clima: Lluvioso.
Personal:

Encargado Obra Inspector Interventor

Aquandes

Debido a las condiciones climáticas ubicadas que han presentado en la zona nos vemos en la obligación de cerrar temporalmente las actividades hasta llegado a un acuerdo con la comunidad

Reside: el Limonal (Cartago) Clima: Nublado, lluvia intermit
Personal.

Encargado obra

Ayudantes

Se fundio 35 ml de dados y 20 ml de viga.

Reside: la mesa (Cartago) Clima: lluvioso

Reside: Popayan (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Encargado OBRA

Inspector Interventor

Ayudantes

Se realiza demolición de acero y concreto

Scanned with CamScanner

Fecha: UPAE T2 (YAGUACHI) Clima: Soleado

Personal:

Encargado Obra Proyecto Interventor

Ayudantes

Se realiza Apertura de Acceso y Limpieza

Fecha: UPAE T3 (YAGUACHI)

06/06/25

Fecha: UPAE (LA AGRIPINA) Clima: Nublado

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes Inspector Interventor

La persona de limpia no permite laborar en la conformación de la placa huella y todo el trabajo desde el de agua lluvias

Fecha: UPAE T1 (CHEVER) Clima: Nublado

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

De intento conformar y replantear pero llovió todo el día

Scanned with CamScanner

Fecha: San Pedro (Colombia)

Fecha: El Tiempo (Natagá) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interventor

No se realiza trabajo por los inconvenientes que ha tenido la comunidad con la obra y se espera la reunión.

Fecha: La mesa (Natagá)

Fecha: Porvenir (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza empalmado y quedan listos para fundir

Fecha: Upar Tz (Yagará) Clima:
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza fundición de cunetas.

Scanned with CamScanner

Frente: Upar K1 (Yaguara)

07/06/25
Frente: La casa (La Agradecida) Clima:
Personal Soleado

Encargado obra Inspector: Interventoría

Ayudantes


Se realiza Replanteo de cuadras de la Av 65 hasta la Av 90, acarreo en buggy el material de Agregados y Formaleteada de Bordillos

Frente: La mina K1 (Oeste) Clima:
Personal

Encargado obra Inspector: Interventoría

Ayudantes

Se realiza compactacion y Relleno



Frente: Las Flores (Cadomboa)

Frente: El Tanque (Usaquen) Clima:
Personal Soleado

Encargado obra Inspector: Interventoría

Ayudantes

No se realizan trabajos por las lluvias este dia ha llovido la cantidad fuerte de la noche y se cayeron la Rejilla.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: La Mesa (Varela)

Frente: Polvorin (Paleemo) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra

Inspector obra Interventor

Ayudantes

Se realiza Fundicion de Vereda desde la Abs 58 Hasta la 42, se Remaletro y se Armado Hierro desde la Abs 42 Hasta la Abs 33.

Frente: Upae T2 (Yaguera) Clima:
Personal:

Encargado obra

Inspector Interventor

Ayudantes

Se realiza Empedrado para Fundir Placa.

Frente: Upae T1 (Yaguera)

08/06/25
Frente: La Union (La Argentina) Clima: Soleado
Personal:

Inspector obra

Inspector Interventor

Encargado obra

Ayudantes

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Se realiza Tapeteo de fundición de bolsillo desde la Alc 33 hasta la Alc 99.

Frente: la Mina T1 (Tolvel) Clima:
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Se realiza empastillado para placa.

Frente: San Pedro (Colombia) Clima: lluvioso

Frente: El Tenorio (Natagá) Clima: Nublado
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

No se realizan Trabajos por los inconvenientes que la lluvia conlleva con la obra y se espera la lluvia

Frente: la Mesa (Natagá)

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: Palermo (poniente) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Se realiza limpieza y armado de acero

Frente: Upae T2 (seguro) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se realizan muñidos de 3 pasos

Frente: Upae T3 (seguro)

09/06/25
Frente: La Union (La Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Inspector obra Inspector interventor

Encargado obra

Ayudantes

Se realiza armado de aceros en cuneta, fumigación de cuneta, excavación manual para el pilote e instalación.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: La Mina T1 (Nivel) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra Inspector Interventor

Ayudantes

Se replanteo desde la Abs 0+000 Hasta la Abs 0+020, se realizo excavación manual e instalación de riostra desde la Abs 0+000 Hasta la Abs 0+018.

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Tiempo (Nataga) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra Inspector Interventor

Ayudantes

Se realiza la reunion con la comunidad, delegados de la Alcaldia y de la Gobernación, negando a un acuerdo con las personas para que no realicen por la obra.

Frente: La Mesa Cuataga

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: Poliducto (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se perforaron 35 ml de bordillo, se realizo demolicion y anclaje de acero de refuerzo.

Frente: Upar 12 (Yaguara) Clima:
Personal:

Encargado obra

Ayudantes.

Inspector Interventor

Se realiza Armado de acero

Frente: Upar 11 (Yaguara)

10/06/25
Frente: La Union (La Argentina) Clima: Soleado
Personal:

Inspector Obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza Fundicion de cuneta lado izquierdo Abajando 27 ml de la Abs 99 hasta la Abs 127, Excavacion manual para instalacion de filtro 24 ml, se armo filtro 60 ml.

Scanned with CamScanner

Frente: la Mina T1 (Tacuel) Clima: Nublado.
Personal:

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se realizo Armada de Acero y limpieza

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Tambo (Nataga) Clima: Nublado
Personal

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se fundieron 6m de Losa y se empalmo 6m de Muro.

Frente: la mesa (Nataga)

Frente: posuelo (Palermo) Clima: Nublado
Personal

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se realizo Armada de acero y limpieza.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: UPAE T2 (CYAGUARA) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se hizo Hiello desde la Abs 102 hasta la Abs 45 por un costado, por el otro costado de la Abs 55 hasta la Abs 36, se excavo para riostras desde la Abs 12 hasta la Abs 0. se formaleteo y se hizo hiello y anclaje desde la Abs 27 hasta la Abs 12.

Frente: UPAE T1 (CYAGUARA)

11/06/25
Frente: la Union (la Argentina) Clima: Soleado
Personal:

Inspector obra

Encargado obra

Ayudantes

Se fundieron 15 ml de cuneta de la abs 127 hasta la abs 145, excavacion manual para instalacion de filtro francés, se hizo acero #3 para encole y #4 para refuerzo. se fundio bordillo de la abs 53 hasta la abs 109.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: La Mina T1 (Yaguara) Clima:
Personal:

Encargado obra
Inspector interventor
Ayudantes

Se realiza fundición de 4ml de placa

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Triunfo (Natagá) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra
Inspector interventor
Ayudantes

Se fundieron 6ml de Huella

Frente: La Mesa (Natagá)

Frente: Porvenir (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Inspector Obra
Encargado obra
Ayudantes

Norma

Scanned with CamScanner

Se realizo 21 ml de pileta pegada de 90 cm y
al mismo se hizo 21 ml de pileta pegado de
20 cm por el lado derecho entrando desde la
Abs 000 hasta la Abs 479 de punto 30 ml
de ancho bajo 25 por el lado izquierdo y
por el derecho de punto doble hon

Frente Obra 12 (Yaguaca) Clima:
Personal: Soleado

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se punto Vuelta de 1,95 m de la Abs 32 hasta
la Abs 20 se encontraba cuesta desde la Abs 102
hasta la Abs 32

12/06/25
Frente: La Unión (Lo Argentino) Clima:
Personal: Soleado

Inspector interventor

Inspector obra

Encargado obra

Ayudantes

Se punto 21 ml de bordillo, se tropeza con demasia de
acero de desnivel se hace demasia de acero
cuesta el excavacion manual pago mixto pesos

Fecha: 16 Mayo T1 (Hoy) Clima:

Personal:

Encargado obra Inspector Interventor

Ayudantes

De Ayer: Empalletado Loza placa y cuneta

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Tiempo (Natagá) Clima: Soleado

Personal:

Encargado obra Inspector Interventor

Ayudantes

De Ayer: 6ml de placa, 18ml de Cadalpeo y 12 ml de Cuneta.

Frente: La Mesa (Natagá)

Frente: Porvenir (Palermo) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra Inspector Interventor

Encargado obra

Ayudantes

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Se realizo Excavación manual e instalación de Riostras desde la Abs 199 hasta la Abs 164.36 Hierro instalación de Acero, de Huella, cuneta y Bordillo desde la Abs 179 hasta la Abs 164 y se dejo Perfectamente.

Frente: Upoe T2 (Yagüera) Clima: Nublado, Lluvias Intermitentes
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza fundición de Huella de la Abs 20 hasta la Abs 5.

13/06/25
Frente: La Unión (La Negativa) Clima: Nublado
Personal:

Inspector Obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza armada de Acero, cuneta, Riostras y relleno manual por detrás del Bordillo.

Frente: La Mina T1 (Oeste) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se funde 3 ml de placa.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: San Pedro (Colombia) Clima: Lluvioso

Frente: El Tiburón (Antaga) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra Inspector Interventor

Ayudantes

Se fundieron 12 m³ de adoquín y 12 m³ de cuneta.

Frente: La Mesa (Antaga)

Frente: Porvenir (Polecmo) Clima: Soleado
Personal:

Inspector Obra Inspector Interventor

Encargado

Se realiza fundición de huella y de cuneta del lado izquierdo bajando desde la Abs 179 hasta la Abs 164 y fundición de huella y cuneta del lado derecho bajando desde la Abs 179 hasta la Abs 190.

Frente: Vía Tx (Yaguara) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra Inspector Interventor

Ayudantes

Se realiza fundición de 5m³ de huella, se encofra e instalación de tubo y se funda el pentellón.

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: Upae T1 (Yacopera)

14/06/25
Frente: la unión (la Argentina) Clima: lluvioso
Personal:

Inspector obra

Inspector interventor

Encargado obra

Ayudantes

Se realiza demarda de aceros, conexta e instalacion de piedra filtro.

Frente: la mina T1 (Teruel) Clima:
Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza demarda de acero y empradillado para la placa.

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Tambo (Nariño) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

El personal no trabajo

Reunión de MESA (NATAGA) Clima: Lluvia
Personal:

Excavación obra

Aun no se tiene buen Acceso en la vía, Apical de
Subestación.

Reunión Personal (Coloso) Clima: Soleado
personal

Inspector obra

Excavación obra Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza trabajo de amarre de acero y limpieza

Reunión Upar T2 (YAGUARA) Clima:
personal Soleado

Inspector obra

Excavación obra Inspector interventor

Ayudantes

Se quiere la planja de piedra desde la Abs 45 Hasta
la Abs 0.2 se deja listo 30 ml y cuesta para Bunker

Reunión Upar T1 (YAGUARA)

Scanned with CamScanner

DD MM AA

15/06/25

Frente: la unión (la Argentina) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

De realizo aseo a la placa por material que trae la lluvia, se instalo el filtro.

Frente: la mina T1 (Trevel) Clima:

Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

No se elaboro

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El trompo (Natagá) Clima: Nublado

Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Placa total contenido 8860 ml, falta 2770 ml de bolsillos se reemplatea nuevo muestreo y ubicados.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: La MESA (NATAGA)

Frente: POLICLINICA (palermo) Clima: SOLEADO
Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector Interventoria

No de Ensayo

Frente: Upar T2 (YAGUARA) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

No de Ensayo

Frente: Upar T3 (YAGUARA)

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

16/06/25

Frente: La Unión (La Argentina) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra

Encargado obra

Ayudante

Inspector interventor

Se realiza armado de acero riostras, instalación de pilote, excavación mecanica de encole y fundición de placa de encole.

Frente: La mina T1 (Treval) Clima: Nublado

Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se funde 6 ml de placa y cuneta.

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Triunfo (Natagá) Clima: Nublado

Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza inducción y limpieza

Scanned with CamScanner

Frente: 1a MEPA (Cataluña)

Frente: Poniente (Galeana) Clima:
Personal: Nublado

Inspector obra

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

De lámina empanelado de placa.

Frente: Oper 12 (Cataluña) Clima:
Personal: Nublado

Inspector obra

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

De lámina acanalada de acero y madera.

Frente Oper 13 (Cataluña)



Scanned with CamScanner

17/06/25

Frente: La Unión (La Argentina) Clima: Soleado

Personal:

Inspector obra

Inspector interventor

Encargado obra

Ayudantes

Función de encole

Frente: La Mina T1 (Tesalia) Clima: Nublado

Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza limpieza y armado de acero

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Triunfo (Natagá) Clima: Soleado

Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza compactación y relleno

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: la meda (Malaga)

Frente: Poligono (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Se realiza Panel de placa y Montaje

Frente: Upae T2 (Yaguaca) Clima: Soleado
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Se Punge Cubeta

Frente: Upae T1 (Yaguaca)

Scanned with CamScanner

DD MM AA

18/06/25

Frente: la union (la Argentina) Clima: Nublado

Personal:

Inspector obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza instalación de 5 tuloncs, pero se detiene la obra por lluvia.

Frente: la mina T1 (Genui) Clima: Nublado

personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza fundición de cunetas y andenes

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El tesoro (Natagá) Clima: Nublado

personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza Encauce manual.

Frente: la MESA (Vallada)

Frente: Poyente (Palermo) Clima: Soleado

Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector Investigador

De Escalera en colocación manual para cuerpos

Frente: Upac 12 (Yaguara) Clima: Nublado

Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector Investigador

Frente: Upac 11 (Yaguara)

Scanned with CamScanner

DD MM AA

19/06/25

Frente: La Unión (La Argentina) Clima: Lluvias intermitentes.

Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se hace fundición de placa de descole y se deja armado aceros aletas. Se hace fundición de placa de descole y se deja armado aceros aletas, se hacen trabajo destapé en zona llena de barro.

Frente: La Mina T1 (Teruel) Clima:

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza fundición de 6ml de placa.

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Triunfo (Nulaga) Clima: Nublado

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se da inicio a excavación manual para refuerzo de tubos de 36'

DD MM AA

Frente: la MESA (Malago)

Frente: Poniente (Palermo) Clima:
Personal: Soleado

Inspector interventor

Inspector OBRA

Encargado OBRA

Ayudantes

Se realiza inspección de toda la placa con un total de 30 ml.

Frente: Upae 12 (Yaguaraa) Clima:
personal: Soleado

Inspector OBRA Inspector interventor

Encargado OBRA

Ayudantes

Se realiza Excavación manual para instalación de filtro.

Frente: Upae 12 (Yaguaraa)

20/06/25
Frente: la Unión (la Argentina) Clima:
Personal: Lluvioso

Inspector OBRA

Encargado OBRA Inspector interventor

Ayudantes

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Se realizo Excavación manual para vigas de cimentación de acuerdo de encole a descole, se dejo aceros #4 y #3 en viga, se hizo nuevamente destape de derecho en descole, se desencofro el encole.

Frente: la mina T1 (Teluci) Clima: Nublado

Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza Aseo de acero y limpieza.

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Triunfo (Natagá) Clima: Soleado

Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

Se hace excavación manual de 2.8 * 4.50 * .30 para Empredillado y encofrado de tubos de 36". Se hace limpieza en descole para revisar la profundidad del solado fundido anteriormente y se constata que tiene .14cm. Se realiza limpieza en encole.

Frente: La Mesa (Natagá)

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Recep: Provincia (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Inspector Obra Inspector Interventor

Encargado obra

Ayudantes

Se realiza inventario.

Recep: Upar 12 (Yaguaron) Clima: Nublado
Personal:

Encargado obra Inspector Interventor

Ayudantes

Se realiza excavación manual para el pilote.

Recep: Upar 11 (Yaguaron)

21/06/25
Recep: La Unión (La Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Inspector Obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Se realiza Fundición Descole

Recinto: La Mina T1 (Jewel) Clima: Nublado
Personal:

Encargado Obra Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza fundición de Gml de placa

Recinto: San Pedro (Colombia)

Recinto: Natagá (El Tejunjo) Clima: Lluvioso
Personal:

Encargado Obra Inspector interventor

Ayudantes

No se completó por las condiciones climáticas. Pero se hace limpieza.

Recinto: La Mesa (Natagá)

Recinto: Porvenir (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Scanned with CamScanner

Se realiza empedrillado y fundición de cabezas.

Frente: Upae T2 (Godoy Cruz) Clima:
Personal:

Encargado obra

Inspector Interventor

Ayudantes.

Se realiza llenado de pilar de piedra.

Frente: Upae T3 (Godoy Cruz)

22/06/25
Frente: La Unión (La Argentina) Clima:
Personal: Nublado

Inspector Obra

Inspector Interventor

Encargado obra

Ayudantes

Se realiza acceso de la vía para hacer uso al costado de la placa con 35 ml de ciclopeo de 20

Frente: La Mina T1 (Tesorel) Clima:
Personal:

Encargado obra

Inspector Interventor

Ayudantes

Se realiza Alcantarilla de acceso y Fundición de cuneta.

Norma

Scanned with CamScanner

Fuente: San Pedro (Colombia)

Fuente: El Tiempo (Nariño) Clima: Soleado
Personal:
Encargado obra Inspector Interventor
Ayudantes

Se realizo fundicion con mezcladora pero esta se dano y no se logro reparar, se colco Empañetado de
encofrado de tubo 26"

Fuente: La Mesa (Cundinamarca)

Fuente: Bosque Clima: Soleado
Personal:
Inspector obra Inspector Interventor
Encargado obra
Ayudantes

Se realiza fundido de bordillos y Empañetado de placa

Fuente: Upar 12 (Cagüan) Clima: Soleado
Personal:
Encargado obra Inspector Interventor
Ayudantes

Se realiza relleno para el filtro

Frente: Upe 13 (Yoguera)

23/06/25
Frente: La Union (La Argentina) Clima: Nuboso
Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza armado de Aceros #4 y #3, se estiliza el material del pescle colocado para el relleno del Cacol, se hace Fundido de Placa Huella de la Abd 223 hasta la Abd 233 pero solo se pudo una sola cara por motivo de mucha lluvia.

Frente: La Mina 11 (Itagüí) Clima: Nublado
Personal:

Encargado Obra

Inspector Interventor

Ayudantes

Se realiza Fundido de 6m³ de Placa

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Tesoro (Envigado) Clima: Nuboso
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Se realiza Armada de Acero.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: la MESA (NATAGA)

Frente: Poblado (Palermo) Clima: Soleado
Personal:
Inspector obra
Encargado obra
Ayudantes
Inspector interventor

Se realiza fundido de placa huella

Frente: Upar T2 (YAGUARA) Clima: Soleado
Personal:
Encargado obra
Ayudantes
Inspector interventor

Se realiza fundido de cunetas.

Frente: Upar T1 (YAGUARA)

24/06/25.
Frente: la Union (la Argentina) Clima: lluvioso
Personal:
Inspector obra
Encargado obra
Ayudantes
Inspector interventor

Scanned with CamScanner

FD MM AA

Se realizó fundición de placa huella.

Frente: la Mina T1 (Guepsa) Clima: Nublado
Personal:
Encargado obra Inspector interventor
Ayudantes

Se realiza punicado de 3 ml de placa.

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: el Tumpo (Natagá) Clima: Lluvioso
Personal:
Encargado obra Inspector interventor
Ayudantes

Se realiza armado de aceros, muestras y cuneta.

Frente: la mesa (Natagá)

Frente: Polvorín (Palermo) Clima: Nublado
Personal:
Inspector Obra Inspector interventor
Encargado Obra
Ayudantes

Se realiza fundición de cunetas y muestras.

Norma

Scanned with CamScanner

Frente: Upae 12 (Yaguaron) clima: Nublado

Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza empedrado de cuneta y bordillos

Frente: Upae 13 (Yaguaron)

25/06/25

Frente: La Unión (La Argentina) clima: Nublado

Personal:

Inspector de obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Se realiza Tapado de pozo desde la abs 225 hasta la abs 258.

Frente: La Mina 13 (Ybycui) clima: Nublado

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Se realiza Limpieza de acero y limpieza.

Fecha: San Pedro (Colombia)

Frente: El Tejuelo (Malaga) Clima: Nuboso
Personal:
Encargado obra Inspector interventor
Ayudantes

Se realiza Acopio de Aceros, Madera y Hostes

Frente: La Mesa (Malaga).

Frente: Poblado (Palermo) Clima: Soleado
Personal:
Inspector Obra
Encargado obra Inspector interventor
Ayudantes

Se realiza Fundición de cubetas y Hostes

Frente: Vía 12 (Yarumal) Clima: Soleado
Personal:
Inspector Obra
Encargado obra Inspector interventor
Ayudantes

Se Realiza Excavadora Manual para la instalación de postes.

DD MM AA

Frente: Upar T3 (Yopal)

26/06/25
Frente: La Unión (La Argentina) Clima: Lluvioso
Personal:

Inspector obra

Encargado obra

Ayudantes

No se logro realizar Actividad por la lluvia.

Frente: La Mina T3. (Cesar) Clima: Nublado
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

De punte 6ml de placa

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El triunfo (Natagá) Clima: Lluvioso
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

De realiza demolo de aceros.

Scanned with CamScanner

Frente: la mesa (Matoza)

Frente: Poblado (Palermo) Clima: Soleado
Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza Empalillado de placa y cuneta.

Frente: Upar Tz (Yaguara) Clima: Nublado
Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza Excavación manual para la instalación de pilote.

Frente: Upar Tz (Yaguara)

27/06/23
Frente: la unión (La Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Inspector Obra

Encargado Obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Se realiza limpieza ocasionada por la lluvia.

Frente a la mina T1 (Frenal) Clima:
Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

No se elaboro por temporada San Pedrino

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El Triunfo (Nutaga) Clima:
Personal: Nublado

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza armada de acero y cuelas.

Frente: la mesa (Nutaga)

Frente: Porvenir (Palermo) Clima:
Personal: Soleado

Inspector interventor

Inspector obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector interventor

Scanned with CamScanner

Se realiza fundición de placa y cunetas.

Frente: Upae T2 (Yaguarón) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza excavación manual para el filtro

Frente: Upae T1 (Yaguarón)

28/06/25
Frente: La Unión (La Argentina) Clima: Nublado
Personal:

Encargado obra Inspector interventor

Ayudantes

Se realiza inventario.

Frente: La Mina T1 (Treinta) Clima:
Personal:

Encargado obra

Inspector interventor

Ayudantes

No se ejecuta por temporada sin precipitación.

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Frente: San Pedro (Colombia)

Frente: El tiempo (Cundinamarca) Clima: Nublado
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza INVENTARIO

Frente: la mesa (Cundinamarca)

Frente: Porvenir (Paipa) Clima: Soleado
Personal:

Inspector obra

Encargado obra

Ayudantes

Inspector Interventor

Se realiza Fundición de la Ab3 500 hasta la Ab3 431

Frente: Upac T2 (Yopal) Clima: Soleado
Personal:

Encargado obra

Ayudantes

Se realiza Fundición de Riostras

Frente: Upac T2 (Yopal)

Scanned with CamScanner

30/06/25

Reende: La Unión (La Argentina) Clima: Nublado

Personal:

Inspector Obra

Inspector Interventor

Encargado Obra

Ayudantes

No se trabajo por temporal lluvia

Reende: La Nueva T1 (Arevel) Clima: Nublado

Personal:

Encargado Obra

Inspector Interventor

Ayudantes

No se elaboro por temporal lluvia

Reende: San Pedro (Colombia)

Reende: El Tiempo (Cuitaga) Clima: Nublado

Personal:

Encargado Obra

Ayudantes

No se elaboro por temporal lluvia.

Norma

Scanned with CamScanner

Fuente: la mesa (cuenca)

Fuente: Poblacion (palermo) Clima: Soleado
Peso unit:

Encargado obra

Ayudantes

No se elabora por temporada Sin peso

Fuente: Uvas kg (Yaguarcocha) Clima: Nublado
Peso unit:

Encargado obra

Ayudantes

No se elabora por temporada Sin peso

Fuente: Uvas kg (Yaguarcocha)

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 5

- **COMITÉ DE OBRA No.13**
- **COMITÉ DE OBRA No.14**
- **COMITÉ DE OBRA No.15**

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 14	Página 1 de 6
	CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024** INTERVENTORIA: **CONSORCIO INTERVENTORES 2030** **CONTRATO 1590 DE 2024** OBJETO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	FECHA: Día: 03 Mes:07 Año: 2025

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE	R.L. CONSORCIO INTERVENTORES 2030	
JAMES ANDRADE ZAMBRANO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	
LEINER GUERRERO	R.L. CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	
VLADIMIR PINCHAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CRISTIAN DELGADO	INGENIERO APOYO CONTRATISTA

OBJETO DE LA REUNION:

Seguimiento al contrato de obra 879 de 2024 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ORDEN DEL DIA:

1) Llamado a lista y verificación de los asistentes
2) Lectura y aprobación acta de comité No.13
3) Revisión programación de obra y de plan de contingencia.
4) Revisiones parte técnica ejecución

5) Proposiciones y varios.

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes

Toma la palabra la Ing. JAMES ANDRADRE Z., Coordinador de la interventoría indicando que teniendo en cuenta la invitación enviada por esta Interventoria por medio de correo electrónico el día 02 de julio de 2025, el día de hoy 03 de julio de 2025 a las 2:00 pm en las oficinas de la Interventoria hacen presencia, en representación del Consorcio Vial Iquira 2024 el señor LEINER GUERRERO Representante legal, el Ing. VLADIMIR PINCHAO, Director de obra, por su parte la interventoría externa, hace presencia el Ing. JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE, R.L. CONSORCIO INTERVENTORES 2030, Ing. JAMES ANDRADE ZAMBRANO, Coordinador General de Interventoria; y el Ing LUIS CARLOS FONSECA Director de interventoría y el Ing. CRISTIAN DELGADO, apoyo del contratista. Es decir, se concluye que se encuentran todos los profesionales para adelantar el presente comité técnico de obra.

2. Avance del contrato 879 de 2024

Toma la palabra el ingeniero James Andrade Zambrano, quien agradece la asistencia al comité de obra y una vez verificado el cuórum se da inicio al comité técnico de obra No.14 para la revisión del estado del contrato de obra 879 de 2024 y sus inconvenientes.

Hace la presentación el Ing. Vladimir Pinchao como nuevo Director de Obra y agradece la invitación al comité técnico, indica que aunque este es el primer comité que asiste ya ha venido adelantando seguimiento a las labores de obra.

El primer punto de la agenda del día es la lectura y aprobación del acta de comité técnico No.13 del 14 de junio de 2025, la cual no se recibe observación de ninguno de los asistentes por lo tanto se procede a su correspondiente aprobación y firma.

El siguiente punto es la revisión del avance del contrato y la revisión de la implementación del plan de contingencia. Toma la palabra el Ing. Luis Fonseca para revisar los avances de los tramos intervenidos y deja claro que en la presentación del informe semanal a la Gobernación del Huila; se hace el seguimiento de estos avances y los retrasos, además del seguimiento que esta hace atraves de la plataforma de Gesproy por tal razón se debe cumplir con la programación. Estos informes se envían en los primeros días de la semana a la Supervisión del contrato de Interventoria y también al correo del contratista de obra, El Ing. James Andrade indica que, con la vinculación del Ing. Vladimir, los informes también se le deben enviar a él a su correo personal.

A continuación, se presenta el reporte de avance de cada uno de los frentes intervenidos:

La Argentina: A la fecha aún no se presenta personal a laborar, desde la semana pasada salió el personal por el asunto de las festividades de San Pedro. En la visita del 17 de junio por parte de la Interventoria se dejaron observaciones de la construcción de las medidas de contención, de manejo del drenaje y de la construcción del muro sin que a la fecha se adelanten estas labores, además de esto como ya se ha venido comunicando sobre el cierre del cruce por donde acceden los vehículos con material por la construcción de la placa huella por parte de los contratistas de la Alcaldía, sin que se tomen las medidas por parte del Consorcio Vial Iquira 2024.
Toma la palabra el Señor Leiner Guerrero indicando que ya se está movillzando el personal pero que debido a problemas de logistica de las comidas se está coordinando con un personal de Neiva, pero se espera que el día de mañana ya se esté trabajando.

La Plata: Ya se realizó la entrega a la comunidad se le requiere al contratista agilizar la documentación correspondiente para la liquidación del tramo.

Rivera- Llanitos: Ya se realizó la entrega a la comunidad se le requiere al contratista agilizar la documentación correspondiente para la liquidación del tramo.

Colombia: No se están ejecutando actividades en el frente conforme a lo solicitado por la comunidad con respecto a esperar a la disminución de la temporada de lluvias para reiniciar, lo que es aproximadamente en el mes de Agosto, el señor Leiner Guerrero apunta que se han presentado varios inconvenientes para intervenir este y los demás frentes con los deslizamientos presentados y la perdida de banca en el puente de la Legiosa.

Teruel: Una vez realizada la visita por parte del equipo técnico de la Interventoria se dejaron una serie de indicaciones para el manejo de las aguas de escorrentía, en el tramo 3 el cual ya se encuentra finalizado se debe revisar al final del tramo el descargue de esas aguas a un costado para no afectar la vivienda, por tal razón debe revisarse la opción de una cuneta o un cárcamo transversal. Para el tramo 2 se solicita el inicio de la intervención y el manejo de aguas con un cárcamo transversal para recoger las aguas de la placa huella y no afectar la casa que se encuentra al finalizar. El tramo 1 se ha construido 79 ml de placa huella, se solicita la intervención de la repotenciación de la alcantarilla así como el replanteo del muro y el diseño de la intersección.

Palermo: Se han completado 60ml de placa huella, se solicita al contratista la correcta disposición de los materiales sobrantes de obra así como la demolición de los bordillos según indicaciones del comité técnico No.13, se solicita al contratista el inicio de la construcción de los muros para adelantar las actividades pendientes sin interferir con las labores de logística de la placa huella.

Yaguara: Desde el 19 de junio se tiene la información que no se había presentado personal a trabajar, solo hasta esta semana se reiniciaron labores, en Upar 200 se han completado 200ml de placa, 150ml de concreto ciclopeo y 100 ml de cuneta y bordillo, se aclara como se va a trabajar los accesos a los predios, la

repotenciación de la alcantarilla. La comunidad no deja hacer intervención de la placa huella en Upar 150 hasta no terminar la obra, se solicita al contratista terminar lo pendiente e iniciar con las otras estructuras complementarias para avanzar en ese frente.

Nataga: En la presente semana no ha presencia de personal en el tramo del Triunfo por lo tanto no se han ejecutado actividades. En la vereda de la Mesa se sigue sin intervenir, incumpliendo el compromiso del comité técnico No.12 con el inicio de este tramo.

Campoalegre: No se ha iniciado la ejecución de la obras incumpliendo lo programado, el contratista alega el estado de la vía de acceso que no permite el ingreso de materiales, la Interventoria solicita el registro de lo manifestado para dejar constancia.

Santa Maria: Aunque el contratista ha enviado información sobre el estado en su momento de las vías de acceso la Interventoria solicita que se debe volver a verificar el estado conforme al descenso de las lluvias.

Algeciras: La Interventoria solicita al contratista el inicio de la coordinación de la logística y el acercamiento con las autoridades municipales y de los habitantes de la zona para programar los inicios de los tramos según programación.

Iquira: La Interventoria solicita al contratista el inicio de la coordinación de la logística y el acercamiento con las autoridades municipales y de los habitantes de la zona para programar la intervención de los 40ml restantes de placa huella.

El Ing. Luis Fonseca menciona que conforme a la información presentada anteriormente se tiene un gran atraso en la ejecución de las construcciones y debe evaluarse el plan de contingencia debido a que no se está implementando según lo establecido y no está cumpliendo con su objetivo.

Toma la palabra el señor Leiner Guerrero informando que como también lo ha mencionado ha habido muchos inconvenientes con la ejecuciones más que todo con respecto al clima que dificultan el acceso, los diferentes bloqueos de las vías y tramos que no se pueden intervenir por el convenio con el INVIAS, por tal razón y en respuesta del informe por un presunto incumplimiento enviado por la Interventoria a la entidad contratante, estamos estructurando un documentos con todas estas dificultades que no son culpa de nosotros como ejecutores y que se nos sale de las manos para poder evaluar la verdadera programación con nuestro avance.

El Ing Luis Fonseca indica que en los informes semanales se están dejando todas estas anotaciones y se hace una evaluación del porcentaje de estos frentes y se indica otro valor de diferencia con la ejecución pero que de todas formas ya se cuenta con un atraso considerable que todo no puede ser atribuido a lo indicado por el señor Leiner.

El Ing. James Andrade solicita al contratista ser más diligente con las acciones a tomar con estas

dificultades y se adelante un acompañamiento más efectivo con las entidades territoriales, no solo con el envió de comunicaciones si no con la presencia en las alcaldías para solicitar colaboración o trabajar mancomunadamente y poder sacar este proyecto en el tiempo contractual vigente.

3. Proposiciones y varios

Por parte de la Interventoria se reitera la solicitud de la presentación al contratista del informe de la inversión y buen manejo de anticipo con los soportes correspondientes. Así mismo la entrega de todos los soportes de calidad de los materiales y de los procesos constructivos.

COMPROMISOS PACTADOS:

Entrega de documento con los inconvenientes indicados	Contratista

COMENTARIOS:

Hace parte integral del presente comité técnico de obra No. 14, el listado de asistencia.

PROXIMA REUNION

- Fecha:
- Hora:
- Lugar:

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE COMTE DE OBRA No. 14





GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	COMITÉ TECNICO DE OBRA DEL CONTRATO 879-2024 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ TECNICO OBRA No. 14

DIA: 03-07-2025
HORA: 2:00 PM
SITIO: SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

NOMBRE	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
Lana Guevara	87218414	lailamesaguevara@gmail.com	Controlista R/L	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Interventoria	
Diego A. Medina Losada	1081151990	consorcio interventores.	Ins. Obra Interv	Diego A. MEDINA L.
Cristian Camilo Delgado Ladino	1075308184	consorcio vial sigma 2024	contratista	
Darwin Vladimir Pinchao Rojas	1085923729	darpinchaoro@gmail.c	Contratista	
Juan C. Polanía	1075294681	//	Interventoria	

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 15	Página 1 de 11
	CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024** INTERVENTORIA: **CONSORCIO INTERVENTORES 2030** **CONTRATO 1590 DE 2024** OBJETO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	FECHA: Día: 11 Mes:07 Año: 2025

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES	SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE	RL. CONSORCIO INTERVENTORES 2030 - INTERVENTORIA	
JAMES ANDRADE ZAMBRANO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	
LEINER GUERRERO	RL. CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	
VLADIMIR PINCHAO ROMO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE MAURICIO DURAN	INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION
CRISTIAN DELGADO	INGENIERO APOYO CONTRATISTA

OBJETO DE LA REUNION:

Seguimiento al contrato de obra 879 de 2024 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes
2. Revisión programación de obra y de plan de contingencia.
3. Estado presunto incumplimiento.
4. Estado tramite creación convenio INVIAS- Gobernación del Huila
5. Proposiciones y varios.

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes

Toma la palabra el Ing. JAMES ANDRADRE, Coordinador de la interventoría indicando que teniendo en cuenta la invitación a comité técnico enviado mediante comunicación del 10 de julio de 2025 comité, el dia de hoy 11 de julio de 2025 a las 9:00 am en las oficinas de la Secretaria de Vías e Infraestructura hacen presencia la supervisora de interventoría la Ing. ANGELA ZAMBRANO, el Ing. JOSE MAURICIO DURAN, profesional de apoyo a la supervisión, en representación del contratista de obra el señor LEINER GUERRERO, Representante Legal, el Ing. VLADIMIR PINCHAO, Director de obra; por su parte la interventoría externa, hace presencia el Ing. JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE, representante legal de la Interventoria, el Ing. JAMES ANDRADE ZAMBRANO, Coordinador General de Interventoría; y el Ing LUIS CARLOS FONSECA Director de interventoría. Es decir, se concluye que se encuentran todos los profesionales para adelantar el presente comité técnico de obra.

2. Avance del contrato 879 de 2024

Toma la palabra el ingeniero James Andrade Zambrano, quien agradece la asistencia al comité de obra; y una vez verificado el cuórum se da inicio al comité técnico de obra No.15 para la revisión del estado del contrato de obra 879 de 2024 y de los compromisos adquirido en los anteriores comités.

El ing. Luis Fonseca inicia con el punto del reporte de avance por parte de la Interventoria de cada uno de los frentes en ejecución y el estado de avance del proyecto:

CUADRO RESUMEN		
PROGRAMADO	66,09%	$ 4.721.240.311
EJECUTADO	26,53%	$ 1.894.875.535
VARIACION	-39,57%	$ -2.826.364.776
FECHA CORTE	06/07/2025	



La Plata: ha terminado con la construcción de la placa huella, entrega a satisfacción, espera entrega documentos para cierre.

Rivera: ha terminado con la construcción de la placa huella de los Llanitos, entrega a satisfacción, espera entrega documentos para cierre, para el tramo de las Juntas en espera de las actividades de EPR según compromisos de la última reunión del 01 de julio de 2025.

La Argentina: Solo hasta el día 04 de julio llegaron trabajadores a obra para iniciar con temas logísticos, la Interventoria solicito al contratista que teniendo en cuenta el atraso del proyecto no se pueden permitir pasar varios días sin que no se ejecuten actividades. Se solicitó al contratista el suministro de materiales para concreto y demás ya que próximamente se cerrará la vía de acceso por parte de la placa huella de la Alcaldía, la fecha de finalización prevista en la programación actual era el 24 de mayo 2025.

Toma la palabra el señor Leiner Guerrero indicando que la obra se ha visto afectada por el invierno, se ha presentado perdida de banca por las fuertes lluvias presentadas, ya esta semana se iniciaron las labores, ya con el asunto del muro tenemos el material pero no hemos podido avanzar porque aún no disminuyen las lluvias, porque el material de relleno de los geobags debe estar seco, ya

como vemos esta semana han bajado las lluvias ya podemos terminare ese muro de contención

La Ing Ángela Zambrano informa que ya en varias ocasiones la comunidad de La Argentina nos ha requerido por los avances en este tramo y el no cumplimiento de la finalización del tramo con respecto a lo informado en la socialización, ya le hemos dado respuesta a una solicitud con la colaboración de la Interventoría. Se tiene programada una reunión para el día 16 de julio de 2025 a las 10am en el sitio de obra, para que por favor asistan contratista e Interventoría, le hago la pregunta al contratista, cuando tiene estimado terminar la placa huella?, el señor Leiner Guerrero responde que en 20 días aproximadamente se termine con la placa huella.

Toma la palabra el Ing James Andrade indicando que ya se ha desembolsado el anticipo a los proveedores de los materiales pero solicita la contratista se termine con la realización del acta parcial, ya se ha venido trabajando mucho en ese tema con la completa disposición del equipo de Interventoría pero necesitamos que se complete toda la documentación requerido, solicitamos que el día lunes ya deba estar radicada en la Gobernación del Huila.

La Ing Angela Zambrano menciona que según lo indicado por el representante legal del contratista de obra de la Argentina debe terminarse en la primera semana de agosto, ya han pasado casi siete meses desde la firma del acta de inicio y este tramo que se tenía proyectado para 3 meses y es la fecha que no se termina, solicita a la Interventoría el seguimiento a este compromiso.

Nataga: Retoma el Ing. Luis Fonseca mencionando que para el tramo del Triunfo se encuentran terminados 70ml de placa huella pero que ya se lleva dos semanas sin persona y en el tramo de la Mesa aún no se ha iniciado con la intervención del tramo.
Toma la palabra Leiner Guerrero indicando que en la Mesa han tenido problemas con el acceso y el orden público, hay problemas en las vías de acceso de ampliaciones para el tránsito de vehículos pesados y de fallas se hizo el acercamiento con la Alcaldía para el mantenimiento de la vía pero no se ha tenido respuesta sobre estos trabajos. En la vereda el triunfo se tenía personal y materiales se iniciaron trabajos pero llegaron las cosechas y las lluvias y el personal no quiso seguir trabajando en obra y está un poco complicado llevar el personal de afuera.
El Ing. James Andrade indica que como se ha mencionado en anteriores comités ya se le dio autorización al contratista de incorporar personal así no sea de la zona para poder cumplir con lo programado por tal razón solicita que se realicen las gestiones pertinentes.

La Ing Angela Zambrano complementa diciendo que debe reorganizar el tema para incorporar nuevo personal y que este cumpla con el rendimiento esperado y poder terminar lo antes posibles, pregunta al representante legal del contratista cuando es la fecha prevista de terminación de estos dos tramos?

Leiner Guerrero responde que en mes y medio para terminar el Triunfo y en 20 días para la Mesa, si logramos conseguir el personal suficiente, esperamos una vez se termine en La Argentina trasladar parte de ese personal. La Ing. Angela Zambrano responde que así las cosas entonces para la primera semana de septiembre ya se terminarían los frentes de Nataga.

Yaguará: El Ing. Fonseca menciona que en el tramo Upar 200 ya se terminó con el concreto de placa, concreto ciclópeo y se están terminando las cuentas, en este frente todavía hace falta la repotenciación de las alcantarillas, se le ha insistido al contratista la intervención de Upar 150 en donde se tiene previsto trabajos de alcantarilla y un muro, estas actividades pueden iniciarse sin interferir en el tránsito.
El señor Leiner Guerrero indica que esta próxima semana a más tardar el miércoles se termina Upar 200 y pasamos a intervenir el otro frente, en Upar 150 como tenemos obras de arte el plazo el plazo que se prevé de intervención son dos meses. La Ing. Ángela Zambrano responde que así las cosas para el 15 de septiembre sería la fecha de terminación.

Palermo: El Ing. Luis Fonseca informa que a la fecha se han ejecutado 100ml de placa huella terminada y todavía en espera de la atención del contratista de las observaciones realizadas, en la presente semana no se contó con personal en la obra. Toma la palabra el Ing. Vladimir mencionando que dentro del consorcio tienen un inconveniente con los recursos, que aunque se tiene pagado gran parte del material aún faltan recursos para cubrir la mano de obra por esta razón a más tardar el lunes debemos estar radicando acta ya estamos restructurando la operación. Toma la palabra el señor Leiner Guerrero confirmando que el lunes se retoman las actividades en ese tramo.

Teruel: El Ing. Luis Fonseca menciona que el tramo 3 se encuentra construido 100ml de placa huella falta la construcción de la alternativa para el manejo de aguas según lo revisado en el recorrido con Interventoría, el tramo 2 no se ha intervenido y el tramo 1 tienen 78 ml de placa huella, faltando por ejecutar la repotenciación de la alcantarilla, la estructura de contención para la ampliación de la vía y la intersección. El señor Leiner Guerrero informa que ya se envió lo del muro a Interventoría y espera el aval, el Ing Fonseca responde que ya el documento está en revisión por el equipo técnico de la Interventoría y a más tardar el lunes se enviara la respuesta.

La Ing. Angela Zambrano pregunta cuando es la fecha de terminación de todos los tramos de Teruel. El señor Leiner Guerreo responde que el tramo 1 el 31 de julio 2025 y el tramo 2 finalizando Agosto.

Colombia: El frente de San Pedro se encuentra suspendido desde el mes de junio 2025 común acuerdo con la comunidad por el tema de lluvias y estado de las vías de acceso. La Ing. Angela Zmabrano pregunta y los demás frentes porque no se han iniciado si ya se tienen programada su

intervención.

Toma la palabra el Ing. Vladimir Pinchao y para dar una respuesta más clara del porque los atrasos en la ejecución de las obras va a proceder a leer el comunicado en respuesta del informe por presunto incumplimiento, este comunicado ya fue radicado a la Gobernación, igualmente este comunicado se anexa y hace parte del presente comité:

TRAMO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	LONGITUD POR TRAMO (ml)	SITUACION POR TRAMO
1	COLOMBIA	VEREDA LA BERNAZA	100	En el tramo ubicado en la vereda Bernaza se ha visto afectado, al igual que todo el municipio de Colombia, por la ola invernal, adicionalmente temas de orden público, por último, el tramo no cuenta con la cantidad de m3 de subbase contractuales y se determina que se necesitan 74.26 m3
2		VEREDA SAN PEDRO	300	En el tramo ubicado en la vereda San Pedro, del municipio de Colombia, se inició a ejecutar labores de construcción, pero la ola invernal obligó trabajar bajo la lluvia y demás, debido a las fuertes precipitaciones hubo múltiples deslizamientos y un puente ubicado en un sector llamado lejiosa perdió una parte de la vía y puente, para la maquinaria y volquetas se volvió muy peligroso pasar por ese sector. Adicionalmente se necesitan 234.78 m3 de subbase.
3		CRUCE SAN ABROSIO - VERSALLES	100	En el tramo ubicado en la vereda Versalles se ha visto afectado, al igual que todo el municipio de Colombia, por la ola invernal y adicionalmente temas de orden público. Adicionalmente, se necesitan 69.9 m3 de subbase que no se encuentran contractualmente.
4		VEREDA SANTA ANA TRAMO 1	100	Los tramos ubicados en la vereda Santa Ana son de propiedad del INVIAS y la gobernación aún no cuenta con el convenio. En los tramos de Santa Ana, también se necesitan 140,63 m3 de subbase.
		VEREDA SANTA ANA TRAMO 2	100	
5		VEREDA SAN MARCOS TRAMO 1	30	En el tramo ubicado en la vereda San Marcos, se ha visto afectado, al igual que todo el municipio de Colombia, por la ola invernal y adicionalmente temas de orden público. Por otro lado, al igual que en los otros tramos, se necesita subbase, un total de 141,17m3
		VEREDA SAN MARCOS TRAMO 2	170	
6	YAGUARA	VEREDA UPAR	150	En la vereda Upar T1, no fue posible iniciar simultáneamente al otro tramo, debido a que por petición de veedores y presidente de la junta de acción comunal se dejó iniciar la construcción de una placa huella ejecutada por otro contratista. próximamente se iniciará con labores de construcción de muro de contención y alcantarillas. Sin embargo, ya se realizaron labores de excavaciones mecánicas, ampliaciones y mejoramientos.
7		VEREDA	200	A la fecha ya se están terminando labores de construcción de la placa huella,

		UPAR		filtros de drenaje y demás obras complementarias.
8	LA ARGENTINA	VEREDA LA UNIÓN	300	En la vereda La Unión, se vienen realizando labores de construcción, sin embargo, no se ha podido avanzar con la programación y el rendimiento esperado, debido a las fuertes lluvias que se presentan en el lugar, esto ha provocado deslizamientos de tierra, perdida de banca, entre otros, por lo cual se ha optado por realizar labores de contención y estabilización. Se han realizado 150 ml de placa huella con cuneta, concreto ciclópeo y bordillo, además, se ha hecho la construcción de filtro.
9	TERUEL	LA MINA TRAMO 1 ESCUELA	100	A la fecha ya se cuenta con la construcción de 78 ml de placa huella con su respectiva cuneta, bordillos y ciclópeo, se empezarán a realizar labores de construcción de muro de contención para poder lograr el ancho de la vía, es de resaltar que el muro de contención no se encontraba estimado contractualmente, sin embargo, se realizaron estudios de suelos y estructurales para darle viabilidad al diseño y ejecución del muro, además, se realizará la repotenciación de la alcantarilla.
		LA MINA TRAMO 2	100	Por petición de la comunidad y la época de cosecha, no se ha podido iniciar con labores de construcción, sin embargo, ya se realizaron labores de ampliaciones y mejoramientos de vía.
		LA MINA TRAMO 3 VIA A LA ARMENIA	100	A la fecha ya se encuentra totalmente ejecutado el tramo, durante su ejecución hubo muchos inconvenientes debido a la fuerte ola invernal, además, los propietarios de los predios al inicio no dejaban realizar las ampliaciones, se contó con el acompañamiento de la interventoría y funcionarios de la alcaldía de Teruel para persuadir al propietario y superar el inconveniente.
10	LA PLATA	VEREDA ALTO DEL RETIRO	100	A la fecha ya se encuentra totalmente ejecutado el tramo.
11	SANTA MARIA	VEREDA LAS PALMAS - FINCA DE MIGUEL	100	Se han realizado visitas al lugar de ejecución del tramo de placa huella, pero se ha evidenciado que está muy difícil el acceso al lugar del tramo, debido a deslizamientos en vías de acceso, la comunidad nos comenta que ya han hecho la solicitud a la alcaldía municipal para que intervengan en las vías de acceso.
12	RIVERA	VEREDA LLANITOS	100	A la fecha ya se encuentra totalmente ejecutado el tramo.
13		TERMOPILAS QUE CONDUCE A LAS JUNTAS	180	El tramo ubicado en la vereda las juntas ya cuenta con las ampliaciones, mejoramientos y demás, aunque en la socialización, nadie advirtió sobre una obra paralela más arriba de nuestro tramo, otro contratista se encuentra ejecutando la construcción de una bocatoma, mediante comité realizado el día 26 de Febrero en las instalaciones de la secretaría de Vías e infraestructura

				del Departamento del Huila se concluyó que se daba un plazo de cuatro meses, con el fin de que se pudiera dar inicio a la construcción el dia 01 de junio, sin embargo, en comité realizado el 01 de julio se estableció que aún no se concluyen actividades y necesitan de más tiempo para poder finalizar la construcción, por ende, se aplaza para inicio del mes de Septiembre
14	BARAYA	VEREDA SOTO	100	El tramo ubicado en la vereda Soto, es de propiedad del INVIAS y aún no se cuenta con el convenio que nos permita intervenir el tramo.
15	ALGECIRAS	QUEBRADA PERDIZ	180	En general, se han estado haciendo acercamientos para poder acceder de manera segura a las diferentes veredas, ya que el orden público de la zona es bastante delicada. Se le ha manifestado a la interventoría y ellas se han comprometido con nosotros a realizar acercamientos para garantizar la seguridad del personal y demás actores.
16		ARGELIA	95	
17		GUADUALEJA	150	
18		LAS BRISAS	150	
19		LÍBANO	125	
20		KROSKO	100	
22	CAMPOALEGRE	VEREDA BUENA VISTA A LAS TORRES DE TELECOM - 2 TRAMOS	130	Se han realizado visitas al lugar de ejecución del tramo de placa huella, pero se ha evidenciado que está muy difícil el acceso al lugar del tramo, debido al mal estado de las vías de acceso, la comunidad nos comenta que ya han hecho la solicitud a la alcaldía, les enviaron una máquina, pero se dañó y nunca más volvieron a enviar
23		VEREDA EL GUAYABO - TF LA ESPERANZA GEDCAGRO MUJERES	100	Se realizó la visita al tramo y se hizo el acercamiento con la comunidad, manifestaron que aproximadamente en el mes de agosto podríamos realizar la intervención del tramo, debido a que esta vía es la única vía de acceso para diferentes veredas de la zona y el taponamiento de la vía sería imposible en el momento porque se encuentran en cosechas.
24		VEREDA ALTO BEJUCAL - TF ALTO BEJUCAL	200	El tramo ubicado en la vereda Alto Bejuca , es de propiedad del INVIAS y aún no se cuenta con el convenio para poder intervenir el tramo.
25	IQUIRA	VEREDA JARDÍN PASANDO EL PUENTE DE VALENCIA	100	En el tramo ya existe construido una placa huella de 120ml, por lo tanto, ya no se puede construir la placa huella.
26		VIA A LA LOMA DE LA CRUZ	100	Ya se encuentra construido 60ml de placa huella, por ende, solamente se podrá ejecutar 40ml
27	NATAGA	VEREDA LA MESA - 2 TRAMOS	130	En la vereda la mesa se realizaron acercamientos para poder ingresar a la zona, pudimos dejar algo de material en el punto, sin embargo, las fuertes

				lluvias imposibilitaron el acceso al punto, atascando volquetas y demás, el orden público de la zona es complicada
28		EL TRIUNFO	200	Nos encontramos realizando labores de construcción de placa huella, ya se realizó la alcantarilla y se continúan ejecutando labores, sin embargo, las fuertes lluvias no nos han permitido tener un curso normal en la construcción de la placa huella.
29	PALERMO	PORVENIR	500	En la vereda Porvenir, nos encontramos realizando labores de ejecución de la placa huella, ya se ejecutó una alcantarilla, se rediseñaron los muros de contención que estaban contractuales. Al igual que en los otros puntos, la fuerte ola invernal nos ha ocasionado retrasos en la obra, debido a las fuertes precipitaciones hemos perdido material instalado y hemos estado en la obligación de volverlo a instalar. Cabe resaltar que cuando hicimos la socialización de la obra, nos dijeron que no podíamos iniciar debido a una obra paralela, la ejecución de otra placa huella por otra de las vías de acceso a la vereda, lo cual nos hizo desplazar la fecha de inicio de construcción.

Se adjunta oficio CONT-OBR-879-96 con el total del contenido.

La Ing. Angela Zambrano toma la palabra mencionando que se tiene el compromiso del balance donde se está incluyendo las cantidades faltantes de subbase de Colombia y el tema de seguridad pues es una condición conocida, si es complicado por ese lado porque no se inició antes Algeciras que no presenta tantos inconvenientes, ya me he comunicado con el Alcalde para coordinar una reunión y la socialización. Otro tema que está pendiente es la respuesta a las observaciones del ajuste que se enviaron desde el 8 de julio de 2025.

Toma la palabra el Ing. Luis Fonseca que ya se está trabajando en la atención a las observaciones, unos puntos fueron remitidos al contratista para su atención y estamos a la espera. La Ing. Ángela Zambrano solicita reunión para el martes 15 de julio para la revisión de la respuesta

Toma la palabra el Ing. James Andrade mencionando que se debería ajustar la programación con la realidad según lo mencionado por el contratista, programar lo antes posible el inicio de los tramos que no presentan inconvenientes y programar más adelante los otros tramos; mientras se dan las soluciones y enfatiza que el compromiso del Consorcio es terminar con los tramos ya intervenidos según las fechas que se acaban de dar en el presente comité, propone iniciar con los 40ml que faltan de Iquira. Igualmente se ha tenido un acercamiento con el alcalde de Algeciras y hoy nos reunimos para poder coordinar la socialización y demás temas que necesita el contratista para iniciar con la intervención.

2. Proposiciones y varios

El Ing Luis Fonseca solicita información acerca del avance del convenio del INVIAS con La Gobernación para poder intervenir los frentes que están a cargo del INVIAS, La Ing Ángela Zambrano menciona que ya se atendieron las observaciones y se envió nuevamente a la entidad.

COMPROMISOS PACTADOS:

Terminación de obras tramo La Argentina – Primera semana Agosto 2025	Contratista
Reunión con comunidad, Alcaldía, Gobernación Contratista e Interventoria – 16 de julio 2025	Todos
Terminación de obras tramos Nataga – Primera semana Septiembre 2025	Contratista
Terminación de obras tramos Yaguara – 15 de Septiembre 2025	Contratista
Reinicio tramo de Palermo 14 de julio de 2025	Contratista
Terminación de obras tramos Teruel – Última semana de Agosto 2025	Contratista
Mesa de trabajo revisión atención observaciones balance – 15 de julio 2025	Contratista - Interventoria
Presentación de reprogramación según las condiciones actuales	Contratista
Radicar acta de recibo Parcial de obra No.1 – 14 de julio de 2025	Contratista

COMENTARIOS:

Hace parte integral del presente comité técnico de obra No. 15, el listado de asistencia.

PROXIMA REUNION

- Fecha: 25 de julio de 2025
- Hora:

- Lugar: Secretaría de Vías e Infraestructura





GOBERNACION DEL HUILA	COMITÉ TECNICO DE OBRA DEL CONTRATO 879-2024
CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ TECNICO OBRA No. 15

DIA: 11-07-2025
HORA: 9:00 AM
SITIO: SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

NOMBRE	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
Cristian Camilo Delgado Lachino	1075308184	cristiandelgado1998@gmail.com	consorcio vial Iquira 2024	
Vladimir Pinchao Ramos	1085921129	davpinchaoro@gmail.com	Consorcio vial Iquira 2024	
Angela Matilde Zambrano C	1077893945	angela.zambrano@hotmail.com	SVI	
Jose Mauricio Perez	1070023480	joselmauricio-jobinnovo@hotmail.com	SVI	
Jaime Andrade F	12.125593	Jandrade05@gmail.com		
Leinor Guerrero Morillo	57218414	leidenguerrero@gmail.com	consorcio vial Iquira 2024 R/L	
Luis Pablo Tovar	1084676098	12luiscarlosmontealegre7@gmail.com	Interventoria	

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 879 DE 2024	ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 16 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORES 2030 CONTRATO 1690 DE 2024 OBJETO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Página 1 de 8 FECHA: Dia: 28 Mes: 07 Año: 2025

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES	SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE	RL. CONSORCIO INTERVENTORES 2030 - INTERVENTORIA	
JAMES ANDRADE ZAMBRANO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	
VLADIMIR PINCHAO ROMO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024	

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE MAURICIO DURAN	INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION
CRISTIAN DELGADO	INGENIERO APOYO CONTRATISTA

OBJETO DE LA REUNION:

Seguimiento al contrato de obra 879 de 2024 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes
2. Revisión estado de avance de obra y cumplimiento compromisos
3. Proposiciones y varios.

1. Llamado a lista y verificación de los asistentes

Toma la palabra el Ing. JAMES ANDRADRE, Coordinador de la interventoria indicando que teniendo en cuenta la invitación a comité técnico por parte de la Supervisión de Interventoria, el dia de hoy 28 de julio de 2025 a las 2:00 pm en las oficinas de la Secretaria de Vias e Infraestructura hacen presencia la supervisora de interventoria la Ing. ANGELA ZAMBRANO, el Ing. JOSE MAURICIO DURAN, profesional de apoyo a la supervisión, en representación del contratista de obra el Ing. VLADIMIR PINCHAO, Director de obra; por su parte la interventoria externa, hace presencia el Ing. JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE, representante legal de la Interventoria, el Ing. JAMES ANDRADE ZAMBRANO, Coordinador General de Interventoría; y el Ing LUIS CARLOS FONSECA Director de interventoria. Es decir, se concluye que se encuentran todos los profesionales para adelantar el presente comité técnico de obra.

2. Avance del contrato 879 de 2024

Toma la palabra el ingeniero James Andrade Zambrano, quien agradece la asistencia al comité de obra; y una vez verificado el cuórum se da inicio al comité técnico de obra No.16 para la revisión del estado del contrato de obra 879 de 2024 y de los compromisos adquirido en el anterior comité.

El ing. Luis Fonseca inicia con el punto del reporte de avance por parte de la Interventoria de cada uno de los frentes en ejecución y el estado de avance del proyecto:

CUADRO RESUMEN		
PROGRAMADO	74,94%	$ 5.353.290.025
EJECUTADO	26,97%	$ 1.926.237.675
VARIACION	-47,98%	$ -3.427.052.350
FECHA CORTE	27/07/2025	
