Certificado de calidad ART INDUSTRIAL FUERTE

HOLCIM

Interval From 01.08.2025 00:00 To 01.09.2025 00:00 Max. Records Period Primary log values

02.10.2025 07:47:05

INFORME DE RESULTADOS **Cemento hidráulico tipo ART** **ART INDUSTRIAL FUERTE**	Proveedor: Holcim Colombia S.A. Planta: Nobsa Dirección: Km 15 vía Duitama - Belencito Municipio: Nobsa, Boyacá, Colombia Teléfono: +57 608 773055 Cliente: General

Autor: Ingeniero de Control de Calidad	Revisa: Coordinador de Control de Calidad	Aprueba: Coordinador de Control de Calidad

Alcance

El cemento Industrial Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo ART. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras. Los datos presentados corresponden al Cemento Industrial Fuerte Tipo ART producido por Holcim Colombia S.A. en la fecha especificada, la ejecución de los ensayos se lleva a cabo dentro de la semana señalada de análisis.

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine.

NTC 221: Método para determinar la densidad del cemento hidráulico.

NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45 um.

NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland.

NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat.

NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.

NTC 220: Determinación de la reistencia a la compresion de morteros de cemento hidráulico.

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua.

NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico.

NTC 5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

INFORME DE RESULTADOS

Composición Química - Oxidos (%)

FECHA	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	P.I.	Na2O	K2O	TiO2	P2O5	Mn2O3	Cl	Suma
02/08/2025	25.5	4.5	3.2	57.5	1.0	3.7	3.2	0.04	0.73	0.31	0.29	0.09	0.12	100.1
06/08/2025	26.5	4.6	3.1	57.1	0.9	4.0	3.1	0.06	0.72	0.31	0.32	0.10	0.12	100.9
08/08/2025	26.3	4.5	3.1	57.3	1.0	3.8	3.0	0.05	0.67	0.30	0.32	0.07	0.10	100.5
11/08/2025	25.9	4.5	3.1	57.4	1.0	3.8	3.2	0.05	0.72	0.31	0.31	0.09	0.09	100.5
13/08/2025	25.6	4.8	3.1	58.0	1.0	3.6	2.7	0.06	0.72	0.32	0.30	0.19	0.10	100.6
14/08/2025	23.8	4.6	3.1	58.5	0.9	3.7	4.0	0.05	0.75	0.32	0.31	0.08	0.08	100.1
15/08/2025	23.9	4.7	3.1	58.6	1.0	3.7	3.9	0.04	0.75	0.32	0.31	0.15	0.12	100.6
18/08/2025	23.9	4.5	3.2	58.7	1.0	3.7	3.8	0.05	0.73	0.30	0.31	0.09	0.10	100.3
19/08/2025	24.1	4.5	3.2	58.2	1.0	3.6	3.8	0.05	0.73	0.31	0.32	0.10	0.08	99.9
20/08/2025	23.8	4.3	3.4	58.0	0.9	3.9	4.1	0.02	0.71	0.29	0.33	0.09	0.07	99.8
21/08/2025	25.4	5.7	3.0	56.8	1.0	3.8	2.6	0.39	0.70	0.33	0.30	0.51	0.34	100.9
22/08/2025	27.0	4.5	3.0	57.0	0.9	3.9	3.0	0.04	0.71	0.30	0.33	0.08	0.10	100.9
25/08/2025	26.6	4.5	3.0	56.9	0.9	3.8	3.0	0.04	0.72	0.30	0.31	0.08	0.09	100.2
26/08/2025	24.7	4.7	3.1	58.0	1.0	3.6	4.0	0.06	0.73	0.30	0.31	0.17	0.10	100.8
27/08/2025	26.6	4.5	3.0	57.1	1.0	3.7	2.8	0.10	0.72	0.30	0.32	0.08	0.14	100.4
28/08/2025	24.8	4.7	3.0	58.9	1.1	3.7	3.0	0.04	0.74	0.31	0.30	0.08	0.11	100.8
29/08/2025	24.7	4.4	3.0	58.6	1.0	3.9	2.8	0.02	0.73	0.30	0.30	0.08	0.05	99.9
Min	23.8	4.3	3.0	56.8	0.9	3.6	2.6	0.02	0.67	0.29	0.29	0.07	0.05	99.8
Max	27.0	5.7	3.4	58.9	1.1	4.0	4.1	0.39	0.75	0.33	0.33	0.51	0.34	100.9
Avg	25.2	4.6	3.1	57.8	1.0	3.8	3.3	0.07	0.72	0.31	0.31	0.13	0.11	100.4
Std	1.1	0.3	0.1	0.7	0.0	0.1	0.5	0.09	0.02	0.01	0.01	0.11	0.06	0.4

FECHA	Finura Blaine	Finura Densidad	Finura Ret. 45 um	Fraguado Vicat Inicial	Fraguado Vicat Final	Fraguado Vicat C.Nor	Resistencias a la compresión 1 dia	3 dias	7 días	28 días	A/C
	m2/kg	g/cm3	%	min	min	%	MPa	MPa	MPa	MPa	%
02/08/2025	484	3.00	2.11	137	185	27.9	20.2	29.2	34.0	43.5	48.0
06/08/2025	509	3.00	2.08	133	208	27.9	20.1	30.3	37.2	42.0	47.3
08/08/2025	502	3.04	1.61	125	199	27.9	20.7	33.2	38.0	46.9	47.3
11/08/2025	498	3.05	2.02	136	234	27.9	18.5	32.2	37.3	45.5	47.3
13/08/2025	488	3.04	1.97	134	215	27.4	19.4	30.0	36.2	45.0	47.3
14/08/2025	491	3.04	2.99	109	229	27.8	20.8	32.1	38.2	46.1	47.9
15/08/2025	495	3.06	2.76	113	213	27.7	19.2	29.4	36.3	44.3	47.8
18/08/2025	496	3.03	2.70	126	219	27.5	20.7	31.9	33.3	46.4	47.8
19/08/2025	491	3.07	1.56	109	189	27.7	20.3	30.6	39.3	44.5	47.8
20/08/2025	487	3.05	3.30	134	218	27.9	20.8	28.7	36.2	45.7	48.0
21/08/2025	485	3.04	1.81	118	186	27.5	19.0	30.5	37.0	45.3	48.0
22/08/2025	482	3.05	1.41	113	175	28.2	20.8	29.9	34.3	48.3	48.0
25/08/2025	500	3.02	1.81	118	193	28.0	22.1	30.8	38.5	50.3	47.0
26/08/2025	489	3.04	1.94	102	183	27.2	21.5	30.0	36.4	47.8	48.0
27/08/2025	490	3.05	1.89	129	225	27.5	21.5	31.3	38.6	46.0	48.5
28/08/2025	513	3.05	1.54	128	200	27.2	20.0	32.3	39.3	51.3	48.1
29/08/2025	490	3.06	1.56	113	224	27.2	22.6	35.3	37.3	49.8	47.9
Min	482	3.00	1.41	102	175	27.2	18.5	28.7	33.3	42.0	47.0
Max	513	3.07	3.30	137	234	28.2	22.6	35.3	39.3	51.3	48.5
Avg	494	3.04	2.06	122	206	27.7	20.5	31.0	36.9	46.4	47.8
Std	9	0.02	0.55	11	18	0.3	1.1	1.7	1.8	2.5	0.4

NTC 4927
Exp. Barras Mortero sumergidas en agua (%)

Holcim	NTC 121
0.01	Máximo 0.02%

NTC 224
Contenido de aire en mortero de cemento (%)

Holcim	NTC 121
3.0	Máximo 12 %

Comentarios

N/D.: Resultado de ensayo no disponible.

Fecha de reporte: 02.10.2025

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinador Control Calidad
Holcim Colombia S.A.
Planta Nobsa

601

ENSAYOS DE LABORATORIO



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

602

GEOTECH Laboratorio e Ingeniería	INFORME DE RESULTADOS	Código: GT-LB-INF-01-V1
	GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S.	Fecha: 01/04/2024
	Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Agregados y Concretos	Aprobó: Gerencia

Yopal, 3 de Abril de 2026 **INF-091-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
CAMARA DE INSPECCIÓN

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **54** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7 ,14 y 28 días


Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-850-878

603

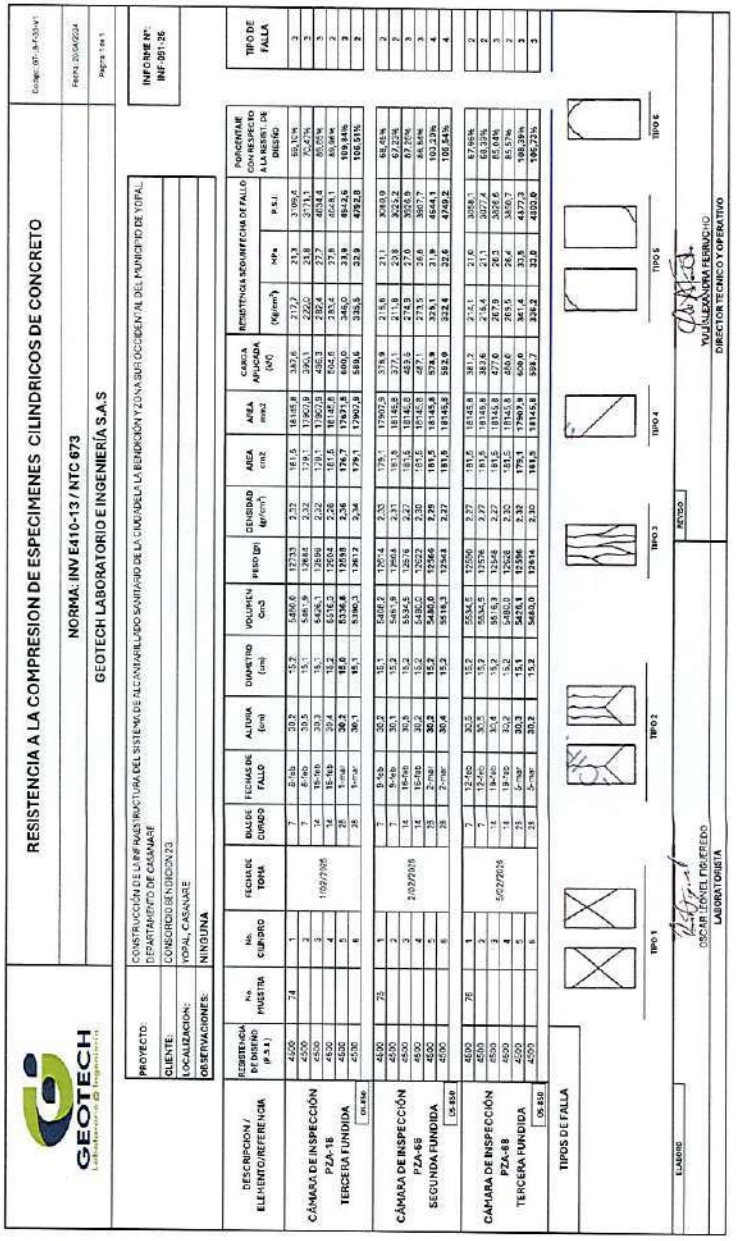

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Código: GT-LB-F-03-V1 | Fecha: 20/04/2024 | Página 1 de 1

INFORME Nº: INF-091-26

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE: CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACION: YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES: NINGUNA

DESCRIPCION / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	EDADES CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD gr/cm³	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUIMIENTO DE FALLO		PORCENTAJE (%) DE RESISTENCIA A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
															(Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-1B TERCERA FUNDIDA OS-850	4500	74	1	1/09/2026	7	8-feb	20.2	15.2	5456.6	13733	2.52	181.5	18145.8	347.8	217.7	21.3	3106.6	88.31%	3
	4500		2		7	8-feb	30.5	15.1	5481.9	13844	2.52	179.1	17902.8	390.1	244.1	23.9	3473.1	98.75%	3
	4500		3		14	15-feb	30.3	15.1	5476.1	13896	2.52	179.1	17902.8	486.3	304.4	29.8	4334.4	123.25%	3
	4500		4		14	15-feb	30.4	15.2	5516.3	13904	2.52	181.5	18145.8	504.8	315.9	30.9	4498.1	127.95%	2
	4500		5		28	1-mar	30.2	15.0	5536.8	13958	2.52	176.7	17671.8	600.0	375.5	36.8	5345.6	152.01%	3
	4500		6		28	1-mar	30.1	15.1	5390.3	13617	2.52	179.1	17902.8	589.6	369.0	36.1	5253.8	149.41%	3
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-6B SEGUNDA FUNDIDA OS-850	4500	75	1	2/09/2026	7	9-feb	30.2	15.1	5408.9	13614	2.52	179.1	17902.8	378.9	237.1	23.1	3353.9	95.40%	2
	4500		2		7	9-feb	30.1	15.2	5467.8	13804	2.52	181.5	18145.8	377.1	235.9	23.0	3325.2	94.58%	2
	4500		3		14	16-feb	30.0	15.2	5434.5	13676	2.52	181.5	18145.8	483.5	302.5	29.5	4306.9	122.50%	3
	4500		4		14	16-feb	30.2	15.2	5482.0	13856	2.53	181.5	18145.8	479.9	300.3	29.3	4275.5	121.61%	3
	4500		5		28	2-mar	30.2	15.2	5482.0	13856	2.53	181.5	18145.8	574.9	359.7	35.1	5124.1	145.78%	4
	4500		6		28	2-mar	30.4	15.2	5516.3	13964	2.53	181.5	18145.8	582.9	364.7	35.6	5196.7	147.84%	4
CAMARA DE INSPECCIÓN PZA-4B TERCERA FUNDIDA OS-850	4500	76	1	5/09/2026	7	12-feb	30.5	15.2	5534.5	13990	2.53	181.5	18145.8	381.2	238.5	23.3	3386.1	96.31%	2
	4500		2		7	12-feb	30.5	15.2	5534.5	13976	2.53	181.5	18145.8	383.6	240.0	23.5	3407.4	96.91%	2
	4500		3		14	19-feb	30.4	15.2	5516.3	13954	2.53	181.5	18145.8	477.0	298.4	29.2	4238.6	120.56%	3
	4500		4		14	19-feb	30.2	15.2	5480.0	13968	2.55	181.5	18145.8	480.0	300.3	29.4	4265.2	121.32%	3
	4500		5		28	5-mar	30.3	15.1	5426.1	13986	2.58	179.1	17902.8	606.0	379.1	37.1	5385.7	153.19%	2
	4500		6		28	5-mar	30.2	15.2	5480.0	13914	2.54	181.5	18145.8	538.7	336.2	32.9	4777.3	135.89%	3
																	4203.0	119.53%	3

TIPOS DE FALLA

ELABORÓ: OSCAR LEONEL FIGUEREDO, LABORATORISTA

REVISÓ: YULI ALEXANDRA FERRUCHO, DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACION:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-091-26

DESCRIPCION / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-14 PRIMERA FUNDIDA OS-678	4500	77	1	4/02/2026	7	11-feb	30,2	15,1	5408,2	12622	2,33	179,1	17907,9	382,1	217,4	21,3	3106,1	69,02%	3
	4500		2		7	11-feb	30,4	15,2	5516,3	12396	2,28	181,5	18145,8	378,6	212,6	20,8	3037,2	67,40%	3
	4500		3		14	18-feb	30,2	15,2	5480,0	12694	2,32	181,5	18145,8	479,6	269,3	26,4	3847,5	85,50%	3
	4500		4		14	18-feb	30,5	15,2	5534,5	12700	2,29	181,5	18145,8	477,8	268,3	26,3	3833,1	85,16%	2
	4500		5		28	4-mar	30,2	15,2	5480,0	12685	2,32	181,5	18145,8	589,7	331,2	32,5	4730,8	105,13%	3
	4500		6		28	4-mar	30,3	15,1	5426,1	12650	2,33	179,1	17907,9	592,3	337,0	33,1	4814,6	106,99%	2
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-16 PRIMERA FUNDIDA OS-678	4500	78	1	6/02/2026	7	13-feb	30,4	15,1	5444,9	12684	2,33	179,1	17907,9	371,2	211,2	20,7	3017,5	67,06%	2
	4500		2		7	13-feb	30,3	15,1	5426,1	12702	2,34	179,1	17907,9	373,6	212,5	20,8	3036,1	67,47%	2
	4500		3		14	20-feb	30,2	15,1	5408,2	12688	2,35	179,1	17907,9	459,6	276,6	27,1	3978,9	88,44%	3
	4500		4		14	20-feb	30,5	15,1	5461,9	12612	2,31	179,1	17907,9	490,1	294,9	27,9	3984,0	88,53%	3
	4500		5		28	6-mar	30,3	15,2	5498,2	12606	2,29	181,5	18145,8	599,3	326,5	32,0	4607,8	106,84%	4
	4500		6		28	6-mar	30,4	15,3	5589,2	12584	2,25	183,9	18385,4	612,0	339,2	33,3	4845,7	107,68%	4
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-14 SEGUNDA FUNDIDA OS-678	4500	79	1	7/02/2026	7	14-feb	30,4	15,2	5516,3	12714	2,30	181,5	18145,8	381,2	214,1	21,0	3038,1	67,06%	2
	4500		2		7	14-feb	30,2	15,2	5480,0	12688	2,32	181,5	18145,8	380,6	213,7	21,0	3033,3	67,05%	2
	4500		3		14	21-feb	30,3	15,2	5498,2	12695	2,31	181,5	18145,8	453,2	277,0	27,2	3956,6	87,92%	3
	4500		4		14	21-feb	30,4	15,1	5444,9	12602	2,31	179,1	17907,9	495,2	281,8	27,6	4025,4	89,45%	2
	4500		5		28	7-mar	30,1	15,2	5461,9	12438	2,28	181,5	18145,8	596,1	334,7	32,8	4782,1	106,27%	3
	4500		6		28	7-mar	30,1	15,2	5461,9	12532	2,29	181,5	18145,8	597,4	335,5	32,9	4792,5	106,50%	3

TIPOS DE FALLA



ELABORO

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISO

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACION:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-091-26

DESCRIPCION / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-16 SEGUNDA FUNDIDA OS-678	4500	80	1	9/02/2026	7	16-feb	30,1	15,1	5390,3	12648	2,33	179,1	17907,9	371,2	211,2	20,7	3017,5	67,06%	3
	4500		2		7	16-feb	30,2	15,2	5480,0	12612	2,30	181,5	18145,8	373,6	209,8	20,6	2997,1	66,60%	3
	4500		3		14	23-feb	30,2	15,3	5589,2	12578	2,26	184,3	18433,5	501,2	272,1	27,2	3958,0	87,96%	3
	4500		4		14	23-feb	30,5	15,2	5534,5	12624	2,28	181,5	18145,8	503,6	282,8	27,7	4040,0	89,78%	2
	4500		5		28	9-mar	30,1	15,2	5461,9	12655	2,32	181,5	18145,8	600,2	337,0	33,1	4816,0	107,69%	3
	4500		6		28	9-mar	30,2	15,3	5552,4	12687	2,28	183,9	18385,4	585,6	326,8	32,0	4668,3	103,74%	2
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-14 TERCERA FUNDIDA OS-678	4500	81	1	10/02/2026	7	17-feb	30,4	15,2	5516,3	12600	2,28	181,5	18145,8	378,6	212,6	20,8	3037,2	67,49%	2
	4500		2		7	17-feb	30,5	15,1	5461,9	12569	2,30	179,1	17907,9	377,9	215,0	21,1	3071,9	68,26%	2
	4500		3		14	24-feb	30,4	15,0	5372,1	12608	2,35	176,7	17671,5	489,9	282,5	27,7	4035,6	89,68%	3
	4500		4		14	24-feb	30,4	15,1	5444,0	12618	2,32	179,1	17907,9	492,5	280,2	27,5	4003,9	88,97%	3
	4500		5		28	10-mar	30,3	15,2	5498,2	12660	2,29	181,5	18145,8	603,3	338,8	33,2	4839,9	107,55%	4
	4500		6		28	10-mar	30,5	15,2	5534,5	12654	2,29	181,5	18145,8	605,1	339,8	33,3	4854,3	107,87%	4
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-6 PRIMERA FUNDIDA OS-678	4500	82	1	10/02/2026	7	17-feb	30,2	15,2	5480,0	12585	2,30	181,5	18145,8	385,4	216,4	21,2	3091,8	68,71%	2
	4500		2		7	17-feb	30,1	15,2	5461,9	12605	2,31	181,5	18145,8	387,8	217,8	21,4	3111,0	69,13%	2
	4500		3		14	24-feb	30,2	15,2	5480,0	12564	2,30	181,5	18145,8	478,8	268,9	26,4	3841,1	85,36%	3
	4500		4		14	24-feb	30,4	15,2	5516,3	12599	2,28	181,5	18145,8	480,0	269,5	26,4	3850,7	85,57%	2
	4500		5		28	10-mar	30,3	15,1	5426,1	12770	2,35	179,1	17907,9	586,9	334,0	32,8	4770,9	106,02%	3
	4500		6		28	10-mar	30,2	15,2	5480,0	12665	2,31	181,5	18145,8	590,0	331,3	32,5	4733,2	105,16%	3

TIPOS DE FALLA



ELABORO

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISO

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GTLB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Página: 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACION:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-091-26

DESCRIPCION / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-16 TERCERA FUNDIDA	4500	83	1	12/02/2026	7	19-feb	30,2	15,2	5480,0	12654	2,31	181,5	18145,8	387,5	217,8	21,4	3111,6	69,13%	3
	4500		2		7	19-feb	30,3	15,2	5496,2	12596	2,29	181,5	18145,8	388,4	218,1	21,4	3115,9	69,24%	3
	4500		3		14	26-feb	30,5	15,2	5534,5	12660	2,28	181,5	18145,8	498,9	280,2	27,5	4002,3	88,94%	3
	4500		4		14	26-feb	30,1	15,2	5461,9	12622	2,31	181,5	18145,8	500,0	280,8	27,5	4011,2	89,14%	2
	4500		5		28	12-mar	30,2	15,0	5336,8	12565	2,37	176,7	17671,5	598,7	345,2	33,9	4931,5	109,60%	3
	4500		6		28	12-mar	30,3	15,0	5354,5	12624	2,36	176,7	17671,5	601,2	346,7	34,0	4952,5	110,06%	2
05-878																			
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-6 SEGUNDA FUNDIDA	4500	84	1	12/02/2026	7	20-feb	30,3	15,1	5426,1	12622	2,33	179,1	17907,9	370,9	210,6	20,7	3008,6	66,86%	2
	4500		2		7	20-feb	30,5	15,1	5461,9	12589	2,30	179,1	17907,9	373,6	212,6	20,8	3037,6	67,49%	2
	4500		3		14	27-feb	30,2	15,2	5480,0	12658	2,31	181,5	18145,8	490,2	275,3	27,0	3932,5	87,39%	2
	4500		4		14	27-feb	30,4	15,2	5516,3	12639	2,29	181,5	18145,8	495,3	278,1	27,3	3973,4	88,30%	3
	4500		5		28	13-mar	30,5	15,2	5534,5	12502	2,26	181,5	18145,8	584,6	328,3	32,2	4689,8	104,22%	4
	4500		6		28	13-mar	30,4	15,2	5589,2	12618	2,26	182,9	18285,4	600,0	332,5	32,6	4750,7	105,57%	4
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-7 PRIMERA FUNDIDA	4500	85	1	13/02/2026	7	20-feb	30,2	15,2	5480,0	12624	2,29	181,5	18145,8	381,2	214,1	21,0	3058,1	67,96%	2
	4500		2		7	20-feb	30,2	15,1	5408,2	12568	2,32	179,1	17907,9	383,3	218,1	21,4	3118,8	69,29%	2
	4500		3		14	27-feb	30,5	15,2	5534,5	12559	2,27	181,5	18145,8	482,5	271,0	26,6	3870,8	86,02%	3
	4500		4		14	27-feb	30,3	15,2	5498,2	12602	2,29	181,5	18145,8	485,0	272,4	26,7	3890,8	86,46%	2
	4500		5		28	13-mar	30,2	15,1	5408,2	12589	2,33	179,1	17907,9	579,8	329,9	32,4	4713,1	104,74%	3
	4500		6		28	13-mar	30,4	15,1	5444,0	12564	2,31	179,1	17907,9	589,0	335,2	32,9	4787,9	106,40%	3
05-878																			

TIPOS DE FALLA



ELABORO

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISO

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GTLB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Página: 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACION:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-091-26

DESCRIPCION / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-6 TERCERA FUNDIDA	4500	86	1	16/02/2026	7	23-feb	30,1	15,1	5390,3	12599	2,34	179,1	17907,9	372,5	212,0	20,8	3028,0	67,29%	3
	4500		2		7	23-feb	30,2	15,0	5336,8	12604	2,36	176,7	17671,5	374,1	215,7	21,2	3081,7	68,48%	3
	4500		3		14	2-mar	30,2	15,2	5480,0	12598	2,30	181,5	18145,8	502,0	282,1	27,7	4029,6	89,55%	3
	4500		4		14	2-mar	30,3	15,1	5426,1	12614	2,32	179,1	17907,9	565,1	267,4	26,2	4165,9	81,24%	2
	4500		5		28	16-mar	30,5	15,1	5461,9	12564	2,30	179,1	17907,9	612,3	348,4	34,2	4977,3	110,61%	3
	4500		6		28	16-mar	30,1	15,0	5319,1	12568	2,37	176,7	17671,5	608,4	350,8	34,4	5011,8	111,37%	2
05-878																			
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-7 SEGUNDA FUNDIDA	4500	87	1	16/02/2026	7	23-feb	30,3	15,1	5426,1	12584	2,34	179,1	17907,9	368,9	209,9	20,6	2998,8	66,64%	2
	4500		2		7	23-feb	30,2	15,0	5336,8	12702	2,38	176,7	17671,5	370,0	213,4	20,9	3047,9	67,73%	2
	4500		3		14	2-mar	30,1	15,2	5461,9	12660	2,31	181,5	18145,8	500,0	280,8	27,5	4011,2	89,14%	3
	4500		4		14	2-mar	30,2	15,3	5552,4	12574	2,26	183,9	18385,4	505,1	279,9	27,5	3999,3	88,87%	3
	4500		5		28	16-mar	30,3	15,1	5426,1	12582	2,32	179,1	17907,9	602,3	342,7	33,6	4896,0	108,80%	4
	4500		6		28	16-mar	30,2	15,2	5480,0	12569	2,29	181,5	18145,8	605,4	340,0	33,3	4856,7	107,93%	4
05-878																			
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-7 TERCERA FUNDIDA	4500	88	1	16/02/2026	7	26-feb	30,5	15,3	5607,5	12714	2,27	183,9	18385,4	387,2	214,6	21,0	3065,8	68,13%	2
	4500		2		7	26-feb	30,5	15,2	5534,5	12588	2,29	181,5	18145,8	388,9	218,4	21,4	3116,8	69,26%	2
	4500		3		14	5-mar	30,2	15,3	5552,4	12522	2,26	183,9	18385,4	472,5	261,9	25,7	3741,2	83,14%	3
	4500		4		14	5-mar	30,2	15,3	5552,4	12510	2,25	183,9	18385,4	476,3	264,0	25,9	3771,2	83,81%	2
	4500		5		28	19-mar	30,2	15,2	5480,0	12555	2,29	181,5	18145,8	600,0	336,9	33,0	4813,4	106,96%	3
	4500		6		28	19-mar	30,3	15,2	5498,2	12570	2,29	181,5	18145,8	598,7	330,2	33,0	4803,0	106,73%	3

TIPOS DE FALLA



ELABORO

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISO

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-T-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 23/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACION:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-091-26

DESCRIPCION / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-10 PRIMERA FUNDIDA 05-878	4500	89	1	22/02/2026	7	1-mar	30,2	15,1	5408,2	12468	2,31	179,1	17907,9	386,2	219,8	21,6	3139,4	69,76%	3
	4500		2		7	1-mar	30,4	15,2	5516,3	12522	2,27	181,5	18145,8	387,8	217,3	21,3	3104,6	68,99%	3
	4500		3		14	8-mar	30,2	15,2	5480,6	12560	2,29	181,5	18145,8	512,3	287,7	28,2	4109,8	91,33%	3
	4500		4		14	8-mar	30,3	15,2	5498,3	12534	2,28	181,5	18145,8	515,4	289,4	28,4	4134,7	91,88%	2
	4500		5		28	22-mar	30,5	15,1	5461,9	12550	2,30	179,1	17907,9	600,6	341,4	33,5	4877,3	108,39%	3
	4500		6		28	22-mar	30,1	15,1	5390,3	12574	2,33	179,1	17907,9	602,3	342,7	33,6	4896,0	108,80%	2
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-10 SEGUNDA FUNDIDA 05-879	4500	90	1	25/02/2026	7	4-mar	30,3	15,1	5426,1	12524	2,31	179,1	17907,9	370,1	210,6	20,7	3008,5	66,86%	2
	4500		2		7	4-mar	30,6	15,2	5534,5	12599	2,28	181,5	18145,8	372,5	209,2	20,5	2988,3	66,41%	2
	4500		3		14	11-mar	30,4	15,0	5372,1	12468	2,32	176,7	17671,5	486,2	280,4	27,5	4006,0	89,02%	3
	4500		4		14	11-mar	30,2	15,1	5408,2	12660	2,33	179,1	17907,9	482,5	274,6	26,9	3922,2	87,16%	3
	4500		5		28	25-mar	30,2	15,2	5480,6	12554	2,29	181,5	18145,8	589,6	331,1	32,5	4730,0	105,11%	4
	4500		6		28	25-mar	30,2	15,0	5236,8	12622	2,37	176,7	17671,5	591,2	340,9	33,4	4870,1	108,22%	4
CÁMARA DE INSPECCIÓN PZA-10 TERCERA FUNDIDA 05-878	4500	91	1	28/02/2026	7	7-mar	30,4	15,1	5446,0	12634	2,32	179,1	17907,9	381,2	216,9	21,3	3098,7	68,86%	2
	4500		2		7	7-mar	30,3	15,2	5498,2	12609	2,29	181,5	18145,8	390,0	219,0	21,5	3128,7	69,53%	2
	4500		3		14	14-mar	30,4	15,2	5516,3	12567	2,28	181,5	18145,8	498,5	279,9	27,5	3995,1	88,67%	3
	4500		4		14	14-mar	30,4	15,2	5516,3	12556	2,28	181,5	18145,8	500,0	280,8	27,5	4011,2	89,14%	2
	4500		5		28	28-mar	30,2	15,1	5408,2	12669	2,33	179,1	17907,9	584,5	332,5	32,6	4751,3	105,59%	3
	4500		6		28	28-mar	30,3	15,1	5426,1	12589	2,32	179,1	17907,9	589,6	335,5	32,9	4792,8	106,51%	3

TIPOS DE FALLA



ELABORO

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISO

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO

Yopal, 3 de Abril de 2026 **INF-092-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
POZOS

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **116** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7, 14 y 28 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-850-878-939

GEOTECH Laboratorio de Ingeniería	INFORME DE RESULTADOS	Código: GT-LB-INF-01-V1
	GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S.	Fecha: 01/04/2024
	Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Agregados y Concretos	Aprobó: Gerencia

609

PLACA INFERIOR

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-03-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Página 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA INFERIOR POZO No. PN-129 OS-878	4000	132	1	3/02/2026	7	10-feb	30,2	15,1	5408,2	12584	2,33	179,1	17907,9	349,1	199,6	19,9	2764,6	69,12%	3
	4000		2		7	10-feb	30,2	15,2	5480,0	12566	2,29	181,5	18145,8	335,9	188,6	18,5	2684,7	67,32%	3
	4000		3		14	17-feb	30,4	15,0	5372,1	12624	2,35	176,7	17671,5	432,8	249,5	24,5	3563,6	89,09%	3
	4000		4		14	17-feb	30,2	15,0	5306,8	12634	2,37	176,7	17671,5	433,5	250,0	24,5	3571,0	89,28%	2
	4000		5		28	3-mar	30,2	15,1	5408,2	12508	2,32	179,1	17907,9	612,3	291,6	28,6	4164,4	104,11%	4
	4000		6		28	3-mar	30,3	15,0	5354,5	12600	2,35	176,7	17671,5	520,0	256,5	29,4	4283,6	107,09%	4
PLACA INFERIOR POZO No. PN-173 OS-878	4000	133	1	6/02/2026	7	13-feb	30,3	15,1	5426,1	12580	2,32	179,1	17907,9	336,5	191,6	18,8	2736,4	68,36%	2
	4000		2		7	13-feb	30,2	15,2	5480,0	12626	2,30	181,5	18145,8	337,9	189,8	18,6	2710,7	67,72%	4
	4000		3		14	20-feb	30,4	15,2	5516,3	12650	2,29	181,5	18145,8	426,5	239,5	23,5	3421,5	85,54%	4
	4000		4		14	20-feb	30,2	15,2	5480,0	12687	2,30	181,5	18145,8	430,1	241,5	23,7	3450,4	86,26%	6
	4000		5		28	6-mar	30,2	15,0	5336,8	12548	2,35	176,7	17671,5	512,3	288,4	29,0	4229,2	105,50%	2
	4000		6		28	6-mar	30,2	15,0	5336,8	12563	2,35	176,7	17671,5	515,1	287,0	29,1	4243,2	106,08%	3
PLACA INFERIOR POZO No. PN-181 OS-878	4000	134	1	10/02/2026	7	17-feb	30,3	15,1	5426,1	12235	2,26	179,1	17907,9	326,9	186,0	18,2	2657,9	66,42%	2
	4000		2		7	17-feb	30,2	15,1	5408,2	12344	2,28	179,1	17907,9	331,5	188,6	18,5	2684,7	67,37%	2
	4000		3		14	24-feb	30,4	15,2	5516,3	12323	2,23	181,5	18145,8	441,2	247,8	24,3	3519,4	88,48%	3
	4000		4		14	24-feb	30,4	15,2	5516,3	12344	2,27	181,5	18145,8	446,0	250,5	24,6	3577,9	89,45%	2
	4000		5		28	10-mar	30,2	15,2	5480,0	12604	2,30	181,5	18145,8	531,0	298,2	29,2	4259,8	106,50%	3
	4000		6		28	10-mar	30,5	15,3	5607,5	12615	2,25	183,9	18385,4	535,9	297,0	29,1	4243,1	106,08%	3

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULIA ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-03-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Página 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CLIENTE: CONSORCIO BENDICION 23

LOCALIZACIÓN: YOPAL, CASANARE

OBSERVACIONES: NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA INFERIOR POZO No. PN-195 OS-878	4000	135	1	14/02/2026	7	21-feb	30,1	15,2	5461,9	12524	2,28	181,5	18145,8	338,6	190,1	18,6	2716,4	67,91%	3
	4000		2		7	21-feb	30,2	15,3	5552,4	12506	2,26	183,8	18385,4	340,1	188,5	18,5	2692,8	67,32%	3
	4000		3		14	28-feb	30,5	15,3	5607,5	12534	2,24	183,9	18385,4	438,9	243,1	23,9	3475,1	86,88%	3
	4000		4		14	28-feb	30,3	15,2	5498,2	12501	2,29	181,5	18145,8	442,3	248,4	24,4	3548,3	88,71%	2
	4000		5		28	14-mar	30,4	15,2	5516,3	12612	2,29	181,5	18145,8	515,5	290,1	28,4	4144,0	103,61%	4
	4000		6		28	14-mar	30,2	15,2	5480,0	12558	2,30	181,5	18145,8	521,0	292,6	28,7	4179,6	104,49%	4
PLACA INFERIOR POZO No. PZR-19(03) OS-878	4000	136	1	20/02/2026	7	27-feb	30,2	15,2	5480,0	12566	2,30	181,5	18145,8	335,6	188,6	18,5	2692,3	67,31%	2
	4000		2		7	27-feb	30,1	15,2	5461,9	12567	2,30	181,5	18145,8	337,8	189,7	18,6	2708,9	67,72%	4
	4000		3		14	6-mar	30,4	15,1	5444,0	12468	2,29	179,1	17907,9	412,3	234,6	23,0	3351,6	83,79%	4
	4000		4		14	6-mar	30,5	15,1	5461,9	12512	2,29	179,1	17907,9	421,0	239,6	23,5	3422,3	85,56%	4
	4000		5		28	20-mar	30,3	15,2	5498,2	12536	2,28	181,5	18145,8	516,3	289,9	28,4	4141,5	103,55%	2
	4000		6		28	20-mar	30,3	15,2	5498,2	12550	2,28	181,5	18145,8	520,1	292,1	28,6	4172,4	104,31%	3

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULIA ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-052-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA m2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA INFERIOR POZO No. PN-164 OS-939	4000	137	1	2/03/2026	7	9-mar	30,2	15,1	5466,2	12368	2,32	179,1	17907,5	335,9	191,1	18,7	2730,5	68,26%	3
	4000		2		7	9-mar	30,3	15,2	5498,2	12360	2,28	181,5	18145,8	338,6	190,1	18,6	2716,4	67,91%	3
	4000		3		14	16-mar	30,4	15,0	5372,1	12410	2,36	176,7	17671,8	412,5	237,9	23,3	3396,0	84,95%	3
	4000		4		14	16-mar	30,2	15,1	5468,2	12355	2,34	179,1	17907,5	418,6	238,2	23,4	3402,8	85,07%	2
	4000		5		28	30-mar	30,3	15,2	5498,2	12359	2,25	181,5	18145,8	526,3	295,6	29,0	4222,1	105,55%	4
	4000		6		28	30-mar	30,5	15,2	5534,5	12399	2,27	181,5	18145,8	530,1	297,7	29,2	4252,6	106,32%	4
PLACA INFERIOR POZO No. PN-168 OS-939	4000	138	1	4/03/2026	7	11-mar	30,3	15,2	5498,2	12348	2,25	181,5	18145,8	341,2	191,6	18,8	2737,2	68,43%	2
	4000		2		7	11-mar	30,3	15,2	5498,2	12330	2,24	181,5	18145,8	345,6	194,1	19,0	2772,5	69,31%	4
	4000		3		14	18-mar	30,3	15,2	5498,2	12378	2,29	181,5	18145,8	432,2	242,7	23,8	3467,2	86,68%	4
	4000		4		14	18-mar	30,5	15,2	5534,5	12400	2,28	181,5	18145,8	436,0	244,8	24,0	3499,7	87,24%	4
	4000		5		28	1-abr													
	4000		6		28	1-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PN-175 OS-939	4000	139	1	5/03/2026	7	12-mar	30,2	15,3	5552,4	12496	2,25	183,9	18385,4	339,0	187,8	18,4	2684,1	67,10%	2
	4000		2		7	12-mar	30,4	15,4	5662,5	12524	2,21	186,3	18626,5	340,1	186,1	18,2	2658,0	66,45%	2
	4000		3		14	19-mar	30,5	15,3	5607,5	12500	2,24	183,9	18385,4	445,3	246,2	24,2	3525,0	88,12%	3
	4000		4		14	19-mar	30,2	15,2	5489,0	12538	2,29	181,5	18145,8	443,9	249,3	24,4	3561,1	89,03%	2
	4000		5		28	2-abr													
	4000		6		28	2-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-052-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA m2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA INFERIOR POZO No. PN-189 OS-939	4000	140	1	6/03/2026	7	13-mar	30,1	15,2	5461,8	12524	2,29	181,5	18145,8	342,5	192,3	18,9	2747,6	68,69%	3
	4000		2		7	13-mar	30,2	15,3	5552,4	12566	2,26	183,9	18385,4	345,6	191,5	18,8	2736,4	68,41%	3
	4000		3		14	20-mar	30,5	15,3	5607,5	12534	2,24	183,9	18385,4	441,2	244,5	24,0	3493,3	87,33%	3
	4000		4		14	20-mar	30,3	15,2	5498,2	12591	2,29	181,5	18145,8	443,6	249,1	24,4	3558,7	88,97%	2
	4000		5		28	3-abr													
	4000		6		28	3-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PN-197 OS-939	4000	141	1	9/03/2026	7	16-mar	30,2	15,2	5480,0	12568	2,30	181,5	18145,8	340,1	191,0	18,7	2728,4	68,21%	2
	4000		2		7	16-mar	30,1	15,2	5461,8	12567	2,30	181,5	18145,8	339,8	190,8	18,7	2726,0	68,15%	4
	4000		3		14	23-mar	30,6	15,1	5479,8	12614	2,30	179,1	17907,9	425,6	242,2	23,7	3459,7	86,49%	4
	4000		4		14	23-mar	30,4	15,2	5516,3	12635	2,33	181,5	18145,8	430,0	241,5	23,7	3449,6	86,24%	4
	4000		5		28	6-abr													
	4000		6		28	6-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PN-237 OS-939	4000	142	1	10/03/2026	7	17-mar	30,1	15,4	5606,8	12238	2,16	186,3	18626,5	350,1	191,5	18,8	2736,1	68,40%	2
	4000		2		7	17-mar	30,3	15,1	5425,1	12344	2,27	179,1	17907,9	349,8	199,0	19,5	2843,5	71,09%	3
	4000		3		14	24-mar	30,3	15,2	5498,2	12323	2,24	181,5	18145,8	446,0	250,6	24,6	3577,9	89,45%	3
	4000		4		14	24-mar	30,3	15,3	5570,8	12544	2,25	183,8	18385,4	451,2	250,1	24,5	3572,5	89,31%	2
	4000		5		28	7-abr													
	4000		6		28	7-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-03-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 30/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Página 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA INFERIOR POZO No. PN-239 (05-939)	4000	143	1	11/03/2026	7	18-mar	30,3	15,2	5498,2	12588	2,29	181,5	18145,6	341,2	191,6	18,8	2732,2	68,43%	3
	4000		2		7	18-mar	30,4	15,3	5585,2	12566	2,25	183,8	18385,4	343,6	190,4	18,7	2720,6	68,01%	3
	4000		3		14	25-mar	30,5	15,2	5534,5	12500	2,26	181,5	18145,6	440,0	247,1	24,2	3525,8	88,25%	3
	4000		4		14	25-mar	30,1	15,1	5390,3	12468	2,31	179,1	17907,9	443,6	252,4	24,8	3606,0	90,15%	2
	4000		5		28	8-abr													
	4000		6		28	8-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PZR-18(04) (05-939)	4000	144	1	13/03/2026	7	20-mar	30,4	15,1	5444,0	12598	2,31	179,1	17907,9	331,2	188,5	18,8	2692,3	67,31%	2
	4000		2		7	20-mar	30,3	15,0	5354,5	12634	2,36	176,7	17671,5	333,6	192,4	18,9	2748,1	68,70%	4
	4000		3		14	27-mar	30,2	15,0	5336,8	12614	2,36	176,7	17671,5	415,0	239,3	23,5	3416,6	85,47%	4
	4000		4		14	27-mar	30,5	15,1	5461,9	12655	2,30	179,1	17907,9	421,6	239,9	23,5	3427,1	85,68%	4
	4000		5		28	10-abr													
	4000		6		28	10-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PZR-20 (05-939)	4000	145	1	16/03/2026	7	23-mar	30,4	15,2	5516,3	12465	2,26	181,5	18145,6	336,9	189,2	18,6	2702,7	67,57%	2
	4000		2		7	23-mar	30,2	15,2	5480,0	12498	2,28	181,5	18145,6	341,5	191,8	18,8	2739,6	68,49%	2
	4000		3		14	30-mar	30,3	15,2	5503,6	12512	2,27	181,5	18145,6	445,8	250,3	24,6	3576,3	89,41%	3
	4000		4		14	30-mar	30,5	15,1	5461,9	12468	2,28	179,1	17907,9	442,6	251,8	24,7	3597,9	89,95%	2
	4000		5		28	13-abr													
	4000		6		28	13-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-03-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 30/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Página 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA INFERIOR POZO No. PZR-46(69) (05-939)	4000	146	1	17/03/2026	7	24-mar	30,2	15,1	5408,2	12634	2,34	179,1	17907,9	345,6	196,7	19,3	2809,4	70,23%	3
	4000		2		7	24-mar	30,3	15,2	5498,2	12566	2,29	181,5	18145,6	341,8	191,9	18,8	2742,0	68,55%	3
	4000		3		14	31-mar	30,4	15,3	5589,2	12548	2,25	183,9	18385,4	450,0	249,4	24,5	3563,6	89,09%	3
	4000		4		14	31-mar	30,2	15,3	5552,4	12587	2,27	183,9	18385,4	446,9	247,7	24,3	3538,5	88,46%	2
	4000		5		28	14-abr													
	4000		6		28	14-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PZR-47(70) PZR-48(71) (05-935)	4000	147	1	18/03/2026	7	25-mar	30,2	15,2	5480,0	12600	2,30	181,5	18145,6	336,9	189,2	18,6	2702,7	67,57%	2
	4000		2		7	25-mar	30,3	15,2	5498,2	12645	2,30	181,5	18145,6	338,0	189,8	18,6	2711,5	67,79%	4
	4000		3		14	1-abr													
	4000		4		14	1-abr													
	4000		5		28	15-abr													
	4000		6		28	15-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PZA-51 (05-930)	4000	148	1	19/03/2026	7	26-mar	30,4	15,1	5444,0	12589	2,31	179,1	17907,9	334,2	190,2	18,6	2716,7	67,92%	2
	4000		2		7	26-mar	30,3	15,1	5426,1	12610	2,32	179,1	17907,9	335,6	191,1	18,7	2729,7	68,24%	2
	4000		3		14	2-abr													
	4000		4		14	2-abr													
	4000		5		28	16-abr													
	4000		6		28	16-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Código: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 30/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Página: 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA INFERIOR POZO No. PZA-52 OS-939	4000	149	1	24/03/2026	7	31-mar	30,1	15,1	5390,3	12538	2,33	179,1	17907,9	337,5	192,0	18,8	2743,5	68,59%	3
	4000		2		7	31-mar	30,0	15,0	5301,4	12546	2,37	176,7	17671,8	340,0	196,1	19,2	2830,8	70,02%	3
	4000		3		14	7-abr													
	4000		4		14	7-abr													
	4000		5		28	21-abr													
	4000		6		28	21-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PZA-71 OS-936	4000	150	1	25/03/2026	7	2-abr													
	4000		2		7	2-abr													
	4000		3		14	9-abr													
	4000		4		14	9-abr													
	4000		5		28	23-abr													
	4000		6		28	23-abr													
PLACA INFERIOR POZO No. PZA-3 OS-935	4000	151	1	30/03/2026	7	6-abr													
	4000		2		7	6-abr													
	4000		3		14	13-abr													
	4000		4		14	13-abr													
	4000		5		28	27-abr													
	4000		6		28	27-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ	REVISÓ
OSCAR LEONEL FIQUEREDO	YULI ALEXANDRA FERRUCHO
LABORATORISTA	DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

PLACA SUPERIOR

Calle 30 N 5 - 71
Yopal, Casanare
(+57) 311 443 8218
contacto@geotechcolombia.com

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Agregados y Concretos	GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S.	INFORME DE RESULTADOS
Aprobó: Gerencia	Fecha: 01/04/2024	Código: GT-LB-INF-01-V1

611

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LAF-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Página 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PZA-50 OS-850	4000	128	1	1/02/2026	7	8-feb	30,2	15,1	5408,2	12621	2,33	179,1	17907,9	322,6	183,6	18,0	2622,4	65,90%	3
	4000		2		7	8-feb	30,3	15,2	5498,2	12584	2,29	181,5	18145,8	326,4	182,7	17,9	2610,5	65,26%	2
	4000		3		14	15-feb	30,3	15,2	5498,2	12932	2,35	181,5	18145,8	422,6	237,3	23,3	3389,6	84,74%	3
	4000		4		14	15-feb	30,3	15,3	5570,8	12858	2,31	183,9	18385,4	426,0	236,1	23,2	3373,9	84,32%	2
	4000		5		28	1-mar	30,2	15,1	5408,2	12522	2,32	179,1	17907,5	522,3	297,2	29,1	4245,7	106,14%	3
	4000		6		28	1-mar	30,3	15,0	5354,5	12502	2,33	176,7	17671,5	510,4	294,0	28,9	4204,5	105,11%	2

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LAF-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Página 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-129 OS-878	4000	129	1	5/02/2026	7	12-feb	30,2	15,2	5480,0	12668	2,31	181,5	18145,8	338,9	190,3	18,7	2718,6	67,97%	3
	4000		2		7	12-feb	30,4	15,2	5516,3	12700	2,30	181,5	18145,8	340,0	190,8	18,7	2727,6	68,19%	2
	4000		3		14	19-feb	30,2	15,3	5582,4	12859	2,28	183,9	18385,4	445,6	247,0	24,2	3528,2	88,20%	3
	4000		4		14	19-feb	30,2	15,3	5582,4	12849	2,28	183,9	18385,4	451,2	250,1	24,5	3572,5	89,31%	2
	4000		5		28	5-mar	30,1	15,1	5390,3	12560	2,34	179,1	17907,9	516,3	293,6	28,8	4187,0	104,67%	3
	4000		6		28	5-mar	30,2	15,2	5480,0	12548	2,29	181,5	18145,8	531,0	292,6	28,7	4179,6	104,49%	2
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-173 OS-876	4000	130	1	6/02/2026	7	13-feb	30,1	15,1	5390,3	12548	2,30	179,1	17907,9	351,2	196,6	19,6	2854,9	71,37%	2
	4000		2		7	13-feb	30,5	15,1	5461,9	12587	2,31	179,1	17907,9	352,3	200,5	19,7	2863,8	71,60%	3
	4000		3		14	22-feb	30,4	15,1	5444,0	12624	2,32	179,1	17907,9	441,2	251,1	24,6	3586,5	89,66%	3
	4000		4		14	22-feb	30,2	15,1	5408,2	12568	2,32	179,1	17907,9	443,0	252,1	24,7	3601,1	90,03%	3
	4000		5		28	6-mar	30,4	15,2	5516,3	12566	2,28	181,5	18145,8	538,8	305,1	29,7	4330,4	108,26%	2
	4000		6		28	6-mar	30,5	15,3	5607,5	12587	2,24	183,9	18385,4	546,8	302,9	29,7	4327,1	108,18%	2
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-181 OS-878	4000	131	1	12/02/2026	7	19-feb	30,2	15,2	5480,0	12524	2,28	181,5	18145,8	333,6	187,3	18,4	2676,2	66,91%	2
	4000		2		7	19-feb	30,4	15,3	5549,2	12560	2,26	183,9	18385,4	335,1	185,7	18,2	2653,2	66,33%	2
	4000		3		14	26-feb	30,1	15,2	5461,9	12534	2,29	181,5	18145,8	425,6	236,0	23,4	3434,2	85,86%	3
	4000		4		14	26-feb	30,5	15,2	5534,5	12560	2,27	181,5	18145,8	427,6	240,2	23,6	3431,9	85,80%	2
	4000		5		28	12-mar	30,2	15,1	5408,2	12539	2,32	179,1	17907,9	525,6	299,5	29,3	4272,6	106,81%	1
	4000		6		28	12-mar	30,3	15,1	5426,1	12566	2,31	179,1	17907,9	530,0	301,5	29,6	4308,3	107,71%	1

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-052-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-195 OS-878	4000	132	1	19/02/2026	7	23-feb	30,4	15,2	5516,3	12584	2,28	181,5	18145,8	346,5	194,8	19,1	2782,8	69,57%	3
	4000		2		7	23-feb	30,3	15,2	5498,2	12607	2,29	181,5	18145,8	348,5	195,7	19,2	2795,8	69,89%	2
	4000		3		14	2-mar	30,4	15,3	5603,8	12898	2,29	184,3	18433,5	435,6	240,8	23,6	3440,0	86,00%	3
	4000		4		14	2-mar	30,2	15,2	5501,7	12496	2,27	182,2	18217,5	442,6	247,5	24,3	3535,9	88,40%	2
	4000		5		28	16-mar	30,3	15,2	5498,2	12512	2,28	181,5	18145,8	545,6	306,4	30,0	4377,0	109,42%	3
	4000		6		28	16-mar	30,5	15,2	5534,5	12547	2,27	181,5	18145,8	542,7	304,8	29,9	4353,7	108,84%	2
PLACA SUPERIOR POZO No. PZR-19(03) OS-878	4000	133	1	22/02/2026	7	1-mar	30,2	15,1	5408,2	12622	2,33	179,1	17907,9	393,6	189,8	18,6	2711,8	67,80%	2
	4000		2		7	1-mar	30,4	15,0	5372,1	12603	2,35	176,7	17671,5	335,8	193,8	19,0	2768,2	69,16%	2
	4000		3		14	8-mar	30,3	15,1	5426,1	12598	2,32	179,1	17907,9	435,1	247,6	24,3	3535,9	88,40%	3
	4000		4		14	8-mar	30,5	15,2	5534,5	12584	2,27	181,5	18145,8	440,0	247,1	24,2	3529,8	88,25%	3
	4000		5		28	22-mar	30,2	15,2	5480,6	12618	2,30	181,5	18145,8	539,8	303,1	29,7	4330,4	108,26%	2
	4000		6		28	22-mar	30,3	15,2	5498,2	12650	2,30	181,5	18145,8	540,0	303,2	29,7	4332,9	108,30%	2

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CLIENTE: CONSORCIO BENDICION 23


LOCALIZACIÓN: YOPAL, CASANARE

OBSERVACIONES: NINGUNA

INFORME Nº: INF-052-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-164 OS-939	4000	134	1	4/03/2026	7	11-mar	30,2	15,1	5408,2	12584	2,33	179,1	17907,9	332,6	169,3	16,6	2703,7	67,59%	3
	4000		2		7	11-mar	30,4	15,2	5516,3	12607	2,29	181,5	18145,8	335,2	168,2	16,5	2689,1	67,23%	2
	4000		3		14	18-mar	30,5	15,3	5622,2	12661	2,25	184,3	18433,5	440,1	243,3	23,9	3476,5	86,89%	3
	4000		4		14	18-mar	30,2	15,3	5552,4	12779	2,30	183,9	18385,4	438,6	243,1	23,8	3472,7	86,82%	2
	4000		5		28	1-abr													
	4000		6		28	1-abr													
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-168 OS-933	4000	135	1	6/03/2026	7	13-mar	30,3	15,1	5426,1	12587	2,35	179,1	17907,9	329,8	167,7	16,4	2680,5	67,02%	2
	4000		2		7	13-mar	30,2	15,1	5408,2	12382	2,29	179,1	17907,9	333,0	169,5	16,6	2705,9	67,67%	2
	4000		3		14	20-mar	30,2	15,2	5480,9	12672	2,31	181,5	18145,8	435,1	244,3	24,0	3490,5	87,26%	3
	4000		4		14	20-mar	30,5	15,1	5469,1	12881	2,34	179,1	17907,9	438,9	249,7	24,5	3567,8	89,19%	3
	4000		5		28	3-abr													
	4000		6		28	3-abr													
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-175 OS-935	4000	136	1	7/03/2026	7	14-mar	30,4	15,2	5516,3	12284	2,23	181,5	18145,8	345,2	193,9	19,0	2769,3	69,23%	2
	4000		2		7	14-mar	30,5	15,3	5534,5	12418	2,24	181,5	18145,8	342,9	192,6	18,9	2750,8	68,77%	2
	4000		3		14	21-mar	30,2	15,2	5480,9	12681	2,30	181,5	18145,8	438,8	246,5	24,2	3521,0	88,02%	3
	4000		4		14	21-mar	30,4	15,2	5516,3	12449	2,26	181,5	18145,8	435,1	244,3	24,0	3490,5	87,26%	2
	4000		5		28	4-abr													
	4000		6		28	4-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2026

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-189	4000	137	1	8/03/2026	7	15-mar	30,5	15,1	5461,9	12598	2,31	179,1	17907,9	343,2	194,2	19,0	2773,6	69,34%	3
	4000		2		7	15-mar	30,6	15,2	5552,6	12598	2,27	181,5	18145,8	343,6	193,8	18,9	2756,5	68,91%	2
	4000		3		14	22-mar	30,2	15,2	5480,9	12596	2,29	181,5	18145,8	438,9	246,5	24,2	3521,0	88,02%	3
	4000		c		14	22-mar	30,1	15,1	5390,3	12612	2,34	179,1	17907,9	440,0	250,4	24,6	3576,7	89,42%	2
	4000		5		28	5-abr													
	4000		6		28	5-abr													
OS-935																			
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-197	4000	138	1	13/03/2026	7	18-mar	30,2	15,2	5480,9	12680	2,31	181,5	18145,8	336,1	188,7	18,5	2695,3	67,41%	2
	4000		2		7	18-mar	30,5	15,4	5681,1	12700	2,24	186,3	18626,6	338,6	185,2	18,2	2645,5	66,14%	2
	4000		3		14	25-mar	30,4	15,2	5516,3	12650	2,29	181,5	18145,8	429,8	241,4	23,7	3448,0	86,20%	3
	4000		c		14	25-mar	30,2	15,1	5408,2	12628	2,33	179,1	17907,9	435,0	247,5	24,3	3536,1	88,40%	3
	4000		5		28	8-abr													
	4000		6		28	8-abr													
OS-938																			
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-237	4000	139	1	12/03/2026	7	19-mar	30,3	15,2	5498,2	12696	2,29	181,5	18145,8	342,6	192,4	18,9	2748,6	68,71%	2
	4000		2		7	19-mar	30,2	15,3	5552,4	12684	2,27	183,9	18385,4	345,1	191,0	18,8	2722,4	68,11%	2
	4000		3		14	26-mar	30,5	15,2	5534,5	12675	2,29	181,5	18145,8	445,6	250,2	24,5	3574,7	89,37%	3
	4000		4		14	26-mar	30,2	15,2	5480,9	12622	2,30	181,5	18145,8	442,5	248,5	24,4	3549,9	88,75%	2
	4000		5		28	9-abr													
	4000		6		28	9-abr													
OS-939																			

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2026

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CLIENTE: CONSORCIO BENDICION 23

LOCALIZACIÓN: YOPAL, CASANARE

OBSERVACIONES: NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PN-239	4000	140	1	13/03/2026	7	20-mar	30,4	15,2	5516,3	12594	2,28	181,5	18145,8	335,9	188,6	18,5	2694,7	67,37%	3
	4000		2		7	20-mar	30,3	15,2	5498,2	12607	2,29	181,5	18145,8	338,7	190,2	18,7	2717,2	67,93%	2
	4000		3		14	27-mar	30,3	15,1	5426,1	12641	2,33	179,1	17907,9	432,6	246,2	24,1	3516,6	87,91%	3
	4000		4		14	27-mar	30,3	15,1	5426,1	12773	2,35	179,1	17907,9	433,0	246,4	24,2	3519,8	88,00%	2
	4000		5		28	10-abr													
	4000		6		28	10-abr													
OS-939																			
PLACA SUPERIOR POZO No. PZR-18 (04)	4000	141	1	15/03/2026	7	22-mar	30,3	15,1	5426,1	12187	2,25	179,1	17907,9	330,1	187,8	18,4	2683,4	67,08%	2
	4000		2		7	22-mar	30,1	15,1	5390,3	12362	2,29	179,1	17907,9	332,5	189,2	18,6	2702,9	67,57%	2
	4000		3		14	29-mar	30,2	15,2	5480,0	12672	2,31	181,5	18145,8	441,5	247,5	24,3	3541,6	88,55%	3
	4000		4		14	29-mar	30,2	15,1	5408,2	12811	2,37	179,1	17907,9	439,8	250,3	24,5	3575,1	89,38%	3
	4000		5		28	12-abr													
	4000		6		28	12-abr													
OS-938																			
PLACA SUPERIOR POZO No. PZR-20	4000	142	1	18/03/2026	7	25-mar	30,2	15,3	5570,8	12284	2,21	183,9	18385,4	340,1	188,8	18,5	2692,8	67,32%	2
	4000		2		7	25-mar	30,2	15,1	5408,2	12418	2,30	179,1	17907,9	342,9	195,1	19,1	2787,4	69,69%	2
	4000		3		14	1-abr													
	4000		4		14	1-abr													
	4000		5		28	15-abr													
	4000		6		28	15-abr													
OS-939																			

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LAB-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA m2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PZR-46 (69) OS-939	4000	143	1	19/03/2026	7	26-mar	30,2	15,2	5480,9	12697	2,32	181,5	18145,8	346,9	195,4	19,2	2781,8	69,78%	3
	4000		2		7	26-mar	30,3	15,3	5570,8	12650	2,27	183,9	18385,4	345,9	191,7	18,8	2728,8	68,41%	2
	4000		3		14	2-abr													
	4000		4		14	2-abr													
	4000		5		28	16-abr													
	4000		6		28	16-abr													
PLACA SUPERIOR POZO No. PZR-47 (70) PZR-48 (71) OS-939	4000	144	1	20/03/2026	7	27-mar	30,5	15,1	5461,9	12684	2,30	179,1	17907,9	336,9	191,7	18,8	2728,6	68,41%	2
	4000		2		7	27-mar	30,2	15,1	5404,2	12526	2,32	179,1	17907,9	340,5	192,8	18,9	2767,9	69,20%	2
	4000		3		14	3-abr													
	4000		4		14	3-abr													
	4000		5		28	17-abr													
	4000		6		28	17-abr													
PLACA SUPERIOR POZO No. PZA-51 OS-939	4000	145	1	21/03/2026	7	28-mar	30,2	15,2	5498,2	12690	2,29	181,5	18145,8	342,5	192,3	18,9	2747,6	69,69%	2
	4000		2		7	28-mar	30,5	15,3	5607,5	12615	2,25	183,9	18385,4	345,6	191,5	18,8	2726,4	68,41%	2
	4000		3		14	4-abr													
	4000		4		14	4-abr													
	4000		5		28	18-abr													
	4000		6		28	18-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LAB-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CLIENTE: CONSORCIO BENDICION 23


LOCALIZACIÓN: YOPAL, CASANARE

OBSERVACIONES: NINGUNA

INFORME Nº: INF-092-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA m2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
PLACA SUPERIOR POZO No. PZA-52 OS-939	4000	148	1	26/03/2026	7	2-abr													
	4000		2		7	2-abr													
	4000		3		14	9-abr													
	4000		4		14	9-abr													
	4000		5		28	23-abr													
	4000		6		28	23-abr													
PLACA SUPERIOR POZO No. PZA-71 OS-939	4000	147	1	26/03/2026	7	4-abr													
	4000		2		7	4-abr													
	4000		3		14	11-abr													
	4000		4		14	11-abr													
	4000		5		28	25-abr													
	4000		6		28	25-abr													
PLACA SUPERIOR POZO No. PZA-51 OS-939	4000	146	1	1/04/2026	7	8-abr													
	4000		2		7	8-abr													
	4000		3		14	15-abr													
	4000		4		14	15-abr													
	4000		5		28	29-abr													
	4000		6		28	29-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

Yopal, 03 de Abril de 2026 **INF-093-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
CAJAS DE INSPECCIÓN

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **52** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7, 14 y 28 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-850-939

	INFORME DE RESULTADOS	Código: GT-LB-INF-01-V1
GEOTECH Laboratorio e Ingeniería	GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S.	Fecha: 01/04/2024
	Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Agregados y Concretos	Aprobó: Gerencia

PLACA BASE

GEOTECH
laboratorio @ ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD ELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-87 (11 CAJAS DE INSPECCIÓN) PLACA BASE	3000	391	1	3/03/2026	7	10-mar	30,2	15,0	5336,8	12558	2,36	176,7	17671,5	254,1	146,5	14,4	2083,2	69,72%	4
	3000		2		7	10-mar	30,3	15,1	5426,1	12634	2,33	179,1	17907,9	256,0	145,7	14,3	2081,0	69,37%	4
	3000		3		14	17-mar	30,2	15,2	5480,0	12692	2,30	181,5	18145,8	331,2	186,0	18,2	2657,0	88,57%	4
	3000		4		14	17-mar	30,5	15,2	5534,5	12535	2,26	181,5	18145,8	335,6	188,5	18,5	2692,3	89,74%	4
	3000		5		28	31-mar	30,2	15,3	5552,4	12633	2,28	183,9	18385,4	402,5	223,1	21,9	3186,9	106,23%	2
	3000		6		28	31-mar	30,4	15,3	5589,2	12574	2,25	183,9	18385,4	405,1	224,5	22,0	3207,5	106,92%	2
05-939																			
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-86 (9 CAJAS DE INSPECCIÓN) PLACA BASE	3000	392	1	6/03/2026	7	13-mar	30,2	15,2	5480,6	12524	2,29	181,5	18145,8	250,3	140,6	13,8	2008,9	66,96%	2
	3000		2		7	13-mar	30,5	15,1	5461,9	12568	2,30	179,1	17907,9	252,8	143,8	14,1	2055,0	68,50%	2
	3000		3		14	20-mar	30,3	15,1	5426,1	12495	2,30	179,1	17907,9	328,4	186,9	18,3	2669,5	88,98%	3
	3000		4		14	20-mar	30,2	15,1	5408,2	12592	2,31	179,1	17907,9	329,6	187,6	18,4	2679,3	89,31%	3
	3000		5		28	3-abr													
	3000		6		28	3-abr													
05-939																			
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-85 (7 CAJAS DE INSPECCIÓN) PLACA BASE	3000	393	1	10/03/2026	7	17-mar	30,2	15,1	5408,2	12593	2,31	179,1	17907,9	249,8	142,1	13,9	2029,6	67,68%	2
	3000		2		7	17-mar	30,5	15,2	5534,5	12610	2,28	181,5	18145,8	252,3	141,7	13,9	2024,0	67,47%	4
	3000		3		14	24-mar	30,4	15,2	5518,3	12555	2,28	181,5	18145,8	325,6	182,8	17,9	2612,1	87,07%	2
	3000		4		14	24-mar	30,1	15,1	5390,3	12530	2,32	179,1	17907,9	328,9	187,2	18,4	2673,6	89,12%	3
	3000		5		28	7-abr													
	3000		6		28	7-abr													
05-939																			

TIPOS DE FALLA



ELABORO

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
laboratorio @ ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD ELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-84 (3 CAJAS DE INSPECCIÓN) PLACA BASE	3000	394	1	13/03/2026	7	20-mar	30,2	15,2	5480,0	12522	2,29	181,5	18145,8	258,6	145,2	14,2	2074,6	69,15%	4
	3000		2		7	20-mar	30,5	15,1	5461,9	12538	2,30	179,1	17907,9	260,0	147,9	14,5	2113,5	70,45%	4
	3000		3		14	27-mar	30,1	15,2	5461,9	12560	2,30	181,5	18145,8	338,4	190,9	18,6	2714,7	90,49%	4
	3000		4		14	27-mar	30,2	15,2	5480,0	12587	2,30	181,5	18145,8	337,2	189,4	18,6	2705,1	90,17%	4
	3000		5		28	10-abr													
	3000		6		28	10-abr													
05-939																			
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-81 (72) (17 CAJAS DE INSPECCIÓN) PLACA BASE	3000	395	1	18/03/2026	7	25-mar	30,1	15,2	5461,9	12650	2,32	181,5	18145,8	261,2	146,7	14,4	2095,4	69,85%	2
	3000		2		7	25-mar	30,2	15,1	5408,2	12638	2,34	179,1	17907,9	263,5	149,9	14,7	2142,0	71,40%	2
	3000		3		14	1-abr													
	3000		4		14	1-abr													
	3000		5		28	15-abr													
	3000		6		28	15-abr													
05-939																			
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-81 (72) (12 CAJAS DE INSPECCIÓN) PLACA BASE	3000	396	1	18/03/2026	7	25-mar	30,4	15,3	5589,2	12522	2,24	183,8	18385,4	263,5	146,0	14,3	2086,3	69,54%	2
	3000		2		7	25-mar	30,2	15,4	5605,2	12499	2,22	186,3	18626,5	264,0	144,4	14,2	2063,2	68,77%	4
	3000		3		14	1-abr													
	3000		4		14	1-abr													
	3000		5		28	15-abr													
	3000		6		28	15-abr													
05-939																			

TIPOS DE FALLA



ELABORO

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 30/09/2026

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Página: 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO			PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
															(Kg/cm²)	MPa	P.S.I.		
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TP-195 (10 CAJAS DE INSPECCIÓN) PLACA BASE	3000	397	1	26/08/2026	7	1-abr													
	3000		2		7	1-abr													
	3000		3		14	8-abr													
	3000		4		14	8-abr													
	3000		5		28	22-abr													
	3000		6		28	22-abr													
DS 030																			

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ	REVISÓ
OSCAR LEONEL FIGUEREDO	YULI ALEXANDRA FERRUCHO
LABORATORISTA	DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

TAPA

GEOTECH Laboratorio de Ingeniería

Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Agregados y Concretos	GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S.	INFORME DE RESULTADOS
Aprobó: Gerencia	Fecha: 01/04/2024	Código: GT-LB-INF-01-V1

Calle 30 N 5 - 71
Yopal, Casanare
(+57) 311 443 8218
contacto@geotechcolombia.com

618

GEOTECH
laboratorio de ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2026

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TP-53 (4 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA 05-850	3000	384	1	30/01/2026	7	6-feb	30,2	15,3	5586,9	12536	2,25	184,3	18433,5	270,2	145,4	14,6	2133,7	71,12%	4
	3000		2		7	6-feb	30,2	15,1	5408,2	12584	2,33	179,1	17907,9	276,4	157,3	15,4	2246,8	74,89%	4
	3000		3		14	13-feb	30,6	15,2	5534,5	12569	2,27	181,5	18145,8	301,5	169,3	16,6	2418,7	80,62%	4
	3000		4		14	13-feb	30,2	15,1	5408,2	12658	2,34	179,1	17907,9	292,2	166,3	16,3	2376,3	79,15%	4
	3000		5		28	27-feb	30,5	15,1	5461,9	12528	2,29	179,1	17907,9	406,1	231,1	22,7	3301,2	110,04%	2
	3000		6		28	27-feb	30,2	15,0	5336,8	12634	2,37	176,7	17671,5	412,6	237,9	23,3	3398,9	113,30%	2
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-86 (66) (7 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA 05-850	3000	385	1	30/01/2026	7	6-feb	30,3	15,2	5498,2	12584	2,29	181,5	18145,8	254,6	143,0	14,0	2042,6	68,09%	2
	3000		2		7	6-feb	30,2	15,2	5480,0	12630	2,30	181,5	18145,8	248,3	139,4	13,7	1991,9	66,40%	2
	3000		3		14	13-feb	30,5	15,3	5607,5	12721	2,27	183,9	18385,4	286,1	155,2	15,2	2217,8	73,93%	3
	3000		4		14	13-feb	30,5	15,3	5607,5	12689	2,26	183,9	18385,4	280,2	152,0	14,9	2242,3	74,74%	3
	3000		5		28	27-feb	30,1	15,3	5534,0	12688	2,29	183,9	18385,4	456,4	253,0	24,8	3613,7	120,46%	4
	3000		6		28	27-feb	30,2	15,2	5480,0	12664	2,31	181,6	18145,8	442,0	248,2	24,3	3545,9	118,20%	2
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-85 (65) (4 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA 05-850	3000	386	1	1/02/2026	7	8-feb	30,2	15,1	5408,2	12702	2,35	179,1	17907,9	278,2	158,3	15,5	2261,4	75,38%	2
	3000		2		7	8-feb	30,3	15,2	5498,2	12660	2,30	181,5	18145,8	269,4	151,3	14,8	2161,2	72,04%	6
	3000		3		14	15-feb	30,2	15,1	5408,2	12586	2,33	179,1	17907,9	313,6	176,6	17,5	2569,2	84,97%	2
	3000		4		14	15-feb	30,2	15,1	5408,2	12623	2,33	179,1	17907,9	330,1	187,8	18,4	2683,4	89,45%	3
	3000		5		28	1-mar	30,2	15,1	5408,2	12699	2,35	179,1	17907,9	400,0	227,5	22,3	3251,6	108,39%	4
	3000		6		28	1-mar	30,5	15,1	5461,9	12764	2,33	179,1	17907,9	405,3	230,6	22,6	3294,6	109,82%	2

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
laboratorio de ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2026

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CLIENTE: CONSORCIO BENDICION 23


LOCALIZACIÓN: YOPAL, CASANARE

OBSERVACIONES: NINGUNA

INFORME Nº: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO MPa	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-84 (64) (6 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA 05-850	3000	387	1	1/02/2026	7	8-feb	30,3	15,3	5578,1	12633	2,26	184,1	18409,4	258,8	143,1	14,0	2044,9	68,16%	4
	3000		2		7	8-feb	30,2	15,2	5480,0	12680	2,31	181,5	18145,8	255,9	143,7	14,1	2052,9	68,43%	4
	3000		3		14	15-feb	30,4	15,2	5516,3	12586	2,28	181,5	18145,8	320,0	179,7	17,6	2567,1	85,57%	4
	3000		4		14	15-feb	30,5	15,3	5607,5	12622	2,25	183,9	18385,4	324,6	179,9	17,6	2570,1	85,67%	4
	3000		5		28	1-mar	30,5	15,2	5534,5	12684	2,29	181,5	18145,8	402,3	225,9	22,2	3227,4	107,58%	2
	3000		6		28	1-mar	30,3	15,1	5426,1	12584	2,32	179,1	17907,9	400,0	227,6	22,3	3251,6	108,39%	2
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-83 (63) (6 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA 05-850	3000	388	1	1/02/2026	7	8-feb	30,2	15,2	5480,0	12584	2,30	181,5	18145,8	252,6	141,9	13,9	2026,4	67,55%	2
	3000		2		7	8-feb	30,3	15,2	5498,2	12636	2,30	181,5	18145,8	255,6	143,4	14,1	2048,9	68,30%	2
	3000		3		14	16-feb	30,5	15,2	5534,5	12674	2,27	181,5	18145,8	315,6	177,2	17,4	2531,8	84,39%	3
	3000		4		14	16-feb	30,4	15,1	5444,0	12549	2,30	179,1	17907,9	317,0	180,4	17,7	2576,9	85,90%	3
	3000		5		28	1-mar	30,3	15,2	5498,2	12684	2,31	181,5	18145,8	389,6	218,8	21,5	3125,5	104,18%	4
	3000		6		28	1-mar	30,2	15,3	5552,4	12598	2,27	183,8	18385,4	355,2	219,0	21,5	3125,1	104,39%	2
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-82 (62) (6 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA 05-850	3000	389	1	1/02/2026	7	8-feb	30,2	15,1	5408,2	12689	2,35	179,1	17907,9	248,6	141,5	13,9	2020,8	67,36%	2
	3000		2		7	8-feb	30,3	15,0	5354,5	12677	2,37	176,7	17671,5	246,9	142,4	14,0	2033,9	67,80%	4
	3000		3		14	16-feb	30,4	15,0	5372,1	12630	2,35	176,7	17671,5	319,6	184,3	18,1	2632,8	87,76%	2
	3000		4		14	16-feb	30,2	15,0	5336,8	12552	2,35	176,7	17671,5	321,2	185,2	18,2	2646,9	88,23%	3
	3000		5		28	1-mar	30,2	15,3	5552,4	12773	2,30	183,9	18385,4	400,0	221,7	21,7	3167,1	105,57%	4
	3000		6		28	1-mar	30,4	15,1	5444,0	12964	2,38	179,1	17907,9	352,5	223,3	21,9	3190,6	106,35%	2

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Código: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Página 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-61 (3 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS-153	3000	390	1	1/02/2026	7	8-feb	30,2	15,2	5480,0	12468	2,28	181,5	18145,8	265,6	148,2	14,6	2130,7	71,02%	4
	3000		2		7	8-feb	30,5	15,3	5607,5	12513	2,25	183,9	18385,4	266,0	147,4	14,5	2126,1	70,20%	4
	3000		3		14	15-feb	30,4	15,2	5516,3	12518	2,27	181,5	18145,8	342,5	192,3	18,9	2742,6	91,59%	4
	3000		4		14	15-feb	30,2	15,2	5480,0	12560	2,29	181,5	18145,8	340,8	191,4	18,8	2734,0	91,13%	4
	3000		5		28	1-mar	30,3	15,2	5498,2	12625	2,30	181,5	18145,8	386,1	216,8	21,3	3097,4	103,25%	2
	3000		6		28	1-mar	30,5	15,2	5534,5	12633	2,28	181,5	18145,8	394,5	221,5	21,7	3164,8	105,49%	2

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Código: GT-LB-F-33-V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 20/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S


Página 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME N°: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-87 (11 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS-153	3000	391	1	5/03/2026	7	12-mar	30,2	15,2	5480,0	12564	2,29	181,5	18145,8	255,6	143,5	14,1	2050,5	68,35%	4
	3000		2		7	12-mar	30,3	15,1	5426,1	12550	2,31	179,1	17907,9	254,0	144,5	14,2	2064,7	68,82%	4
	3000		3		14	19-mar	30,4	15,2	5516,3	12606	2,29	181,5	18145,8	326,9	183,6	18,0	2622,5	87,42%	4
	3000		4		14	19-mar	30,5	15,3	5607,5	12622	2,25	183,9	18385,4	328,1	181,8	17,8	2597,8	86,59%	4
	3000		5		28	2-abr													
	3000		6		28	2-abr													
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-86 (9 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS-153	3000	392	1	6/03/2026	7	15-mar	30,2	15,2	5480,0	12468	2,28	181,5	18145,8	249,8	140,3	13,8	2004,0	66,80%	2
	3000		2		7	15-mar	30,3	15,2	5498,2	12506	2,27	181,5	18145,8	251,6	141,3	13,9	2018,4	67,28%	2
	3000		3		14	22-mar	30,5	15,1	5461,8	12524	2,29	179,1	17907,9	323,6	184,1	18,1	2630,5	87,68%	3
	3000		4		14	22-mar	30,1	15,2	5461,8	12533	2,29	181,5	18145,8	325,0	182,5	17,9	2607,2	86,91%	3
	3000		5		28	6-abr													
	3000		6		28	6-abr													
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-85 (7 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS-153	3000	393	1	12/03/2026	7	19-mar	30,2	15,2	5480,0	12639	2,29	181,5	18145,8	256,9	144,3	14,1	2060,9	68,70%	2
	3000		2		7	19-mar	30,5	15,1	5461,8	12648	2,32	179,1	17907,9	257,1	146,3	14,3	2089,9	69,66%	4
	3000		3		14	26-mar	30,4	15,6	5372,1	12672	2,35	176,7	17671,5	324,8	187,0	18,4	2675,6	89,19%	2
	3000		4		14	26-mar	30,3	15,6	5354,5	12610	2,36	176,7	17671,5	322,3	185,8	18,2	2655,9	88,50%	3
	3000		5		28	9-abr													
	3000		6		28	9-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33 V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 26/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD ELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CLIENTE:	CONSORCIO BENDICION 23
LOCALIZACIÓN:	YOPAL, CASANARE
OBSERVACIONES:	NINGUNA

INFORME Nº: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO CO-E-84 (3 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS 999	3000	384	1	15/03/2026	7	22-mar	30,3	15,3	5578,1	12633	2,26	184,1	18409,4	263,5	146,9	14,3	2083,6	69,45%	4
	3000		2		7	22-mar	30,2	15,2	5486,6	12680	2,31	181,5	18145,8	261,7	147,0	14,4	2099,5	69,98%	4
	3000		3		14	29-mar	30,4	15,2	5516,3	12596	2,28	181,5	18145,8	331,2	186,0	18,2	2657,0	88,52%	4
	3000		4		14	29-mar	30,5	15,3	5607,5	12622	2,25	183,9	18385,4	333,0	184,6	18,1	2636,6	87,88%	4
	3000		5		28	12-abr													
	3000		6		28	12-abr													
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-81 (72) (17 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS 999	3000	385	1	26/03/2026	7	27-mar	30,2	15,2	5490,0	12584	2,30	181,5	18145,8	257,8	144,8	14,2	2068,2	68,94%	2
	3000		2		7	27-mar	30,3	15,2	5498,2	12638	2,30	181,5	18145,8	259,0	145,4	14,3	2077,8	69,26%	2
	3000		3		14	3-abr													
	3000		4		14	3-abr													
	3000		5		28	17-abr													
	3000		6		28	17-abr													
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TR-81 (72) (12 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS 999	3000	386	1	26/03/2026	7	27-mar	30,2	15,1	5408,2	12699	2,35	179,1	17902,9	255,9	145,8	14,3	2080,2	69,34%	2
	3000		2		7	27-mar	30,3	15,0	5354,5	12677	2,37	176,7	17671,5	258,1	148,8	14,6	2126,1	70,87%	4
	3000		3		14	3-abr													
	3000		4		14	3-abr													
	3000		5		28	17-abr													
	3000		6		28	17-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

GEOTECH
Laboratorio de Ingeniería

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO

Codigo: GT-LB-F-33 V1

NORMA: INV E410-13 / NTC 673

Fecha: 26/04/2024

GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S

Pagina 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD ELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CLIENTE: CONSORCIO BENDICION 23


LOCALIZACIÓN: YOPAL, CASANARE

OBSERVACIONES: NINGUNA

INFORME Nº: INF-093-26

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO/REFERENCIA	RESISTENCIA DE DISEÑO (P.S.I.)	No. MUESTRA	No. CILINDRO	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE FALLO	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	VOLUMEN Cm3	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	AREA cm2	AREA mm2	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA SEGUN FECHA DE FALLO (Kg/cm²)	MPa	P.S.I.	PORCENTAJE CON RESPECTO A LA RESIST. DE DISEÑO	TIPO DE FALLA
CAJAS DE INSPECCIÓN TRAMO TP-195 (10 CAJAS DE INSPECCIÓN) TAPA OS 999	3000	387	1	27/03/2026	7	3-abr													
	3000		2		7	3-abr													
	3000		3		14	10-abr													
	3000		4		14	10-abr													
	3000		5		28	24-abr													
	3000		6		28	24-abr													

TIPOS DE FALLA



ELABORÓ

OSCAR LEONEL FIGUEREDO
LABORATORISTA

REVISÓ

YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare



MAQUITOP S.A.S.
NIT: 900.131.105-1
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACIÓN DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

Calle 45 A No. 50 - 27 * B; la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

CERTIFICADO

Nº D 622

EL EQUIPO: ESTACION TOPCON GTS-239W

NÚMERO DE SERIE: 295292

PROPIETARIO: EMIRO OIDOR TRIANA

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES	
TELESCOPIO	30X
Aumentos	45 mm
Apertura	1PX6
Campo de Visión a 100 mts	
Impermeabilización	
Peso con baterías y estuche	5Kg

MEDIDA DEL ÁNGULO	
PRECISIÓN	10"
(Desviación Estándar basada en norma DIN 18723)	10"
Lectura de ángulos (apreciación)	+/-3
Compensador Automático de nivel	

MEDIDAS DE DISTANCIA	
PRECISIÓN	1mm+2ppm
Medición Estándar	
Seguimiento	
Mínima distancia posible	
Tiempo de medición	1 minuto

ALCANCE			
Con 1 prisma	Con 2 prismas	Grey Card	No prisma

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL
Presión en mm de nivelación por Km doble
Aumento del Telescopio
Mínima Distancia Focal
Factor Multiplicados de la Estadía
Rango del compensador
Campo de Visión a 30 Mtrs.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR
Equipo Calibrado y ajustado

PATRÓN UTILIZADO
TAYLOR - HOBSON 112/9-568 PAT3 2404262682094

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD

MAQUITOP S.A.S.
NIT: 900.131.105-1
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACIÓN DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

Calle 45 A No. 50 - 27 * B; la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

Nº D 622

EL EQUIPO: ESTACION TOPCON GTS-239W

NÚMERO DE SERIE: 295292

PROPIETARIO: EMIRO OIDOR TRIANA

AJUSTES REALIZADOS

CÓDIGO 1: CORRECTO
CÓDIGO 2: FALLA CORREGIDA
CÓDIGO 3: FALLA NO CORREGIDA
CÓDIGO 4: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OBSERVACIONES
Limpieza general y engrase		
Ajuste de nivele	1	
Ajuste del sistema de colimación	1	
Ajuste del compensador automático	2	
Ajuste del nivel tubular	1	
Ajuste del sistema de enfoque	1	
Ajuste de nivel ojo de pollo	1	
Ajuste Plomada óptica	1	
Exactitud ángulo horizontal y vertical	1	
Exactitud de distanciómetro	1	
Verticalidad, horizontalidad de la retícula y limpieza	1	
Foco mínimo (1,5 mts o menos)	1	
Suavidad de enfoque repetitivamente	1	
Prensa horizontal y tornillo de movimiento lento	1	
Chequeo del display	2	
Fuente de poder extrema	1	
Data input - output	1	
Lentes de objetivo	1	
Resolución	1	
Tornillos base nivelante	1	
Miras de puntería	1	
Chequeo del teclado	1	
Apariencia exterior	1	
	1	

Este documento se expide a solicitud de: EMIRO OIDOR TRIANA

En la ciudad de BOGOTA al los 8 dias del mes MARZO de 20 26

Además certificamos que le anterior equipo cumple con todos los parámetros originales exigdos por el fabricante

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA POR 06 MESES A PARTR DE LA FECHA

MAQUITOP S.A.S. NIT. 900.131.105-1 Bogotá D.C. Calle 45 A No. 50 - 27 Tels. (571) 324 2334 - 702 3008

JORGE ELIECER CABRA
GERENTE

NIT. 900.131.105-1 Calle 45 A No. 50 - 27 * Bogotá, D.C. Tels. (571) 324 2334 - 702 3008

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD



MAQUITOP S.A.S.
NIT: 900.131.105-1
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACIÓN DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

Calle 45 A No. 50 - 27 * B; la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

CERTIFICADO

Nº D 623

EL EQUIPO: NIVEL TOPCON AT-B4A

NÚMERO DE SERIE: WP095310

PROPIETARIO: EMIRO OIDOR TRIANA

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES	
TELESCOPIO	
Aumentos	24X
Apertura	32mm
Campo de Visión a 100 mts	1PX4
Impermeabilización	1,8Kg
Peso con baterías y estuche	

MEDIDA DEL ÁNGULO	
PRECISIÓN	
(Desviación Estándar basada en norma DIN 18723)	
Lectura de ángulos (apreciación)	
Compensador Automático de nivel	

MEDIDAS DE DISTANCIA	
PRECISIÓN	
Medición Estándar	
Seguimiento	
Mínima distancia posible	
Tiempo de medición	

ALCANCE			
Con 1 prisma	Con 2 prismas	Grey Card	No prisma

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL	
Presión en mm de nivelación por Km doble	1mm
Aumento del Telescopio	24X
Minima Distancia Focal	1m
Factor Multiplicados de la Estadía	100
Rango del compensador	+/- 15'
Campo de Visión a 30 Mtrs.	

DIAGNOSTICO PRELIMINAR
Equipo Calibrado y ajustado

PATRÓN UTILIZADO
TAYLOR - HOBSON 112/9-568 PATS 240426262094

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD

MAQUITOP S.A.S.



MAQUITOP S.A.S.

NIT: 900.131.105-1

COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACIÓN DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

Calle 45 A No. 50 - 27 * B; la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

Nº D 623

EL EQUIPO: NIVEL TOPCON AT-B4A

NÚMERO DE SERIE: WP095310

PROPIETARIO: EMIRO OIDOR TRIANA

AJUSTES REALIZADOS

CÓDIGO 1: CORRECTO
CÓDIGO 2: FALLA CORREGIDA
CÓDIGO 3: FALLA NO CORREGIDA
CÓDIGO 4: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OBSERVACIONES
Limpieza general y engrase	1	
Ajuste de nivele	1	
Ajuste del sistema de colimación	1	
Ajuste del compensador automático	1	
Ajuste del nivel tubular	1	
Ajuste del sistema de enfoque	1	
Ajuste de nivel ojo de pollo	4	
Ajuste Plomada óptica	1	
Exactitud ángulo horizontal y vertical	1	
Exactitud de distanciómetro	4	
Verticalidad, horizontalidad de la retícula y limpieza	4	
Foco mínimo (1,5 mts o menos)	1	
Suavidad de enfoque repetitivamente	1	
Prensa horizontal y tornillo de movimiento lento	1	
Chequeo del display	1	
Fuente de poder extrema	1	
Data input - output	4	
Lentes de objetivo	4	
Resolución	1	
Tornillos base nivelante	1	
Miras de puntería	1	
Chequeo del teclado	4	
Apariencia exterior	1	

Este documento se expide a solicitud de: EMIRO OIDOR TRIANA

En la ciudad de BOGOTA al los 8 dias del mes MARZO de 20 26

Además certificamos que le anterior equipo cumple con todos los parámetros originales exigdos por el fabricante

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA POR 06 **MESES A PARTR DE LA FECHA**

MAQUITOP S.A.S. NIT. 900.131.105-1 Bogotá, D.C. Calle 45 A No. 50 - 27 Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008

JORGE ELIECER CABRA
GERENTE

MAQUITOP S.A.S. NIT. 900.131.105-1 Calle 45 A No. 50 - 27 * Bogotá, D.C. Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD

626

ACTAS DE COMITÉ



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
02 03 2026	08 :00 AM [X] PM [ ]	09 : 00 AM [X] PM [ ]

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Campamento de Obra.

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Aspectos técnicos de las actividades de obra programadas para el mes de marzo de 2026 en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041-2023.

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Daniel Alexander Gil	Director de Obra	Consorcio Bendición 23
2	Nelson Armando Rodriguez	Residente de Obra	Consorcio Bendición 23
3	Gabriel Duran Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK
4	Jorge Alexander Bernal	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Discutir generalidades y aspectos técnicos de las actividades de obra programadas por el contratista de obra para el mes de marzo de 2026 del contrato de obra No. 041-2023.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DEL DÍA:

- Saludo.
- Presentación de los asistentes.
- Descripción de las actividades a realizar durante el mes de marzo de 2026.
- Cierre de la reunión.

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 am, se da inicio a la reunión con el saludo y la presentación de los asistentes, El residente de Interventoría informa que el objetivo de la reunión es socializar las actividades de obra programadas para el mes de marzo del 2026 y de esta forma dar seguimiento a su cumplimiento.

El residente de Obra toma la palabra e informa que para el mes de marzo se tiene programado: construcción de pozos de inspección de redes interas con las siguientes especificaciones: H=2.0-2.5m ϕ 1.50m; H=3.0-3.5m ϕ 1.50m; H=4.0-4.5m ϕ 1.50m; Construcción de acometidas domiciliarias en el sector Ciudadela La Bendición, Actividades de reparación derivadas de intervenciones en redes domiciliarias, tales como: reparación de acometidas PF+ UAD de 1/2" para acueducto, reparación de tubería de gas en polietileno PE-80 de 1/2" e instalación de unión de reparación RDE 21 de 3", corte, demolición y reposición de andenes en concreto de 3000 PSI. y construcción de cajas de Inspecaión en el sector de la Ciudadela Bendición

El residente de Interventoría informa que se viene realizando un seguimiento permanente a los controles de calidad, verificando que los materiales utilizados en las actividades constructivas del proyecto cumplan con las especificaaures técnicas y normativas vigente.

El residente de obra señala que las actividades de obra se vienen ejecutando sin contratiempos y sin afectaciones al cronograma ni a la calidad de la obra.

Así mismo indica que las actividades cumplen con los requisitos técnicos y de calidad establecidos en el contrato.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por finalizado el comité de obra.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

FR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Acuerdos y compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento

4) FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Daniel Alexander G.
CARGO: Director de Obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Gabriel Andrés Zarate
CARGO: Residente Interventoría.

NOMBRE: Nelson Rodriguez T.
CARGO: Residente obra

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBF
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
31 03 2026	03 : 00 AM ☐ PM ☒	04 : 00 AM ☐ PM ☒

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Campamento de Obra.

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Avance y seguimiento al contrato de Obra No. 041-2023.

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Daniel Alexander G.	Director de Obra	Consorcio Bendición 23
2	Nelson Armando Rodriguez	Residente de Obra	Consorcio Bendición 23
3	Gabriel Andrés Duran	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Socializar e informar novedades, avances técnicos de ejecución y de Salud/seguridad en el trabajo de las actividades de Obra realizadas durante el mes de marzo en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041-2023.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

FR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DEL DÍA:

-Saludo
-Presentación de los asistentes
- Desarrollo de la reunión
-Cierre.

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 3:00pm se da inicio a la reunión, el director de obra toma la palabra y menciona que hasta la fecha se ha logrado un avance ejecutado del 91,92%. correspondiente a la semana 102, El director de Obra informa que el avance ejecutado acumulado coincide con el porcentaje programado.

A su vez, El residente de Obra informa que se han realizado actividades de construcción de pozo de inspección en redes emisarios de H= 2.5 - 3.0 Ø 1.50 m en el sector de Alameda. Tambien informa que se esta realizando actividades de reparaciones derivadas de intervenciones en redes domiciliarias, tales como: reparación de acometidas Pf + UAD de 1/2" para aqueducto, reparación de tubería de gas en polietileno PE-80 de 1/2" e instalación de unión de reparación de RDE 21 de 3" y corte, demolición y reposición de andenes en concreto de 3000 psi en el sector de la ciudadela Bendición.

El representante de la Interventoria menciona que han realizado una verificación detallada de las actividades ejecutadas por el contratista de obra y ratifica los porcentajes de avance mencionados por el contratista de Obra es consistente con las observaciones e inspecciones hechas en campo.

Validando así que corresponde al progreso real de la obra.

A su vez agrega que se ha verificado que se cumpla a cabalidad con los parametros técnicos y de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades de obra garantizando así la durabilidad de esta.

Se da por finalizado el comité de obra y se firma la presente acta por quienes en ella participaron.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Acuerdos y compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento

4) FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Daniel Alexander G.
CARGO: Director de Obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO: Residente Interventoría

NOMBRE: Nelson Rodriguez T
CARGO: Residente obra

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

ACTAS DE REUNION DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

- SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023

Fecha de la Reunión:			Hora de inicio	Hora de finalización
2026	03	05	3:00 PM	4:00 PM

LUGAR DE LA REUNIÓN: ACUATODOS S.A. E.S.P.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Daniel Alexander Gil Chaparro	Director de Obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
2	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
4	Nelson Armando Rodríguez	Residente de obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
5			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento a la ejecución del contrato de obra pública No. 041 de 2023.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Presentación de los asistentes
3. Socialización del avance en porcentaje de las actividades del contrato de obra No. 041 de 2023, aspectos técnicos y otras actividades inherentes a la ejecución del contrato.
4. Dudas e inquietudes
5. Cierre de la reunión

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 3:00 p.m., con el saludo y la presentación de los asistentes. El supervisor del contrato abre la sesión indicando que el objetivo principal es realizar un seguimiento detallado a la ejecución y avance del Contrato de Obra No. 041 de 2023. Asimismo, se busca verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo aspectos fundamentales para garantizar que el proyecto se desarrolle conforme a los estándares exigidos y que sus beneficios se materialicen de manera efectiva para la comunidad.

El contratista informa que actualmente se adelantan actividades en diferentes frentes de obra. En el sector Ciudadela La Bendición, se ejecutan labores de reparación derivadas de intervenciones en redes domiciliarias, entre las que se incluyen: reparación de acometidas PF + UAD de ½" para acueducto, reparación de tubería de gas en polietileno PE-80 de ½", instalación de unión de reparación RDE 21 de 3", así como la reparación de acometidas eléctricas subterráneas con cable de aluminio No. 6 y cable concéntrico de cobre. De igual forma, se desarrollan actividades de corte, demolición y reparación de andenes en concreto de 3000 PSI.

El interventor manifiesta que, durante las visitas de campo, se ha evidenciado personal laborando sin el uso completo de los elementos de protección personal, específicamente sin guantes o sin camisa de manga larga en algunos frentes de obra. Indica además que esta situación fue objeto de llamado de atención verbal y comunicada al residente de obra para la implementación de las acciones correctivas correspondientes.

En respuesta, el contratista señala que se han atendido las observaciones formuladas por la interventoría y que se han adoptado medidas para garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de todo el personal vinculado al Consorcio Bendición 23. Asimismo, informa que se mantiene control permanente sobre el

cumplimiento de las disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la correcta señalización de los frentes de trabajo y zanjas de excavación. Adicionalmente, se realizan charlas periódicas de seguridad, orientadas a reforzar las buenas prácticas laborales y la prevención de riesgos.

El contratista también destaca que se están ejecutando los controles de calidad requeridos, tales como la toma de muestras para ensayos de laboratorio y demás pruebas técnicas, asegurando que las actividades reportadas han sido previamente verificadas y avaladas por la interventoría, en cumplimiento de los criterios técnicos exigidos.

Por su parte, el supervisor enfatiza la importancia de garantizar no solo la calidad de la obra, sino también de los procesos constructivos. Reitera la obligatoriedad del uso adecuado de los elementos de protección personal y la necesidad de contar con procedimientos claros para el manejo de residuos de construcción y la protección de la fauna. Frente a esto, el contratista confirma que dichas medidas se están implementando conforme a lo establecido, indicando que se cuenta con protocolos especificos para el manejo ambiental, los cuales son socializados periódicamente al personal mediante las charlas diarias.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Próxima reunión el día doce de marzo de 2026.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre Cargo Acuatodos.	Nombre Daniel Alexander G. Cargo Director de Obra.
Nombre Zaira Andrea Duran Cargo Residente Interventoría	Nombre Nelson Rodriguez S. Cargo Residente obra
Nombre Cargo	Nombre Cargo

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

- SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
2026 | 03 | 12	8:00 AM	9:00 AM

LUGAR DE LA REUNIÓN: ACUATODOS S.A. E.S.P.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Daniel Alexander Gil Chaparro	Director de Obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
2	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
4	Nelson Armando Rodríguez	Residente de obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
5			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento a la ejecución del contrato de obra pública No. 041 de 2023.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Presentación de los asistentes
3. Socialización del avance en porcentaje de las actividades del contrato de obra No. 041 de 2023, aspectos técnicos y otras actividades inherentes a la ejecución del contrato.
4. Dudas e inquietudes
5. Cierre de la reunión

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 08:00 a.m., se da inicio a la reunión con el saludo y la presentación de los asistentes.

El director de obra manifiesta que el comité se convoca con el propósito de realizar seguimiento periódico y detallado a la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad establecidos.

El representante legal de la interventoría toma la palabra e informa que se ha realizado una revisión minuciosa de las actividades reportadas por el contratista, destacando la rigurosidad y transparencia en la gestión del proyecto.

Posteriormente, el supervisor solicita al contratista informar sobre las actividades que se encuentran en ejecución a la fecha, a lo cual el contratista responde que se están desarrollando las siguientes:

- Excavación mecánica en material común.
- Construcción de pozos de inspección de redes internas con las siguientes especificaciones: H=2.0–2.5 m Ø 1.50 m; H=3.0–3.5 m Ø 1.50 m; H=4.0–4.5 m Ø 1.50 m en los sectores de La Bendición y Alameda.
- Construcción de acometidas domiciliarias en el sector Ciudadela La Bendición.
- Actividades de reparación derivadas de intervenciones en redes domiciliarias, tales como: reparación de acometidas PF + UAD de ½" para acueducto, reparación de tubería de gas en polietileno PE-80 de ½" e instalación de unión de reparación RDE 21 de 3".
- Corte, demolición y reposición de andenes en concreto de 3000 PSI.

- Construcción de cajas de inspección en el sector Ciudadela La Bendición.

El coordinador del proyecto señala que las actividades de obra se vienen ejecutando sin contratiempos significativos, sin afectaciones al cronograma ni a la calidad de la obra. Asimismo, indica que las actividades cumplen con los requisitos técnicos y de calidad establecidos en el contrato.

El residente de interventoría ratifica que se ha verificado que los materiales utilizados en la ejecución del proyecto cumplen con las especificaciones técnicas y normativas vigentes, garantizando su resistencia y durabilidad conforme a los requerimientos del proyecto.

Como conclusión, la supervisión establece que, de acuerdo con lo reportado por el contratista y verificado por la interventoría, se evidencia un adecuado desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Finalmente, la supervisión reitera su disposición como entidad contratante para brindar acompañamiento ante cualquier situación que se presente durante la ejecución del proyecto.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Próxima reunión el día veintiséis de marzo de 2026.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre [illegible] Andres Diaz Cargo Residente Interventoria	Nombre [illegible] Cargo Acuatodos Apoyo
Nombre Daniel Alejander Gil Cargo Director de obra.	Nombre Nelson Rodriguez S. Cargo Residente obra
Nombre Cargo	Nombre Cargo

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: - Seguimiento a la ejecución del contrato de Obra No. 041-2023.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
2026 | 08 | ~~17~~	9:00 am	12:00 pm

LUGAR DE LA REUNIÓN: Campamento de Obra

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Miguel Ángel Farias	Subgerente técnico y operativo	ACUATODOS SA ESP
2	Roberto Rios Figueroa	Profesional de Apoyo	ACUATODOS SA ESP
3	Jorge Muñoz	Profesional de Apoyo	ACUATODOS SA ESP
4	Gabriel Andres Duran	Representante de Interventoria	Consorcio PR-HK
5	Marcela Salazar	Profesional de Apoyo	Consorcio Bendición 23
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar la verificación en campo, mediante visita y recorrido de Obra de las actividades ejecutadas y reportadas por el contratista de obra en el Acta de cobro parcial No. 23 con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas, planos, y cantidades de Obra.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.
2. Presentación de los asistentes.
3. Socialización del avance en porcentaje de las actividades del Contrato de Obra No. 041-2023, aspectos técnicos y otras actividades inherentes a la ejecución del contrato.
4. Recorrido de Obra y verificación en campo de las actividades reportadas en el acta de cobro parcial No. 23.
5. Dudas e Inquietudes.
6. Cierre de la reunión.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión a las 9:00 am en el campamento de obra, Se realiza la respectiva presentación de los asistentes. En atención al orden del día establecido, se procede a realizar la verificación del avance de ejecución alcanzando en el mes de febrero. y a la ird identifitación de las actividades incluidas para el cobro en el acta parcial No. 23. Toma la palabra, el representante de obra y expone las labores en curso y las que han sido objeto de avance físico verificable en el mes de febrero. A su vez informa que el porcentaje de avance acumulado es de 91,34% con fecha de corte al 28 de febrero de 2026. e informa que dentro de las cantidades de obra reportadas para el cobro de acto parcial No. 23 se encuentran dos (2) tramos de colectores, seis (6) pozos de inspecaón, cinco (5) cámaras de Inspecaón y reparaciones. Igualmente, El contratista de obra informa a la sperisión e Interventoria la metodologia de la visita, visitando los puntos del cobro anterior como del presente cobro. Posteriormente, se visitaros los puntos señalados con acompañamiento del contratista de obra, sperisión e Interventoria, en donde se evidencia la ejecución de actividades conforme a los planos y especificaciones técnicos, asi mismo, el uso de elementos de protección personal de los trabajadores en campo. La sperisión concluye que el avance de ejecución corresponde con el avance financiero y con lo construido en campo. Por lo tanto, autorizan la Suscripción del acta de cobro Parcial No. 23 del contratista de obra. Para finalizar se deja constancia de que todos los puntos del orden del día fueron abordados a satisfacción

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Proxima reunión el dra 26 de marzo de 2026.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre [illegible]
Cargo Fiscal/Interventoría

Nombre Marcela Salazar O
Cargo Profesional de Apoyo Consejo Bendición 23.

Nombre Apoyo Acuatodos
Cargo

Nombre Jorge Armando Muñoz
Cargo prof Apoyo Acuatodos

Nombre Miguel Perlaza
Cargo Sub gerente

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

- SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
2026 | 03 | 25	11:00 AM	12:00 AM

LUGAR DE LA REUNIÓN: ACUATODOS S.A. E.S.P.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Daniel Alexander Gil Chaparro	Director de Obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
2	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
4	Nelson Armando Rodríguez	Residente de obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
5			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento a la ejecución del contrato de obra pública No. 041 de 2023.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Presentación de los asistentes
3. Socialización del avance en porcentaje de las actividades del contrato de obra No. 041 de 2023, aspectos técnicos y otras actividades inherentes a la ejecución del contrato.
4. Dudas e inquietudes
5. Cierre de la reunión

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:00 a.m., se da inicio a la reunión con el saludo y la presentación de los asistentes.

El director de obra toma la palabra e informa que, a la fecha, el proyecto presenta un avance aproximado del 91%. A continuación, relaciona las actividades que actualmente se encuentran en ejecución:

- Excavación mecánica en material común.
- Construcción de pozos de inspección de redes internas con las siguientes especificaciones: H=2.5–3.0 m Ø 1.50 m y H=3.5–4.0 m Ø 1.50 m, en los sectores de La Bendición y Alameda.
- En el sector Ciudadela La Bendición, ejecución de actividades de encamado de tubería con arena apisonada (arena de río), así como el suministro e instalación de tubería PEAD corrugada de 150 mm (SN8) para alcantarillado y kits de acometidas domiciliarias en el mismo diámetro.
- Actividades de reparación derivadas de intervenciones en redes domiciliarias, tales como: reparación de acometidas PF + UAD de ½" para acueducto, reparación de tubería de gas en polietileno PE-80 de ½" e instalación de unión de reparación RDE 21 de 3".
- Corte, demolición y reposición de andenes en concreto de 3000 PSI.
- Construcción de cajas de inspección en el sector Ciudadela La Bendición.
- Construcción de pozos de inspección de redes emisarios con las siguientes especificaciones: H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m en el sector de Alameda.

El director de obra precisa que el avance reportado ha sido previamente revisado y avalado por la interventoría, garantizando la veracidad de la información presentada.

El representante legal de la interventoría interviene para ratificar los porcentajes de avance expuestos, indicando que se ha realizado una verificación detallada de las actividades ejecutadas por el contratista. Señala que este proceso permite asegurar la consistencia y confiabilidad de la información reportada, destacando la transparencia y el rigor en la gestión del proyecto.

Por su parte, la supervisión enfatiza la importancia de garantizar la calidad en cada una de las actividades ejecutadas, resaltando la relevancia del proyecto para el desarrollo del municipio y el mejoramiento del acceso al servicio de alcantarillado en los sectores de Alameda y Ciudadela La Bendición. Asimismo, reitera la necesidad de cumplir con los estándares técnicos, de seguridad y ambientales establecidos.

Finalmente, el supervisor manifiesta su conformidad con el avance de obra y ratifica el compromiso de ACUATODOS S.A. E.S.P. en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de garantizar la ejecución de una obra estable, segura y de alta calidad.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Próxima reunión el día seis de abril de 2026.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre: Daniel Alexander G.T Cargo: Director de obra	Nombre: Nelson Rodriguez S. Cargo: Residente obra
Nombre: Gabriel Andres Duran Cargo: Residente Interventoría	Nombre: Cargo: Apoyo Acuatodos
Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo:

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:
- SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023

Fecha de la Reunión:			Hora de inicio	Hora de finalización
2026	03	26	11:00 AM	12:00 AM

LUGAR DE LA REUNIÓN: ACUATODOS S.A. E.S.P.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Leonardo Cardenas	Gerente proyecto	Consorcio Bendición 23 - Obra
2	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
4	Hoyne Avila	Esp. geotecnia Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
5	Miguel Bello	Profesional de apoyo	Consorcio Bendición 23 - Obra
6			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Atender inquietudes por parte de la comunidad y veeduría de Alameda Martha Mojica.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Solicitudes de la comunidad
3. Resolver Inquietudes e inconvenientes de la comunidad
4. Conclusiones y cierre de la reunión

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la sesión, los representantes de la comunidad del sector Alameda Martha Mojica manifiestan su inquietud frente a la ausencia de tapas en algunos pozos de inspección y cajas de registro en zonas intervenidas, señalando los riesgos que esta situación representa para la seguridad de los habitantes y la movilidad en el sector.

En respuesta, el contratista de obra informa que durante el año inmediatamente anterior se instalaron ciento treinta y cuatro (134) tapas en estructuras completamente terminadas; sin embargo, estas fueron objeto de hurto debido a actos de vandalismo. Indica que se implementaron medidas como la fijación mediante soldadura, las cuales no resultaron efectivas. Así mismo, precisa que la situación fue puesta en conocimiento de la entidad contratante, la cual reiteró que la responsabilidad sobre dichos elementos recae en el contratista hasta la suscripción del acta de recibo final.

Adicionalmente, se menciona que el campamento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) también fue afectado por hurto, con una pérdida aproximada de una (1) tonelada de acero, lo que evidencia la recurrencia de estas situaciones en el área del proyecto.

En consideración a lo anterior, el contratista señala que ha optado por programar la instalación de las tapas en la etapa final de ejecución, con el fin de evitar nuevas pérdidas. No obstante, indica que se han implementado medidas de señalización preventiva en los puntos que representan riesgo para la comunidad.

En relación con lo anterior, se informa que la señalización es objeto de revisión y reposición periódica, con una

frecuencia mensual, garantizando su visibilidad y funcionalidad. Así mismo, se aclara que los sectores donde no se evidencia señalización corresponden a frentes activos con presencia permanente de personal. De manera complementaria, se realizan inspecciones semanales a los puntos críticos del proyecto para verificar el estado de las condiciones de seguridad e intervenir oportunamente en caso de requerirse.

Por otra parte, el contratista informa que se ha intentado concertar una reunión con los responsables de las redes de acueducto y gas, con el propósito de verificar la información técnica disponible y evitar interferencias durante la ejecución de las actividades. Al respecto, se pone de presente que no se cuenta con planos récord de las redes existentes, sino únicamente con planos de diseño que presentan inconsistencias frente a la realidad en campo, lo cual ha dificultado las labores de excavación y aumenta el riesgo de afectación a dichas infraestructuras.

En este contexto, el contratista considera necesario el acompañamiento técnico de los responsables de estas redes, así como el suministro de información actualizada que permita una adecuada identificación de las interferencias.

Así mismo, se indica que las empresas prestadoras del servicio de acueducto (EAAAY E.I.C.E. E.S.P.) y gas no han recibido formalmente las redes construidas, situación que limita la disponibilidad de información validada y dificulta la coordinación en campo.

Frente a esta situación, la comunidad resalta la importancia de que en la mesa de trabajo programada en el sector Alameda Martha Mojica participen los contratistas de acueducto y gas, así como la entidad contratante ASISURPO, con el fin de mejorar la articulación y facilitar el acceso a la información requerida.

Por su parte, la interventoría confirma que lo expuesto por el contratista corresponde a las condiciones evidenciadas en campo, particularmente en lo relacionado con la falta de información confiable y las dificultades de coordinación entre los diferentes actores.

El contratista reitera su disposición permanente para atender los requerimientos de la comunidad, participando activamente en los espacios de diálogo y brindando respuesta a las inquietudes presentadas.

En otro punto, una representante de la comunidad expone una queja relacionada con el comportamiento del personal de vigilancia en la EBAR. Al respecto, se aclara que el consorcio no cuenta con competencia para adelantar actuaciones de carácter disciplinario, por lo que se recomienda acudir a las instancias competentes mediante los canales formales.

Seguidamente, el señor Carlos Salazar destaca la importancia de que la comunidad contribuya en el cuidado de las obras, promoviendo acciones de vigilancia y protección. En complemento, una representante de la comunidad manifiesta que los residentes han venido apoyando estas labores, colaborando con el personal del proyecto en el resguardo de las infraestructuras.

Posteriormente, la comunidad consulta sobre la posibilidad de ejecutar mejoramientos viales en los sectores donde se han finalizado actividades. El contratista indica que estas intervenciones se realizarán una vez se culminen completamente las obras en cada tramo, incluyendo las labores de paisajismo previstas.

De igual manera, el señor Carlos Salazar expresa su preocupación frente a la proximidad de la temporada de lluvias y los posibles efectos sobre las excavaciones y frentes de trabajo. En atención a ello, el contratista informa que se encuentra finalizando la ruta crítica en el sector Ciudadela La Bendición, lo cual permitirá habilitar nuevos frentes de trabajo en Alameda Martha Mojica y avanzar en las actividades programadas.

Finalmente, el señor Carlos Salazar solicita apoyo para las actividades de mejoramiento vial previstas en la etapa 4 de Alameda Martha Mojica, las cuales se desarrollarán con el respaldo de la Gobernación y la Secretaría de Obras Públicas, requiriendo coordinación para evitar interferencias con el proyecto en ejecución. Así mismo, consulta sobre la disponibilidad de una volqueta para el transporte de material. El representante del consorcio indica que se evaluará la viabilidad de esta solicitud, de acuerdo con las condiciones operativas del proyecto.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Próxima reunión el día seis de abril de 2026.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre: Leonardo Cardenas S. Cargo: Gerente Proyecto.	Nombre: Cargo: Residente de Interventoría.
Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo: Acuatodos
Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo:

acuatodos s.a. E.S.P.

REGISTRO DE ASISTENCIA
SIG MECA
GIC-F-15
18/08/2015
V-02

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	GERENCIA
				HORA		

OBJETO

TEMAS A TRATAR

1 ..... 5 .....
2 ..... 6 .....
3 ..... 7 .....
4 ..... 8 .....

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO/e-mail	HORA	FIRMA
1	Rafael Rodriguez	Comunidad		3205153964		4:30 Pm	
2	Giovanny Medina	Contratista	Apoyo Profesional	3124412052		4:00 Pm	
3	Pedro Rios	Acuatodos	Prof Adm	3123635		4: de	
4	Maria Consuelo Gaitan Pena	A. M. M	Lider	3115[illegible]10 24		3:00pm	
5	Carlos Salazar	R.L. Veeduria	Veeduria	3103365698		4:00 pm.	
6	Rosa Yolanda Abril Arangurem	A. M. M.	Lider	3123351338		04:00pm	Rosa Yolanda A.A
7	Marcela Salazar Ochoa	Contratista	P.A. Apoyo	3052446646		04:00pm	
8							
9							
10							
11							
12							

OBSERVACIONES

.....
.....
.....

acuatodos s.a. E.S.P.

REGISTRO DE ASISTENCIA
SIG MECA
GIC-F-15
18/08/2015
V-02

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	GERENCIA
				HORA		

OBJETO

TEMAS A TRATAR

1 ..... 5 .....
2 ..... 6 .....
3 ..... 7 .....
4 ..... 8 .....

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO/e-mail	HORA	FIRMA
1	Miguel Angel Bello	Contratista obra	apoyo profesional	3217411603		3:40	
2	Jose Inocencio Plaza	ST comunican		3213367174		3:40	
3	YENNY ARIZA	comunida		3115789878		346	YENNY
4	Jaqueline Adz	Comunida		3227840752		348	Jaqueline Adz
5	JESSAFIN HERNANDEZ	COMUNIDAD		3102911926		349	
6	Gloria Figueredo	COMUNIDA		3228574309		349	
7	Jose Inocencio Plaza	465245		3144437935		3:00	
8	Diana Carolina Vianchá Alfonso.	Beneficiaria de Alameda Martha Mojica	Residente	3119226077	vianchadiana1@gmail.com	3:52	Diana C. Vianchá.
9	José Uribe Jimenez	Comunidad		3118004473		3-54	
10	Lucy N. Boyacá A.	Comunidad Ocupante	Ocupante	3106741059	lucyboyaca3a@gmail.com		
11	Carina Cacles Lince	Comunidad		3114819138			
12	Fiofilo Fabio gonzalez	comunidad	Ocupante	3204182649		4 PM	Fiofilo

OBSERVACIONES

.....
.....
.....

659

CORRESPONDENCIA ENVIADA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 05 de marzo de 2026

Recibido!
05/03/2026
9:00 am
Consorcio PR-HK

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No. 25**

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito hacerle entrega del **INFORME MENSUAL DE OBRA No. 25** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2026 del contrato de obra No. 041 de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Para lo anterior se hace entrega del informe original y sus respectivos anexos.

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

652

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 05 de marzo de 2026

Recibido:
05/03/2026
9:01am
Consorcio PR-HK

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME PARCIAL DE OBRA No. 23**

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito hacerle entrega del **INFORME PARCIAL DE OBRA No. 23** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 del contrato de obra No. 041 de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Para lo anterior se hace entrega del informe original y sus respectivos anexos.

No. de folios: 679 + 1 cd

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

653

Outlook

RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN SEÑORA OMAIRA VILLEGAS CONTRERAS

Desde Consorcio Bendicion 23 <consorciobendicion23@theos.com.co>
Fecha Mié 11/03/2026 16:13
Para riadaingenieria <riadaingenieria@gmail.com>; subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
20260306 - RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN OMAIRA ACUATODOS.pdf;

Yopal, 6 de marzo de 2026

SEÑORES:
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Ing. Miguel Ángel Farías Osorio
Subgerente técnico y operativo
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN SEÑORA OMAIRA VILLEGAS CONTRERAS**

En mi calidad de representante legal del CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, y en atención al derecho de petición presentado por usted, mediante el cual solicita la verificación técnica de la acometida eléctrica del predio ubicado en la Manzana 44, Casa 28, Ciudadela La Bendición, y en el que manifiesta una presunta afectación ocasionada durante actividades de excavación relacionadas con la ejecución de obras de alcantarillado, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

Una vez revisado el contenido de su solicitud, y con el fin de verificar las condiciones actuales de la acometida eléctrica objeto de reclamación, se llevó a cabo visita técnica al inmueble, con el propósito de inspeccionar el estado físico y funcional de la acometida y establecer si existían anomalías asociadas a los hechos puestos en conocimiento.

De conformidad con el informe técnico de visita, se realizó la verificación de una acometida eléctrica trifásica en conductor 3x6 + 1x6 en cobre, asociada al predio antes referido. Durante la diligencia, la usuaria manifestó que la acometida había sido averiada y posteriormente empalmada. En desarrollo de la inspección se efectuó revisión visual externa de la acometida, sin evidenciarse conductores expuestos,

654

empalmes visibles irregulares, deterioro aparente del aislamiento o condiciones externas que representaran riesgo eléctrico inminente.

De igual manera, durante la visita se efectuó medición de tensiones en el punto de conexión, sin encontrarse fallas, interrupciones, pérdidas de continuidad ni variaciones anormales en el suministro eléctrico. Técnicamente se verificó que la acometida se encuentra operando de manera estable y dentro de condiciones normales de funcionamiento al momento de la inspección.

Es importante indicar que, para este tipo de acometida, en caso de haberse requerido un empalme, el procedimiento técnico adecuado corresponde al empleo de conectores tubulares debidamente prensados, complementados con protección mediante cinta autofundente y cinta aislante, con el fin de garantizar el aislamiento, la continuidad del conductor y la seguridad eléctrica de la instalación. No obstante, durante la visita no se observaron señales externas que permitieran concluir la existencia de una condición anómala o insegura en la acometida inspeccionada.

En consecuencia, con fundamento en la verificación técnica realizada, se concluye que la acometida trifásica 3x6 + 1x6 en cobre se encuentra en condiciones técnicas normales y operando correctamente, sin que se evidencien fallas eléctricas, recalentamientos, pérdidas de continuidad, afectaciones en la prestación del servicio o anomalías asociadas a la situación manifestada en su escrito. Por tanto, no se encontró mérito técnico que haga procedente ordenar intervención, cambio total del cableado o ejecución de reparación adicional por parte del contratista, al no evidenciarse afectación actual en las condiciones de seguridad o funcionamiento de la acometida.

La presente respuesta se emite con base en los hallazgos observados durante la visita técnica realizada.

Sin otro particular,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 6 de marzo de 2026

SEÑORES:
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Ing. Miguel Ángel Farías Osorio
Subgerente técnico y operativo
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN SEÑORA OMAIRA VILLEGAS CONTRERAS**

En mi calidad de representante legal del CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, y en atención al derecho de petición presentado por usted, mediante el cual solicita la verificación técnica de la acometida eléctrica del predio ubicado en la Manzana 44, Casa 28, Ciudadela La Bendición, y en el que manifiesta una presunta afectación ocasionada durante actividades de excavación relacionadas con la ejecución de obras de alcantarillado, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

Una vez revisado el contenido de su solicitud, y con el fin de verificar las condiciones actuales de la acometida eléctrica objeto de reclamación, se llevó a cabo visita técnica al inmueble, con el propósito de inspeccionar el estado físico y funcional de la acometida y establecer si existían anomalías asociadas a los hechos puestos en conocimiento.

De conformidad con el informe técnico de visita, se realizó la verificación de una acometida eléctrica trifásica en conductor 3x6 + 1x6 en cobre, asociada al predio antes referido. Durante la diligencia, la usuaria manifestó que la acometida había sido averiada y posteriormente empalmada. En desarrollo de la inspección se efectuó revisión visual externa de la acometida, sin evidenciarse conductores expuestos, empalmes visibles irregulares, deterioro aparente del aislamiento o condiciones externas que representaran riesgo eléctrico inminente.

De igual manera, durante la visita se efectuó medición de tensiones en el punto de conexión, sin encontrarse fallas, interrupciones, pérdidas de continuidad ni variaciones anormales en el suministro eléctrico. Técnicamente se verificó que la acometida se encuentra operando de manera estable y dentro de condiciones normales de funcionamiento al momento de la inspección.

Es importante indicar que, para este tipo de acometida, en caso de haberse requerido un empalme, el procedimiento técnico adecuado corresponde al empleo de conectores tubulares debidamente prensados, complementados con protección mediante cinta autofundente y cinta aislante, con el fin de garantizar el aislamiento, la continuidad del conductor y la seguridad eléctrica de la instalación. No

obstante, durante la visita no se observaron señales externas que permitieran concluir la existencia de una condición anómala o insegura en la acometida inspeccionada.


En consecuencia, con fundamento en la verificación técnica realizada, se concluye que la acometida trifásica 3x6 + 1x6 en cobre se encuentra en condiciones técnicas normales y operando correctamente, sin que se evidencien fallas eléctricas, recalentamientos, pérdidas de continuidad, afectaciones en la prestación del servicio o anomalías asociadas a la situación manifestada en su escrito. Por tanto, no se encontró mérito técnico que haga procedente ordenar intervención, cambio total del cableado o ejecución de reparación adicional por parte del contratista, al no evidenciarse afectación actual en las condiciones de seguridad o funcionamiento de la acometida.


La presente respuesta se emite con base en los hallazgos observados durante la visita técnica realizada. A continuación, se adjunta el correspondiente registro fotográfico:





Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

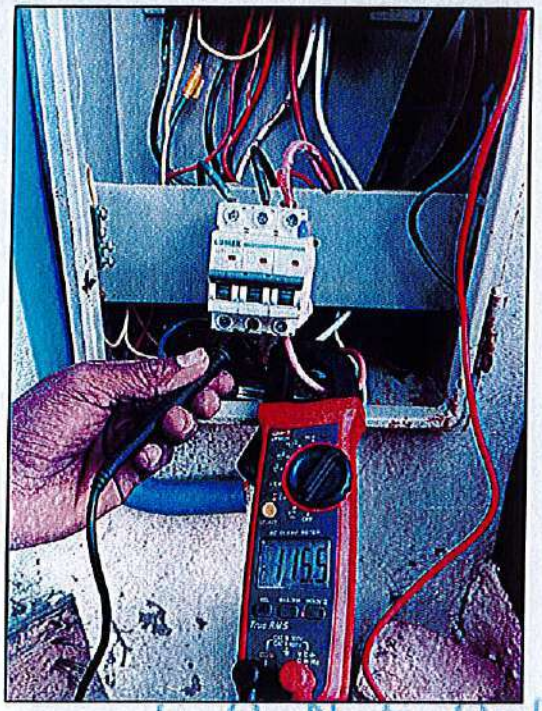

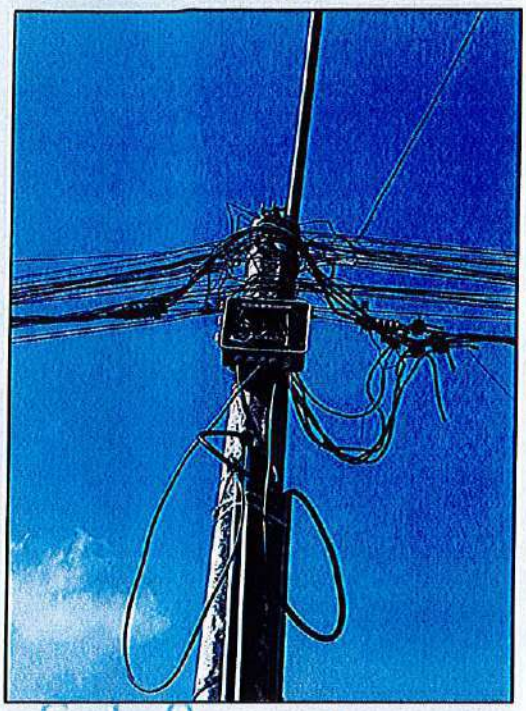

Sin otro particular,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 24 de marzo 2026

Señora:
ALIX YADIRA MORA DAZA
Yopal-Casanare

REFERENCIA: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE INSCRIPCIÓN DE MEDIDOR ANTE ENERCA S.A E.S.P.

Cordial saludo,

Por medio del presente se hace entrega formal de los documentos solicitados por la señora **Alix Yadira Mora Daza**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1118535429, los cuales son requeridos para adelantar el trámite de inscripción del nuevo medidor ante la empresa **ENERCA S.A. E.S.P.**

Se realiza entrega de los siguientes documentos:

1. Fotocopia de cedula del técnico.
2. Tarjeta profesional del técnico.
3. FT-MAC-AC-29 - Declaración de cumplimiento de instalaciones eléctricas (diligenciada por el técnico particular.)
4. Factura de compraventa del medidor y protocolo original.
5. Oficio por parte del consorcio de certificación técnica de evento, reparación de acometida y sustitución de equipo de medida.

Lo anterior, en razón a que se efectuó el cambio del equipo de medición en el inmueble ubicado en la Ciudadela La Bendición Manzana 115 Casa 6, siendo necesario realizar el respectivo registro y actualización ante la entidad prestadora del servicio.

En consecuencia, se realiza la presente entrega de documentos para que la interesada se acerque a las oficinas de la empresa prestadora del servicio y continúe con el trámite administrativo correspondiente.

Cordialmente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 24 de marzo de 2026

Señores:
ENERCA S.A E.S.P.
Yopal – Casanare

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE EVENTO, REPARACIÓN DE ACOMETIDA Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA.**

Por medio de la presente y en mi calidad de Especialista Eléctrico del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito informar y certificar lo siguiente respecto del predio ubicado en la Ciudadela La Bendición Manzana 115 Casa 6:

1. Descripción del evento

Durante actividades de excavación con retroexcavadora asociadas a la ejecución del contrato de la referencia, el día, se presentó un daño accidental sobre la acometida eléctrica domiciliaria, consistente en jalonamiento/tracción involuntaria del conductor por interacción con el equipo mecánico. Como consecuencia, se generó un evento de cortocircuito, ocasionando la afectación del equipo de medida (medidor de energía) del inmueble.

2. Acciones correctivas ejecutadas

Una vez identificado el incidente, se realizó atención inmediata que incluyó:


- Aseguramiento del punto e implementación de medidas de control para mitigación de riesgo eléctrico.
- Reparación de la acometida eléctrica domiciliaria, mediante reposición del tramo afectado y normalización de la conexión.
- Sustitución del medidor de energía por equipo nuevo e instalación en el punto de medición, dejando el sistema operativo.
- Verificación final de funcionamiento y restablecimiento del servicio.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


3. Datos del equipo de medida

Medidor retirado (afectado):

- Marca: SUNRISE
- Serial / No.: 243410341
- Configuración: Trifásico Tetrafilar
- Lectura al momento del daño: 1371,40 kWh
- Observación del estado: Medidor presenta daño físico – fuera de servicio.

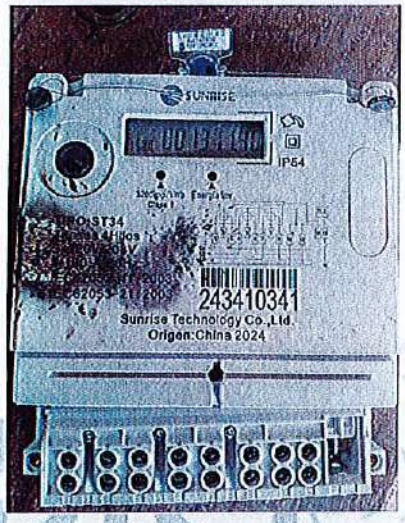

Medidor instalado (nuevo):

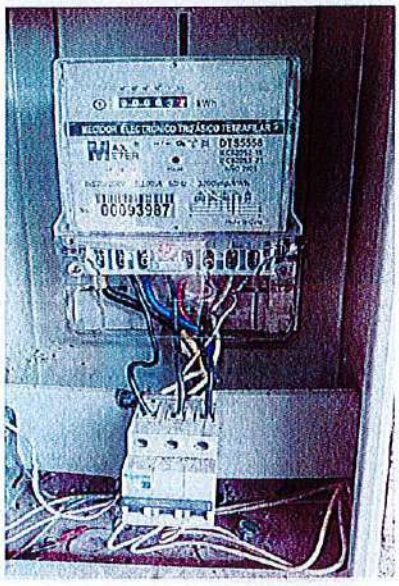

CONSORCIO BENDICIÓN 23

- Marca: MAX METER
- Modelo/Tipo: DTS5558
- Serial / No.:00093987
- Configuración: Trifásico Tetrafilar
- Observación del estado: Medidor Nuevo Instalado

En virtud de lo expuesto, certifico que el evento descrito se originó por una situación accidental derivada de las actividades constructivas y que, una vez identificado, se ejecutaron de manera inmediata las acciones necesarias para restituir las condiciones de seguridad, continuidad y funcionalidad del servicio, incluyendo la reparación de la acometida eléctrica domiciliaria y la sustitución del equipo de medida.

Así mismo, se deja constancia de que todas las actividades asociadas a la intervención, reparación y reinstalación fueron ejecutadas por personal competente, conforme a las especificaciones técnicas aplicables, las condiciones de instalación del operador de red y la normativa vigente relacionada con seguridad eléctrica y sistemas de medida, garantizando la correcta operación del punto intervenido.

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente a esa empresa se sirva tener por presentada la presente certificación como constancia formal del evento y de la corrección realizada, y se adelanten los trámites internos a que haya lugar para la validación, registro y/o actualización del equipo de medida instalado en el sistema comercial y técnico del usuario, así como cualquier verificación adicional que se considere pertinente.

Atentamente,

DIANA CAROLINA TOVAR

DIANA CAROLINA TOVAR CORTÉS
ESPECIALISTA ARÉA ELÉCTRICA
CONSORCIO BENDICIÓN 23
M.P CN205-87930

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CORRESPONDENCIA RECIBIDA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

Yopal, 02 de Marzo de 2026 **INF-056-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
CAJAS DE INSPECCIÓN

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **384** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7, 14 y 28 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-850

664

Yopal Casanare, 02 de Marzo de 2026 **INF-054-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.*

Asunto: Resultados de Toma de densidades Por El Método Del Cono y Arena -BASE GRANULAR- REDES

Cordial saludo,

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los ensayos realizados en Campo Densidad y Peso Unitario Del Suelo En El Terreno Por El Método Del Cono Y Arena, realizados al material tipo Base granular proveniente de la Cantera Morichal, fuente Río Charte, los cuales fueron elaborados bajo las normas INV E 161-13 del INVIAS.

- **En total: Seis (6) densidades tomadas**

Los ensayos realizados cumplen con el porcentaje mínimo de compactación Establecido por la norma Art 610-22 "Rellenos para estructuras" Tipo BG, Base Granular, donde se especifica un valor de compactación del 90% como mínimo.

Sin más particular y agradecidos por poner su confianza en nuestra labor.

Cordialmente:

ING. YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref. OS-879

665

Yopal, 02 de Marzo de 2026 **INF-053-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
POZOS

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **120** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7, 14 y 28 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-850-878

666

Yopal, 02 de Marzo de 2026 **INF-052-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
CAMARA DE INSPECCIÓN

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **176** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7, 14 y 28 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-850-878

667

DERECHO DE PETICIÓN
(Art. 23 Constitución Política de Colombia – Ley 1755 de 2015)

Ciudad: Yopal, Casanare

Fecha: 21/11/2025

Señores:

Empresa contratista de la ciudadela de la Bendición

Consorcio Bendición, 2023

Área de Atención al Usuario

Asunto: **Solicitud de reparación definitiva por daño en la cometida de energía eléctrica**

Yo, **Omaira Villegas Contreras**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 49656482, en calidad de propietario(a) del inmueble ubicado en **Calle 73 N° 7 oeste-81 (antiguo lote 28, manzana 44) ciudadela la bendición en el municipio de Yopal (Casanare)**, me permito presentar este DERECHO DE PETICIÓN en la modalidad de **reclamación**, con base en los siguientes:

HECHOS

1. En fecha 17/11/2025, personal contratado para realizar excavaciones relacionadas con el sistema de alcantarillado generó un **daño en la cometida de energía eléctrica** del inmueble mencionado.
2. En el momento del daño, **la vivienda no cuenta con habitantes**, por lo cual no existe riesgo para terceros desde el interior de la casa.
3. Los contratistas responsables, identificados como **Osvaldo y Óscar Duarte**, quienes se encuentran disponibles en el número de celular **3125725310**, realizaron un **arreglo provisional** del cableado.
4. Sin embargo, dicho arreglo **no garantiza la seguridad eléctrica**, ya que el cable quedó expuesto. Esta situación genera un **riesgo de ingreso de agua al cableado**, lo cual puede causar cortocircuitos, descargas eléctricas o daños mayores en la instalación.
5. Debido a lo anterior, la vivienda **no puede solicitar reinstalación ni restablecimiento formal del servicio**, pues el estado del cableado no cumple con las condiciones mínimas de seguridad eléctrica exigidas por su entidad.

PETICIONES

Respetuosamente solicito:

1. Que la empresa realice **una inspección técnica inmediata** al inmueble para verificar el daño generado en la cometida eléctrica.

2. Que se efectúe el cambio total del cableado ya que este no puede estar ñedido con cinta y así asegurando el cumplimiento de las normas técnicas vigentes.
3. Que se informe por escrito **quiénes serán los responsables del arreglo** y el **tiempo estimado de ejecución**.
4. Que se indique **si la empresa asumirá los costos** de la reparación o, en caso contrario, cuál es el **procedimiento para presentar formalmente la reclamación** ante los contratistas responsables del daño.
5. Que se me notifique la respuesta dentro de los términos legales establecidos por la Ley 1755 de 2015.

NOTIFICACIONES

Recibiré respuesta en:
Correo: Omairavillegascontreras@gmail.com
Teléfono: 3133760410
Dirección: Cra 8 N° 61-137 Torre 1 504- Conjunto Metrópolis II barrio real de minas, Bucaramanga-Santander

Atentamente,

Omaira Villegas Contreras

C.C. 49656482

9651535

CONSORCIO BENDICION 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 26
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

BITÁCORA DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

01/03/2026	Domingo. Residente Obra — Residente interventoría
02/03/2026	Lunes Soleado - Lluvioso Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición Residente Obra — Residente interventoría
03/03/2026	Martes, Soleado Continua construcción de pozos de inspección y acometid. domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente Obra — Residente interventor.
04/03/2026	Miercoles, Soleado. continua construcción de pozos de inspección y acometid. domiciliarios en ciudadela la bendición. Residente Obra — Residente interventor.
05/03/2026	Jueves, Soleado - Lluvioso Se realiza reunión de obra con participación del Supervisor, interventoría y director de obra. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarios en ciudadela la bendición. Residente Obra — Residente interventoría

06/03/2026	Viernes, soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
07/03/2026	Sabado, soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
08/03/2026	Domingo. Residente obra — Residente interventoría
09/03/2026	Lunes, soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
10/03/2026	Martes, soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría

11/03/2026	Miercoles, soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoria
12/03/2026	Jueves, soleado. Se realiza reunión de obra con participación del supervisor, interventoria y director de obra. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoria
13/03/2026	Viernes, soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoria
14/03/2026	Sabado, Lluviosa/ Soleado Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoria
15/03/2026	Domingo - Residente obra — Residente interventoria

16/03/2026	Lunes, Lluvioso - Soleado Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición, Residente obra — Residente interventoría
17/03/2026	Martes, Soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
18/03/2026	Miercoles, Soleado Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
19/03/2026	Jueves, Soleado. Se realiza reunión de obra con participación del Supervisor, interventoría y director de obra. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición Residente obra — Residente interventoría
20/03/2026	Viernes, Soleado Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría

21/03/2026	Sabado, Lluvias - Soleado Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición Residente Obra — Residente interventoria
22/03/2026	Domingo Residente Obra — Residente interventoria
23/03/2026	Lunes, Dia festivo Residente Obra — Residente interventoria
24/03/2026	Martes, Soleado. Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición Residente Obra — Residente interventoria
25/03/2026	Miercoles, Soleado Continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición Residente Obra — Residente interventoria
26/03/2026	Jueves, Soleado Se realiza reunión de obra con participación del Supervisor, interventoria y director de obra.

	Continúa construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
27/03/2026	Viernes, Soleado. Continúa construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
28/03/2026	Sabado, Soleado Continúa construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventoría
29/03/2026	Domingo Residente obra — Residente interventoría
30/03/2026	Lunes, Lluvioso / soleado Continúa construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. Residente obra — Residente interventor.
31/03/2026	Martes, Lluvioso - soleado. Continúa construcción de pozos de inspección y

acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición.

Residente obra

Residente interventoría

ACTAS DE VECINDAD



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	10	2025	3803	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 casa 8

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	NA	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	NA	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	NA	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NA.
FACHADA:	bloque a media altura sin pañete	OTRO: Cual?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	10	2025	3803	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 10 2025	3804	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: manzana 4 casa 9

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☑	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	NA	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	NA	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	NA	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NA
FACHADA:	Cerca, en lona con lamina de zinc.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 10 2025	3804	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23






Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

680

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3805	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

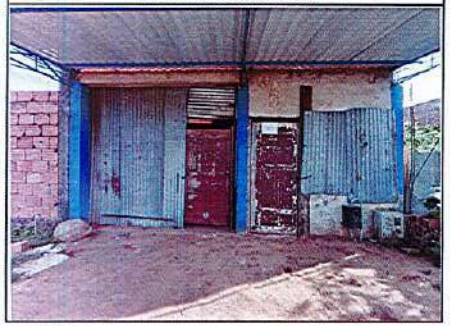

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Monica Lizeth Pardo
Dirección: Manzana 4 casa 10
Teléfono: 3202724823 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☑
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con columnas en madera, sin muros, sin vigas.	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	NA.	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con teja eternit.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	1 pozo ubicado al costado derecho del anden.
FACHADA:	Puertas en madera, con lamina de zinc, muros medio ladrillo	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

	Nombre:	CC:	
Propietario del predio	Monica Pardo	1.118.860.881	
Representante del Contratista de Obra	Nelson Rodriguez S.	1015.417.243	
Representante del Contratista de Interventoría	Gabriel Duran	9.516.424	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3805	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









	Nombre:	CC:	
Propietario del predio	Monica Pardo	1.118.860.881	
Representante del Contratista de Obra	Nelson Rodriguez S.	1015.417.243	
Representante del Contratista de Interventoría	Gabriel Duran	9.516.424	

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
01	10	2025	3806	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Montana 4 casa 11

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Batallo	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos:

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURAS:	Estructura en concreto con vigas y columnas.	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	NA	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	NA	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia pozo septico.
FACHADA:	Puerta metalica, con muros en bloque sin pañete	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:		Nombre:	Nelson Rodriguez S.	Nombre:	Gabriel Duran
CC:		CC:	1015.417.250	CC:	91.516.424
Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
01	10	2025	3806	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:		Nombre:	Nelson Rodriguez S.	Nombre:	Gabriel Duran
CC:		CC:	1015.417.250	CC:	91.516.424
Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria	

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3807	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 casa 12

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en arc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	Fisura en vidrio de la ventana, anden y pisos.
MUROS:	bloque con pañete sin pintura.	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con lamina madermit.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	concreto con esmalte verde	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	1 Pozo ubicado al costado derecho del cerramiento.
FACHADA:	carpinteria metalica con vidrio espejo	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516429
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3807	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23





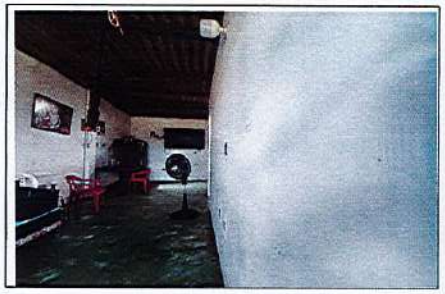

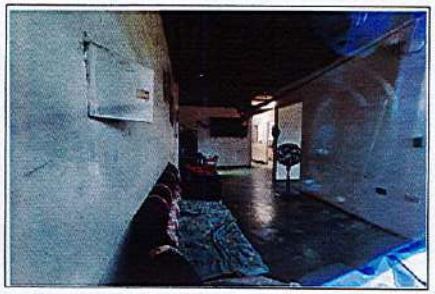





Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516429
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	10	2025	3808	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: manzana 4 casa 13

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☑	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	NA	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	NA	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	NA	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NA.
FACHADA:	Puerta metalica, con bloque sin pañete y Pintura.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Alvarán
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	10	2025	3808	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Alvarán
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	10	2025	3809	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Milena Barrajes
Dirección: Manzana 4 casa 24
Teléfono: 3143847032 No. piso: 1
Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑
4. Institucional	☐	Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con viga de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	Se evidencia grieta. y fisuras en viga y anden.
MUROS:	bloque con Pañete y Pintura.	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con lamina de zinc.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	1 Pozo ubicado al costado izquierdo del anden.
FACHADA:	Puerta ventana en lamina metalica con bloque sin Pañete	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Diana Barrajes	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Ramirez
Nombre: Diana Milena Barrajes	Nombre:	Nombre:
CC: 1120567092	CC: 1015.417.2??	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	10	2025	3809	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23





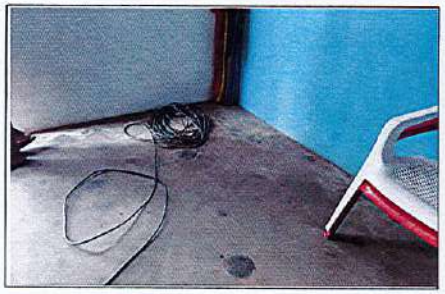







Diana Barrajes	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Ramirez
Nombre: Diana Milena Barrajes	Nombre:	Nombre:
CC: 1120567092	CC: 1015.417.2??	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3810	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. — CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 casa 17

Teléfono: No. piso: 1

Long. del frente (mts): 6 MT

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Se construye	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia fisuras y grietas.
MUROS:	bloque con pañete y pintura	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con lamina en zinc.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terminados con baldosa	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terminado con baldosa	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO se evidencia pozo septico.
FACHADA:	Carpinteria metalica con muros en bloque pañete y pintura.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.250 Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arcos CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3810	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. — CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.250 Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arcos CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3811	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 41 Casa 16

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	Bloque sin pañete	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con teja masternit.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NA
FACHADA:	Puerta metalica con muros sin pañete y pintura.	OTRO Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:		Nombre:	Nelson Rodriguez T.	Nombre:	Gabriel Parada
CC:		CC:	1015.417.210	CC:	9151624
Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3811	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:		Nombre:	Nelson Rodriguez T.	Nombre:	Gabriel Parada
CC:		CC:	1015.417.210	CC:	9151624
Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría	

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3812		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Israel Perez
Dirección: Manzana 4 casa 17
Teléfono: 318.4372010 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramentos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	Si garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	se evidencia grietas y fisuras en piso y anden.
MUROS:	bloque con pañete y pintura	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con teja eternit.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	1 pozo ubicado al costado derecho del anden.
FACHADA:	Carpinteria metalica con muros en bloque y pintura	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Israel Perez R	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Duran
Nombre: 9528390	Nombre:	Nombre:
CC: Israel Perez	CC: 1015.417.277	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

688

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 10 / 2025	3812		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Israel Perez R	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Duran
Nombre: 9528390	Nombre:	Nombre:
CC: Israel Perez	CC: 1015.417.277	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 10 / 2025	3813		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: manzana 4 casa 18

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☑	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	NA	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	NA	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NA
FACHADA:	NA	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplado en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Puron
CC:	1015.417.240	9151.6424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra / Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 10 / 2025	3813		







Nombre:	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Puron
CC:	1015.417.240	9151.6424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra / Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	3814		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 casa 7

Teléfono: No. pisos: 2

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramiento con malla	☐
		5. Concreto y mampostería	☑
		6. Mampostería no reforzada	☐
		7. Otro	☐
		Cual?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cual?	

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos:

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con viga de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia grietas y fisuras en anden.
MUROS: Piso 1 bloque con pañete Piso 2 bloque sin pañete	HUMEDADES: NA
CUBIERTA: Piso 1, Placa en bloque loa Piso 2 Estructura metalica con lamina Novatemit.	HUNDIMIENTO PISO: NA
PISOS: terminado con baldoza.	DESPLAZAMIENTOS: NA
ANDEN: Granito con baldoza gres.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo Ubicado al costado izquierdo del anden.
FACHADA: Carpinteria metalica con muros en bloque y pañete.	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: CC: Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.250 Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	3814		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: CC: Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.250 Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

069

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	05	2025	3815		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Omaira Bernal G.
Dirección: Manzana 4 casa 6
Teléfono: 3212341439 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	bloque con pañete y Pintura.	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con lamina masternit.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	concreto con esmalte	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Concreto Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN	Pozo Ubicado al costado derecho del anden
FACHADA:	Carpinteria metalica con rejas, y vidrio espejo	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
CC: 33460172	CC: 1015.417.230	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	05	2025	3815		








Nombre:	Nombre:	Nombre:
CC: 33460172	CC: 1015.417.230	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	05	2025	3816		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: manzana 4 casa 5,4,3

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 18 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	NA
MUROS:	No se evidencia	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia.
FACHADA:	Porton metalico, con muros en bloque sin pañete.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Ruron
CC:	CC: 1015.417.232	CC: 91516424.
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	05	2025	3816		









Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Ruron
CC:	CC: 1015.417.232	CC: 91516424.
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

269

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DÍA) 05 (MES) 2025 (AÑO)	3817	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 Casa 2

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, ¿Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	¿Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	¿Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	se evidencia grietas y fisuras en piso y anden.
MUROS:	bloque sin pañete	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructura metalica con lamina de zinc.	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO se evidencia.
FACHADA:	Carpinteria metalica con muros en bloque sin pañete.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T. S.	Nombre: Gabriel Ovalle Ovalle
CC:	CC: 1015.417.750	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DÍA) 05 (MES) 2025 (AÑO)	3817	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T. S.	Nombre: Gabriel Ovalle Ovalle
CC:	CC: 1015.417.750	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 05 / 2025	3818		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Andres Fonseca
Dirección: Mantana 4 casa 1
Teléfono: 3102909263 No. Pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructora en Concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	Se evidencia en Pisos
MUROS:	bloque con Pañete sin Pintura.	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	Estructora metalica con teja eternit, viga canal	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO Se evidencia
FACHADA:	Carpinteria metalica con muros en ladrillo a la vista	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Andres Angeles	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118552648	CC: 1015.417.720	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 05 / 2025	3818		













Nombre: Andres F.	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118552648	CC: 1015.417.720	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Consultoria de Interventoria

69

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3819	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Denis Jeronimo.
Dirección: Manzana 4 casa 46
Teléfono: 3178099193 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐
		5. Concreto y mampostería	☑
		6. Mampostería no reforzada	☐
		7. Otro	☐
		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	
		Garaje SI ☐ NO ☑	
		Cuantos:	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con viga de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia grietas y fisuras en anden y piso
MUROS: Bloque con pañete y Pintura.	HUMEDADES: NA
CUBIERTA: Estructura metalica con lamina masterna 4	HUNDIMIENTO PISO: NA
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: NA
ANDEN: Concreto rustico con Pintora antideslizante.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: + Pozo Ubicado al costado derecho del anden.
FACHADA:	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Denis Jeronimo	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.115.690.702	CC: 1015.417.2??	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3819	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23



Nombre: Denis Jeronimo	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.115.690.702	CC: 1015.417.2??	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

69

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
DD 05 MM 06 AAAA 2025	3820	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Frente 4 casa 45
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otra	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☑
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	N/A
MUROS:	bloque sin pañete	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	NO se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO:	N/A
PISOS:	terreno natural.	DESPLAZAMIENTOS:	N/A
ANDEN:	terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO se evidencia.
FACHADA:	Puerta ventana en lamina de zinc, muros en bloque.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

696

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
DD 05 MM 06 AAAA 2025	3820	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 05 2025	3821		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 casa 44

Teléfono: No. pisos: 2

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS:	Se evidencia grietas en anden.
MUROS:	bloque con Pañete.	HUMEDADES:	NA
CUBIERTA:	estructura metalica con lamina masternit	HUNDIMIENTO PISO:	NA
PISOS:	terminados con baldosa	DESPLAZAMIENTOS:	NA
ANDEN:	Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO se evidencia.
FACHADA:	Carpinteria metalica, con reja en malla electro-soldada	OTRO, Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Rincón
CC:	CC: 1015.417.270	CC: 91516.924
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 05 2025	3821		





Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Rincón
CC:	CC: 1015.417.270	CC: 91516.924
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

69

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 DD 05 MM 2025 AAAA	3822	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 casa 43

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Sole corte perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	N A
MUROS:	bloque con pañete	HUMEDADES:	N A
CUBIERTA:	Estructura metalica con teja eternit.	HUNDIMIENTO PISO:	N A
PISOS:	terminados con baldosa.	DESPLAZAMIENTOS:	N A
ANDEN:	Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia.
FACHADA:	Carpinteria metalica, con malla electrosoldada, muros en bloque y pañete.	OTRO. Cual?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 DD 05 MM 2025 AAAA	3822	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

959

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3823	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 4 Casa 42

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Sola cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Estructura en concreto con vigas de cimentacion.	GRIETAS Y FISURAS:	N/A
MUROS:	bloque con pañete	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	Estructura metalica con lamina masternit.	HUNDIMIENTO PISO:	N/A
PISOS:	terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	N/A
ANDEN:	terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO se evidencia
FACHADA:	Puerta metalica con muros en bloque.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3823	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23



Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

659

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3824		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Manzana 28 Casa 1
Teléfono: No. pisos 1
Long. del frente (mts): 12

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☑	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzado	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en tubo metalico	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: Internos en mamposteria	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Dos aguas en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Relleno en material y placa concreto pobre	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural y concreto pobre parcial	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No evidencia ubicación
FACHADA: Carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3824		









Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3825		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ismari Quitebe
Dirección: Manzana 28 C 2
Teléfono: 320 830 6220 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Sola cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería estructural	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Dos aguas con teja	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto y acabado en mineral	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, sobre el anden
FACHADA: Mampostena y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ismari Quitebe	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Rincon
CC: 1.117.960.824	CC: 1015.417.217	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3825		













Nombre: Ismari Quitebe
CC: 1.117.960.824
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.217
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rincon
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3826		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Wilmer Sena Garrido
Dirección: Manzana 78 Casa 3
Teléfono: 314 231 7757 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema estructural de pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: N.A.
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: N.A.
CUBIERTA: Parcialmente en teja	HUNDIMIENTO PISO: N.A.
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: N.A.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, sobre el anden
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario no se encuentra al momento de la visita

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3826		








Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	01	2026	3827	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Emilse Sierra

Dirección: Manzana 28 Casa 4

Teléfono: 313 433 0744 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO

- 1. Construido: ☑
- 2. En construcción: ☐
- 3. Sin construir: ☐
- 4. Otro, ¿Cuál? ☐

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

- 1. Solo cerca perimetral: ☐
- 2. Construcción en madera: ☐
- 3. Construcción en zinc: ☑
- 4. Cerramiento con malla: ☐
- 5. Concreto y mampostería: ☑
- 6. Mampostería no reforzada: ☐
- 7. Otro: ☐
- Cuál? .....

USO ACTUAL

- 1. Residencial: ☑
- 2. Comercial: ☐
- 3. Industrial: ☐
- 4. Institucional: ☐
- 5. Recreacional: ☐
- 6. Baldío: ☐
- 7. Otro: ☐
- Cuál? .....

ACCESOS VEHICULARES

- Garaje SI ☐ NO ☑
- Cuantos: .....
- El garaje se usa como contenedor SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Perfileria metalica	GRIETAS Y FISURAS: N.A.
MUROS: Divisores en PVC	HUMEDADES: N.A.
CUBIERTA: Dos aguas en zinc	HUNDIMIENTO PISO: N.A.
PISOS: Concreto con detalle en mineral	DESPLAZAMIENTOS: N.A
ANDEN: Loseta prefabricada	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, sobre anden
FACHADA: Muro en mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Emilse Sierra Murillo
Nombre: Emilse Sierra
CC: 37897440
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9516624
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	01	2026	3827	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Emilse Sierra Murillo
Nombre: Emilse Sierra Murillo
CC: 37897440
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9516624
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	01	2026	3828	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 28 Casa 05

Teléfono: No. pers: 4

Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☑	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esa información)

ESTRUCTURA:	Columnas, viga amarre y aerea en concreto	GRIETAS Y FISURAS:	Andenes
MUROS:	Mampostería con pañete y pintura	HUMEDADES:	N.A
CUBIERTA:	Teja y cielo raso	HUNDIMIENTO PISO:	N.A
PISOS:	Terminado en enchape	DESPLAZAMIENTOS:	N.A.
ANDEN:	Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se ubica
FACHADA:	Mampostería a nivel de pañete y pintura. Puertas y ventanas en carpintería	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.252	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	01	2026	3828	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.252	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3829	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 28 Casa 06.

Teléfono: No. pisos: 1.

Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☒	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☒
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en madera.	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: No se evidencia interior.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Teja de zinc perfileria en madera.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Cemento rustico.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Puerta metalica, cerramiento en alambre de Puas.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Nuñez
CC:	CC: 1015.417.250	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3829	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Nuñez
CC:	CC: 1015.417.250	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3830	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 28 CASA 07

Teléfono: No. pisos: 2

Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3 Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cual?		4. Cerramientos con malla		Cual?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		
2. Comercial		6. Baldío	Garaje SI X NO	
3. Industrial		7. Otro	Cuantos 1	
4. Institucional		Cual?	El garaje se usó como comercio SI NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga aerea y de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos con grietas.
MUROS:	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: 1er piso placa maciza 2do piso teja de zinc pertileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: 1er PISO, PISOS en cemento rustico 2do no se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Cemento rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden.
FACHADA:	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 9151642A
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3830	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 9151642A
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3831	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 28 CASA 08

Teléfono: No. predio:

Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga aerea y de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Pisos internos
MUROS: Bloque sin pañete.	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Placa en bloqueló n	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Cemento rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO se evidencia ubicación
FACHADA: Bloque sin pañete.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: ..... CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424.
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3831	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: ..... CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424.
Representante del Contratista de Interventoría

406

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3832		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

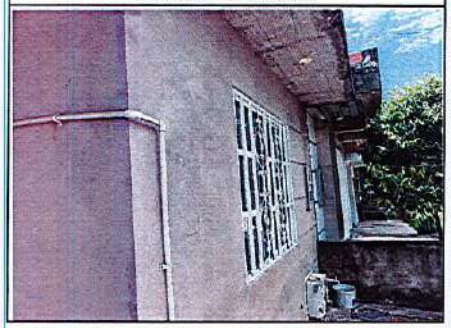

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jhon Sandoval
Dirección: Mz 24 Cs 6
Teléfono: 320 233 1775 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Dos aguas en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: A nivel de enchape	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, sobre anden
FACHADA: Mampostería y carpintería metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

3125268531 Número adicional

Nombre: Yolanda Arevalo CC: 336772665 Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.220 Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3832		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

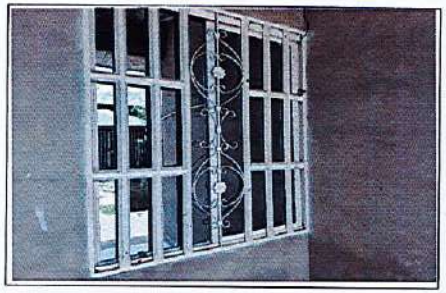





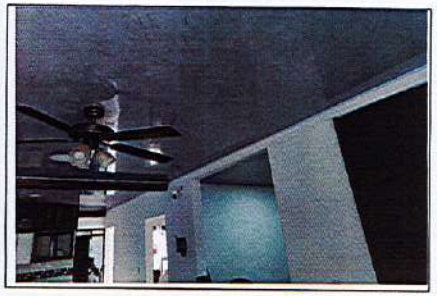






Nombre: Yolanda Arevalo CC: 336772665 Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.220 Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3833		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

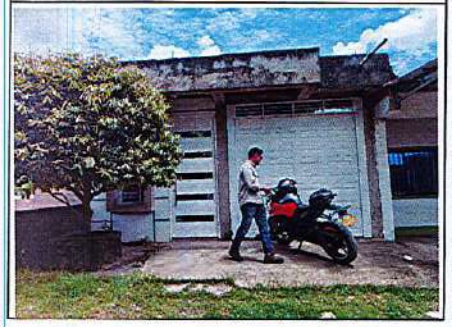

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alberto Avella
Dirección: Manzana 71 Cs 7
Teléfono: 311 930 7626 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo carca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramentos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Placa aligerada (metal deck)	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Acabado en enchape	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, sobre el anden
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenigda en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Alberto Avella	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 111.955.812 2	CC: 1015.417.220	CC: 9151.642A
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3833		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: Alberto Avella	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 111.955.812 2	CC: 1015.417.220	CC: 9151.642A
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3834	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 21 Cs 8

Teléfono: No. piso: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo carta perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: En anden
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No evidencia
CUBIERTA: En teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No evidencia
PISOS: No evidencia en el interior	DESPLAZAMIENTOS: No evidencia
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No evidencia
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3834	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3835	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Milena Hernandez Lopez
Dirección: Mz 21 Cs 9
Teléfono: 314 373 3450 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cual?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto estructural.	GRIETAS Y FISURAS: Zona de andenes
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Dos aguas en teja de fibrocemento con correa metalica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto a nivel de mineral.	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, Zona de anden
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S. CC: 1015.417.249 Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516.424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3835	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23



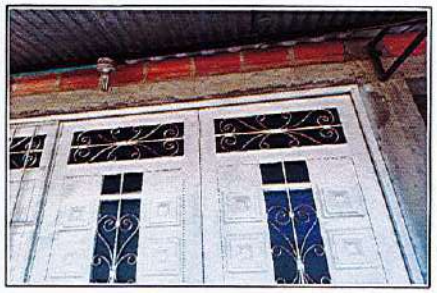







Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S. CC: 1015.417.249 Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516.424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3836		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlita Hernandez Lopez
Dirección: Mz 71 Cs 16
Teléfono: 320 307 8484 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Zona de anden
MUROS: Mamposteria a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Dos aguas en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Nivel de enchape.	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Mamposteria (Bloque y ladrillo) Carpinteria metalica (Puerta y ventana)	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Elsa Beatriz Lopez	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 24227514	CC: 1015.417.280	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3836		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Elsa Beatriz Lopez	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 24227514	CC: 1015.417.280	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD MM AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 01 2026	3837		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

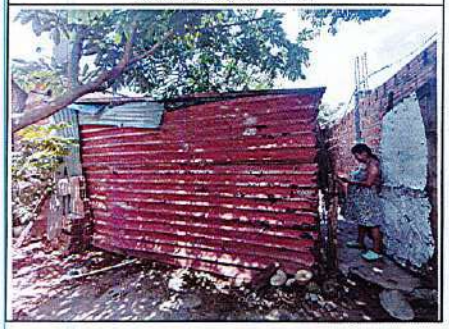

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gisela Jacqueline Peña
Dirección: M7 11 CS 11
Teléfono: 322 942 3115 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Sobre cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórtico en unidad sanitaria, divisiones en teja	GRIETAS Y FISURAS: N.A.
MUROS: Laminas o tejas	HUMEDADES: Areas de lavado
CUBIERTA: Irregular en zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Lamina o teja	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Yaqueline Peña A.		
Nombre: Gisela Yaqueline	Nombre:	Nombre: Gabriel Duran
CC: 39951420	CC: 1015.417.282	CC: 91516424
39951420 Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD MM AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 01 2026	3837		









Yaqueline Peña A.		
Nombre: Gisela Yaqueline	Nombre:	Nombre: Gabriel Duran
CC: 39951420.	CC: 1015.417.282	CC: 91516424
39951420 Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3838		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 21 CASA 12.

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cúal?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☒
4. Institucional	☐	Cúal?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubiertas.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se encuentra ubicación
FACHADA: Teja master mil, soporte s en madera.	OTRO. Cúal?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.290	CC: 9151.6424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3838		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.290	CC: 9151.6424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3839		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: MZ 21 CASA 13.
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del lleno (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐ Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío ☒ Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro ☐ El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cual? SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: NO cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: NO cuenta con muros.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: NO cuenta con cubierta.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO se evidencia ubicación
FACHADA: Cerramientos en teja de zinc.	OTRO. Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	Nombre	Nombre
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3839		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre	Nombre	Nombre
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3840	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: M7 21 Casa 14.
Teléfono: No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro. Cuál?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio SI X NO
4. Institucional		Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto.	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: No se evidencia interior.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Teja master mil perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Portón metalico, bloque con y sin pañete.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3840	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3841	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 35 Cs 1

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 17

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Sola cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Portico en concreto	GRIETAS Y FISURAS: fisuras menores en fachada (fuente)
MUROS: Mamposteria a nivel de pintura	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: A dos (2) aguas en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No ses puede evidenciar
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, Zona de anden
FACHADA: Mamposteria, a nivel de panete y carpinteria metalica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: CC: Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.2?? Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duarte CC: 9151?424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3841	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre: CC: Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.2?? Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duarte CC: 9151?424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3842		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

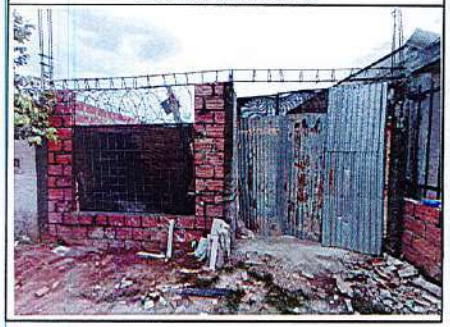

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: M7 35 Cs 2
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1. Construido ☐	1. Solo cerca perimetral ☐	5. Concreto y mampostería ☑
2. En construcción ☑	2. Construcción en madera ☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir ☐	3. Construcción en zinc ☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cuál? ☐	4. Cerramientos con malla ☐	Cuál?

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial ☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial ☐	6. Baldío ☑	Cuantos:
3. Industrial ☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional ☐	Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Proyección de porticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: No presenta	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Placa base en concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se puede evidenciar
FACHADA: Mamposteria y provisional en teja de zinc y malla electrosoldada	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson V. Rodriguez S.
CC: 1.015.417.292
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Eduardo Duron
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3842		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

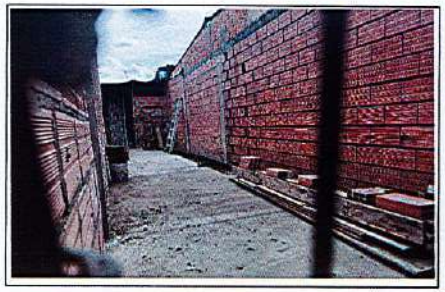

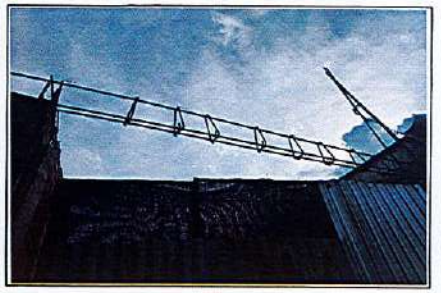







Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson V. Rodriguez S.
CC: 1.015.417.292
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Eduardo Duron
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3843		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Beinute Ruiz
Dirección: Mz 35 Cs 3
Teléfono: 3150011332 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo carga perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Andenes
MUROS: Mampostería a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A un (1) agua en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Sí, zona anden
FACHADA: Cerramiento metalico y mampostería a nivel de pintura	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Freddy Alexander Mendez Ayala
CC: 74.814.463
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.249
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.516.429
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3843		







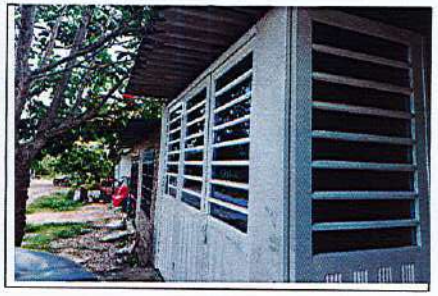

Nombre: Freddy Alexander Mendez Ayala
CC: 74.814.463
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.249
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.516.429
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3849		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Mz 33 Cs 4
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☑
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia sistema estructural completo, solo viga de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería (ladrillo)	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Mampostería sin pañete y carpintería metálica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran	
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91515429	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3844		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran	
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91515429	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría	

act

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3845	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ovel Loizo
Dirección: M7 35 C5 5
Teléfono: 310 658 6152 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercio	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostena a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Placa entrepiso	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si ; zona anden
FACHADA: Mampostena nivel pintura y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se construyo solamente habitación en la segunda planta.

Reddy Martinez	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Duran
Nombre:	Nombre:	Nombre:
CC: 1118649599	CC: 1015.417.282	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3845	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23







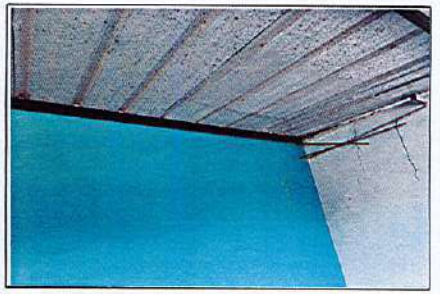

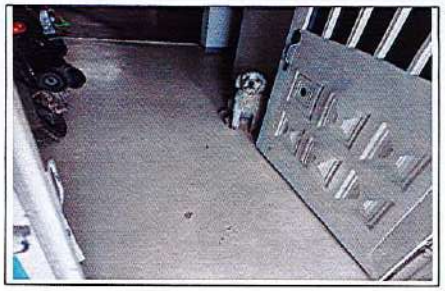

Reddy Martinez	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Duran
Nombre:	Nombre:	Nombre:
CC: 1118649599	CC: 1015.417.282	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3846		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 35 Cs 6

Teléfono: No. pisos: 2

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, ¿Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cual?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Piso de anden
MUROS: Mamposteria a nivel de parete	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Teja arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No se evidencia interior.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Mamposteria a nivel de parete y carpinteria metalica.	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Placa entrepiso: Aligerada en bloquetón

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 9151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

22

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3846		









Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 9151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	01	2026	3847	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M 7 35 Cs 7

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cual?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Piso de anden
MUROS: Mamposteria a nivel de graniplast con pintura	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Teja arquitectonica con correas metalicas	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No se evidencia interior	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia ubicación
FACHADA: Cuerpotena metalica	OTRO. Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	01	2026	3847	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3848		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Mz 35 Cs 8
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cual?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: Piso
MUROS: Mampostería con pañete	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Dos aguas en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural y concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia ubicación
FACHADA: Bloque pañetado y reja metalica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: / CC:	Nombre: Nelson Rodriguez S. / CC: 1015.417.252	Nombre: Gabriel Durán / CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3848		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: / CC:	Nombre: Nelson Rodriguez S. / CC: 1015.417.252	Nombre: Gabriel Durán / CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 01 2026	3849		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Mz 28 Cs 9
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería confinada con columnetas	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: Batería sanitaria
CUBIERTA: A dos (2) aguas en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: No se puede evidenciar	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, dentro del predio
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ovalle
CC: 91515424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 01 2026	3849		





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ovalle
CC: 91515424
Representante del Contratista de Interventoría

125

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3850		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: MZ 28 casa 10
Teléfono: No. pisos:
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cuál?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Carga SI X NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga aerea y de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Teja de zinc perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Fuera del anden.
FACHADA: Bloque sin pañete carpinteria metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Arrion
CC:	CC: 1015.417.222	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	01	2026	3850		











Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Arrion
CC:	CC: 1015.417.222	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3851	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Mz 28 Cs 11
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cuál?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas en concreto.	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería (Bloque)	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: A dos (2) aguas en teja de fibrocemento con correas metálicas	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar.
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, 1 en el anden.
FACHADA: Mampostería a nivel pintura y carpintería metálica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario manifiesta no estar interesado en atender la visita técnica ya que presenta inconformidades con el desarrollo del proyecto con base en un familiar. Por lo tanto, no autoriza la entrada y registro fotográfico de la vivienda.

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.2??	CC: 9115624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 01 / 2026	3851	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23



Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.2??	CC: 9115624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 01 2026	3852		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: N7 28 casa 11
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en arc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, ¿Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	¿Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☒
4. Institucional	☐	¿Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: No cuenta con Fachada.	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenotada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1.015.417.240
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivera
CC: 91516426
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 01 2026	3852		





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1.015.417.240
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivera
CC: 91516426
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3853	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M7 76 Cs 13

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cuál?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga aerea y de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: No se evidencia interior.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Teja master mil perfilería metalica.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia ubicación
FACHADA: Bloque sin pañete carpintería metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.2?? Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	01	2026	3853	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.2?? Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3854		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: MZ 28 Casa 14.
Teléfono: No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cual?		4. Cerramientos con malla		Cual?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldio	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio SI NO X
4. Institucional		Cual?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga aerea y de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: No se evidencia interior.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Teja master mil perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: NO Se evidencia interior.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Anden.
FACHADA: Ladrillo a la vista. Carpinteria metalica con vidrios.	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Quiroa
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3854		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Quiroa
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

730

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3855		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marco Julio Gomez Duarte
Dirección: Mz 28 C5 15
Teléfono: 321 255 8864 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cuál?	☐	4. Cerramiento con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria (Bloque) sin pañete	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A un (1) agua en teja arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Zona verde, presencia de material vegetal	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La vivienda cuenta con caja de inspeccion construida por el propietario.

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Doris Tabimba	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 40091454	CC: 1015.417.722	CC: 9151624

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 01 2026	3855		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23









Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Doris Tabimba	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 40091454	CC: 1015.417.722	CC: 9151624

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 01 / 2026	3856		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ucimi Urrego Campo
Dirección: Mz 23 Cs 16
Teléfono: 311 878 5460 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Se construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☑	6. Baldio	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A un (1) agua en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Mampostería a nivel de pintura y carpintería metálica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda con uso comercial y residencial.

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Durán
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 9156424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 01 / 2026	3856		





Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Durán
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 9156424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	01	2026	3857	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Feliciano Muñoz
Dirección: Mz 42 Cs 1
Teléfono: 310 553 1133 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 9

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mamposteria a nivel de pintura	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: A dos aguas, en teja de fibrocemento con correas metalicas	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Tableta de gres	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Mamposteria (ladrillo) y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Feliciano Muñoz
CC: 3298536
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.230
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	01	2026	3857	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Feliciano Muñoz
CC: 3298536
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.230
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 01 2026	3858		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Mz 42 Cs 2
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Obra, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Concreto con acabado en mineral	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Edna J. Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 01 2026	3858		





Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3859		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 42 Cs 3

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Mamposteria a nivel de peñete y carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 91516479
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3859		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.280	CC: 91516479
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3860	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Larixa Bathman
Dirección: M-7 47 Cs 4
Teléfono: 323 225 1729 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Zona de anden
MUROS: Mampostería a nivel de pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: A un (1) agua en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto acabado con mineral	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, dentro del predio
FACHADA: Mampostería y carpintería metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Larixa Bathman CC: 116 77 40 71 Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.290 Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3860	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Larixa Bathman CC: 116 77 40 71 Propietario del predio	Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.290 Representante del Contratista de Obra	Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3861	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. — CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Enrique Higuera
Dirección: Mz 40 Cs 5
Teléfono: 322 968 8990 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Tejas de zinc	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: A un (1) agua en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: Irregulares en la totalidad del predio
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Ocupado por cultivo platano	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, dentro del predio
FACHADA: Reja tipo bancaria	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	CC	
Carlos Enrique Higuera R.	9523.098	Propietario del predio
Nelson Rodriguez S.	1015.417.210	Representante del Contratista de Obra
Cubria Duran	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3861	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. — CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre	CC	
Carlos Enrique Higuera R.	9523.098	Propietario del predio
Nelson Rodriguez S.	1015.417.210	Representante del Contratista de Obra
Cubria Duran	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
06 01 2026	3862	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gilma Pilar Saledo
Dirección: Mz 42 Cs 6
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Bodega	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede registrar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede registrar
CUBIERTA: Placa entrepiso y teja en zona fachada	HUNDIMIENTO PISO: No se puede registrar
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No se puede registrar
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Mampostería (ladrillo) y carpintería metalica	OTRO. Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Soportes de cubierta en tubo circular cimentado en zona de anden - verde.

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.230	CC: 9151424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
06 01 2026	3862	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.230	CC: 9151424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3863		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Digame Katerine Niño Estupiñan
Dirección: Mz 42 Cs 7
Teléfono: 313 235 6567 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Portico en concreto a nivel de columnas y viga de arriostre	GRIETAS Y FISURAS: Zona de andenes.
MUROS: Mamposteria a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A dos (2) aguas en teja arquitectonica con correas metalicas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona anden
FACHADA: Mamposteria a nivel de pintura y carpinteria metalica	OTRO Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Liz Audrey Barrera E	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Orrian
CC: 1016067423	CC: 1015.417.210	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3863		











Nombre: Liz Audrey Barrera E	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Orrian
CC: 1016067423	CC: 1015.417.210	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 / 01 / 2026	3864		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lyz Beldy Pedraos
Dirección: M7 33 C 10
Teléfono: 321 447 0885 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cual?	☐	4. Combinación con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria a nivel de pintura	HUMEDADES: Zona de fachada
CUBIERTA: A un (1) agua en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto con acabado en mineral	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona de anden
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	CC	
Jose Pedraos	1170922537	Propietario del predio
Nelson Rodriguez S.	1015.417.230	Representante del Contratista de Obra
Gabriel Arias	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 / 01 / 2026	3864		









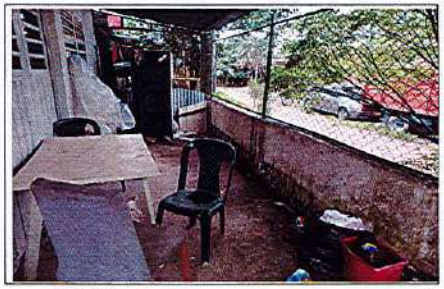

Nombre	CC	
Jose Pedraos	1170922537	Propietario del predio
Nelson Rodriguez S.	1015.417.230	Representante del Contratista de Obra
Gabriel Arias	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3865	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Odilia Cataño Cachay
Dirección: Mz 35 Cs 11
Teléfono: 318 723 9791 No. pisos: 1
Long. de frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☑	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos:
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en madera	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Divisiones en zinc	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, dentro del predio
FACHADA: Malla eslabonada	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

	Nombre	CC	
Propietario del predio	Dandy Moyeth C.	1007334936	
Representante del Contratista de Obra	Nelson Rodriguez S.	1015.417.220	
Representante del Contratista de Interventoría	Gabriel Ortiz Silva	Silvia	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3865	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23









	Nombre	CC	
Propietario del predio	Dandy Moyeth C.	1007334936	
Representante del Contratista de Obra	Nelson Rodriguez S.	1015.417.220	
Representante del Contratista de Interventoría	Gabriel Ortiz Silva	Silvia	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 / 01 / 2026	3866		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ruth Nossa
Dirección: Mz 38 Cs 32
Teléfono: 320 828 8910 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El parqje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Anden
MUROS: Mampostería a nivel de grafura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: A un (1) agua en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona anden
FACHADA: Mampostería y carpintería metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ruth Nossa	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 47 437 157	CC: 1015.417.230	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 / 01 / 2026	3866		







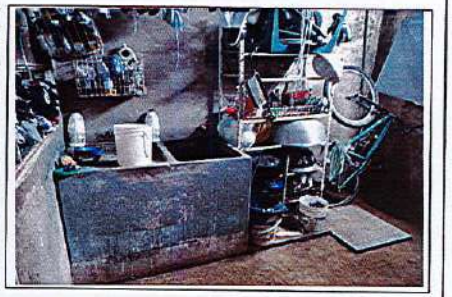





Nombre: Ruth Nossa	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 47 437 157	CC: 1015.417.230	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

2 de 2

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3867	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M7 35 Cs 13

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramentos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:		GRIETAS Y FISURAS:	fisuras menores en fachada
MUROS:	Mampostería	HUMEDADES:	fachada
CUBIERTA:	Teja de zinc con correas metalicas	HUNDIMIENTO PISO:	No se puede evidenciar
PISOS:		DESPLAZAMIENTOS:	No se puede evidenciar
ANDEN:	Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se puede evidenciar
FACHADA:	Mamposteria nivel pañete y carpinteria metalica	OTRO: Cual?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Rivera
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3867	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Rivera
CC:	CC: 1015.417.220	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 01 2026	3868		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Andres Vargas
Dirección: Mz 35 Cs 14
Teléfono: 313 421 9907 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos, en concreto reforzado a nivel de columnas y viga amarre	GRIETAS Y FISURAS: fachada (fisuras pañete)
MUROS: Mamposteria a nivel pañete	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A un (1) agua en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, dentro del predio
FACHADA: Mamposteria a nivel pañete y carpinteria metalica	OTRO? Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Fcibo Andres Vargas
Nombre: Andres Vargas
CC: 1118 554 492
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.232
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Olivella
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 01 2026	3868		







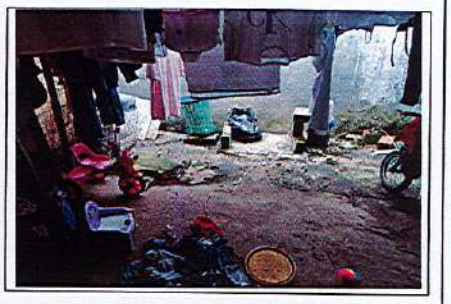





Fcibo Andres Vargas
Nombre: Andres Vargas
CC: 1118 554 492
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S.
CC: 1015.417.232
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Olivella
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 (DD) 01 (MM) 2025 (AAAA)	3869		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yuyany Acevedo
Dirección: M7 35 Cs 35
Teléfono: 312 831 2473 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto, falta viga aerea de segunda planta	GRIETAS Y FISURAS: fisuras en pisos
MUROS: Mampostería a nivel de pañete y pintura primera planta	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Placa entrepiso y teja a un (1) agua de zinc nivel superior	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto acabado con mineral y enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, dentro del predio
FACHADA: Mampostería a nivel de pañete y carpintería metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Sandra Quiroga	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Marin
CC: 1.019.099.753	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 (DD) 01 (MM) 2025 (AAAA)	3869		





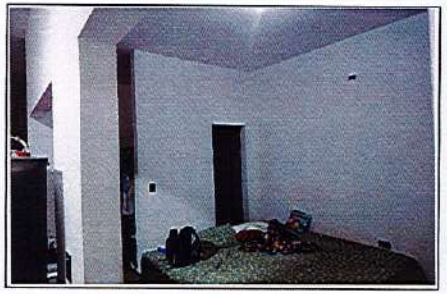



Nombre: Sandra Quiroga	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Marin
CC: 1.019.099.753	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 DD 01 MM 2025 AAAA	3870		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Mz 35 Cs 16
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Dos aguas en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Concreto con acabado en mineral	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona anden
FACHADA: Mampostería y estructura metalica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Parra	
CC:	CC: 1015.417.230	CC: 9151622	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 DD 01 MM 2025 AAAA	3870		







Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Parra	
CC:	CC: 1015.417.230	CC: 9151622	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría	

2 de 2

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 / 01 / 2026	3871		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M7 33 Cs 17

Teléfono: No. pisos: 3

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Dos (2) aguas en teja con correas metalicas	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Enchape ceramico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Soalvis Ayala
CC:	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 / 01 / 2026	3871		









Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Soalvis Ayala
CC:	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	01	2026	3872	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maribel Chaparro

Dirección: Mz 44 Cs 1

Teléfono: 313 460 6421 No. pisos: 1

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☑	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en guadua	GRIETAS Y FISURAS: fisuras en piso
MUROS: Mampostería, lamina de yeso y malla eslabonada	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A dos (2) aguas en teja de zinc y fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple acabado en mineral	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Relleno en triturado y material común	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, sobre anden
FACHADA: Malla eslabonada parcialmente	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Pozo septico sobre cuneta

	Nombre:	CC:	
Propietario del predio	Yauvany Acosta O.	1009373430	
Representante del Contratista de Obra	Nelson Rodriguez S.	1015.417.282	
Representante del Contratista de Interventoría	Gabriel Duran	CC 91516424	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	01	2026	3872	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













	Nombre:	CC:	
Propietario del predio	Yauvany Acosta O.	1009373430	
Representante del Contratista de Obra	Nelson Rodriguez S.	1015.417.282	
Representante del Contratista de Interventoría	Gabriel Duran	CC 91516424	

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3893		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

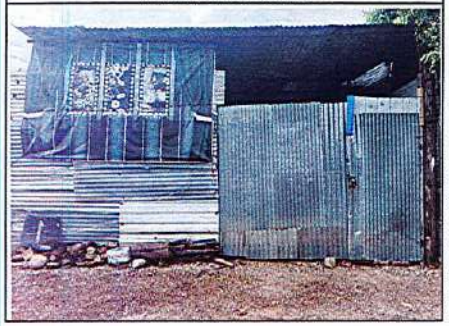

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 79 Cs 2

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: No se pudo evidenciar
MUROS:	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Lamina de zinc.	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.282	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2025	3893		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

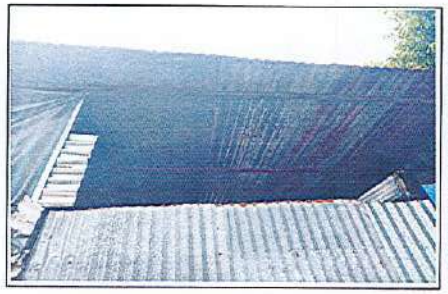











Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.282	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3874	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 49 Cs 3

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Lamina de zinc	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN:	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Lamina de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.230 Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3874	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: CC: Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.230 Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3875.	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Mz 49 Cs 4
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☑	6. Mampostería no reforzado	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Lamina zinc	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Lamina zinc y madera	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran	
CC:	CC: 1015.417.242	CC: 91.516.424	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3875.	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran	
CC:	CC: 1015.417.242	CC: 91.516.424	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	01	2026	3876.	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marly Johana Bermudez
Dirección: Mz 49 Cs 5
Teléfono: 310 876 1324 No. pisos: 2
Long. del frente (m/s):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzado	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☑	6. Bodega	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Zona de anden
MUROS: Mamposteria (bloque)	HUMEDADES: Muros de fachada
CUBIERTA: Teja arquitectonica, correas metalicas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, anden al lado izquierdo
FACHADA: Carpinteria metalica y mamposteria	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presenta ocupacion espacio público con cerramiento en carpinteria metalica.

Nombre: Marly Johana Bermudez	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 34.322.005	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	01	2026	3876	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23







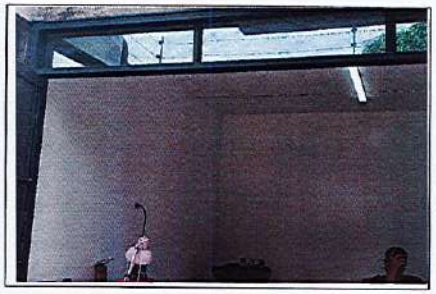





Nombre: Marly Johana Bermudez	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 34.322.005	CC: 1015.417.250	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

352

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3877		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: 49

Dirección: Manana casa 06.

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro. Cuál?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI NO X
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso de anden.
MUROS: No se evidencia interior.	HUMEDADES: No tiene
CUBIERTA: Teja master mil perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No se evidencia interior.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Cemento rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia ubicación
FACHADA: Bloque con pañete y pintura, con pinteria metalica con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.252	CC: 91516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3877		













Nombre: Nelson Rodriguez S. CC: 1015.417.252 Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran CC: 91516.424 Representante del Contratista de Interventoría

EST

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3878		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Heidy Paola Vargas
Dirección: M7 42 Cs 8
Teléfono: 310 802 9143 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☑
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A dos (2) aguas en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto con acabado en mineral	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona anden
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Pozo septico sobre anden de la carrera.

Nombre: Eydi Paola Vargas	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: Eydi Paola Vargas	CC: 1015.417.239	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3878		

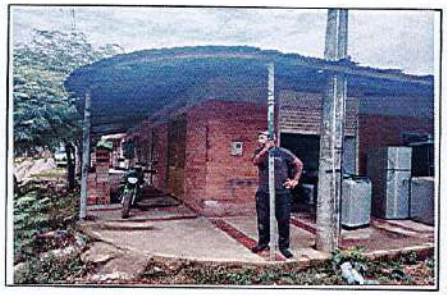







Nombre: Eydi Paola Vargas	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: Eydi Paola Vargas	CC: 1015.417.239	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	01	2025	3879	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Mila Colon
Dirección: Mz 42 Cs 9
Teléfono: 323 2458321 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construccion en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro. Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cual?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria (Bloque) a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A dos (2) aguas en teja	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Enchape ceramico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, zona anden sobre eje central
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO. Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presenta ocupación espacio público con cerramiento en carpinteria metalica.

Nombre: Sandra Rocio Gamez	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 925.497.350	CC: 1015.417.250	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	01	2025	3879	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: Sandra Rocio Gamez	Nombre: Nelson Rodriguez T.S.	Nombre: Gabriel Duran
CC: 925.497.350	CC: 1015.417.250	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3880		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Manzana 49 casa 10.
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐ Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒ Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐ El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: No cuenta con muros.	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: No cuenta con cubierta.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Terreno natural.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia. ubicación
FACHADA: Cerramiental en teja de zinc.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Duran
CC:	1015.417.220	9151642 4
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra / Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 01 2026	3880		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23



Nombre:	Nelson Rodriguez S.	Gabriel Duran
CC:	1015.417.220	9151642 4
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra / Representante del Contratista de Interventoría

956

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3881		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 42 Cs 11

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cual?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: A un (1) agua en teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Concreto acabado con mineral	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
MUROS: Tableta de gres	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Carpintería metalica y mampostería	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 01 / 2026	3881		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S.
CC: 1015.417.220
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoria

454

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AÑO	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	01	2026	3882.	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M: 47 Cs 12

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cúal?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cúal?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Tableta de gres	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Carpintería metalica y mampostería	OTRO: Cúal?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presenta ocupación espacio publico, cerramiento en carpintería metalica

Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.292	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AÑO	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	01	2026	3882.	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre:	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 1015.417.292	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3883.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jhon Jairo Rivas
Dirección: M7 42 Cs 13
Teléfono: 320 804 5034 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cúal?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cúal?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto (2 de fachada)	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: A dos aguas en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: Area de anden
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, dentro del predio
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO: Cúal?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Ocupación de espacio publico con enseres de la vivienda.

Nombre: Esperanza Cristancho
CC: 46455525
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S.
CC: 1015.417.280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	01	2026	3883.		









Nombre: Esperanza Cristancho
CC: 46455525
Propietario del predio

Nombre: Nelson Rodriguez T.S.
CC: 1015.417.280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	01	2026	3884.	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Claudia Alfarez Piratan
Dirección: M7 42 Cs 14
Teléfono: 310 749 8243 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: N.A.
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: N.A.
CUBIERTA: A Un (1) agua en teja arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO: N.A.
PISOS: Enchape ceramico	DESPLAZAMIENTOS: N.A.
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y/UBICACIÓN: Si, dentro de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica	OTRO: Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: MARIA PIRABAN	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Doran
CC: 1117322356	CC: 1015.917.240	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	01	2026	3884.	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICIÓN 23



Nombre: MARIA CLAUDIA ALFAREZ PIRATAN	Nombre: Nelson Rodriguez S.	Nombre: Gabriel Doran
CC: 1117322356	CC: 1015.917.240	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

096

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	03	2026	4361		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	ROSIO MARTINEZ RODRIGUEZ
Dirección:	MANZANA 57 CASA 22
Teléfono:	3214680304 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X	
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera y zinc	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En teja zinc	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Dentro de la vivienda costado izquierdo
FACHADA: En teja zinc y madera	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tubería de alcantarillado existente, información proporcionada por propietaria

Nombre:	ROSIO MARTINEZ RODRIGUEZ	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	31872474	1015417260	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	03	2026	4361		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	ROSIO MARTINEZ RODRIGUEZ	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	31872474	1015417260	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

19

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4362		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	.
Dirección:	MANZANA 57 CASA 21
Teléfono:	. No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería reforzada	X
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional	☐			SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas y viguetas	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja eternit y zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo ubicado en la parte interna de la vivienda
FACHADA: Carpintería metalica y cerramiento en malla de plastico	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


No se pudo constatar conexión a tubería de alcantarillado existente por ausencia del propietario

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1922906[illegible]	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4362		



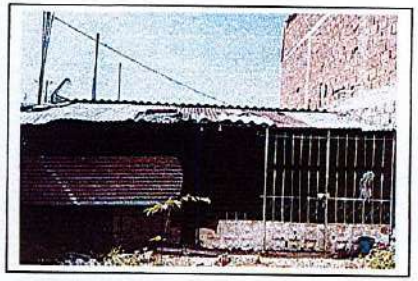



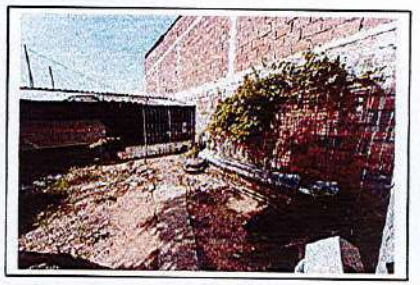





Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1922906[illegible]	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4363		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .
Dirección: MANZANA 57 CASA 20
Teléfono: . No.pisos: 2
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa metal deck y segunda planta en teja master más	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rústico dos plantas	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia la ubicación
FACHADA: Carpintería metálica sin vidrios y muro pañetado en ambas planta	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenpiada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar la conexión a tubería de alcantarillado existente por ausencia del propietario

Nombre: . C.C.: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4363		








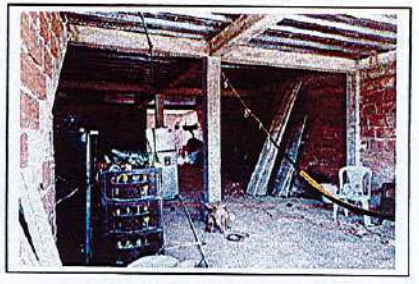

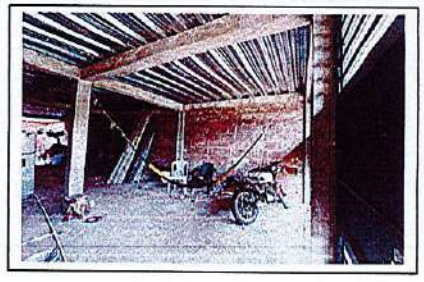

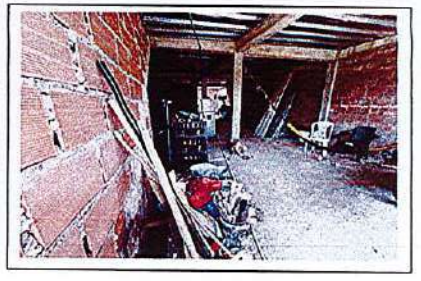

Nombre: . C.C.: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C. 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4364		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -
Dirección: Manzana 57 casa 19
Teléfono: - No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Se evidencia pisos en concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento en malla eslabonada, puerta ventana metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propiocario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4364		







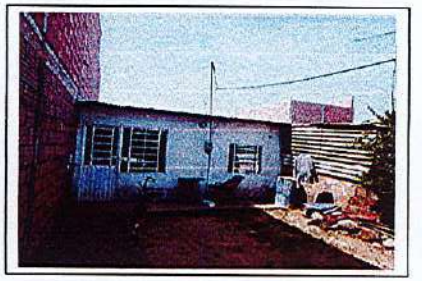





Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

394

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4365		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

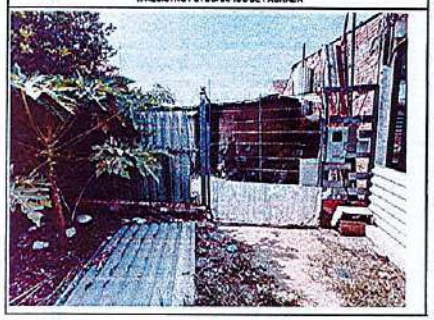

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	María Virginia Lopez
Dirección:	MANZANA 57 CASA 18
Teléfono:	3115794604 No.pisos: 1
Long. del Frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	6.Concreto y mamposteria ☐
2.En construcción	X	2.Construccion en madera	X	6.Mamposteria reforzada ☐
3.Sin confinar	☐	3.Construccion en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	☐	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldio ☐	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera y zinc	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc y tejalermit m	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado dentro de la vivienda en el anden costado izquierdo
FACHADA: Cerramiento con vanita y teja eternit	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a tubería de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada por propietaria

Julio Roa lopez

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: María Virginia Lopez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 23422062	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4365		





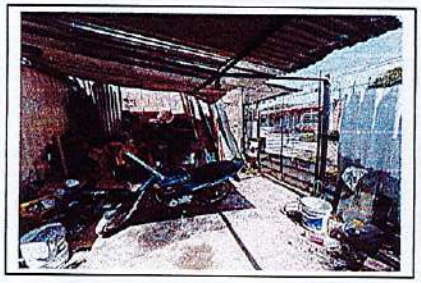







Julio Roa lopez


Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: María Virginia Lopez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 23422062	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

596

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	03	2026	4366		ACUATODOS E.S.P.	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

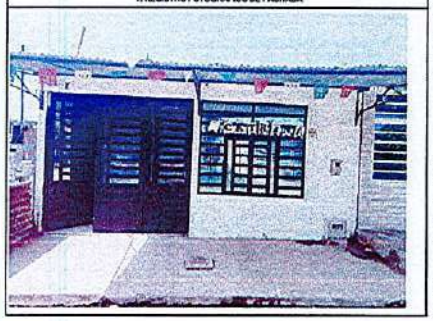

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	Manzana 57 casa 17
Teléfono:	- No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Sin evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: Se evidencia en el patio
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	03	2026	4366		ACUATODOS E.S.P.	CONSORCIO BENDICION 23





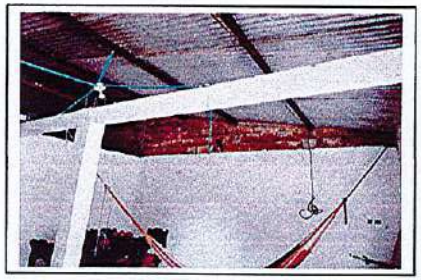







Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4367		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	.
Dirección:	Manzana 57 casa 16
Teléfono:	. No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No se evidencia	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de masternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terminado con baldosa	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque terminado con baldosa	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No de encontro nadie para recibir la visita

Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4367		









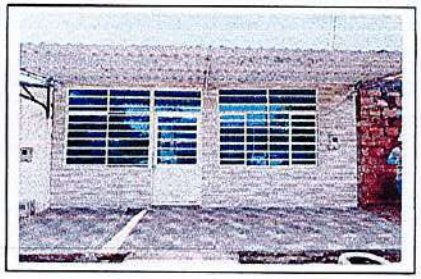



Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

696

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4368		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	.
Dirección:	MANZANA 57 CASA 15
Teléfono:	.
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramientos con mata			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cubículos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica y muro en bloque a la vista	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

No se puede constatar conexión a tubería de alcantarillado existente, por ausencia de propietario

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4368		

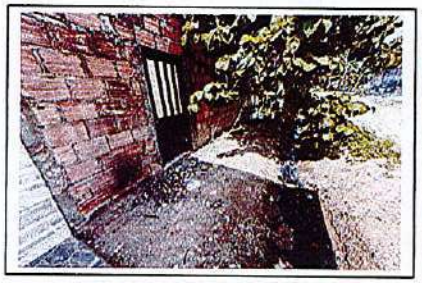


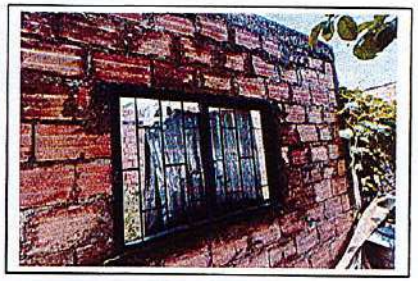

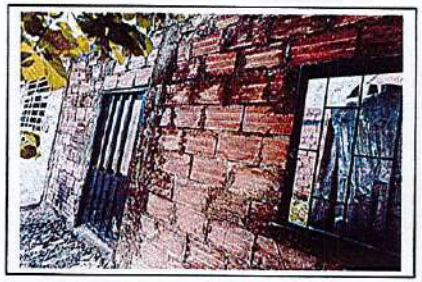

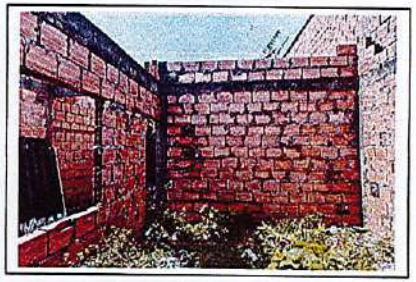

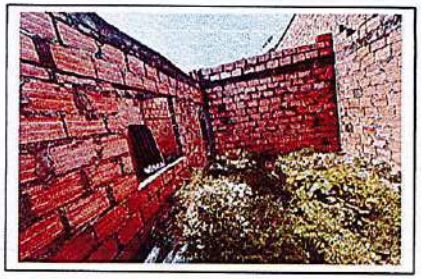

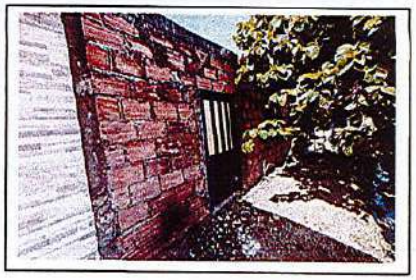

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A.E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4369		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Tirza maria Rodriguez
Dirección:	Manzana 57 casa 14
Teléfono:	3153074983 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construccion en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Piso 1 bloque sin pañete Piso 2 bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1 placa en bloquelon Piso 2 estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Piso 1 terminado con baldosa Piso 2 concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Piso 1 puerta metálica con ventana en malla angebo y muros en bloque sin pañete Piso 2 carpinteria metálica con bloque sin pañete	OTRO: ¿Cual? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este acapite para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria alirma que no se encuentre conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Tirza maria Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: 34320640	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A.E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4305		

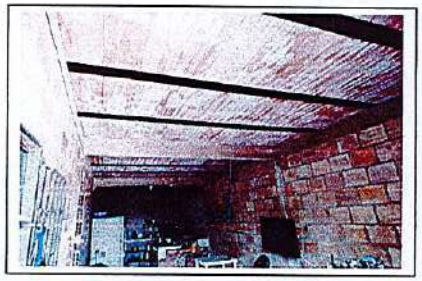







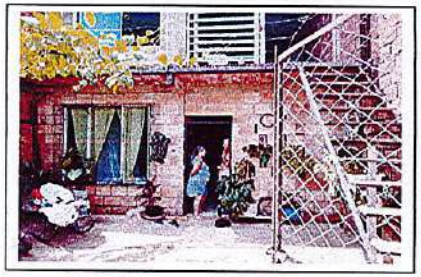




Nombre: Tirza maria Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: 34320640	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4370		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

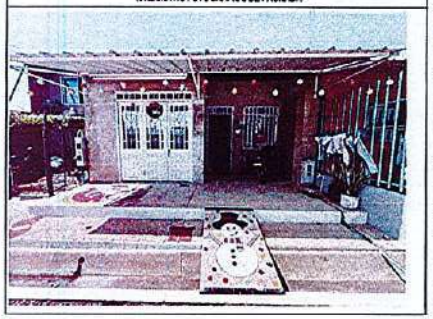

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	ZULMA VIOLETA ABRIL ABRIL
Dirección:	MANZANA 67CASA 13
Teléfono:	3118295352 No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Manguetería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque con pañete y a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc y metalormil	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el andon costadoderecho
FACHADA: Carpinteria metalica con vidrios y muros con pañete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tuberia de alcantarillado exitente , información suministrada por propietaria

Zulma Abril		
Nombre: ZULMA VIOLETA ABRIL ABRIL	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 47440280	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietaria	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4370		




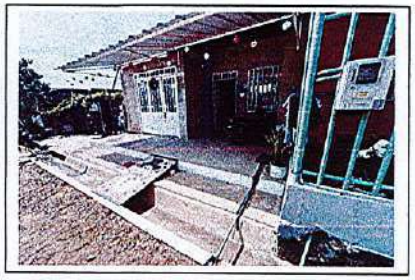



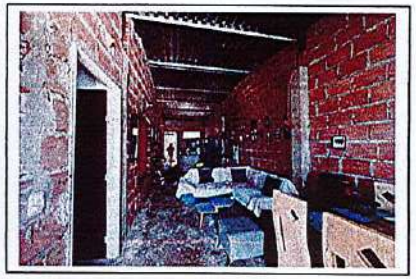





Zulma Abril		
Nombre: ZULMA VIOLETA ABRIL ABRIL	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 47440280	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02 (DD) 03 (MM) 2026 (AAA)	4371		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Saul sachica
Dirección:	Manzana 57 casa 12
Teléfono:	3152119080 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Bodega		Cuantos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja masterrib, cielo raso.	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústica	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado centro de la vivienda
FACHADA: Cerramiento metálico sin vidrio con muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirmó que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Saul sachica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 5722913	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02 (DD) 03 (MM) 2026 (AAA)	4371		

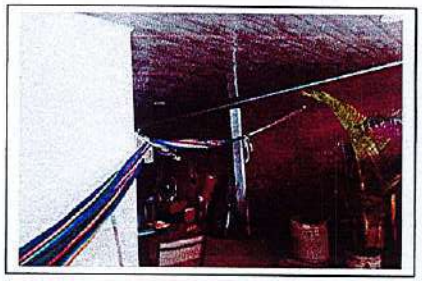











Nombre: Saul sachica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 5722913	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4388		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario(a): .
Dirección: Manzana 50 casa 45
Teléfono: . No.pisos: 1
Long. del frente (m/a): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos.
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica sin vidrio y muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Daniel Palencia	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1.116776624	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4388		













Nombre: Daniel Palencia	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1.116776624	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4389		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .
Dirección: MANZANA 50 CASA 44
Teléfono: . No.pisos: 2
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos. 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa en losa aligerada de bloqueton y	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden en el centro de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica con vidrios y muro con graniplos	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectados a tuberia de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada por el propietario

Maidy yulieth leon		
Nombre: Maidy Leon cruz	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1081422945	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4389		














Maidy yulieth Leon		
Nombre: Maidy leon	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1081422945	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

378

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4390		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

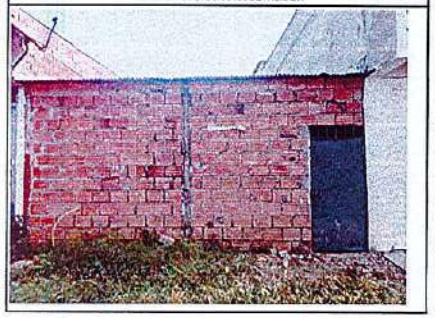

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .

Dirección: Manzana 50 casa 43

Teléfono: . No.pisos: 1

Long. del frente (m/s): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2 Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:
3 Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio
4 Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Puerta metálica con muros en bloque sin pañete	OTROS: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4390		

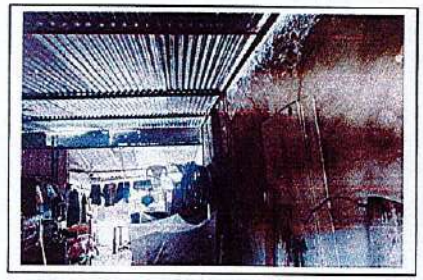


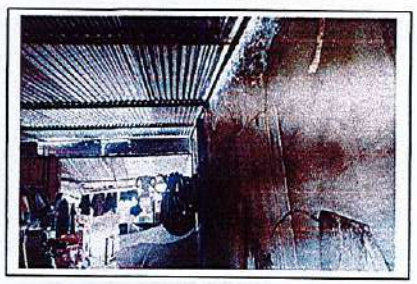







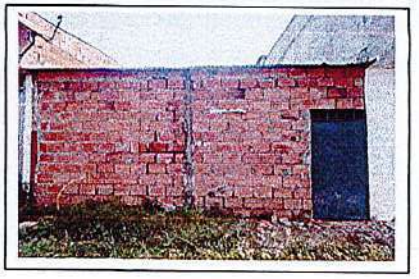

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4391		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JOHANA MATEUS
Dirección:	MANZANA 50 CASA 42
Teléfono:	3204120409 No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa aligerada en bloquelon y segunda planta teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Baldosa ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDÉN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden en el centro de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica con vidrios y muro en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tuberia de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada por propietario

Nombre: JOHANA MATEUS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1116615042	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4391		





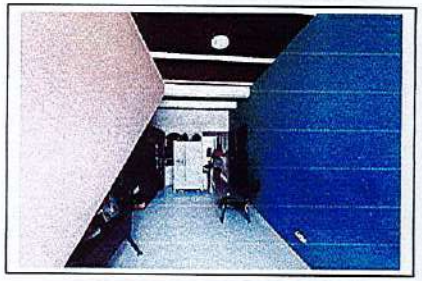







Nombre: JOHANA MATEUS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1116615042	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

566

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4392		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .
Dirección: Manzana 50 casa 41
Teléfono: . **No.pisos:** 1
Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura metálica con cerramiento en lámina de zinc	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Zinc de color rojo	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Puerta metálica con vidrio y zinc de color rojo	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4392		



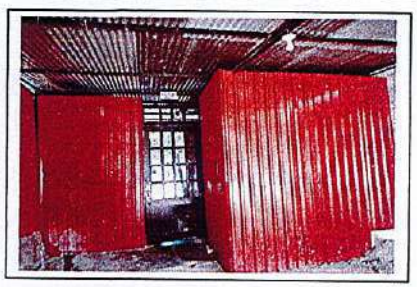



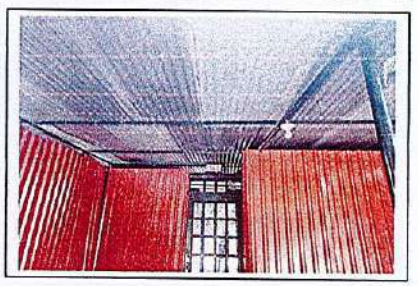





Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

9CE

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4293		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yelvis velsario
Dirección:	Manzana 50 casa 40
Teléfono:	3115908762 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en madera con lámina de zinc	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Cerramiento en lámina de zinc	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura en madera con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado dentro de la vivienda
FACHADA: Puerta en madera con lámina de zinc, y cerramiento en lámina de zinc	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Yelvis velsario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 33481973	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4293		













Nombre: Yelvis velsario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 33481973	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4394		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	.
Dirección:	MANZANA 60 CASA 30
Teléfono:	. No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería ☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál? Instalado unos perfiles metalicos
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío ☒	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio
4.Institucional	☐		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: No tiene	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rustico y terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: No aplica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se pudo constatar la conexión a tubería de alcantarillado existente, por ausencia del propietario

Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91518424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4394		

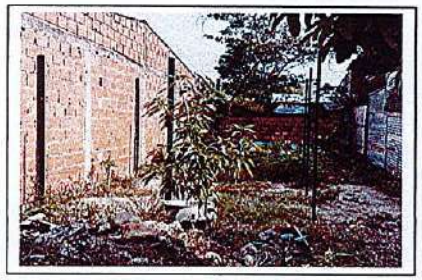



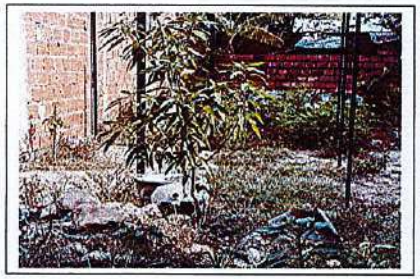







Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91518424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03 (DD) 03 (MM) 2026 (AAA)	4395		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JHON EDER ACEVEDO DUQUE
Dirección:	MANZANA 56 CASA 38
Teléfono:	3222320648 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubiertos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice elemento "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit y cielo raso en pvc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Baldosa tipo cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Baldosa y concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado derecho
FACHADA: Carpintería metálica con vidrios y rejas con muros con pañete estuco y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tuberia de alcantarillado existente, información suministrada por propietario

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: JHON EDER ACEVEDO DUQUE	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1143846388	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03 (DD) 03 (MM) 2026 (AAA)	4395		










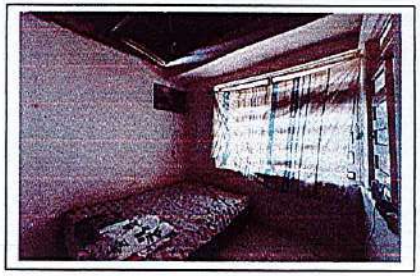

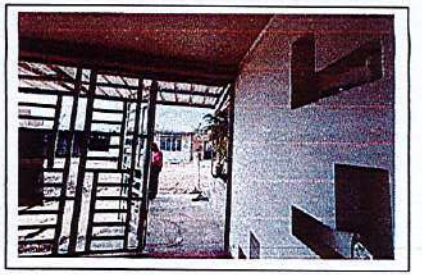

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: JHON EDER ACEVEDO DUQUE	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1143846388	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

666

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4396		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	María Carolina daza
Dirección:	Manzana 50 casa 37
Teléfono:	3142581502 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cementerios con reata			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico con mineral nestra	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenpiada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: María Carolina daza	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 33676399	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4396		













Nombre: María Carolina daza	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 33676399	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4397		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	CINDY BORJA
Dirección:	MANZANA 50 CASA 36
Teléfono:	3208041667 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cancha/piso		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas y vigueta	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja metalmil	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado izquierdo de la vivienda
FACHADA: Carpintería metálica y muro con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tubería de alcantarillado cubierta información suministrada por propietaria

Sindy Borja		
Nombre: CINDY BORJA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1048426872	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4397		



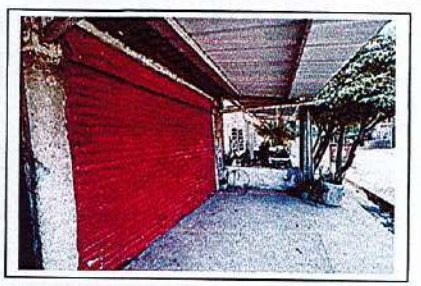





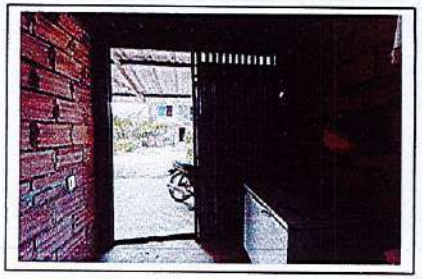



Sindy Borja		
Nombre: CINDY BORJA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1048426872	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4398		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .
Dirección: Manzana 60 casa 35
Teléfono: . No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con maita			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico con mineral nostre	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)


La comunidad afirmo que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente


Nombre: Johana Gonzalez C.C.: 1057910916. Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4398		



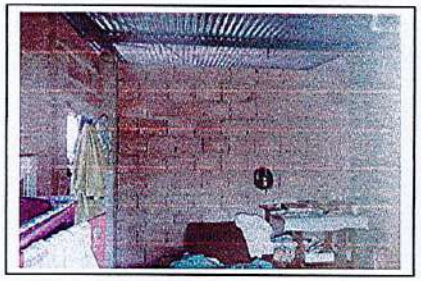

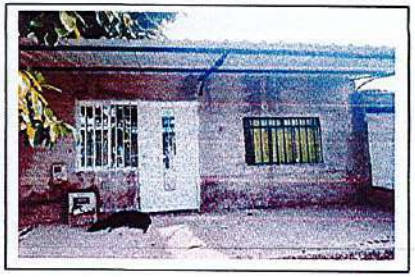Nombre: Johana Gonzalez C.C.: 1057910916. Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
03 / 03 / 2026	4399		CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	MANZANA 50 CASA 34
Teléfono:	- No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construccion en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros sin estructura de refuerzo	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja zinc y madermi	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural y concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden costado derecho de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica y cerramiento con porton	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar conexión a tubería de alcantarillado existente por ausencia de propietario

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Valentina Osorio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1029692200	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
03 / 03 / 2026	4399		CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

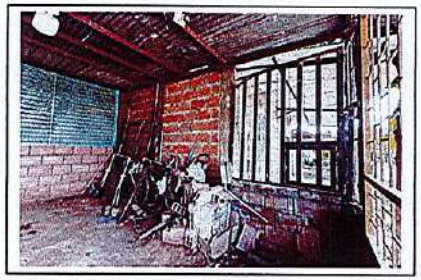

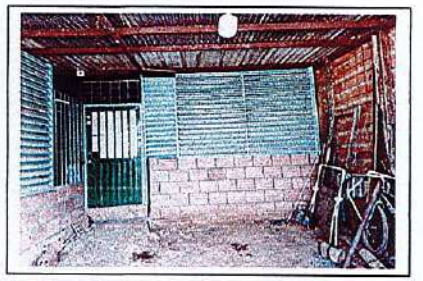









Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Valentina Osorio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1029692200	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	03	2026	4372		ACUATODOS E.S.P.	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	ELIZABETH BENAVIDES AGUILAR
Dirección:	MANZANA 57 CASA 11
Teléfono:	3186476708 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cúal?		4.Convencional con zinc			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS AEREAS PERIMETRAL	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Baldosa	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el patio de la casa
FACHADA: Carpintería metalica con vidrios y muros con baldosa	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tuberia de alcantarillado existente, información suministrada por propietario

Nombre:	ELIZABETH BENAVIDES AGUILAR	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	63321495	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	03	2026	4372		ACUATODOS E.S.P.	CONSORCIO BENDICION 23







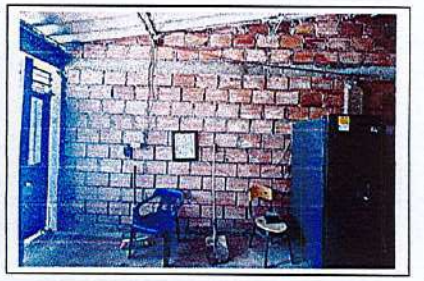





Nombre:	ELIZABETH BENAVIDES AGUILAR	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	63321495	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4373		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 67 casa 10
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío ☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Puerta metálica y ventana en malla eslabonada, con muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4373		












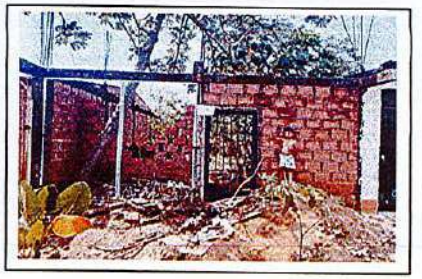

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

S&t

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
02	03	2026	4374		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	VANESA RESTREPO
Dirección:	MANZANA 57 CASA 9
Teléfono:	3203377264 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en andén
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja termoacril	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En baldosa tipo cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rotico con Fisuras y en mal estado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrios y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tubería de alcantarillado existente, información proporcionada por propietaria

Nombre:	C.C.:	
VANESA RESTREPO	1118534618	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
02	03	2026	4374		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	C.C.:	
VANESA RESTREPO	1118534618	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4375		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Nathali Rodriguez
Dirección:	Manzana 57 casa 8
Teléfono:	3210272227 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja metálica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenigda en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propiedad alirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre:	Nathali Rodriguez	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1118529401	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4375		






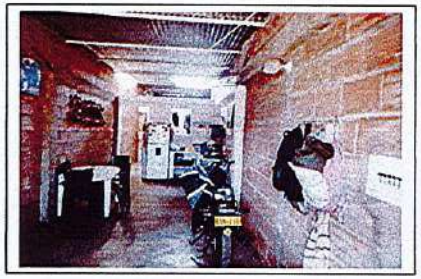



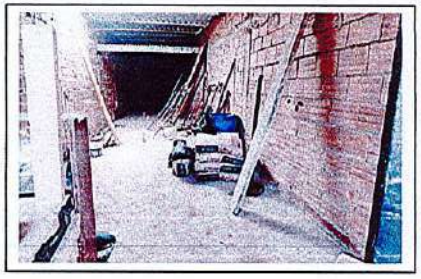

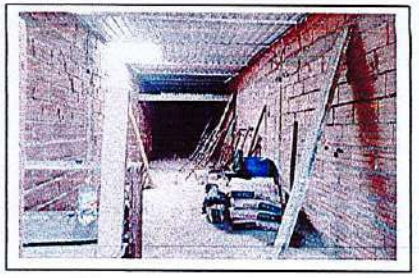

Nombre:	Nathali Rodriguez	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1118529401	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4376		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	NARCISA BARRAZA
Dirección:	MANZANA 57 CASA 7
Teléfono:	3114148108 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado sin placa	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACION: Ubicado en el anden parte interna de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica con vidrios y cerramiento con malla eslabonada y muros con pintete y pintura	OTRO: ¿Cual?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información conceptuada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tuberia de alcantarillado existente, información suministrada por propietaria

Nombre:	NARCISA BARRAZA	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	30208301	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4376		

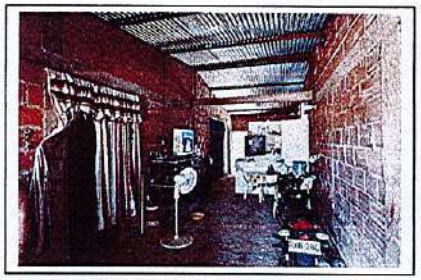






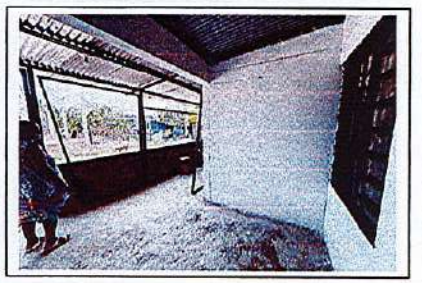

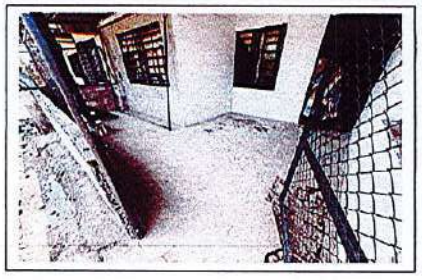

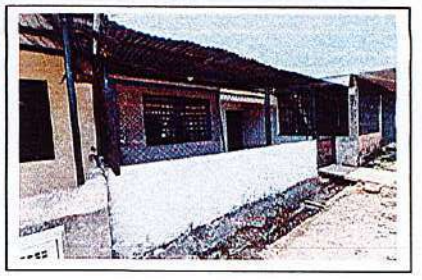

Nombre:	NARCISA BARRAZA	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	30208301	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4377		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	BLANCA MONCADA
Dirección:	MANZANA 67 CASA 6
Teléfono:	3214226700 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Salón		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Baldosa tipo cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica con vidrios	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tubería de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada por propietario

Nombre: BLANCA MONCADA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1098634833	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4377		













Nombre: BLANCA MONCADA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1098634833	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

bak

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4378		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Ingrid yurani izquierdo
Dirección:	Manzana 67 casa 6
Teléfono:	3222872130 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: I pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio y muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria alli me dijo que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Ingrid yurani izquierdo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118566044	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4378		













Nombre: Ingrid yurani izquierdo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118566044	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
02	03	2026	4379		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

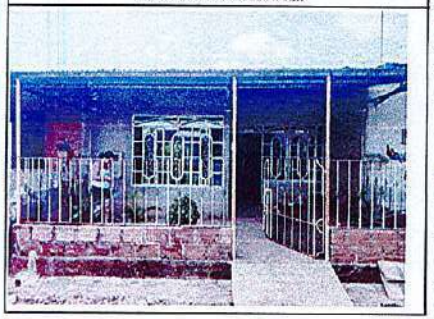

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Marniela castañeda
Dirección:	Manzana 57 casa 4
Teléfono:	3005111023 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete	HUMEDADES: Se evidencia en muros de habitación y sala
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.:	
Marniela castañeda	52443360	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
02	03	2026	4379		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23



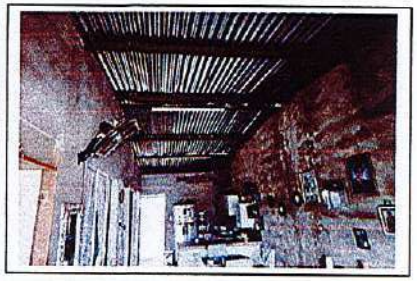









Nombre:	C.C.:	
Marniela castañeda	52443360	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4389		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -
Dirección: MANZANA 57 CASA 3
Teléfono: - No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con pañete	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja machimbrada	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden costado derecho
FACHADA: Carpinteria metalica y muro en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


No se pudo constatar conexión a tuberia de alcantarillado existente por ausencia del propietario

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4390		



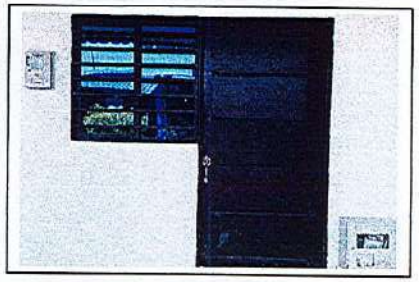



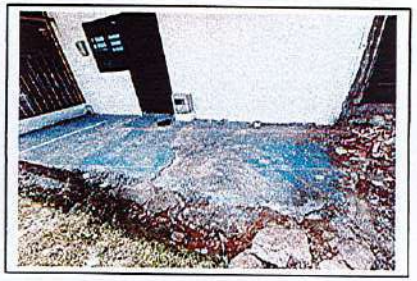





Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

202

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4381		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Eduardo Vargas
Dirección:	Manzana 5/ casa 2
Teléfono:	3227173317 No.pisos: 1
Long. del frente (m/a):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Placa huella en metaldut, con instalación de cielo raso.	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica sin vidrio.	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirmó que no se encuentra conectado a la red de alcantarillado existente

Nombre: Eduardo Vargas	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 125200575	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4381		




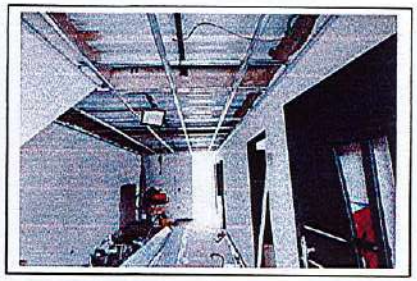

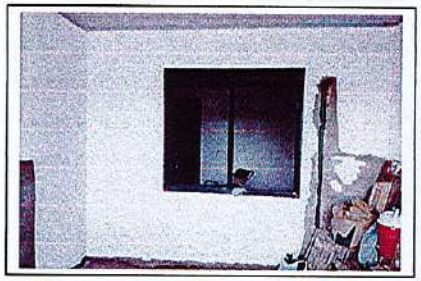

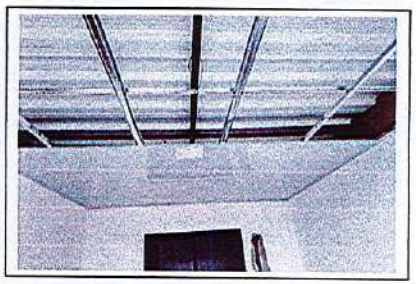



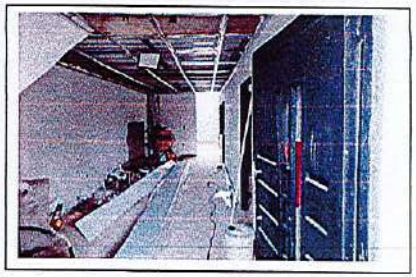


Nombre: Eduardo Vargas	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 125200575	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4382		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

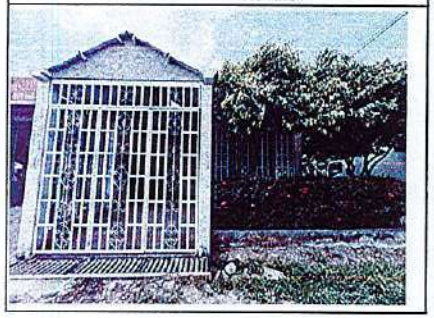

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -

Dirección: MANZANA 57 CASA 1

Teléfono: - No.pisos: 1

Long. del frente (mts): 0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria noreforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cúal?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En cielo raso	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Baldosa tipo cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Baldosa tráfico pedado y concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo ubicado en el anden costado izquierdo
FACHADA: Carpinteria metalica con vidrios y cerramiento con porton metalico y cubierta de teja	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se pueda constatar conexión a tuberia de alcantarillado existente por ausencia de propietario

Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
02	03	2026	4382		

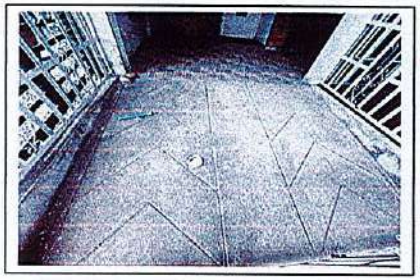


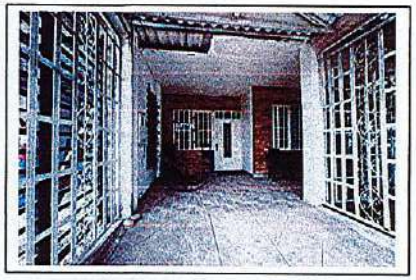







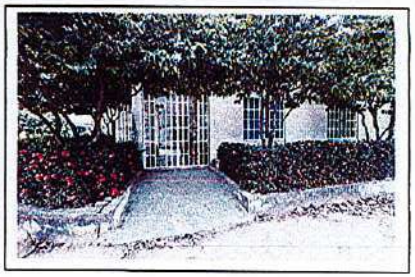

Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2025	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4490		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	Manzana 60 casa 33
Teléfono:	- No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2 Comercial		6 Baldío		Cuentos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4 Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo utilizando en el anden
FACHADA: Puerta metálica sin vidrio y muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre:	C.C.:	
[illegible]	1118160379	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2025	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4490		

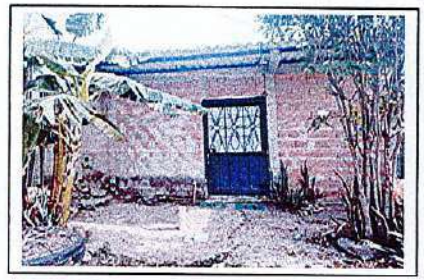












Nombre:	C.C.:	
[illegible]	1118160379	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

SBC

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4401		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

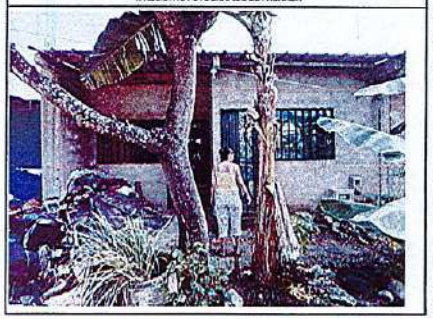

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	HERMINIA FUENTES
Dirección:	MANZANA 50 CASA 32
Teléfono:	3114963804 No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas y vigueta	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque con pañete	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja masiemil	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico y terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el patio
FACHADA: Carpinteria metalica y muro plateado	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado a tubería de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada por propietaria

Herminia Fuentes		
Nombre: HERMINIA FUENTES	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: 47431437	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4401		









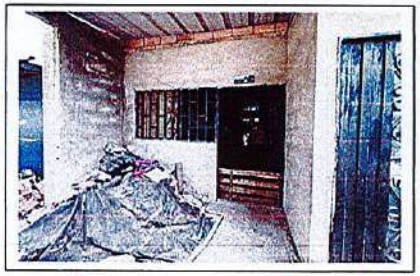



Herminia Fuentes		
Nombre: HERMINIA FUENTES	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: 47431437	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4402		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yasmina torres
Dirección:	Manzana 50 casa 31
Teléfono:	3165056905 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construida	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos.
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura metalica con lámina superboack	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Muros en lámina de superboack	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Puerta metalica con muros en lámina de superboack	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre:	Yasmina torres	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	37178924	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Conintista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4402		













Nombre:	Yasmina torres	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	37178924	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Conintista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4403		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .

Dirección: MANZANA 60 CASA 30

Teléfono: . No pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia ubicación
FACHADA: No aplica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar conexión a tubería de alcantarillado existente por ausencia de propietario

Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
03	03	2026	4403		













Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AÑA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03	03	2026	4404		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Orlando sanabria
Dirección:	Manzana 50 casa 29
Teléfono:	3133767591 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Bpldio	☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional	☐			SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice obvenarl "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No se evidencia	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuenta con pozo séptico por que la vivienda está en construcción
FACHADA: Columnas en concreto con vigas de cimentación	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información conseptada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirmó que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Orlando sanabria	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 91455240	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AÑA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03	03	2026	4404		



Nombre: Orlando sanabria	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91455240	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
03 / 03 / 2026	4405		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -
Dirección: MANZANA 50 CASA 28
Teléfono: - No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construccion en madera		6.Mamposteria no reforzado	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja manicmil	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia la ubicación
FACHADA: Carpinteria metalica y muro pañetado	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar conexión a tubería de alcantarillado existente por ausencia de propietario

Nombre:	C.C.:	Propietario
-	-	

Nombre:	C.C.:	Representante del Contratista de Obra
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	

Nombre:	C.C.:	Representante del Contratista de Interventoria
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
03 / 03 / 2026	4405		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23





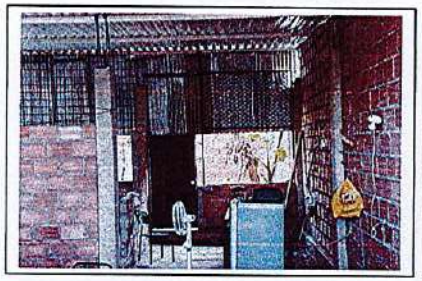

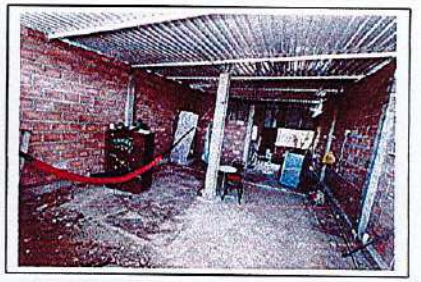

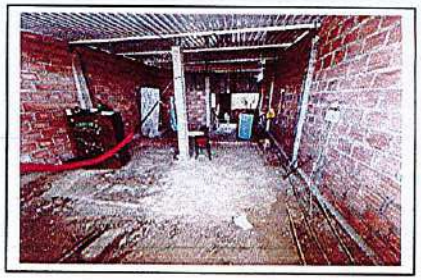



Nombre:	C.C.:	Propietario del predio
-	-	

Nombre:	C.C.:	Representante del Contratista de Obra
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	

Nombre:	C.C.:	Representante del Contratista de Interventoria
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	
