

INFORME CONTRATO No. 2190 2020

PORTADA

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

CIVILAG S.A.S.
Ingeniería Integral Civil & Agrícola S.A.S.

INFORME FINAL


CONTRATO No. 2190-2020

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO A TODO COSTO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CATASTRO

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Total Duración (días)
2020-11-25	2020-12-09	15

De acuerdo al numeral 2.1 (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), y para dar cumplimiento al subnumeral 17 *"Presentar el informe al Supervisor designado del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización de los respectivos pagos de acuerdo con los formatos establecidos por el IGAC para esos fines.";* a continuación, se describen en este informe las actividades realizadas para cumplir con el objeto del contrato en mención:

Etapas de ejecución contractual

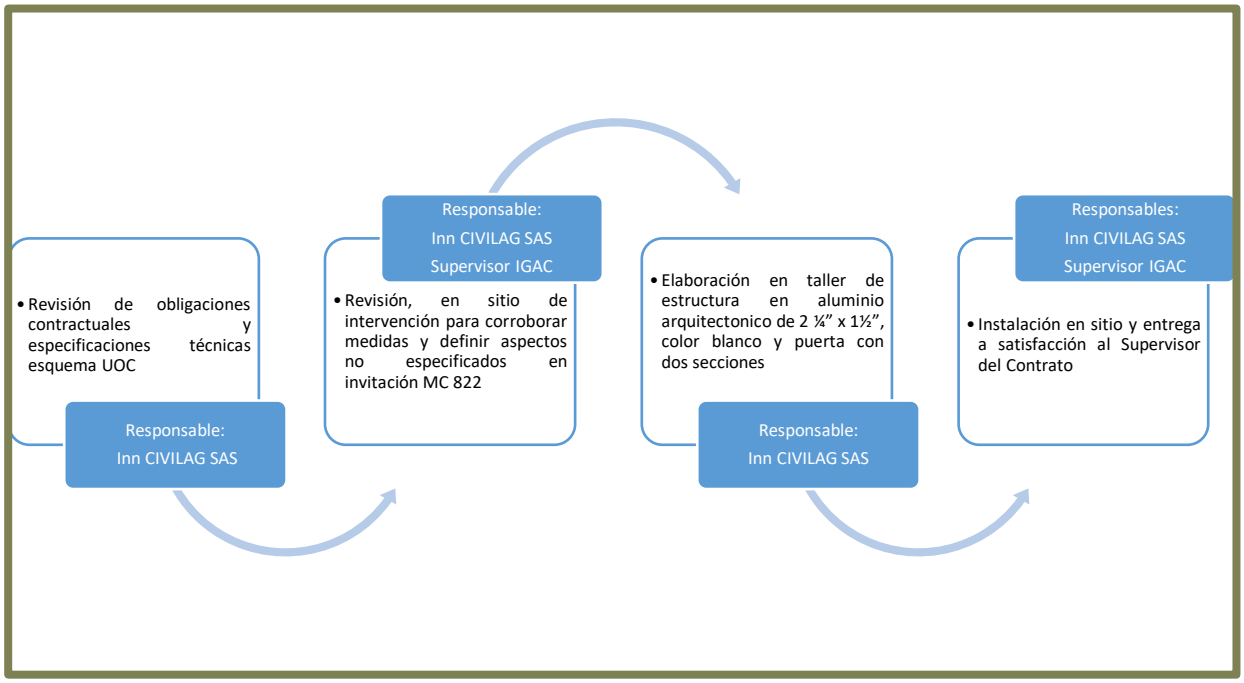

Luego de verificar el anexo técnico UOC el Banco (Figura 1. Especificaciones técnicas), con las medidas y obligaciones del objeto contractual, se procede a verificar las medidas en el sitio de la obra. (Foto No. 1. Fachada principal UOC El Banco Magdalena y Foto 2. Sito de intervención antes).

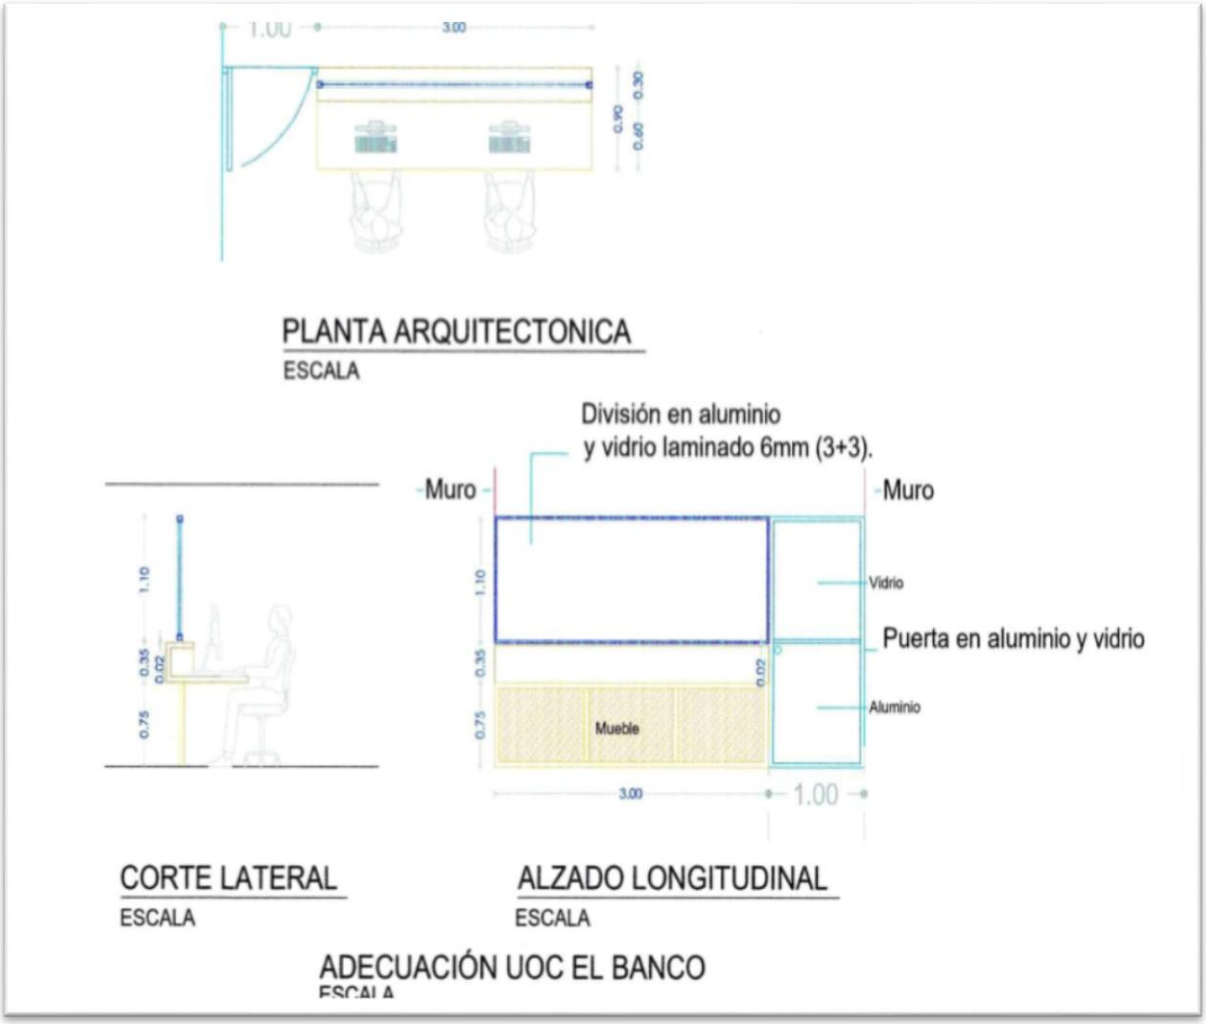


Figura No. 1. Especificaciones técnicas



Foto No. 1. Fachada principal UOC El Banco Magdalena

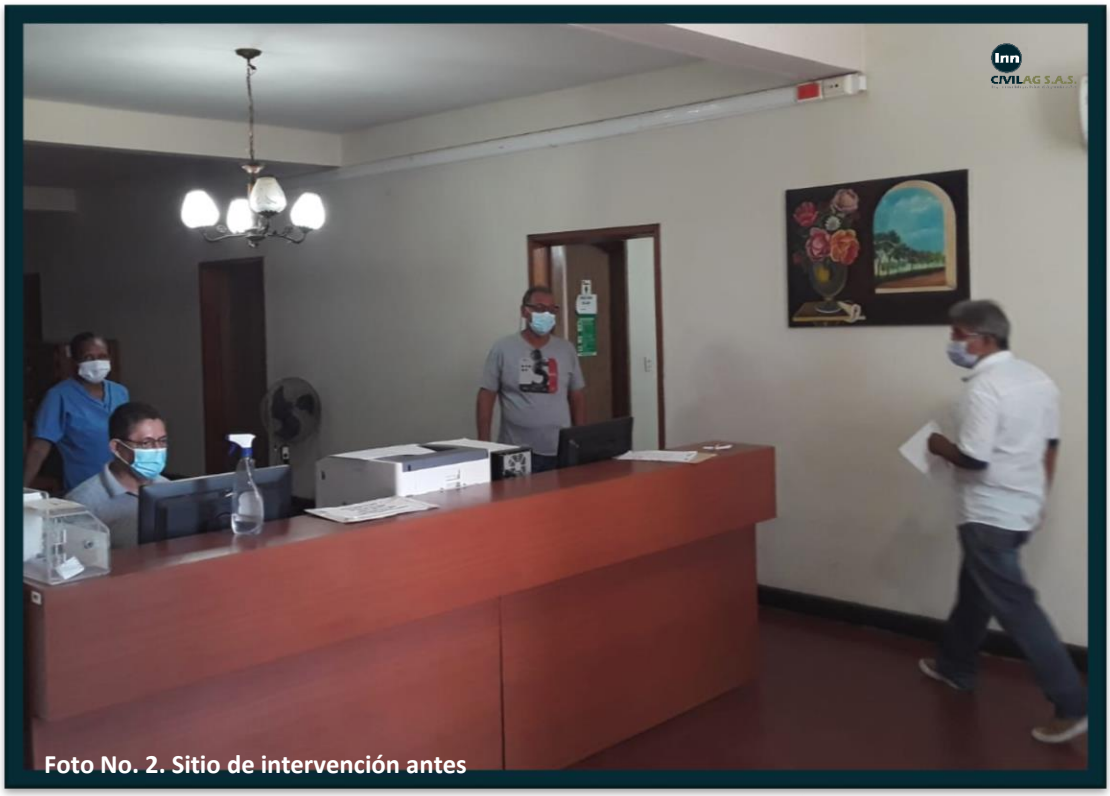


Foto No. 2. Sitio de intervención antes

En donde en conjunto con el supervisor del contrato Arq. Tiberio Guerrero, se determinó que la estructura para soportar el vidrio se construirá en aluminio estructural en 2 ¼" x 1½", se presenta posterior dos opciones de perfil para definir el color y mostrar cómo quedaría la estructura (Foto No. 3. Modelo y definición color estructura)

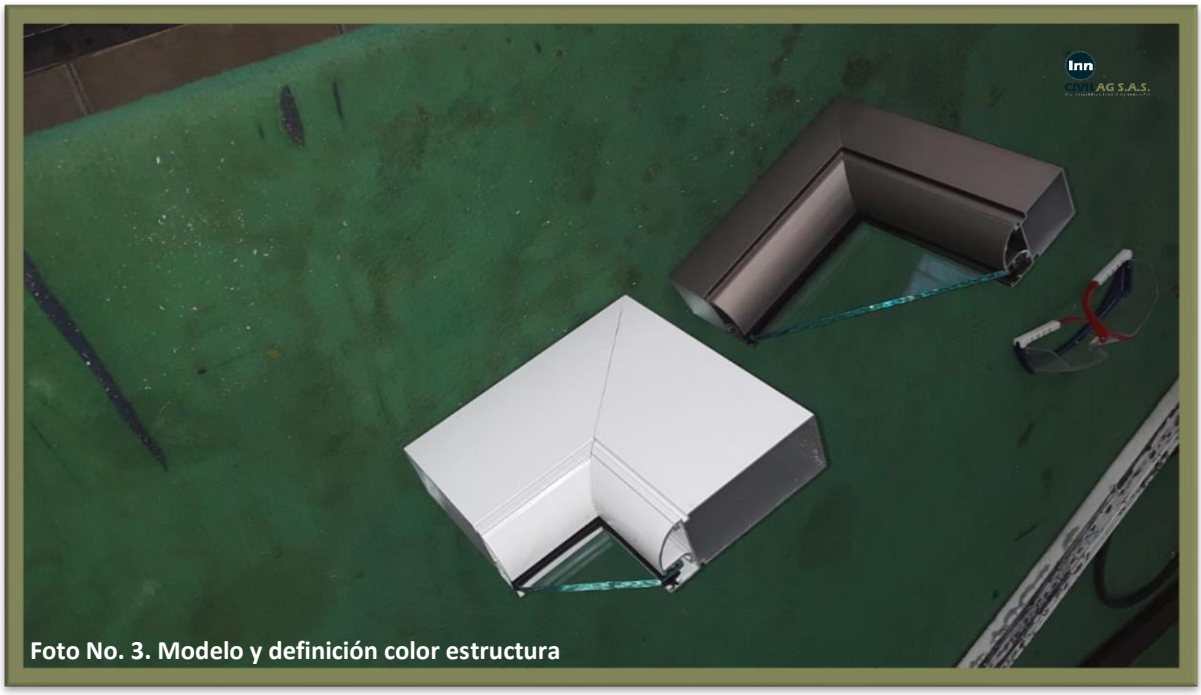


Foto No. 3. Modelo y definición color estructura

seleccionándose el color blanco, ubicando un perfil a la mitad de la misma, esto para darle una mayor estabilidad y seguridad al vidrio, y se instalaron dos secciones de vidrio de 6 mm laminado +3+3, cada una de ellas con dimensiones: 1,51 m de largo x 1,10 m de alto, sin perforaciones para pasa voz, dado a que se consideró que entre el borde superior del vidrio y la placa del techo este queda descubierto, garantizándose con esto comunicación entre clientes y recepción, por otro lado, para el caso del pasa papel, el perfil de aluminio se colocó 2" por encima de la superficie de la recepción, donde descansará el vidrio. Largo = 3,03 m y Alto =1,10 m.

Puerta elaborada con marco en aluminio estructural de 3"x1" y contra marco de 4½", color blanco pintura, con parte inferior tipo machimbre y parte superior en vidrio de espesor 6 mm duplo laminado +3+3, incluida cerradura tipo oficina, dimensión final Alto = 2,15 m, Ancho =1,0 m.

Definidos todos los parámetros anteriores, se construyó e instaló la estructura para el vidrio, así como la puerta en aluminio.

A continuación, y atraves de las fotografías se muestran las secuencias del proceso constructivo, montaje e instalación de la estructura arquitectónica y puerta:

Equipo Humano y Materiales



Foto No. 4. Equipo humano de Inn CIVILAG SAS








CIVILAG S.A.S

Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6

Construcción en Taller

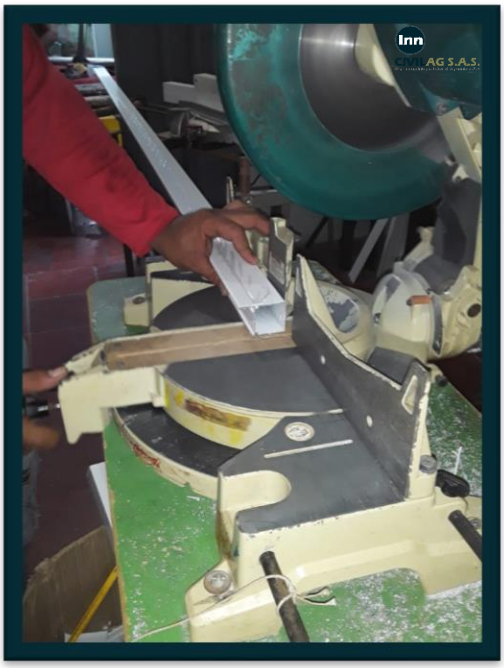
322 386 74 63

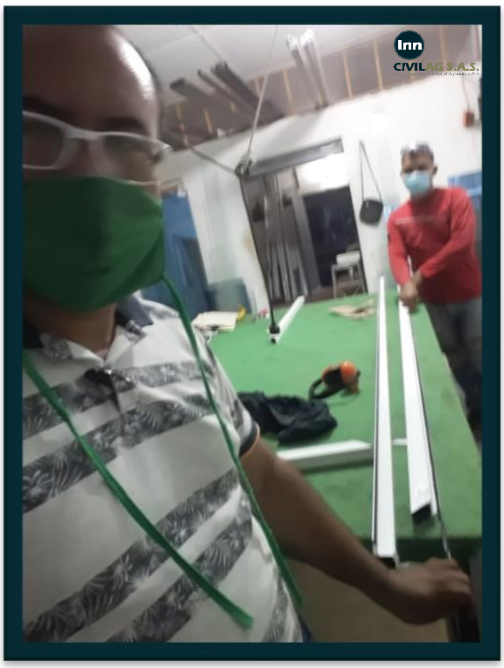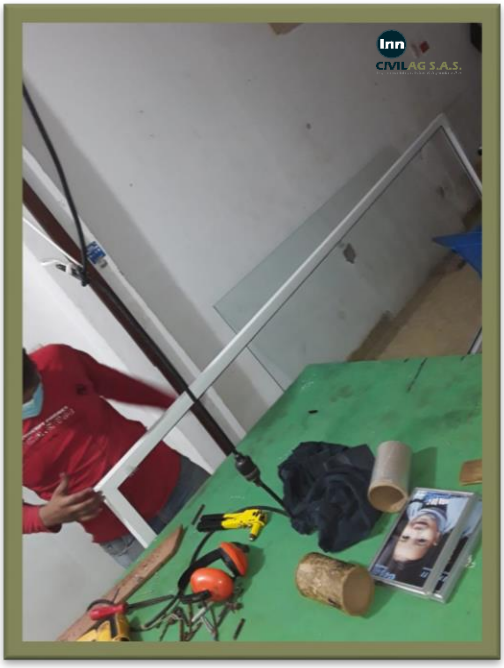@inncivilag

inncivilag@gmail.com

(57-1) 802 64 71

inncivilag

Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia


CIVILAG S.A.S


Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6


Instalación en sitio de obra





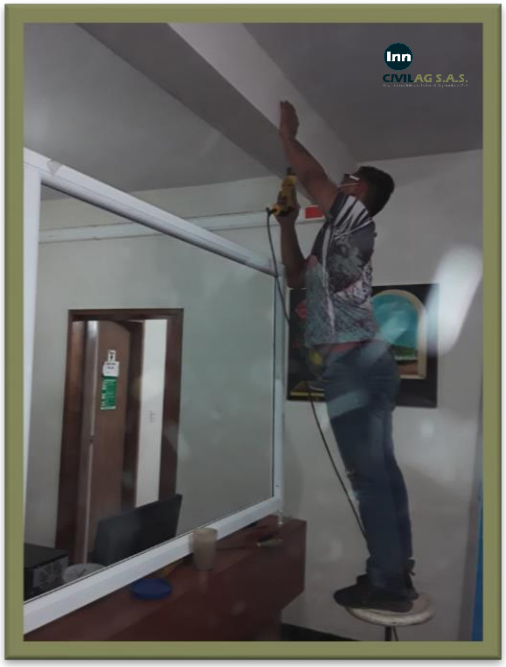

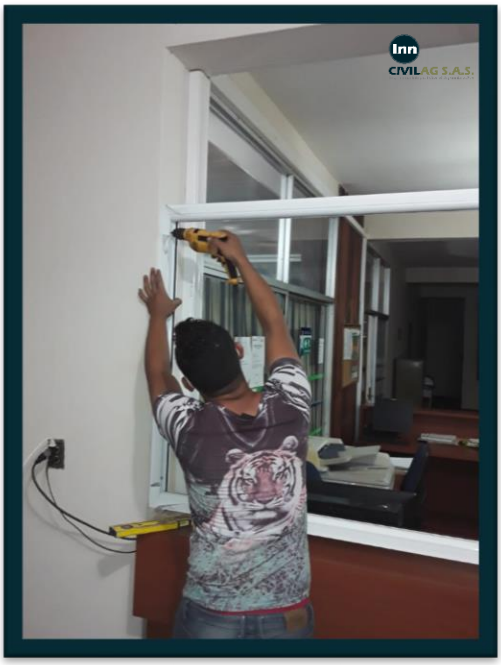

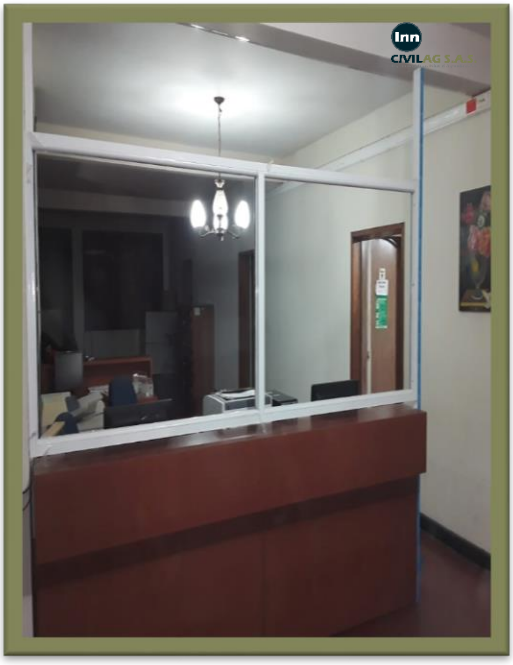

322 386 74 63

@inncivilag

inncivilag@gmail.com



(57-1) 802 64 71

inncivilag


Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

CIVILAG S.A.S

Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6

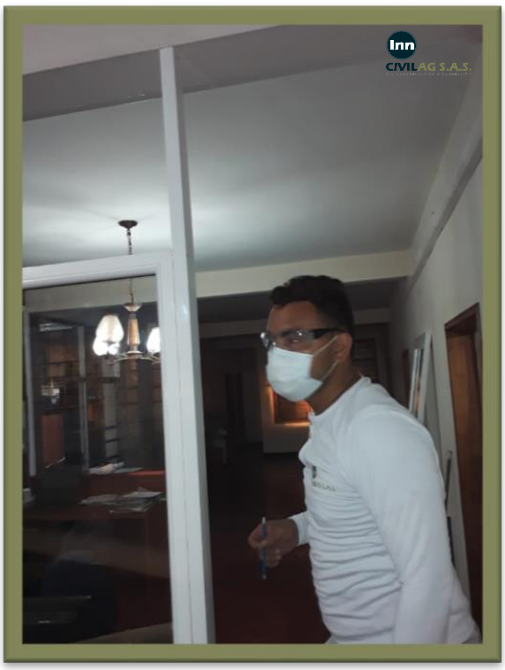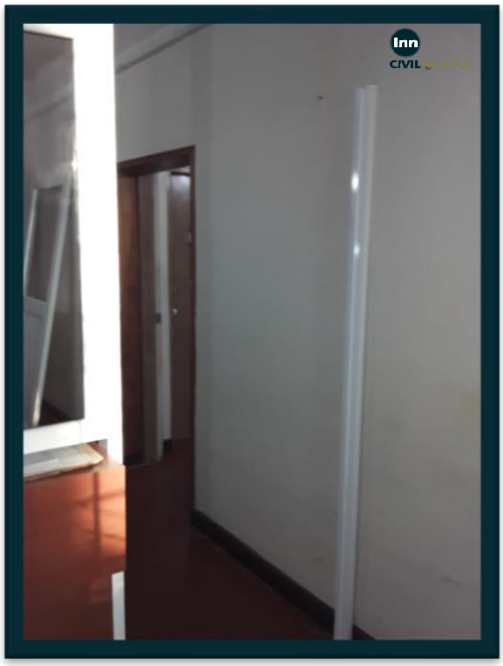

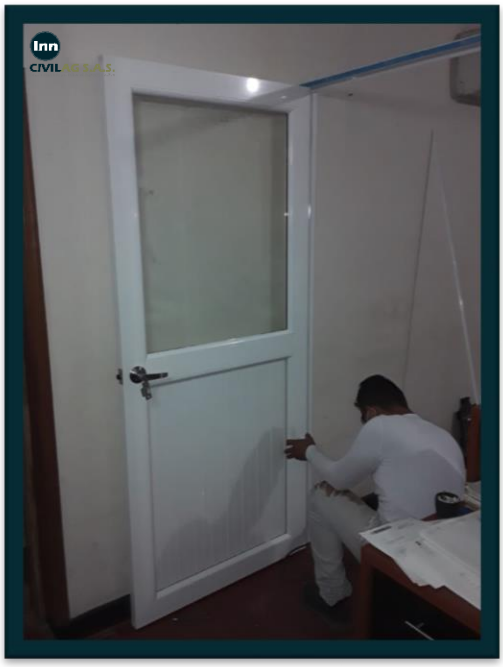

322 386 74 63

@inncivilag

inncivilag@gmail.com

(57-1) 802 64 71

inncivilag

Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

De acuerdo al numeral 2.2. (OBLIGACIONES AMBIENTALES), y para dar cumplimiento al subnumeral 2, y dada la naturaleza de la obra no se generaron escombros, los pocos residuos generados durante la instalación de la estructura se procedió a realizar la recogida y limpieza general del sitio de la obra para la entrega y aprobación por parte del Supervisor del Contrato.

Limpieza y aseo de espacio intervenido





CIVILAG S.A.S
Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6

Recepción UOC El Banco Magdalena (Antes)





Recepción UOC El Banco Magdalena (Después de ejecución del contrato)

By Inn CIVILAG SAS

322 386 74 63
@inncivilag
inncivilag@gmail.com
(57-1) 802 64 71
inncivilag
Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia
