INFORME DE INSTALACIÓN DE AULA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

AULA TIPO I

ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
1.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H =0.0-0.2.0 M	UBATÉ	M3	11.67

DESCRIPCIÓN

Se ejecutaron las excavaciones para la cimentación (dados de concreto) del aula ambiental, las zonas de crecimiento, maduración, rusificación, cuarentena, sustratos y anclajes. Asimismo, se realizaron las adecuaciones de terreno para la hincada de postes de madera y la instalación del sistema hidrosanitario, incluyendo el pozo séptico, campo de infiltración, cajas de inspección, trampa de grasas y redes sanitarias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**MUNICIPIO**	**UND**	**CANTIDAD EJECUTADA**
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIMENTACIÓN DADOS EN CONCRETOS 3000 PSI	UBATÉ	M3	3.26

DESCRIPCIÓN

Se fundieron los dados en concreto de 3000 PSI para la estructura metálica del aula ambiental, las zonas de crecimiento, maduración, rusificación, cuarentena, sustratos y para los anclajes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI	UBATÉ	M3	3.90

DESCRIPCIÓN

Se fundieron las placas para el tanque de almacenamiento de 5000 litros y bodega prefabricada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLISOMBRA Y PLASTICO	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación del plástico calibre 6 y calibre 10 para el aula ambiental y poli sombra para las zonas de crecimiento, maduración, rusificación, cuarentena y sustratos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
1.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza las instalaciones hidrosanitarias, se realiza la adecuación de salidas sanitarias de en 4 y 2 pulgadas para sanitarios, lavamanos y sifón, y puntos hidráulicos para sanitario, ducha y lavamanos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
1.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza las instalaciones eléctricas de la bodega prefabricada la cual consta de las salidas toma y lámparas, línea a tierra, tablero parcial y lampara.

REGISTRO FOTOGRÁFICO








ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
1.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIAS	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación del tanque sanitaria y lavamos con si respectiva grifería.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



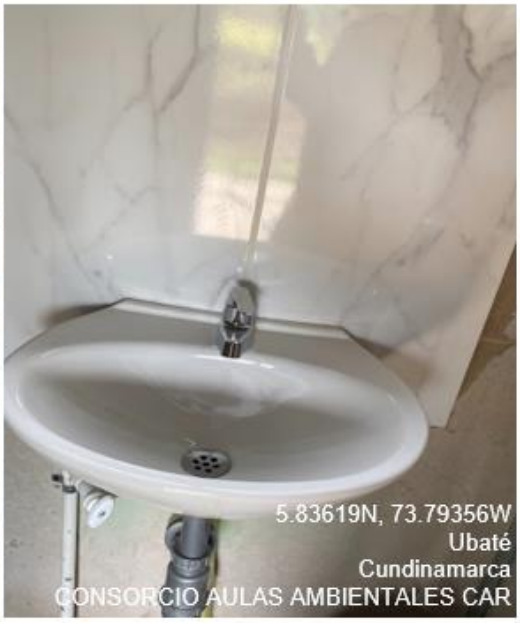

ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
1.1.11	TANQUE SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación del tanque séptico Eternit de 1000 LT.
Este tanque este compuesto por dos tanques de 500 litros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
NP-02	CARPINTERIA METALICA (TIPO B)	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación de la estructura metálica en tubería de 2 pulgadas y cable de acero galvanizado de ¼, 1/8 y 3/16 de pulgada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS HIDROSANITARIOS INCLUYE DUCHA SENCILLA, TUBERÍA, ACCESORIOSY PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA SEPTICO	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación de tubería de 2 y 4 pulgadas, codos, uniones, tee sanitarias para realizar la respectiva conexión del sistema séptico. También, se instala el campo de infiltración con tubería perforada, geotextil y triturado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
NP-05	MESONES EN MADERA AULA DE GERMINACIÓN	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación de las mesas con postes y repisas de madera para el área de germinación dentro del aula ambiental.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	UBATÉ	KG	117

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación del refuerzo en malla electrosoldada para las placas en concreto de los tanques de almacenamiento y la bodega prefabricada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	**INFORME DE INSTALACIÓN DE AULA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01**	CONSORCIO AULAS AMBIENTALES CAR

ÍTEM	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	UND	CANTIDAD EJECUTADA
NP-07	BODEGA PREFABRICADA	UBATÉ	UND	1

DESCRIPCIÓN

Se realiza el suministro e instalación de la bodega prefabricada con sus respectivas, puertas y ventanas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



