QUIMICO	:Polvos inorgánicos, líquidos	Enfermedades respiratorias,irritaciones en la piel y ojos	Ejecutar capacitaciones sobre la importancia de riesgo químico Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas,
FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI X	NO	N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI X	NO	N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI X	NO	N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI X	NO	N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI X	NO	N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI X	NO	N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI X	NO	N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI X	NO	N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI X	NO	N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI X	NO	N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI X	NO	N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI	NO	N/A X

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	Ronal Yesid Rey
martin carvajal	91.352.861	ayudante.	Martin Carv
eucbio Padilla campo	7.048.556.317	ayudante	Eucbio
Pedro leon Chanagua	91.330.586	oficial	Pedro Leon
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestre	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES
Consorcio La Flora 2023		
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jairo Javier B	NOMBRE: Judith Bibiana Gracon
FIRMA: Karen	FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946	CEDULA:	CEDULA: 70707927799
CARGO: Prof. SST	CARGO: Director de obra	CARGO: SST - Subcontratista

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA	✓
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	04 NOV 2023	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	08 NOV 2023	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIONES MECANICAS - Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ✓	NO	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas		Trabajo En Cliente		Espacios Confinados	
Tala de arboles		Excavaciones	X	Boxculver		Actividad Rutinaria	SI X	NO	
REQUIERE BLOQUEO	SI	NO	¿CUÁL?	Eléctrico		Hidráulico		Mecánico	Otro:

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	✓	Gafas de seguridad	✓	Proteccion respiratoria	
Barbuquejo		Guantes De Vaqueta		Careta para Soldar	
Peto		Guantes De Nitrilo	✓	Careta Para Pulir/Esmeril	
Mangas	✓	Guantes caucho		Socialización ATS	✓
Traje de fontanero		Guantes de Carnaza	✓	Permisos de Trabajo	✓
Extintor	✓	Proteccion Auditiva		Kit de rescate	
EPCC		Botas de seguridad (pantaneras)	✓	Elementos de primeros auxilios	✓

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente		Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo		Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada		Organización del trabajo		Bacterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico	✓	Polvo orgánico	✓	Vibraciones	✓	Postura mantenida	✓	Características del grupo		Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos		Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos		Inundaciones	
Público	✓	Líquidos	✓	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no ionizantes (UV)		Manipulación de cargas		Claridad del Rol		Mordeduras		Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado		Radiaciones Ionizantes		Desórdenes musculoesqueléticos (Os bajas)		Relaciones interpersonales		Fluidos y excrementos		Fallas en sistema de desvio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Ruido (impacto intermitente)	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de Maquinas y equipos. Programa de inspecciones.
		Vibraciones	lumbalgias, dolores de cabeza, problemas de equilibrio	Capacitaciones sobre autocuidado, la realizacion de pausas activas Recibir charlas sobre higiene postural Y ergonomia. *Seguimiento a examenes medicos ocupacionales al personal expuesto *Inspecciones preoperacionales Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria Elementos de proteccion personal, mantenimiento del equipo, Pausas activas, higiene postural
		Radiaciones no Ionizantes.	Dolores de cabeza, Migrañas, Mareos, deshidratación.	Charlas sobre medidas de prevención de calor Instalación del punto de hidratación Utilizacion de elementos para protegerse del sol y la utilizacion de Elementos de proteccion personal.
		Locativos : Golpes y Caidas a distinto Nivel, caidas de objetos y deslizantes, con diferencia del nivel	Raspaduras; Laceraciones ;Golpes; Fracturas; Fisuras en parte osea; esguinses.	Charlas sobre autocuidado y seguir protocolos de seguridad en cada una de las tareas. Implementación de orden y aseo Instalación de señalización preventiva Uso de EPP adecuado (Casco, Calzado de seguridad). Delimitación y señalización areas de trabajo, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de maquinaria pesado. Delimitación de áreas para tránsito maquinaria, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de

Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Mecanico	Laceraciones; Atrapamientos; amputaciones;Golpes; Cortes	Charlas de Autocuidado Seguir procolos de seguridad Utilizacion de EPP Llevar control permanente de las hojas de vida de cada uno de los equipos y las maquinas utilizadas en la operación programar y ejecutar inspecciones planeadas.
		Riesgo publico Robos y atracos.	Politraumatismos, caidas a distinto nivel, fracturas, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta) tecnologico por explosión por presencia de red de gas	Fracturas Muerte Pérdidas economicas	Acondicionamiento del terreno Señalización en obra de presencia de red de gas a cargo de la empresa VANTI Delimitación de áreas de trabajo capacitación Peligros y riesgos por fuga de gas cargo de la empresa VANTI Brigada de control de incendio Disponibilidad de extintores en obra Inspecciones de extintores
		Electrico: (Por contacto electrico indirecto de la maquina con presencia de lineas de alta tensión instaladas en el area de trabajo presencia de redes electricas (lineas eléctricas conectadas a las viviendas aledañas al sector)	Golpes y caidas producto del choque electrico Quemaduras Tetanización muscular Afectaciones en el corazón Aumento de presion sanguinea Asficcia y shock	Señalización en obra todo lo referente a riesgo electrico Socializar las 5 reglas de oro (Corte efectivo, Prevenir cualquier posible retroalimentación-Bloqueo y señalización), verificar ausencia de tensión, Puesta a tierra y corto circuito y Señalización a la zona de trabajo) Articulación con la empresa ede lectricidad local (cuando sea necesario desconeccion o corte total por operación de la maquina) continuar entrega oportuna de epp
		Accidentes de transito	Contución Golpes y heridas Perdida de materiales Muerte	Capacitación en el manejo de maquinaria Adecuación de vias Capacitación en seguridad vial Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos Controladores viales Cumplimiento al PMT Señalización en obra Socialización de lineamientos del PMT con conductores de volquetas y operadores de maquinaria
	BIOMECANICOS:	Postura prolongada mantenida	Lumbagos, Dolores de Espalda. Dolores musculares Alteraciones osteomusculares	Gestion ante la ARL para recibir Asistencia Tecnica en Charlas de Higiene Postural Realizar pausas activas. Ejecución de actividades de prevención y promoción (Ballroterapias y pausas activas) Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Capacitacion en Higiene Postural. Programa de pausas activas
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de serpientes y roedores.	Dengue Comun y hemorragico ; Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; vértigo; desmayos, gastroenteritis	*Charlas de Autocuidado; Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Virus y bacterias	Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; desmayos, gastroenteritis	*Punto de desinfección en sitios de obra *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Inhalacion de Gases y Vapores	Tos permanente, Dolor en el pecho, irritación de la garganta, dolores de estomago. Alteraciones respiratorias Intoxicación.	utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de los gases y vapores (Tapabocas, gafas) Seguimiento mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria
		Material Particulado	Gripas; Bronquitis; Tos permanente; Fiebres; Neumonias. Enfermedades respiratorias.	Humectación de áreas en obra y vías donde transitan vehículos que transportan RCD Utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de las particulas de polvo y la contaminación en general. Tapabocas y caretas respiratorias. Seguimiento uso y entrega de tapabocas
		lluvias, Inundaciones y vientos fuertes	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables.

	FENOMENOS NATURALES:	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización de lineas de emergencia

	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Estrés laboral; Dolor de cabeza; Migraña. Fastiga Espasmos musculares	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral Prevención de estres

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO ✓ N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI NO ✓ N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO ✓ N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO ✓ N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PEDRO NELL GALLARDO UREÑA	1090390025	OPERADOR	
WILLIAM A. VALENCIA MAIRONGO	98431537	OPERADOR	
ELVER GOMEZ LACHE	91466934	OPERADOR	
ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN	91288062	OPERADOR	
OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS	1096512815	OPERADOR	
BERNABE PEÑA RONDEROS	91253552	OPERADOR	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA	
NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE:	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA:	26863946	CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA	✓
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	10 Nov 2025	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	15 Nov 2025.	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIONES MECANICAS - Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI [✓]	NO [ ]	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas [ ]		Trabajo En Cliente [ ]	Espacios Confinados [ ]		
Tala de arboles [ ]	Excavaciones [X]			Boxculver [ ]		Actividad Rutinaria	SI [X]	NO [ ]	
REQUIERE BLOQUEO	SI [ ]	NO [ ]	¿CUÁL?	Eléctrico [ ]	Hidráulico [ ]	Mecánico [ ]	Otro: _____		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	[✓]	Gafas de seguridad	[✓]	Proteccion respiratoria	[✓]
Barbuquejo	[✓]	Guantes De Vaqueta	[✓]	Careta para Soldar	[ ]
Peto	[ ]	Guantes De Nitrilo	[✓]	Careta Para Pulir/Esmeril	[ ]
Mangas	[✓]	Guantes caucho	[ ]	Socialización ATS	[✓]
Traje de fontanero	[ ]	Guantes de Carnaza	[✓]	Permisos de Trabajo	[✓]
Extintor	[✓]	Proteccion Auditiva	[✓]	Kit de rescate	[ ]
EPCC	[✓]	Botas de seguridad (pantaneras)	[ ]	Elementos de primeros auxilios	[✓]

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico	✓	Iluminación	✓	Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Bacterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico	✓	Polvo orgánico	✓	Vibraciones	✓	Postura mantenida	✓	Características del grupo	✓	Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras	✓	Temperaturas altas / bajas	✓	Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Liquidos	✓	Presión Atmosférica	✓	Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado	✓	Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes	✓	Desarrollo musculoesqueléticos (De base)	✓	Relaciones interpersonales	✓	Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Ruido (Impacto Intermitente)	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de Maquinas y equipos. Programa de Inspecciones.
		Vibraciones	lumbalgias, dolores de cabeza, problemas de equilibrio	Capacitaciones sobre autocuidado, la realizacion de pausas activas Recibir charlas sobre higiene postural Y ergonomia. *Seguimiento a examenes medicos ocupacionales al personal expuesto *Inspecciones preoperacionales Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria Elementos de proteccion personal, mantenimiento del equipo, Pausas activas, higiene postural
		Radiaciones no ionizantes.	Dolores de cabeza, Migrañas, Mareos, deshidratación.	Charlas sobre medidas de prevención de calor Instalación del punto de hidratación Utilizacion de elementos para protegerse del sol y la utilizacion de Elementos de proteccion personal
		Locativos : Golpes y Caidas a distinto Nivel, caidas de objetos y deslizantes, con diferencia del nivel	Raspaduras; Laceraciones ;Golpes; Fracturas; Fisuras en parte osea; esguinses.	Charlas sobre autocuidado y seguir protocolos de seguridad en cada una de las tareas. Implementación de orden y aseo Instalación de señalización preventiva Uso de EPP adecuado (Casco, Calzado de seguridad). Delimitación y señalización areas de trabajo, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de maquinaria pesada. Delimitación de áreas para tránsito maquinaria, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de

Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Mecanico	Laceraciones; Atrapamientos; amputaciones;Golpes; Cortes	Charlas de Autocuidado Seguir procolos de seguridad Utilizacion de EPP Llevar control permanente de las hojas de vida de cada uno de los equipos y las maquinas utilizadas en la operación programar y ejecutar inspecciones planeadas.
		Riesgo publico Robos y atracos.	Politraumatismos, caidas a distinto nivel, fracturas, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta) tecnologico por explosión por presencia de red de gas	Fracturas Muerte Pérdidas economicas	Acondicionamiento del terreno Señalización en obra-de presencia de red de gas a cargo de la empresa VANTI Delimitación de áreas de trabajo capaictación Peligros y riesgos por fuga de gas cargo de la empresa VANTI Brigada de control de incendio Disponibilidad de extintores en obra Inspecciones de extintores
		Electrico: (Por contacto electrico indirecto de la maquina con presencia de lineas de alta tensión instaladas en el area de trabajo presencia de redes electricas (líneas eléctricas conectadas a las viviendas aledañas al sector)	Golpes y caidas producto del choque electrico Quemaduras Tetanización muscular Afectaciones en el corazón Aumento de presion sanguinea Asficcia y shock	Señalización en obra todo lo referente a riesgo electrico Socializar las 5 reglas de oro (Corte efectivo, Prevenir cualquier posible retroalimentación-Bloqueo y señalización), verificar ausencia de tensión, Puesta a tierra y corto circuito y Señalización a la zona de trabajo) Articulación con la empresa ede lectricidad local (cuando sea necesario desconección o corte total por operación de la maquina) continuar entrega oportuna de epp
		Accidentes de transito	Contución Golpes y heridas Perdida de materiales Muerte	Capacitación en el manejo de maquinaria Adecuación de vias Capacitación en seguridad vial Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos Controladores viales Cumplimiento al PMT Señalización en obra Socialización de lineamientos del PMT con conductores de volquetas y operadores de maquinaria
	BIOMECANICOS:	Postura prolongada mantenida	Lumbagos, Dolores de Espalda. Dolores musculares Alteraciones osteomusculares	Gestion ante la ARL para recibir Asistencia Tecnica en Charlas de Higiene Postural Realizar pausas activas. Ejecución de actividades de prevención y promoción (Ballaterapias y pausas activas) Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Capacitacion en Higiene Postural. Programa de pausas activas
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de serpientes y roedores.	Dengue Comun y hemorragico ; Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; vértigo; desmayos, gastroenteritis	*Charlas de Autocuidado; Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Virus y bacterias	Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; desmayos, gastroenteritis	*Punto de desinfección en sitios de obra *lavado permanente de manos. ‡Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Inhalacion de Gases y Vapores	Tos permanente, Dolor en el pecho, irritación de la garganta, dolores de estomago. Alteraciones respiratorias Intoxicación	udilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de los gases y vapores (Tapabocas, gafas) Seguimiento mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria
		Material Particulado	Gripas, Bronquitis; Tos permanente; Fiebres; Neumonias. Enfermedades respiratorias.	Humectación de áreas en obra y vias donde transitan vehículos que transportan RCD Utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de las particulas de polvo y la contaminación en general. Tapabocas y caretas respiratorias. Seguimiento uso y entrega de tapabocas
		lluvias, Inundaciones y vientos fuertes	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables.

	FENOMENOS NATURALES:	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización de lineas de emergencia

	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Estrés laboral; Dolor de cabeza; Migraña. Fastiga Espasmos musculares	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral Prevención de estres

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI ✓ NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PEDRO NELL GALLARDO UREÑA	1090390025	OPERADOR	
WILLIAM A. VALENCIA MAIRONGO	98431537	OPERADOR	
ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN	91288062	OPERADOR	
OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS	1096512815	OPERADOR	
BERNABE PEÑA RONDEROS	91253552	OPERADOR	
William Ramirez	1390682	Operador	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		**CONTRATISTA**		**SUBCONTRATISTA**	✓
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		**FECHA INICIAL**	[illegible]	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		**FECHA FINAL**	21-11-[illegible]	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIONES MECANICAS - Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐		Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐
Tala de arboles ☐	Excavaciones	X	Boxculver ☐			Actividad Rutinaria	SI [X] NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☑	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	☑	Guantes caucho	☑	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☑	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☑	Kit de rescate	☐
EPCC	☑	Botas de seguridad (pantaneras)	☑	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo		Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea		Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no Ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Desordenes musculoesqueleticos (De base)	✓	Relaciones interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Ruido (Impacto intermitente)	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de Maquinas y equipos. Programa de Inspecciones.
		Vibraciones	lumbalgias, dolores de cabeza, problemas de equilibrio	Capacitaciones sobre autocuidado, la realizacion de pausas activas Recibir charlas sobre higiene postural Y ergonomia. *Seguimiento a examenes medicos ocupacionales al personal expuesto *Inspecciones preoperacionales Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria Elementos de proteccion personal, mantenimiento del equipo, Pausas activas, higiene postural
		Radiaciones no Ionizantes.	Dolores de cabeza, Migrañas, Mareos, desidratación.	Charlas sobre medidas de prevención de calor Instalación del punto de hidratación Utilizacion de elementos para protegerse del sol y la utilizacion de Elementos de proteccion personal.
		Locativos : Golpes y Caidas a distinto Nivel, caidas de objetos y deslizantes, con diferencia del nivel	Raspaduras; Laceraciones ;Golpes; Fracturas; Fisuras en parte osea; esguinses.	Charlas sobre autocuidado y seguir protocolos de seguridad en cada una de las tareas. Implementación de orden y aseo Instalación de señalización preventiva Uso de EPP adecuado (Casco, Calzado de seguridad). Delimitación y señalización areas de trabajo, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de maquinaria pesada. Delimitación de áreas para tránsito maquinaria, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de maquinaria pesada.

Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Mecanico	Laceraciones; Atrapamientos; amputaciones;Golpes; Cortes	Charlas de Autocuidado Seguir procolos de seguridad Utilizacion de EPP Llevar control permanente de las hojas de vida de cada uno de los equipos y las maquinas utilizadas en la operación programar y ejecutar inspecciones planeadas.
		Riesgo publico Robos y atracos.	Politraumatismos, caidas a distinto nivel, fracturas, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta) tecnologico por explosión por presencia de red de gas	Fracturas Muerte Pérdidas economicas	Acondicionamiento del terreno Señalización en obra-de presencia de red de gas a cargo de la empresa VANTI Delimitación de áreas de trabajo capacitación Peligros y riesgos por fuga de gas cargo de la empresa VANTI Brigada de control de incendio Disponibilidad de extintores en obra Inspecciones de extintores
		Electrico: (Por contacto electrico indirecto de la maquina con presencia de lineas de alta tensión instaladas en el area de trabajo presencia de redes electricas (líneas eléctricas conectadas a las viviendas aledañas al sector)	Golpes y caidas producto del choque electrico Quemaduras Tetanización muscular Afectaciones en el corazón Aumento de presion sanguinea Asficcia y shock	Señalización en obra todo lo referente a riesgo electrico Socializar las 5 reglas de oro (Corte efectivo, Prevenir cualquier posible retroalimentación-Bloqueo y señalización), verificar ausencia de tensión, Puesta a tierra y corto circuito y Señalización a la zona de trabajo) Articulación con la empresa ede lectricidad local (cuando sea necesario desconección o corte total por operación de la maquina) continuar entrega oportuna de epp
		Accidentes de transito	Contución Golpes y heridas Perdida de materiales Muerte	Capacitación en el manejo de maquinaria Adecuación de vias Capacitación en seguridad vial Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos Controladores viales Cumplimiento al PMT Señalización en obra Socialización de lineamientos del PMT con conductores de volquetas y operadores de maquinaria
	BIOMECANICOS:	Postura prolongada mantenida	Lumbagos, Dolores de Espalda. Dolores musculares Alteraciones osteomusculares	Gestion ante la ARL para recibir Asistencia Tecnica en Charlas de Higiene Postural Realizar pausas activas. Ejecución de actividades de prevención y promoción (Bailoterapias y pausas activas) Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Capacitacion en Higiene Postural. Programa de pausas activas.
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de serpientes y roedores.	Dengue Comun y hemorragico ; Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; vértigo; desmayos, gastroenteritis	*Charlas de Autocuidado; Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Virus y bacterias	Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; desmayos, gastroenteritis	*Punto de desinfección en sitios de obra *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Inhalacion de Gases y Vapores	Tos permanente, Dolor en el pecho, Irritación de la garganta, dolores de estomago. Alteraciones respiratorias Intoxicación	utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de los gases y vapores (Tapabocas, gafas) Seguimiento mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria
		Material Particulado	Gripas; Bronquitis; Tos permanente; Fiebres; Neumonias. Enfermedades respiratorias.	Humectación de áreas en obra y vías donde transitan vehículos que transportan RCD Utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de las particulas de polvo y la contaminación en general. Tapabocas y caretas respiratorias. Seguimiento uso y entrega de tapabocas
		lluvias, Inundaciones y vientos fuertes	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frante a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables.

	FENOMENOS NATURALES:	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socilaización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización de lineas de emergencia

	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Estrés laboral; Dolor de cabeza; Migraña. Fastiga Espasmos musculares	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral Prevención de estres

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES			
Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO ✓ N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PEDRO NELL GALLARDO UREÑA	1090390025	OPERADOR	
WILLIAM A. VALENCIA MAIRONGO	98431537	OPERADOR	
ELVER GOMEZ LACHE	91466934	OPERADOR	
ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN	91288062	OPERADOR	
OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS	1096512815	OPERADOR	
BERNABE PEÑA RONDEROS	91253552	OPERADOR	
WILLIAM RAMIREZ MARTINEZ	13906327	OPERADOR	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA	
NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE:	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010	CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		**CONTRATISTA**		**SUBCONTRATISTA**	✓
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		**FECHA INICIAL**	24 NOV 2025	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		**FECHA FINAL**	29 NOV 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIONES MECANICAS - Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐		Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones	X	Boxculver ☐			Actividad Rutinaria	SI X	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	✓	Gafas de seguridad	✓	Proteccion respiratoria	✓
Barbuquejo	✓	Guantes De Vaqueta	✓	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	✓	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	✓	Guantes caucho	✓	Socialización ATS	✓
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	✓	Permisos de Trabajo	✓
Extintor	✓	Proteccion Auditiva	✓	Kit de rescate	☐
EPCC	✓	Botas de seguridad (pantaneras)	✓	Elementos de primeros auxilios	✓

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Bacterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo		Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea		Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no Ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Desorden musculoesqueléticos (De base)		Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Ruido (Impacto Intermitente)	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de Maquinas y equipos. Programa de inspecciones.
		Vibraciones	lumbalgias, dolores de cabeza, problemas de equilibrio	Capacitaciones sobre autocuidado, la realizacion de pausas activas Recibir charlas sobre higiene postural Y ergonomia. *Seguimiento a examanes medicos ocupacionales al personal expuesto *Inspecciones preoperacionales Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria Elementos de proteccion personal, mantenimiento del equipo, Pausas activas, higiene postural
		Radiaciones no Ionizantes.	Dolores de cabeza, Migrañas, Mareos, deshidratación.	Charlas sobre medidas de prevención de calor Instalación del punto de hidratación Utilizacion de elementos para protegerse del sol y la utilizacion de Elementos de proteccion personal.
		Locativos : Golpes y Caidas a distinto Nivel, caidas de objetos y deslizantes, con diferencia del nivel	Raspaduras; Laceraciones ;Golpes; Fracturas; Fisuras en parte osea; esguinses.	Charlas sobre autocuidado y seguir protocolos de seguridad en cada una de las tareas. Implementación de orden y aseo Instalación de señalización preventiva Uso de EPP adecuado (Casco, Calzado de seguridad). Delimitación y señalización areas de trabajo, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de maquinaria pesada. Delimitación de áreas para tránsito maquinaria, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de

Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Mecanico	Laceraciones; Atrapamientos; amputaciones;Golpes; Cortes	Charlas de Autocuidado Seguir procolos de seguridad Utilizacion de EPP Llevar control permanente de las hojas de vida de cada uno de los equipos y las maquinas utilizadas en la operación programar y ejecutar inspecciones planeadas.
		Riesgo publico Robos y atracos.	Politraumatismos, caidas a distinto nivel, fracturas, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta) tecnologico por explosión por presencia de red de gas	Fracturas Muerte Pérdidas economicas	Acondicionamiento del terreno Señalización en obra-de presencia de red de gas a cargo de la empresa VANTI Delimitación de áreas de trabajo capaictación Peligros y riesgos por fuga de gas cargo de la empresa VANTI Brigada de control de incendio Disponibilidad de extintores en obra inspecciones de extintores
		Electrico: (Por contacto electrico indirecto de la maquina con presencia de lineas de alta tensión instaladas en el area de trabajo presencia de redes electricas (líneas eléctricas conectadas a las viviendas aledañas al sector)	Golpes y caidas producto del choque electrico Quemaduras Tetanización muscular Afectaciones en el corazón Aumento de presion sanguinea Asficcia y shock	Señalización en obra todo lo referente a riesgo electrico Socializar las 5 reglas de oro (Corte efectivo, Prevenir cualquier posible retroalimentación-Bloqueo y señalización), verificar ausencia de tensión, Puesta a tierra y corto circuito y Señalización a la zona de trabajo) Articulación con la empresa ede tectricidad local (cuando sea necesario desconección o corte total por operación de la maquina) continuar entrega oportuna de epp
		Accidentes de transito	Contución Golpes y heridas Perdida de materiales Muerte	Capacitación en el manejo de maquinaria Adecuación de vias Capacitación en seguridad vial Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos Controladores viales Cumplimiento al PMT Señalización en obra Socialización de lineamientos del PMT con conductores de volquetas y operadores de maquinaria
	BIOMECANICOS:	Postura prolongada mantenida	Lumbagos, Dolores de Espalda. Dolores musculares Alteraciones osteomusculares	Gestion ante la ARL para recibir Asistencia Tecnica en Charlas de Higiene Postural Realizar pausas activas. Ejecución de actividades de prevención y promoción (Ballaterapias y pausas activas) Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Capacitacion en Higiene Postural. Programa de pausas activas
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de serpientes y roedores.	Dengue Comun y hemorragico ; Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; vértigo; desmayos, gastroenteritis	*Charlas de Autocuidado; Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Virus y bacterias	Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; desmayos, gastroenteritis	*Punto de desinfección en sitios de obra *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Inhalacion de Gases y Vapores	Tos permanente, Dolor en el pecho, Irritación de la garganta, dolores de estomago. Alteraciones respiratorias Intoxicación	utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de los gases y vapores (Tapabocas, gafas) Seguimiento mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria
		Material Particulado	Gripas; Bronquitis; Tos permanente; Fiebres; Neumonias. Enfermedades respiratorias.	Humectación de áreas en obra y vías donde transitan vehículos que transportan RCD Utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de las particulas de polvo y la contaminación en general. Tapabocas y caretas respiratorias. Seguimiento uso y entrega de tapabocas
		lluvias, inundaciones y vientos fuertes	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables.

	FENOMENOS NATURALES:	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua,
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización de lineas de emergencia

	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Estrés laboral; Dolor de cabeza; Migraña. Fatiga Espasmos musculares	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral Prevención de estres

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI ✓ NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PEDRO NELL GALLARDO UREÑA	1090390025	OPERADOR	
WILLIAM A. VALENCIA MAIRONGO	98431537	OPERADOR	
ELVER GOMEZ LACHE	91466934	OPERADOR	
ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN	91288062	OPERADOR	
OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS	1096512815	OPERADOR	
BERNABE PEÑA RONDEROS	91253552	OPERADOR	
WILLIAM RAMIREZ MARTINEZ	13906327	OPERADOR	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA	
NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE:	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010	CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 01-11-2025.
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 08:30 AM.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19768481	10. Luis Medina	1003334323
2. Hugo Arrieta	9789132	11. Alvaro Barajas	91298625
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Jorge Guerra	7600898
4. Ivan Londoñobal	1095834868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	1759432	15.	
7. Pedro Rojas	5679152	16.	
8. Ivan Almeyda	1095916963	17.	
9. Atanael Vitoria	19710847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: DIEGO QUINTERO

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Alto - excavado - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 04-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	10768481	10. Luis E Madrid	1003334373
2. Hoyo Arrieta	9978932	11. Alvaro Barros	91792375
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Diego Becerra	7600898
4. Juan Candanoba	1095834868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	1759 4632	15.	
7. Pedro Rojas	5629152	16.	
8. Juan Almeyda	1095916963	17.	
9. Alonso Viloria	19710877	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N.A**
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?	✓		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Altro - ciclopedo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 05-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M. Martinez	19768481	10. Luis E Maduro	1003334373
2. Hugo Arroleto	19789137	11. Alvaro Barajas.	91798735
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Jorge Guerra	16000898
4. Juan Londoño Jabal	1095834868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	17594637	15.	
7. Pedro Lopez	5629152	16.	
8. Juan Almeyda	1095916963	17.	
9. Atanael Viloria	19710547	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: DIEGO QUINTERO

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
EXCAVACION - ALTO - CICLOPEDO - BOXCULVERT.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 06-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19760881	10. Luis C machuca	1003334373
2. Hugo Arrieta	19789132	11. Alvaro Barajas	91298775
3. Gerardo Quintero	91577086	12. Jorge Guerra	7600898
4. Juan Condazabal	1095834868	13.	
5. Luis Aguirre	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	13594632	15.	
7. Pedro Rojas.	3629152	16.	
8. Ivan Almeyda	1095916963	17.	
9. Atanael Villoria.	19710847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: DIEGO QUINTERO


CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: EXCAVACION - FILTRO - CICLOPEO - BOXCULVERT.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 07-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M martinez	19768481	10. Luis C Machuca	1003334323
2. Hugo Arrieta	19789132	11. Alvaro Barajas	91298775
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Jorge Cuesta	76006898
4. Juan Londoroba	1095884868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	17594632	15.	
7. Pedro Rojas	5629152	16.	
8. Juan Almeyda	1095916963	17.	
9. Alonso Villoria.	19710847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación - Filtro - ciclopeo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 08-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 08:30 AM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M martinez	19768481	10.. Luis E Machuca	1003339379
2. Hugo Arrieta	19789137	11. Alvaro Barajas	91298775
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Sorjo bueso	7600298
4. Ivan landazabal	1095831868	13.	
5. Luis A Torres.	3985540	14.	
6. Orlando Taborda	1759 91632	15.	
7. Pedro Rojas	5629157	16.	
8. Juan Almeyda	1095916963	17.	
9. Alonso Villoria	19710847	18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
excavacion - filtro - enchapado - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 10-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M martinez	19768481	10. Luis E machuca	1003334373
2. Hugo Arrieta	19780132	11. Alvaro Barajas	91978775
3. Gexardo Quintero	91577086	12. Sergio Gutierrez	7600898
4. Juan Candazabal	1095834868	13.	
5. Luis A Tovar	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	1759 4632	15.	
7. Pedro Rojas	5629157	16.	
8. Juan Arrieta	1095916963	17.	
9. Alonso Villamil	19710847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Altho - ciclopeo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 11-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M. Martines	19768981	10. Luis E. Machuca	1003339313
2. Hugo Arrieta	1978 9137	11. Alvaro Barajas	91798775
3. Gerardo Quintero	91571086	12. Jorge Guerra	7600898
4. Juan Cardozabal	1095839868	13.	
5. Luis Atencia	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	1759 9632	15.	
7. Pedro Rojas	5679157	16.	
8. Juan Almeyda	1095976963	17.	
9. Alonso Ulloa	1970897	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N.A**
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion – Altro – ciclopeo – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 12-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19468481	10. Luis G Machuca	1003331373
2. Hugo Arrieta	19729137	11. Alvaro Barros	91798775
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Jorge Guerra	7600398
4. Juan Londoño Gal	1095834868	13.	
5. Luis Alfonso	3983376	14.	
6. Orlando Taborda	1759463?	15.	
7. Pedro Rojas	5619757	16.	
8. Juan Amaya	1095416963	17.	
9. Manuel Urrutia	1911 0847.	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	/		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		/	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Altro - azadonado - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 13 - 11 - 2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19768981	10. Luis E Machuca	1003334373
2. Hugo Arrieta	19789131	11. Alvaro Barajas	91201825
3. Boxard Quintero	91577086	12. Sergio Guerra	76000898
4. Ivan Londoño Abal	1005838868	13.	
5. Luis A. Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	17394632	15.	
7. Pedro Reyes	5679152	16.	
8. Ivan Amaya	1095916963	17.	
9. Alanael Viloria	19410847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Filtro - ciclopeo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 14-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M. Martinez	1976 8981	10. Luis E Machuca	1003334393
2. Hugo Arrieta	1978 9137	11. Alvaro Barajas	91798775
3. Gerardo Quintero	9152 7086	12. Jorge Cuevas	7600898
4. Juan Londoñobal	1095 869868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	1759 4637	15.	
7. Pedro Reyes	5629151	16.	
8. Juan Almeyda	1005416963	17.	
9. Alcides Villamil	1971 0847.	18.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO	
		CARGO: RESIDENTE DE OBRA	

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación – filtro – ciclopeo – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 15-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 08:30 AM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19768481	10. Luis C Cadena	1003339373
2. Hugo Arrieta	19720132	11. Alvaro Barajas.	91298223
3. Gerardo Quintero	91371086	12. Diego Quintero	7600898
4. Juan Londoñabal	1093834868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	1759 4632	15.	
7. Pedro Rojas	5629157	16.	
8. Juan Alvarado	1003916963	17.	
9. Atanael Villamil	19710847.	18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación - Filtro - ciclopeo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 18-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	1976891	10. Luis M Machuca	1003334373
2. Hugo Arrieta	1978932	11. Alvaro Barajas	91291276
3. Erando Quintero	91527086	12. Sorge Guerra	7600898
4. Ivan Londoñobal	1095839868	13.	
5. Luis A Tomes	3483570	14.	
6. Orlando Taborda	7594638	15.	
7. Pedro Rojas	3629152	16.	
8. Ivan Arevalo	1095816963	17.	
9. Alonso Villota	19710847	18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N.A**
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	/		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		/	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - Altro - ciclopeo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 19-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19768481	10. Luis E Maduro	1003334373
2. Hugo Arrieta	19789132	11. Alcides Barros	9179875
3. Gerardo Quintero	9523086	12. Sonje Guerra	7600308
4. Ivan Londoño Gal	1095825868	13.	
5. Luis A Torres	3983540	14.	
6. Orlando Taborda	7394632	15.	
7. Pedro Rojas	5629152	16.	
8. Ivan Almeyda	1095916963	17.	
9. Abrael Viloria	1971847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: DIEGO QUINTERO

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Altro - ciclopeado - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 20-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	1976848	10. Luis E Machuca	1003334373
2. Hugo Arrieta	1098 9137	11. Alvaro Barajas	91798725
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Jorge Guerra	7600808
4. Evan londoñobal	1004585 4868	13.	
5. Luis Alfonso	3983370	14.	
6. Orlando Taborda	1759 9637	15.	
7. Pedro Rojas	5629152	16.	
8. Ivan Almeydo	1005916963	17.	
9. Arnold Villarca	1971 0847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación – Filtro – Cabezote – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen G
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 21-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19368981	10. Luis E Machuca	1092333413
2. Hugo Arrieta	19789132	11. Alvaro Borrajos	91298775
3. Orlando Quintero	91527086	12. Sergio Cuervo	7600898
4. Juan Londoño Bol	1095835868	13.	
5. Luis A Torres	5983570	14.	
6. Orlando Taborda	17594637	15.	
7. Pedro Rojas	5679137	16.	
8. Juan Amaya	1095916963	17.	
9. Manuel Villada	19710847	18.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO	
		CARGO: RESIDENTE DE OBRA	

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - Filtro - enrocado - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 22-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 08:30 AM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martines	19768481	10. Luis C madera	1003334343
2. Hugo Arrieta	14789137	11. Alvaro Barajas	91798135
3. Gerardo Quintero	91517086	12. Jorge Garcia	76000808
4. Juan landazabal	1095834868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	13594637	15.	
7. Pedro Rojas	5679157	16.	
8. Juan Alexis	1095916463	17.	
9. Atanael Villalba	19710847.	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: DIEGO QUINTERO

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		/	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion – filtro – ciclopeo – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 24-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19768481	10. Luis G Madera	1003334373
2. Hugo Arrieta	19789132	11. Alvaro Barajas	91198785
3. Eduardo Quintero	91527086	12. Jorge Barrera	7600898
4. Juan Londoñobal	1095834868	13.	
5. Luis A. Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	17594632	15.	
7. Pedro Rojas	5629152	16.	
8. Juan Almeyda	1095916963	17.	
9. Alonso Viloria.	19710897.	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: DIEGO QUINTERO

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion – Filtro – cidopedo – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 25-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez.	19768481	10. Luis E Machuca	1003334373.
2. Hugo Arrieta	19789137	11. Alvaro Barajas	91098123
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Jorge Guevara	76008298
4. Juan Landazabal	1095834868	13.	
5. Luis A Torres.	30835740	14.	
6. Orlando Taborda	17594632	15.	
7. Pedro Rojas	5629152	16.	
8. Juan Arneydo	1093916963	17.	
9. Afonso Viloria	19710847.	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N.A**
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - Altro - ciclopeo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 26-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 Pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19768981	10. Luis E Machuca	1003334373
2. Hugo Arrieta	19789137	11. Alvaro Bohorquez	91798175
3. Gerardo Quintero	91517086	12. Jorge Guerra	7600898
4. Juan Andarcobol	1095834868	13.	
5. Luis A Torres.	3983510	14.	
6. Orlando Taborda	17594632	15.	
7. Pedro Rojas	5679151	16.	
8. Juan Amaya	1005916063	17.	
9. Alonso Villoria	19710847.	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N.A**
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	/		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		/	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion – Altro – ciclopeo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 27-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19463981	10. Luis E Moncada	1003334313
2. Hugo Arrieta	19789132	11. Alvaro Barajas	91798775
3. Gerardo Quintero	91527086	12. Jorje Guerra	76008898
4. Juan Londoñabal	1095834868	13.	
5. Luis A Torres	3983570	14.	
6. Orlando Taborda	17594632	15.	
7. Pedro Reyes	5609157	16.	
8. Juan Almeyda	1095916963	17.	
9. Atonael Viloria	19710842	18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion – Filtro – ciclopeo – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 28-11-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M martines	19763981	10. Luis M Madera	1003334313
2. Hugo Arrieta	19784132	11. Alvaro Barajas	91298125
3. Orlando Quintero	91527086	12. Jorge Cuesta	7600898
4. Juan Londoñobol	1095839868	13.	
5. Luis A Torres	3983340	14.	
6. Orlando Taborda	17594632	15.	
7. Pedro Rojos	5679132	16.	
8. Juan Almeydo	1005916963	17.	
9. Miguel Villamil	19710847	18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación – Filtro – cicloped0 – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen G
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	**PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN**	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 29-11-2023
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 08:30 AM.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Luis M Martinez	19768781	10. Luis E Maguro	1003334373
2. Hugo Arrieta	19780137	11. Alcides Barrios	91198115
3. Eduardo Quintero	91577086	12. Jorge Cuello	1600898
4. Juan Londoño Cabal	1095834868	13.	
5. Luis A Torres	3083570	14.	
6. Orlando Taborda	17594632	15.	
7. Pedro Rojas	5629152	16.	
8. Juan Arevalo	1093916963	17.	
9. Atonael Viloria	19740847	18.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO	
		CARGO: RESIDENTE DE OBRA	

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	/		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		/	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación – Alito – ciclopeo – Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen G
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 000

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 04- noviembre 2025
Ubicación: SAN MARTIN	Hora de inicio tarea: 7:00 PM
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER	Hora terminación tarea: 4:30 pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. martin carvajal	91.352.864	17.	
2. Ronal xaid Rey	7.095.941.331	18.	
3. edicbio padilla C	7.048.556.317	19.	
4. Pedro leon chanasu	91.350.586	20.	
5. David Delgado J	91.343.934	21.	
6.		22.	
7.		23.	
8.		24.	
9.		25.	
10.		26.	
11.		27.	
12.		28.	
13.		29.	
14.		30.	
15.		31	
16.		32	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: Diego andres Quintero

CARGO: Residente de obra

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N. A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	x		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	x		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	x		
¿Está demarcada y señalizada el área?	x		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	x		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	x		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	x		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	x		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	x		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	x		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	x		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	x		
¿Existen puentes para el paso peatonal?	x		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	x		

¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	X		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	X		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	X		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	X		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	X		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	X		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	X		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		X	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Retiro de formaletas - parales sardinel - tensores

VIGIA SSTA	PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE
NOMBRE: Judith Bibiana Chacón	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO: Profesional SST	CARGO: PROFESIONAL SST
FIRMA:	FIRMA:
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	01- 11- 2023
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	04 - 11 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	05 - 11 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	06-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	07-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen


Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	08-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	10-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	11-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen P

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	12-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	13-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	14-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	15-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	18-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	19-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen G


Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	20-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	21-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	22-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	24-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	25-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	26-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: KarenG


Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	27-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	28-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	29-11-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

CONSORCIO LA FLORA 2023

INSPECCION DE EXTINTORES

Consorcio La Flora 2023

EMPRESA / CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023 | MES / AÑO DE LA INSPECCION: 26 Nov 25 | HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA VENCIMIENTO (MES/AÑO)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																		OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)
			POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (EJ. Solkaflam 123)	Otro, Cual?				Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)									Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación					
											CORROSION	GOLPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRETILLA (Satélite)	RUEDAS (Satélite)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCACION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR / BASE	
1	Campamento	1	X					20L	08/26	08/25			B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
2	Frente de obra	1	X					20L	08/26	08/25			B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Buen estado
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																

*La siguiente información se debe colocar solamente en la **ULTIMA HOJA** de la inspección:*

RESULTADOS DE LA INSPECCION

INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes
	Alcance de la inspección	(No.extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100	
	Extintores para recarga	(No.extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No.extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	

Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Accion Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):

RECARGA		OTRA NOVEDAD	

INSPECCIONO	REVISO	APROBO
FIRMA: Karen G.	FIRMA: Karen G.	FIRMA: Karen G.
NOMBRE: Karen Palomino	NOMBRE: Karen Palomino	NOMBRE: Karen Palomino
CARGO: Prof SST.	CARGO: Prof SST.	CARGO: Prof SST

PEÑARANDA Y RAMÍREZ CONSTRUCTORES S.A.S	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01
		F.A.:	Página 1 de 1
CIUDAD / PROYECTO	BUCARAMANGA - SANTANDER / CONSORCIO LA FLORA 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN	28 noviembre 2025		

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

	ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN BOTIQUIN	BOTIQUIN # 1			
		Unidades	**Cantidad Requerida**	**Fecha Vencimiento**	**Fecha de Expedición**
1	YODO-POVIDONA 60 ml	Unidad	2	abr-27	N/A
2	ALGODÓN ZIGZAG 25 Gr	Unidad	2	ene-27	N/A
3	JABÓN YODADO 120 ml	Undidad	1	feb-25	N/A
4	AGUA AOXIGENADA 120ml	Unidad	2	jun-25	N/A
5	ALCOHOL 70% - FRASCO	Unidad	1	mar-26	jul-24
6	SOLUCIÓN SALINA AL 0,9%	Unidad	1	feb-27	N/A
7	BAJALENGUA	Paquete X 20	1	jun-25	N/A
8	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	oct-28	oct-23
9	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	dic-27	dic-22
10	INMOVILIZADOR BLANCO SENCILLO	Unidad	1	N/A	N/A
11	GERINGAS	Unidad	6	may-28	may-23
12	COMPRESA LAPARATOMIA ESTERIL	Unidad	5	oct-27	N/A
13	APOSITO OCULAR ADULTO	Paquete X 20	1	sep-25	N/A
14	CURITAS	Paquete X 20	1	sep-25	sep-23
15	GASA ESPONJA ESTERIL	Paquetes 5 Und	4	sep-28	N/A
16	APLICADORES ASEPTICOS	Paquete X 20	1	jul-25	jul-22
17	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Unidad	2	N/A	N/A
18	CINTA MICROPOROSA	Unidad	0		
19	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 3" X 5" YDS	Unidad	1	sep-28	sep-23
20	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	1	N/A	N/A
21					
22					
23					

CONDICIONES OBSERVADAS	**SI - NO**
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?	SI
Botiquin Localizado en lugar visible?	SI
El botiquín se encuentra señalizado?	SI
UBICACIÓN CAMILLA Y BOTIQUIN	**DESCRIPCIÓN**
Escriba donde esta ubicado el Botiquin	CAMPAMENTO
Escriba donde esta ubicada la camilla	CAMPAMENTO

INSPECCION CAMILLA

ESTADO:BUENO (B)-REGULAR-MALO(M)	**ESTADO B-R-M**
Instalación (Sitio de ubicación)	B
Señalización	B
Estado del soporte	B
Correas de seguridad	B
Sugetadores para agarre	B
Juego de inmovilizadores de cuello, miembro inferior y superior	B

Inspeccionado por

NOMBRE: Judith Rubi Cáceres **CARGO:** Profesional SST **FIRMA:**

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

CONSORCIO LA FLORA 2023

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE EXTINTORES

EMPRESA / CONTRATISTA: Peñaranda y Ramirez constructora S.A.S

MES / AÑO DE LA INSPECCION: 11 / 2025

HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA VENCIMIENTO (MES/AÑO)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																		OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)
			POLVO QUÍMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (EJ. Solkaflam 123)	Otro, Cual?				Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)										Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación					
											CORROSIÓN	GOLPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRETILLA (Satélite)	RUEDAS (Satélite)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCACION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR / BASE	
1	campamento	1	X					70	10-26	10-25	B	B	B	B	E	NE	E	E	E	E	E	NE	NE	X	—	—	E	E	B	B	B	Proyecto retirado
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																

*La siguiente información se debe colocar solamente en la **ULTIMA HOJA** de la inspección:*

RESULTADOS DE LA INSPECCION

INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes
	Alcance de la Inspección	(No.extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100	700 %
	Extintores para recarga	(No.extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	700 %
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No.extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	700 %

Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Accion Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):

RECARGA	Realizar Recarga Octubre 2026	OTRA NOVEDAD	

INSPECCIONO	REVISO	APROBO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Judith Bibu Chacón	NOMBRE: Judith Bibu Chacón	NOMBRE: Judith Bibu Chacón
CARGO: Profesional SST	CARGO: Profesional SST	CARGO: Profesional SST

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01
		F.A.:	Página 1 de 1
CIUDAD / PROYECTO	BUCARAMANGA, SANTANDER / CONSORCIO LA FLORA 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN	26 DE NOVIEMBRE 2025		

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

	ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN BOTIQUIN	BOTIQUIN # 1				BOTIQUIN # 2				BOTIQUIN # 3			
		Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición	Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición	Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición
1	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE	Unidad	3	dic-25	dic-22	Unidad	2	mar-28	mar-23	Unidad	2	mar-28	mar-23
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" X 5" YDS	Unidad	2	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	0	0	0
3	BAJALENGUAS	Unidad	5	ago-27	ago-22	Unidad	5	ago-27	ago-22	Unidad	5	ago-27	ago-22
4	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23
5	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	mar-28	mar-23	Unidad	1	mar-28	mar-23	Unidad	1	mar-28	mar-23
6	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	1	N/A	N/A
7	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3 X 5 YARDAS	Unidad	3	oct-28	oct-23	Unidad	1	oct-28	oct-23	Unidad	1	oct-28	oct-23
8	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	dic-27	dic-22	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
9	SOLUCIÓN SALINA 500 ml	Unidad (500 ML)	1	mar-25	mar-23	Unidad (500 ML)	1	may-26	may-24	Unidad (500 ML)	1	may-26	may-24
10	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	Unidad	2	feb-26	N/A	Unidad	1	feb-26	N/A	Unidad	1	feb-26	N/A
11	AGUA OXIGENADA 120 ML	Unidad	1	feb-25	N/A	Unidad	1	feb-25	N/A	Unidad	0	0	0
12	APOSITO ADULTO	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	6	N/A	N/A
13	COMPRESA ABDOMINAL	Unidad	2	oct-27	N/A	Unidad	2	oct-27	N/A	Unidad	2	oct-27	N/A
14	APLICADORES ASEPTICOS	Unidad	8	nov-25	nov-20	Unidad	20	nov-25	nov-20	Unidad	20	nov-25	nov-20
15	TIJERA BASICO	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	N/A	N/A
16	PITO PARA ALERTA DE EMERGENCIA	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	1	N/A	N/A
17	GERINGA	Unidad	1	may-28	may-23	Unidad	1	may-28	may-23	Unidad	1	may-28	may-23
18	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Unidad	5	N/A	N/A	Unidad	5	N/A	N/A	Unidad	5	N/A	N/A
19	TORNIQUETE	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
20	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	mar-26	jul-24	Unidad	1	mar-26	jul-24	Unidad	1	mar-26	jul-24
21	CINTA MICROPOROSA	Unidad	1	ago-27	N/A	Unidad	1	ago-27	N/A	Unidad	1	ago-27	N/A
22	JABON YODADO (QUIRURGICO)	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A
23	SOLUCIÓN YODADA	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A
24	CURITAS	Unidad	6	ago-22	ago-25	Unidad	6	ago-22	ago-25	Unidad	6	ago-22	ago-25
25	ALGODÓN PURO	Paquete 20 g	1	may-28	dic-23	Paquete 20 g	0	0	0	Paquete 20 g	0	0	0
26	TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	0	0	Unidad	0	0	0

CONDICIONES OBSERVADAS	SI - NO	SI - NO	SI - NO
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	SI	SI
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	SI	SI
ja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de u	SI	SI	SI
Botiquín Localizado en lugar visible?	SI	SI	SI
El botiquín se encuentra señalizado?	SI	SI	SI
UBICACIÓN CAMILLA Y BOTIQUIN	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
Escriba donde esta ubicado el Botiquín	OFICINA SST	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO
Escriba donde esta ubicada la camilla	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	N/A
INSPECCIÓN CAMILLA ESTADO:BUENO (B)-REGULAR-MALO(M)	**ESTADO B-R-M**	**ESTADO B-R-M**	**ESTADO B-R-M**
Instalación (Sitio de ubicación)	B	B	N/A
Señalización	B	B	N/A
Estado del soporte	B	B	N/A
Correas de seguridad	B	B	N/A
Sugetadores para agarre	B	B	N/A
uego de Inmovilizadores de cuello, miembro inferior y superio	B	B	N/A

Inspeccionado por

NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	CARGO: PROF. SST	FIRMA: Karen

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Observaciones

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FO-30
	INSPECCION DE KITS DE DERRAMES	Versión: 00
		Octubre de 2024

INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPO DE CONTROLDE DERRAMES

PROYECTO: CONSORCIO LA FLORA 2023 **FECHA:** 28 DE NOVIEMBRE 2025

CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN CORPORAL (peto)	X			
CORDONES ABSORBENTES	X			
PAÑOS ABSORBENTES	X			
PALA PLASTICA	X			
CINTA DE ACORDONAMIENTO	X			
MASILLA EPOXICA	X			
DESENGRASNTE	X			
CARRETILLA	X			
MARTILLO DE CAUCHO	X			
BOLSAS ROJAS	X			
ABSORBENTE ORGANICO				
EPP(guantes de caucho, gafas proteción respiratoria, botas de caucho)	X			
TACOS DE MADERA	X			
APTITUD DEL PERSONAL				
El personal esta acapacitado para el uso del kit de derrames?	X			
Se evidencia buen uso y cuidado del kit de derrame por parte del personal operativo	X			

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: Karen Palomino

CARGO: Prof SST

FIRMA: Karen G

Consorcio La Flora 2023	INDICE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: IND-SST-001
		VERSIÓN:001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO EVALUADO
2. SEVERIDAD ACCIDENTALIDAD	01 de noviembre al 30 de noviembre 2025

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN
Prevenir la ocurrencia de accidentes mediante la aplicación de controles administrativos y operativos durante el desarrollo del SGSST.	RESULTADO	PARA ESTE PERIODO NO SE PRESENTO AT

TENDENCIA	INTERPRETACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA
DESCENDENTE	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	NA

PERIOCIDAD DEL REPORTE	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE DE LA EMISIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL INDICADOR
	Cumple: ≤10	En riesgo: ≥10 ≤50	Crítico: ≥50			
MENSUAL				HSEQ/COPASST/ÁREA TCENICA	HSEQ, COPASST, INTERVENTORIA	Todos los trabajadores

MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERIODO	Nro dias de incapacidad por at+numero de dias cargados en el mes	Nro de trabajadores	RESULTADO	OBSERVACIONES	ANALISIS DE DATOS
Enero	0	41	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Febrero	0	41	0,00	Se presento AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Marzo	0	41	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Abril	0	41	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Mayo	1	41	2,44	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 2,44 días por accidente de trabajo
Junio	0	43	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Julio	0	43	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Agosto	0	43	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Septiembre	0	40	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Octubre	0	45	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Noviembre	0	45	0,00	No se presentaron AT	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo



ACCIONES Y SEGUIMIENTO
*Revisión mensual de indicadores de incidencia y prevalencia de accidentalidad con profesional HSEQ *Investigación de accidente de trabajo *Charla en manejo adecuado de herramienta manual y uso adecuado de EPP. *Socialización de lección aprendida con trabajadores *Seguimiento suministro y uso de EPP , del trabajador accidentado

REPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA
Profesional HSE	Noviembre del 2025

Consorcio La Flora 2023	PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	CÓDIGO: IND-SST-001
		VERSIÓN:001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO EVALUADO
PROPORCIÓN DE AT MORTALES	01 de noviembre al 30 de septiembre 2025

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	
Identificar el numero de accidentes mortales en el periodo e identificar los riesgos a que esta expuesta la poblacioon trabajadora e implementar acciones de mitigacion de la exposicion al riesgo.	RESULTADO	PARA ESTE PERIODO NO SE PRESENTO AT	
TENDENCIA	**INTERPRETACIÓN**	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**
DESCENDENTE	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	PORCENTAJE

PERIOCIDAD DEL REPORTE	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE DE LA EMISIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL INDICADOR
ANUAL	Cumple: <1	En riesgo: ≥8 ≤10	Crítico: >10	Gerencia - Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo - jefes de área	SST, COPASST	Todos los trabajadores

MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERIODO	Nro de AT MORTALES	TOTAL DE AT	RESULTADO	OBSERVACIONES	ANÁLISIS DE DATOS
01 de noviembre al 30 de noviembre 2025	0	0	0	0	En el periodo de estudio , el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales.



ACCIONES Y SEGUIMIENTO	
*Seguimiento registro analisis estadistico de Accidentalidad *Seguimiento mediantes los informes mensuales recepcionados por el contratista de obra.	
REPONSABLE DE LA ACCIÓN	**FECHA**
Profesional HSE	01 de noviembre al 30 de noviembre 2025

Consorcio La Flora 2023	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	CÓDIGO: IND-SST-001
		VERSIÓN:001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO EVALUADO
PREVALENCIA ENFERMEDAD LABORAL	01 de noviembre al 30 de noviembre 2025

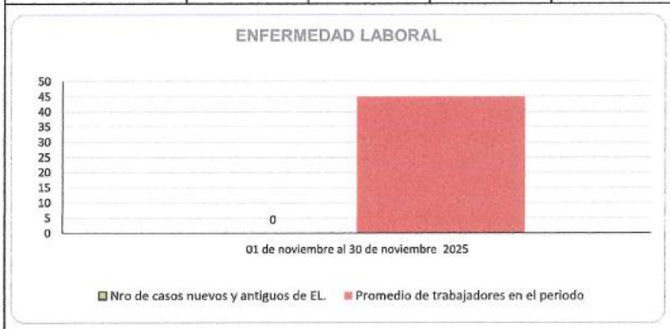
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN
Identificar el Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	RESULTADO	Reportes realizados por el contratista de obra , Relato de Trabajadores, historia medica autorizada para tratamiento administrativo

TENDENCIA	INTERPRETACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA
DESCENDENTE	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	UNIDAD

PERIOCIDAD DEL REPORTE	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE DE LA EMISIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL INDICADOR
	Cumple: <1	En riesgo: ≥1	Critico: >1			
ANUAL (Res0312/19) Informes mensuales del contratista				HSEQ/COPASST/ÁREA TECNICA	HSE, COPASST, INTERVENTORIA	Todos los trabajadores

MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERIODO	Nro de casos nuevos y antiguos de EL.	Promedio de trabajadores en el periodo	RESULTADO	OBSERVACIONES	ANÁLISIS DE DATOS
01 de noviembre al 30 de noviembre 2025	0	45	0%	Durante el periodo no se notificaron casos de enfermedad laboral en ninguno de los trabajadores.	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025



ACCIONES Y SEGUIMIENTO

*Seguimiento del indicador por medio de examenes medicos ocupacionales
*Seguimiento mediantes los informes mensuales recepcionados por el contratista de obra.

REPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA
Profesional HSE	01 de noviembre al 30 de noviembre 2025

Consorcio La Flora 2023	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	CÓDIGO: IND-SST-001
		VERSIÓN:001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO EVALUADO
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	Noviembre del 2025

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION
Medir los episodios de nuevas enfermedades y el total de casos o enfermos en la empresa	PROCESO	*PARA ESTE PERIODO NO SE PRESENTO ENFERMEDAD LABORAL

TENDENCIA	INTERPRETACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA
DESCENDENTE	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	CANTIDAD

PERIOCIDAD DEL REPORTE	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE DE LA EMISIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL INDICADOR
	Satisfactorio: <1 %	En riesgo: ≤2% - ≥1 %	Crítico: >2%			
ANUAL				Talento Humano / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	SST, COPASST	Todos los trabajadores

MEDICIÓN DEL INDICADOR

MES	N. CASOS NUEVOS DE EL	PROMEDIO DE TRABAJADORES	RESULTADO	OBSERVACIONES	ANÁLISIS DE DATOS
ENERO- DICIEMBRE	1	45	2222,22	JOSE DE JESUS TORRES MENDOZA Diagnostico: EPICONDILITIS LATERAL DERECHA	Por cada 100.000 trabajadores existen 1 caso nuevos de enfermedad laboral en el periodo



ACCIONES Y SEGUIMIENTO	
*Revisión semestral de enfermedades laborales notificadas, con el COPASST	
REPONSABLE DE LA ACCIÓN	**FECHA**
Lider responsable del SGSST	2.025

Consorcio La Flora 2023	AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA	CÓDIGO: IND-SST-001
		VERSIÓN:002
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO EVALUADO
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA	01 de noviembre al 30 de noviembre 2025

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN
Identificar el tiempo perdido por diferentes causas al tiempo laboral programado	PROCESO	*Reportes de Incapacidades. *Registros de Ausentismos laborales emitidos por EPS

TENDENCIA	INTERPRETACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA
DESCENDENTE	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	PORCENTAJE (%)

PERIOCIDAD DEL REPORTE	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE DE LA EMISIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL INDICADOR
MENSUAL	**Satisfactorio: < 10 %**	**En riesgo: ≥ 10 y ≤ 50**	**Crítico: > 50 %**	Área administrativa / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Todos los trabajadores

MEDICIÓN DEL INDICADOR

MES	DIAS DE AUSENCIA LABORAL EN EL PERIODO	TOTAL DIAS LABORALES PROGRAMADOS EN EL PERIODO	RESULTADO IAG	OBSERVACIONES	ANÁLISIS DE DATOS
ENERO	13	1025	1,27	**KAREN PALOMINO GUEVARA** (Profesional SST) R509 Fiebre no especificada **PAOLA ALEJANDRA CASTILLO SUPELANO** (Auxiliar trafico) *R101 Dolor abdominal localizado en parte superior *Enfermedad general 0470 *0470 Falso trabajo de parto **DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ** (Residente Obra) N46X	En el mes de enero se perdió 1,27 % de días programados de trabajo por incapacidad médica
FEBRERO	35	984	3,56	**DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ** (Residente Obra) N46X **PAOLA ALEJANDRA CASTILLO SUPELANO** (Auxiliar trafico) DX: 0470 DX: Z358 - 0410 DX: 0829 PARTO POR CESAREA **OLGA PATRICIA MONOGA RIAÑO** DX: N390 **SARAI JULIANA CORTES CRISTANCHO** (Administrativa) Incapacitada	En el mes de febrero se perdió 3,56% de días programados de trabajo por incapacidad médica
MARZO	7	1025	0,68	**JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ** (Topogrfao) DX: A084 **ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO** (Oficial de Obra) DX: Z302	En el mes de marzo se perdió 0,68% de días programados de trabajo por incapacidad médica

ABRIL	6	943	0,64	**JOSE JULIAN PABON SEPULVEDA** (Ayudante) DX: S903 **OLGA PATRICIA MONOGA RIAÑO** (Auxiliar Trafico) DX: N390	En el mes de abril se perdió 0,64% de días programados de trabajo por incapacidad médica
MAYO	7	1066	0,66	**JUAN CAMILO DUARTE SALAMANCA** (Auxiliar SST) DX: K528 **DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ** (Residente de Obra) DX: A083 **BRAIAN SEBASTIAN PABON SAAVEDRA** (Ayudante) DX:M624	En el mes de mayo se perdió 0,66% de días programados de trabajo por incapacidad médica
JUNIO	5	902	0,55	**EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA** (Topografo) DX: R104 **PAOLA ALEJANDRA CASTILLO SUPELANO** (Auxiliar trafico) DX: M196	En el mes de junio se perdió 0,55% de días programados de trabajo por incapacidad médica
JULIO	10	1161	0,86	**JOSE JULIAN PABON SEPULVEDA** (Ayudante) Enfermedad general **JUAN CAMILO DUARTE SALAMANCA** (Aux. SST) DX: J00X **OLGA PATRICIA MONOGA RIAÑO** (Aux. Trafico) DX: M791 **JENIFFER ZARELY CRISTANCHO PIÑA** (Prof. Social) K529	En el mes de julio se perdió 0,86 % de días programados de trabajo por incapacidad médica
AGOSTO	0	1032	0,00	No se notifico ausentismo por causa medica	En el mes de agosto se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
SEPTIEMBRE	0	1014	0,00	No se notifico ausentismo por causa medica	En el mes de septiembre se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica
OCTUBRE	37	1170	3,16	Dx: M255 Dx: K010 Dx: H330 Dx: K429 Dx: T78,4	En el mes de febrero se perdió 3,6% de días programados de trabajo por incapacidad médica
NOVIEMBRE	1	1035	0,10	DX: H330	En el mes de Noviembre se perdió 0,10 % de días programados de trabajo por incapacidad médica
TOTAL	121	11.357	#¡DIV/0!		



ACCIONES Y SEGUIMIENTO
* Gestión oportuna para el reintegro laboral, apoyo con IPS, realización examenes medicos ocupacionales ingreso * Apoyo en procesos administrativos con EPS, radicación oportuna de incapacidades medicas *Control y seguimiento vía telefonicay mensajeria de las condiciones de Salud de trabajadores con incapacidades medicas

REPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA
Profesional HSE	01 de noviembre al 30 de noviembre 2025

COMERCIA|IZADORAAVSAN|ORENZOS.A.S
NIT: 901.251.673

CERTIFICACION

Comercializadora A.V. San Lorenzo S.A.S, con NIT 901.251.673-1 certifica que le suministró material al proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**, del Consorcio La Flora 2023 con NIT 901.702.490-7. Material suministrado durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del presente año

El material suministrado proviene de la cantera de la Asociación Campesina de mineros mina la Esperanza (Acme) ubicada en Rio de Oro (Girón), teniendo en cuenta las siguientes cantidades:

252 m3 de material granular clasificado de la siguiente

manera:

Arena: 62 Metros

Triturado: 145 Metros

Bolo: 45 Metros

Con destino a Quien pueda interesar.

La presente certificación se expide a los dos (10) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

Álvaro Acevedo León
91437999
Representante Legal

CL 103 110 Mz G Lt 6 Par Indust 2

3188019406

comercializadorasanlorenzosas@gmail.com

RAD GPV 861 - 2025 – MEMORANDO No. 501– 2025

FECHA DE REUNIÓN:	01 de diciembre de 2025
HORA DE REUNIÓN:	09:00 A.M – 09:30 A.M
LUGAR DE REUNIÓN:	Edificio Dirección de Tránsito de Bucaramanga DTB, Quinto piso- planeamiento vial.
NOMBRE DEL PROYECTO Y UBICACIÓN	**"Construcción canalización de cauces: quebrada la flora y la iglesia parte alta e interceptores: la flora II y la iglesia alta del municipio de Bucaramanga /Santander.**
APROBACION PMT	Oficio No. 417-2023 del día 06 de junio de 2023 Vigencia Quinta prorroga • Fecha de Inicio: 06 de junio de 2025 • Terminación: 05 de diciembre de 2025 • Fecha de aprobación: Seis (6) meses
CONTRATANTE:	**ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA Correo electrónico: consorciointerventoriacanalbga@gmail.com
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA FLORA 2023** NIT: 901.702490 – 7 AV GONZALEZ VALENCIA # 55 – 10 Bucaramanga Correo electrónico: consorciolaflora2023@gmail.com Cel: 3158997276
SUPERVISOR PMT	KAREN PALOMINO GUEVARA

ORDEN DEL DIA Y OBSERVACIONES

Se realiza comité de tráfico por los meses de octubre y noviembre de 2025, que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que se dictaminan para la supervisión de la implementación de las tareas del proyecto **"Construcción canalización de cauces: quebrada la flora y la iglesia parte alta e interceptores: la flora II y la iglesia alta del municipio de Bucaramanga -Santander.** Según cronograma de actividades:

1. Se menciona la importancia de informar en los comités de tráfico aspectos de temas relacionados con el avance o atraso en el cronograma de obra y la importancia de realizar estas sesiones donde se puedan tratar este tipo de temas administrativos que impacten directamente la ejecución de las actividades y les permitan la continuidad del contrato presentando los ajustes pertinentes y generando las soluciones más convenientes para la ejecución del objeto del contrato dentro del marco normativo y legal aplicable.

   El Porcentaje de obra ejecutada a diciembre 01 de 2025 es de 75.28%, se anexa cronograma de actividades mes ames a la fecha.



Anexo No. 1: AVANCE DE OBRA

2. Se realiza seguimiento a la señalización de obra implementada en el sector y se evidencia la instalación de señalización vial de obra adecuada, donde se ejecutan trabajos conforme con lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial de Colombia 2024 y el PMT aprobado.

NORMATIVIDAD VIGENTE

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040045005 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

•Según el Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la regulación del tránsito y la seguridad vial, adoptado a través de la Resolución Número 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, que sustituye el Capítulo 1 del Título 8 de la Resolución Única de Tránsito 20223040045295 de 2022, establece en su Capítulo 7.12.8, "Autorización y seguimiento al PMT", que las responsabilidades en caso de un siniestro vial estarán sujetas a la investigación que realice la autoridad competente, estando siempre de por medio las actuaciones que hayan realizado tanto el responsable de la obra como la Autoridad de Tránsito que revisó, autorizó y realizó seguimiento a la implementación del PMT.

•La interventoría y/o supervisión del contrato deberá presentar un Plan de seguimiento que incluya inspecciones rutinarias de seguridad vial al cumplimiento del PMT y, en caso de ser

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

necesario, proponer medidas que mantengan o mejoren las condiciones de seguridad vial de todos los actores en el área de influencia directa del PMT.

7.12.9. Supervisión al PMT

Una vez terminada la intervención, el responsable de la obra y su interventoría deberán informar a la autoridad competente que revisa, autoriza y realiza el seguimiento al PMT sobre la finalización de la obra, para que pueda verificar que el responsable ha restaurado las condiciones iniciales de movilidad en la zona y su área de influencia, lo que implica la verificación del retiro de la señalización de obra y la implementación de los dispositivos de señalización vial definitivos que se requieran.

Es responsabilidad de la persona de derecho público o privado el retiro de todos los dispositivos de obra utilizados, so pena de ser sancionado por la Autoridad de Tránsito competente.

Además, el Capítulo 8.3, "Criterios para la señalización de eventos especiales programables (EEP) y no programables (EENP)", detalla que, en el caso de EEP, corresponde a la autoridad de tránsito o entidad competente establecer el procedimiento, el protocolo y otorgar el permiso, lo que puede darse mediante la aprobación del documento del PMT, según el numeral 7.12. Planes de manejo de tránsito (PMT), siempre y cuando sea lo dispuesto y requerido por la autoridad competente; en caso contrario, se recomienda que la autoridad de tránsito o entidad responsable de la infraestructura vial cuente con esquemas típicos de señalización que permitan desarrollar de manera segura el evento.

3. Se verifica que para las intervenciones sobre el espacio público, en lo referente excavaciones a cielo abierto, ubicación de campamentos, cargue y descargue de materiales, parqueo momentáneo de vehículos, y otras que afecten la libre movilidad de los peatones y usuarios de las vías perimetrales al proyecto, cuentan con reguladores de tránsito certificados **y con experiencia certificada,** para guiar el tráfico vehicular y peatonal, y así evitar accidentes de tránsito por maniobras peligrosas que se llegasen a realizar por parte de los usuarios de estas vías y/o el personal de obra a cargo del contratista.

- **TEXTO CITADO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040045005 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Orientación y/o Regulación del Tránsito Vehicular: Por la ubicación del proyecto, se debe garantizar la regulación del tránsito mediante bandereros (paleteros u orientadores de tráfico) durante el tiempo que dure la afectación vial diurna y/o nocturna, con el fin de facilitar los ingresos y las salidas a los usuarios de las vías del sector intervenido y su zona de influencia.

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Figura 7-23. Auxiliar de tránsito



b. Auxiliar de tránsito

En el control PARE / SIGA, el auxiliar de tránsito responsable de cumplir instrucciones dadas por el responsable de la obra para garantizar el correcto control para la circulación segura de los usuarios de la vía debe ser seleccionado cuidadosamente, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber terminado como mínimo el ciclo de educación primaria.
• Haber aprobado una capacitación y entrenamiento o curso teórico/práctico de por lo menos 40 horas, orientado por una institución debidamente reconocida por el Ministerio de Educación, o quien este delegue que lo habilite como auxiliar de tránsito para obras en vías, con énfasis en seguridad vial. Lo anterior sujeto a un acto administrativo que lo modifique o reglamente.
• Certificado de buenas condiciones físicas que incluya visión y audición compatibles con las labores a desarrollar. Es aceptable que estos aspectos puedan ser corregidos por dispositivos tales como lentes o audífonos.
• Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano.
• Estar en capacidad de reconocer situaciones de riesgo, y reaccionar de manera asertiva.
El auxiliar de tránsito debe ser visible a una distancia mínima de 200 m para todos los conductores, y usar permanentemente la vestimenta especificada en el numeral 7.11.
Elementos para aumentar la visibilidad de trabajadores y vehículos.
Durante la noche, el puesto donde se ubica el auxiliar de tránsito debe iluminarse apropiadamente con dispositivos que no encandilen a los conductores, peatones y/o trabajadores y preferiblemente brinden 360 grados de iluminación. En casos de emergencia este requerimiento no rige. La velocidad máxima permitida en la vía, en el sector donde se ubica el auxiliar de tránsito, nunca debe superar los 30 km/h.

4. Se indica por parte de la DTB que todas las intervenciones que se realicen sobre el espacio público deben someterse a la Ley 1503 del 2011, Resolución 1885 del 2015, Resolución N° 268 del 20 de mayo de 2024, Resolución 470 del 2017 y la Ley 769 del 2002, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos (Peatones y Usuarios). **Anexo No. 2 FOTOGRAFIA DE SEÑALIZACION.**

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

5. Se indaga y verifica sobre la socialización del proyecto y su avance a la comunidad, así el diligenciamiento de las actas de vecindad. La oficina de Planeamiento Vial de la DTB hace la respectiva verificación dicha información ya fue enviada por medio digital al correo electrónico de semaforos@transitobucaramanga.gov.co, el cual hará parte del Informe final del seguimiento del PMT al igual que las actas de los comités de tráfico realizadas con frecuencia mensual (como mínimo).

➢ **TEXTO CITADO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040045005 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Artículo 367 POT: Operación de equipos y herramientas de construcción, demolición y reparación de vías. Cuando en desarrollo de obras viales, urbanísticas o de edificaciones las emisiones sonoras sobrepasen los niveles permitidos por la autoridad ambiental, dichas actividades podrán realizarse únicamente entre las 7:00 AM y las 7:00 PM de lunes a sábado.

Artículo 368 POT: Actas de vecindad. Previo al inicio de las obras o actividades de demolición el urbanizador y/o constructor responsable de la obra debe realizar actas de vecindad con los propietarios y/o habitantes de los predios colindantes con los correspondientes registros fotográficos, para certificar el estado en que se encuentran las construcciones vecinas y así facilitar que el constructor tome las medidas preventivas necesarias para garantizar la estabilidad de dichas construcciones y/o la determinación de responsabilidades en el evento de ocurrencia de accidentes o daños a la propiedad. Si en el momento de realizar las actas de vecindad el constructor tiene motivos para creer que alguna de las estructuras de los predios adyacentes se encuentra en condiciones deficientes o inestables, previo al inicio de las obras.

Artículo 372 POT. Señalización temporal de vías. En el caso de actividades de obra que afecten la normal circulación sobre las vías adyacentes, se deben implementar dispositivos para la regulación del tránsito, ubicados con un (1) día de anticipación al inicio de dichas actividades, permanecer durante la ejecución de las obras y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación.

- Todas las señales, cintas, y barricadas que se utilicen, deben ser reflectivas e iluminarse en horas nocturnas. *Los delineadores tubulares (conos y colombinas) que se ubiquen sobre espacio público y vías deben ser plásticos. La señalización se instalará cumpliendo con lo establecido en las normas que regulan la materia y de forma tal que los conductores y/o peatones tengan suficiente tiempo para captar el mensaje y reaccionar consecuentemente*.

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

NOTA: Se anexa registro fotográfico de los meses de octubre y noviembre de 2025, socialización con la comunidad sobre el avance de la obra, cierres viales y Plan de Manejo de Trafico PMT.

Anexo No. 3 FOTOGRAFIA DE SOCIALIZACION.

6. Se socializa la importancia de verificar que los vehículos que realizan el transporte de materiales y escombros deben cumplir las regulaciones dispuestas, en particular lo relacionado a la Resolución N°268 del 20 de mayo de 2024 que regulan las condiciones de movilidad para la disposición de estos residuos en las escombreras del Municipio de Bucaramanga.

Artículo 374 POT. Acopio de materiales. Está prohibido realizar acopio de materiales de construcción, tierra, escombros, herramientas y maquinaria hacia el exterior del cerramiento sobre la vía pública. Tanto el descargue como el cargue de materiales debe hacerse directamente del vehículo hacia el interior de la obra y viceversa, sin ser depositado en espacio público. En casos excepcionales se permite la descarga momentánea de materiales sobre espacio público para su inmediato traslado al interior de la obra, sin que se obstruya el libre tránsito peatonal; en ningún caso estos materiales pueden permanecer más de cuatro (4) horas en el espacio público.

Parágrafo 1°. Se debe realizar la limpieza del espacio público tantas veces como sea necesario para garantizar el libre y seguro tránsito de vehículos y peatones frente a las obras. Cuando se compruebe el incumplimiento de esta norma se ordenará su inmediato retiro sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas correspondientes.

Parágrafo 2°. El titular de la licencia, así como el urbanizador y/o constructor serán responsables de la reposición de los elementos y/o mobiliario ubicado en el espacio público que haya n sido afectados por la realización de las obras

Artículo 115. Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito. Parágrafo 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta, Los trabajos que deben realizar sobre vías arteriales o principales, se ejecutar en horarios diurnos contrarios a las horas pico de máxima demanda.

Tránsito de Vehículos de Carga Pesada: Para el tránsito de vehículos de carga pesada y/o transporte de equipos, elementos, materiales, insumos, escombros, etc., e ingreso o salida de grúas necesarias para la ejecución, desarrollo y logística de las obras, se deben tramitar los permisos necesarios ante la DTB con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la fecha programada para las labores, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y de tránsito vigentes y cancelar los derechos a que haya lugar en la Sede Administrativa de la Entidad, Km. 4 vía Girón.

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Maniobras de Cargue y/o Descargue, Montaje y/o Retiro de Máquinas, Equipos y Grúas: Para los cierres viales transitorios parciales o totales que se requieran para efectuar maniobras de cargue y descargue de vehículos de carga pesada, montaje o desmonte de grúas, aparatos o equipos gran tamaño, capacidad o envergadura necesarios para la ejecución, desarrollo y logística de las obras, se deben tramitar previamente los permisos necesarios con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la fecha programada para las labores, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y de tránsito vigentes y cancelar los derechos a que haya lugar en la Sede Administrativa de la Entidad, Km. 4 vía Girón.

Rutas o Alternativas de Desplazamiento para la evacuación de escombros: Debido a la cantidad de rutas de cargue y descargue de escombros que puedan surgir en los diferentes puntos de trabajo en la ejecución del proyecto, se definirán puntualmente en los comités de tránsito, conforme a dar cumplimiento a las resoluciones N°268 del 20 de mayo del 2024 y N°397 del 19 de julio de 2024, expedida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

7. Se indica y enfatiza que el contratista de obra debe garantizar accesibilidad segura de residentes y/o usuarios que concurren este sector y debe informar y socializar los posibles cierres temporales y definitivos de los corredores viales y/o peatonales.

Protección y/o Conservación de Vías: El responsable de las obras, de manera directa o a través de sus contratistas deberá responder por los daños físicos o estructurales que se causen a las vías (calzadas, andenes, separadores) utilizadas como alternativas de movilización durante la ejecución de los trabajos, lo mismo que a las zonas verdes o espacio público en general.

Protección de Personas y Edificaciones: El responsable de las obras, de manera directa o a través de sus contratistas deberá responder por los daños físicos o estructurales que se causen a los predios o edificaciones, redes de servicios públicos, bienes, integridad y vida de las personas, durante la ejecución de los trabajos.

Protección y/o Conservación del Sistema Semafórico de la Ciudad: El responsable del proyecto de manera directa o a través de sus Contratistas deberá incluir en él la afectación que se causará a las redes de semaforización ubicadas en el sector que se va a intervenir (si la hubiere) y/o en los diferentes tramos viales que se van a utilizar como alternativas de desvío, y asumirá las obras, costos y demás que se deriven del desmantelamiento y montaje, reubicación de equipos y elementos, postes, semáforos, ductería, cableado de control e interconexión, cajas de paso y/o inspección, tapas, etc., así como los daños, reparaciones y adecuaciones que se generen en la ejecución de los trabajos propios de las obras y sus actividades complementarias, con el fin de garantizar la continuidad y el funcionamiento normal del sistema semafórico en esas zonas de la ciudad.

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

8. Se indaga sobre la vigencia de aprobación del Plan de Manejo de Trafico PMT y se anexa, copia de Plan de manejo de Trafico PMT, dada la ampliación del contrato, se anexa Plan de manejo de Trafico PMT especifico, al tramo a intervenir, adicional verifica el cumplimiento para evitar actividades con la vigencia vencida.

Control Vial y Supervisión del PMT: La DTB ejercerá seguimiento, control vial y supervisión a la implementación del PMT y efectuará monitoreo al tránsito vehicular y peatonal con el fin de determinar las medidas que se deban aplicar para minimizar el impacto de la ejecución del proyecto en la movilidad peatonal y vehicular en el sector intervenido.

9. La Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, verifica que se anexan soportes de pago, correspondiente al seguimiento del plan de manejo de tráfico PMT, por valor de $76.321 con No 4530925 de fecha 13-11-2025, N° 4550361 de fecha 01-12-2025 pagado por el CONSORCIO LA FLORA 2023 CON Nit. 901.702.490-7. **Anexo 5 SOPORTES DE PAGO COMITÉ**

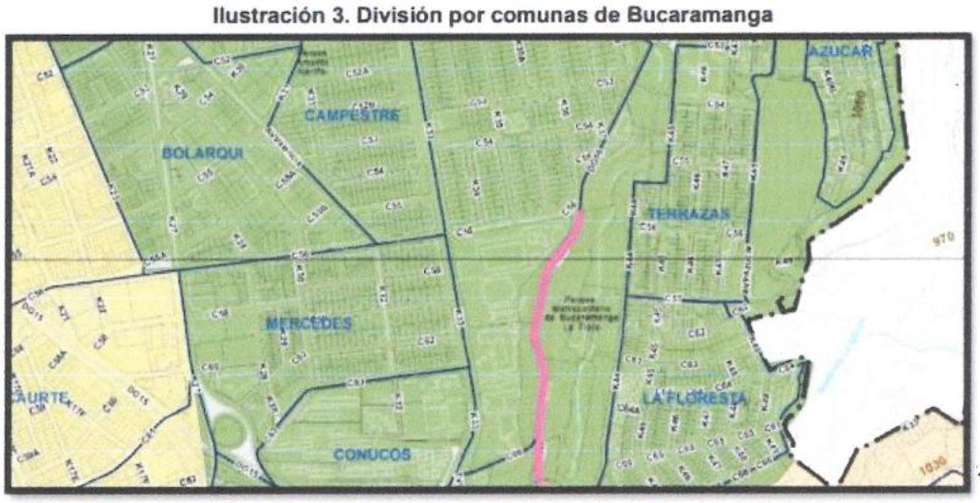
10. Ubicación General de la obra:

El proyecto se encuentra ubicado al costado del parque extremo del Barrio San Martin, carrera 27ª # 87 – 52, luego atraviesa en sentido sur – norte el barrio San Martin y pasa paralelo el Barrio el Sol, posteriormente cruza la vía antigua y entra al parque la Flora atravesándolo en sentido sur norte, para finalizar cruzando la avenida el Jardín.

Según informe de obra, las actividades en ejecución se realizan sobre la comuna 12 – Cabecera del Llano en el municipio de Bucaramanga, más exactamente en el tramo de la Carrera 36 entre la vía Antigua de Floridablanca hasta la calle 56. el cual se describe en la ilustración 3 y 4, página 9 del Plan de Manejo de Trafico (PMT) especifico y se da con el cierre total de la vial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ilustración 3. División por comunas de Bucaramanga



Fuente: POT – Bucaramanga

Ilustración 4.Micro localización del proyecto – Barrio Mercedes



Fuente: POT – Bucaramanga

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO

Debido a que el proyecto se va a realizar en una vía con clasificación local de nivel 2, así mismo en una zona de influencias algunas con mayor o menor impacto y debido a los cierres totales que se presentarán por los procesos de obra, por lo anterior, se clasifica como ALTO IMPACTO.

Sitios especiales barrio Mercedes. - Sector vía La Flora: Como se puede observar en la ilustración 6, en la vía al parque La Flora, podemos encontrar sectores especiales como: La Clínica Chicamocha, IPS Medicuc, EPS Sanitas sede administrativa, Cruz Verde, Colegio la Presentación, Colegio La Merced, Colegio San Pedro Claver de

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Infantes, el Jardín Infantil el Club de los Niños, Parroquia Divino Niño, asimismo encontramos atractores dotacionales recreativos como el parque Divino Niño, el parque La Flora, entre otros sitios especiales en el Se autoriza el cierre total el tramo de la carrera 36 se ilustra con esquema de señalización.

Ilustración 6. Sectores especiales en el sector de estudio – Vía la Flora



Fuente: Mapcarta

Perfiles viales del proyecto por sector - Sector vía La Flora: TRAMO: Carrera 36 entre vía Antigua y calle 56 La carrera 36 entre la vía Antigua y calle 56 posee un ancho efectivo de calzada de 6.5 metros, lo cual en caso de cierre parcial se puede manejar anchos habilitados superiores a 3.2 metros para el carril de paso. Anden del costado Oeste de 1.8 metros y anden Este de 1.8 metros. Una calzada de dos carriles, con carriles unidireccionales sentidos S-N con pavimento flexible. Anexo ilustración 26 pagina31, fuente PMT ESPECIFICO 2025

Ilustración 26. Perfiles viales del tramo – Carrera 36 entre vía Antigua y calle 56

Vía	Nº de Calzadas	Nº de Carriles Por Calzada	Tipo de Pavimento
Carrera 36 entre vía Antigua y Calle 56	1	2	Flexible



Fuente: Elaboración propia

DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO

NOTA: Debido a que el proyecto se va a realizar en diferentes jerarquías viales, incluyendo las arteriales, así mismo con diferentes zonas de influencias algunas con mayor o menor impacto, cada comuna deberá tener el diseño del plan del manejo de tránsito para los tramos que se vayan a trabajar y ser anexados en cada comité de tránsito.

Se enfatiza establecer medidas de control y mitigación, teniendo en cuenta las obras que se realizan en las vías públicas representan un riesgo a la seguridad de los usuarios, ya sea peatones, conductores y/o trabajadores de tal forma que se minimice la posibilidad de ocurrencia de accidentes o bien disminuir sus consecuencias.

La legislación vigente indica claramente que quien ejecute trabajos en las vías públicas, está obligado a instalar y mantener de día y de noche la señalización, además de seguridad adecuada a la naturaleza de los trabajos. Con el fin de orientar de manera precisa a los usuarios de la vía, se debe implantar señales informativas, reglamentarias y preventivas, junto con la debida señalización de primer nivel, aproximación a obra y la canalización mediante dispositivos canalizadores de transito.

En cuanto a la responsabilidad ante daños producidos en accidentes por incumplimiento de esta legislación, ésta recae en los que ejecutan la obra y en los que la encargan.

Así mismo, aunque no se contempla utilizar las vías vehiculares para el estacionamiento de vehículos, se contempla dentro de las propuestas figuras generales de como demarcar y hacer cierres parciales de carriles en caso de requerirse, sin embargo, el proyecto contempla principalmente estacionamiento de vehículos al interior del predio.

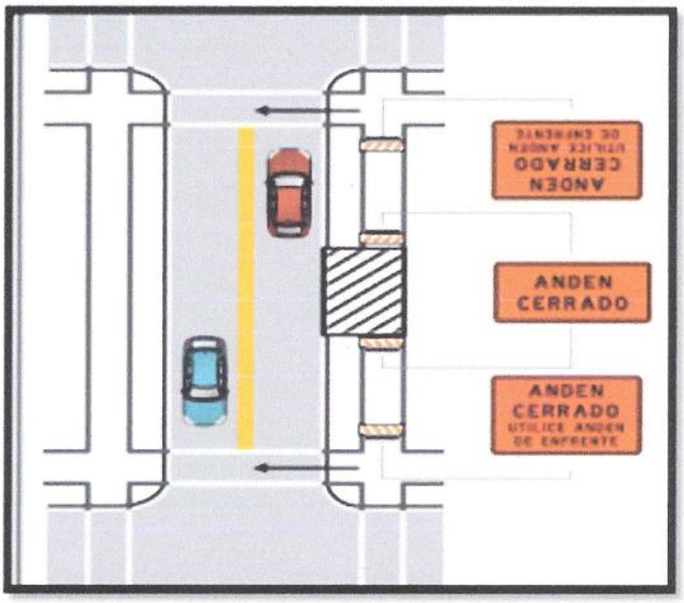
En caso de que las intervenciones requieran desvíos, estos deben contemplar la señalización completa, socialización con la comunidad para el acceso de tránsito local cuando y donde aplique, todo lo anterior, socializado en un coite de tráfico especifico de ser

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

necesario antes de la ejecución de los cierres totales, los cuales se realizarán uno a la vez para no crear problemas de accesibilidad.

Se anexa ilustración 27 pagina 38 PMT especifico 2025

Ilustración 27. Esquema general cierre total de anden con paso seguro al otro costad



RUTA DE EVACUACIÓN DE ESCOMBROS.

Sector Obra por tramo - Sector Vía La Flora: Tramo: Carrera 36 entre vía Antigua a Floridablanca y calle 56 Saliendo de la obra: Salir de la obra por la Carrera 36 a tomar la Calle 54 – Carrera 35ª – Calle 56 – Carrera 23 – Calle 55 – Carrera 27 para tomar la Calle 70 – pasar por el puente El Bueno, seguir hasta dar el retorno para tomar la Calle 70 – Carrera 30 para finalmente llegar a la escombrera el PARQUE.

Entrando a la obra: Saliendo de la escombrera el Parque, los vehículos pueden tomar por la vía Bucaramanga-Girón en sentido W-E - Puente El Bueno, seguimos por la Calle 70 hasta llegar a la calle 71 para luego tomar la calle 72 – Calle 86 – Carrera 30 – Carrera 31 donde tomamos la Calle 73 Bis para finalmente llegar y entrar a la obra por la carrera 36 entre la vía Antigua a Floridablanca y calle 56.

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Se anexa esquema ruta de evacuación de escombros, ilustración 38 pagina 34 PMT ESPECIFICO 2025

Ilustración 38. Esquema de la Ruta de Escombros Ida desde la Obra.



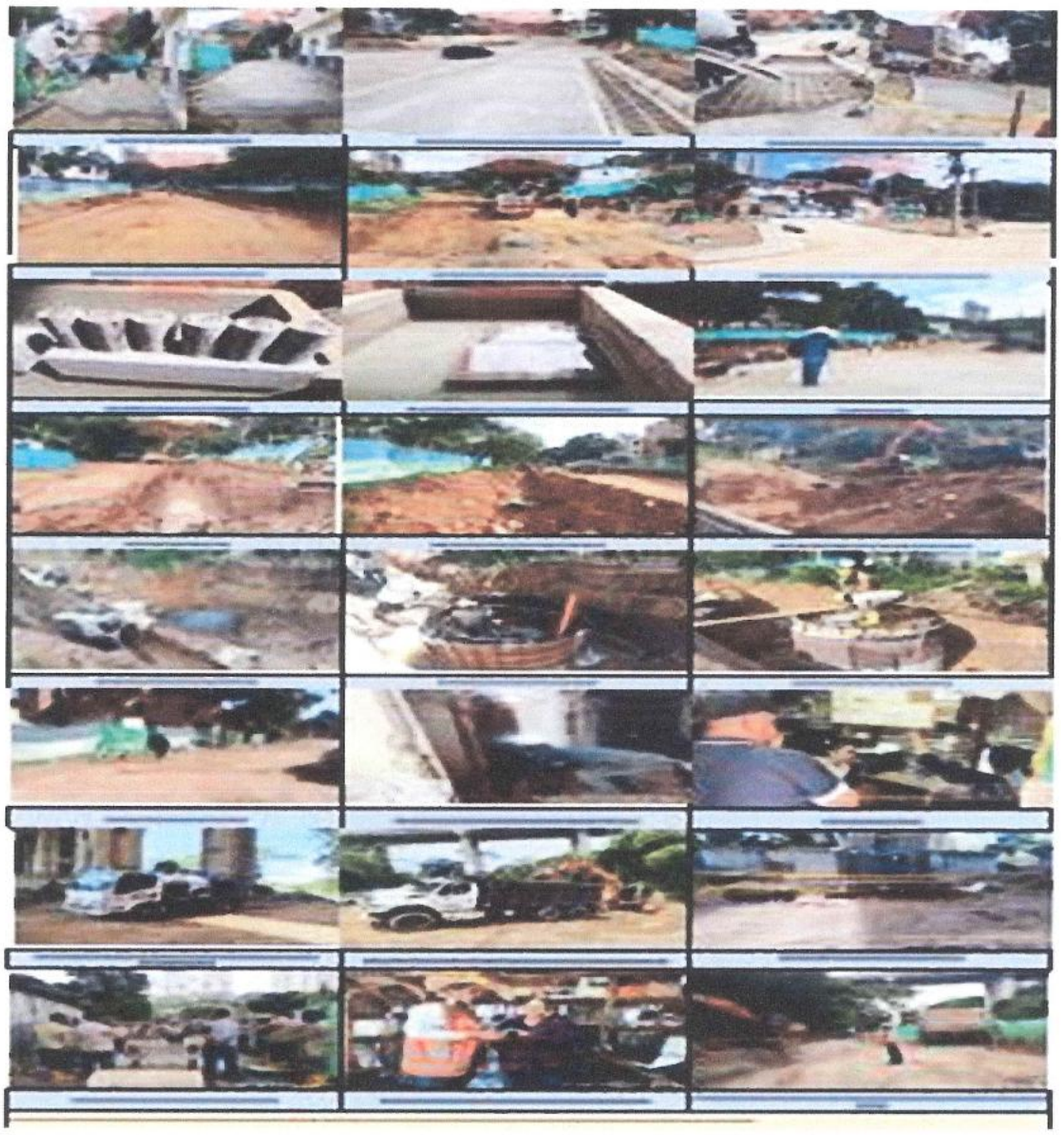
Fuente: Elaboración propia



(57-7)

Fuente: Elaboración propia

Las actividades de obra ejecutadas en los meses de octubre y noviembre de 2.025 fueron: **-demolición de anden existente, viajes internos con material de relleno seleccionado, instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, suministro e instalación de concreto mr41, relleno y compactación material seleccionado, reparación de anden en concreto Anexo No. 1 Evidencia fotográfica avance de obra.**



KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

SEÑALIZACIOM VIAL – CIERRE TOTALES

NOTA: En caso de que sean necesarios cierres totales en los tramos del proyecto en las comunas debido a las obras, se deberán anexar las imágenes con los desvíos correspondientes a cada caso donde existan cierres totales.

Distancias de señalización horizontal por tipo de vía, Vía Jerarquía Arterial primaria, secundarias y vías Nacionales De acuerdo al Manual de señalización vial 2024 se indica que, "en vías urbanas que tengan características operacionales y de diseño geométrico similares a autopistas, la distancia mínima debe regirse por lo establecido para vías rurales", para este tipo de vías, se usara longitudes de la señal SPO-01 para operaciones vehiculares en promedio 50-60 Km/h, por lo anterior, se va a contemplar una distancia mínima de 60 metros. Para la ubicación de la señal SPO-02 se instalará a 45 metros, así

La señal SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO puede ser instalada a 30 metros de la obra, sin embargo, es recomendado que se señalizase con SR-30 para que la aproximación al auxiliar sea a 30 Km/h, esta señal se ubicaría a 80 metros de la intervención para regular el paso de toda la zona de prevención. La señal SIO-2 de INICIO DE OBRA se instalará 10 metros antes de la transición de la obra y finalmente la señal SIO-3 FIN DE OBRA se instalará a 25 metros de la transición de fin de obra. Para el caso que aplique el sentido vial en el que se requiera la señal SPO-05 y/o SPO-06 según corresponda el angostamiento del carril, se instalará a 20 metros desde el final de la longitud de transición. Se va a trabajar 10 metros de zona de trabajos para realizar el parqueo de un vehículo que apoye el mantenimiento del alumbrado, teniendo en cuenta la velocidad de operación de 50 Km/h y un ancho promedio de 3.0 metros (A) la longitud de transición sería de 50 metros (Lt), la longitud de seguridad (Ls) sería de 10 metros debido a que se va a señalizar y el ancho de seguridad (As) sería de 1,2 metros. En total al sumar el área de trabajo, la Longitud de transición, la longitud de seguridad y la longitud de final de obra, el cerramiento es de 70 metros.

Nota: en sectores en los que no se puedan dar esta longitud de cerramiento porque supera la cuadra completa puede decrecer de entre 50 y 55 metros en total de cerramiento.

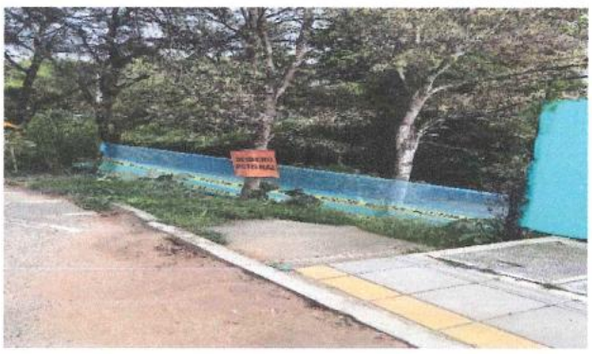
ESQUEMA DE SEÑALIZACION VIAL















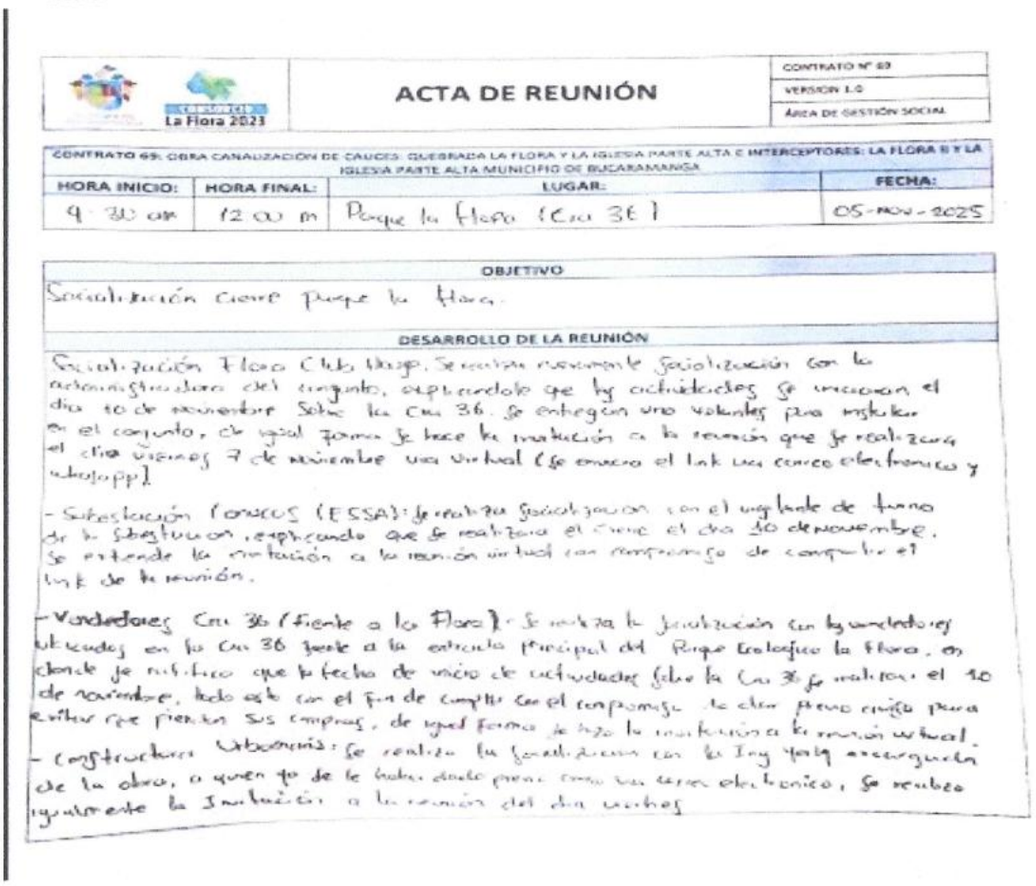


KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

COMPONENTE SOCIAL -PARTICIPACION CIUDADANA

Se llevó a cabo un recorrido técnico en el área de intervención con el objetivo de realizar socialización de cierres viales programados y seguimiento a las condiciones de la obra, de manera paralela, socializar con la comunidad la importancia de hacer uso de los senderos peatonales dispuestos temporalmente, resaltando la necesidad de adoptar estas medidas como mecanismo de autocuidado y prevención de incidentes. 2. Se realizó un recorrido urbano en los barrios de intervención por la obra, con el fin de conocer la percepción de la comunidad sobre el proyecto y atender sus inquietudes y solicitudes de manera oportuna y efectiva.

- **ANEXO No.4:** se anexa acta comité participación ciudadana del mes de octubre de 2025



ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO Nº 69
VERSION 1.0
ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 69: OBRA CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
9:30 am	12:00 m	Parque la Flora (Cra 36)	05-NOV-2025

OBJETIVO

Socialización cierre Parque la Flora.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Socialización Flora Club Urbe. Se realiza nuevamente socialización con la administradora del conjunto, explicandole que hay actividades se iniciaran el dia 10 de noviembre Sobre la Cra 36. Se entregan unos volantes para instalar en el conjunto, de igual forma se hace la invitación a la reunión que se realizara el dia viernes 7 de noviembre una virtual (se envia el link via correo electronico y whatsapp).

- Subestación Porvenir (ESSA): se realiza socialización con el ingeniero de turno de la subestación, explicando que se realizara el cierre el dia 10 de noviembre. Se extiende la invitación a la reunión virtual con compromiso de compartir el link de la reunión.

- Vendedores Cra 36 (frente a la Flora): Se realiza la socialización con los vendedores ubicados en la Cra 36 frente a la entrada principal del Parque Ecologico la Flora, en donde se informa que la fecha de inicio de actividades sobre la Cra 36 se realizara el 10 de noviembre, todo esto con el fin de cumplir con el compromiso de dar previo aviso para evitar que pierdan sus compras, de igual forma se hizo la invitación a la reunión virtual.

- Constructora Urbanemis: se realizo la socialización con el Ing Yesly encargada de la obra, a quien se le hizo dejo previo con los correos electronico, se recibio igualmente la invitación a la reunión del dia viernes

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

ACTA DE REUNIÓN	CONTRATO N° 69
	VERSION 1.0
	AREA DE GESTIÓN SOCIAL

El organismo gestor fue de apoyo fuerza se realizo nuevamente el acercamiento con el ingeniero y el contacto contratista de habitos para reconocerlos el inicio de las actividades, - se dejo claro que la evaluación a las actividades, presentadas de la fecha y demas entrara a la socialización se realizara via correo electronico y mensaje whatsapp.

CONCLUSIONES

Se realizo la socialización con las actores sociales cercanos a la intervención con quienes se ha hecho acercamiento desde el mes de Julio, cumpliendo con lo pactado de dar respuesta a las actividades.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Envio evaluación a las actores sociales para la reunión del dia 7 de noviembre (virtual)	Consorcio la Flora 2023.

CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES	CONTRATO N° 69
	VERSIÓN 1.0
	ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

FECHA	05-NOV-2023
LUGAR	Roya La Flora (Cra 36)
HORA	9:00 am
REUNIÓN	Socialización Cierre Cra 36

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Fenly Dayana Serrano	Cra Flora Club Hacienda	3160538144	
2	Orlando Z. Giral	Cub. Cercas	315 692 5173	
3	Sabina Tarazona	Vendedora Flora	3778777105	Sabina Carvajal
4	Sierra M. Hernandez	Vendedor	3134068938	
5	Fabio Andres Colchado	Extrabajadores de la Flora	3	
6	Diego Cardenas	Vendedor	3176309	
7	Yuly Paola Garcia	Ubatmeno	3173153919	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Consorcio La Flora 2023

Consorcio La Flora 2023
NIT. 901.702.490-7

Bucaramanga-Santander, 23 julio del 2025

CO-CLF-R01-278-24

FLORA CLUB HOUSE
Adm. Farly Dayana Serano
Bucaramanga, Santander

SUBESTACIÓN ELECTRICA CONUCOS
Líder Subestaciones- Juan Carlos Jiménez
Bucaramanga, Santander

Referencia: CONTRATO 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Asunto: SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA SOBRE LA CARRERA 36

Cordial Saludo

El Consorcio La Flora 2023 se permite informar que, a partir del 04 de agosto de 2025, se tiene previsto el inicio de las actividades de obra para la instalación del colector sanitario sobre la carrera 36, con una duración estimada de cuatro (4) meses, sujeta a condiciones climáticas.

Esta es una obra prioritaria cuyo objetivo es interceptar las aguas residuales que actualmente desembocan en el canal de la quebrada La Flora, la red a instalar estará compuesta por una tubería de 71 pulgadas de diámetro, lo cual requerirá excavaciones profundas a lo largo del eje central de la vía. Por esta razón, no será posible habilitar el paso vehicular habitual durante la ejecución de las actividades en el tramo comprendido entre la carrera 36 y el sector del Parque La Flora (calle 56)

Con respecto al tramo correspondiente al conjunto Flora Club House y la Subestación Eléctrica Conucos, la excavación se extenderá desde el pozo ubicado al final de la carrera 36 hasta el frente del Parque La Flora. (se adjunta imagen de referencia)

Consorciolaflora2023@gmail.com

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Consorcio La Flora 2023

Consorcio La Flora 2023
NIT. 901.702.490-7



Esta intervención no afectará directamente los parqueaderos y/accesos contemplados para el conjunto residencial o la subestación; sin embargo, será necesario implementar un cierre total de la vía, con el fin de restringir el tránsito vehicular habitual y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

Con el objetivo de no generar afectaciones a la cotidianidad de la zona, se permitirá el ingreso de vehículos hacia los parqueadero y accesos previamente establecidos para la Flora Club house y la subestación eléctrica; No obstante, se solicita muy amablemente respetar la señalización transitoria instalada (maletines, colombinas, cerramientos, entre otros) y, en caso de que sea necesario movilizar alguno de estos elementos, ubicarlos nuevamente en su lugar para no comprometer la seguridad del área intervenida. (se adjunta imagen de referencia)

Consorciolaflora2023@gmail.com

Consorcio La Flora 2023

Consorcio La Flora 2023
NIT. 901.702.490-7



Finalmente, se aclara que la via no sufrirá reducción ni ampliación, una vez finalizadas las labores, se realizará la reposición total de la malla vial.

Cordialmente,

ING JAIRO J BUITRAGO RIOS
Director de obra- Consorcio La flora 2023

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Bucaramanga, 12 septiembre de 2025

HORA: 2:40 Pm

LUGAR: Parque la Flora

TEMA: Mesa Componente Social

ASISTENTES: Sec. Infraestructura
DADEP
Contratista - interventoría, representantes conjunto Flora Club House
Vendedores de fritos

OBJETIVO:
Articular acciones entre actores claves para acciones preliminares antes de inicio de ejecución de obra

AGENDA DE LA REUNIÓN:

Hora	Tema	Responsable
2:40 Pm.	Presentación	Sec. Infraestructura
	Preliminares	Sec. Infraestructura
	Compromisos	Sec. Infraestructura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Desde el área Social de la Secretaría de Infraestructura, se realizó el enlace con el DADEP, para revisar alternativas con los comerciantes informales, conjunto Flora Club House para atender dudas e inquietudes en relación al inicio de la obra.

A continuación la contratista expone los avances del proceso de Socialización así:

Avances Sociales desde contratista e interventoría de obra:
- Socialización a actores identificados
- Socialización a conjunto
- Remisión de comunicado a conjunto. Sobre una nueva comunicación de inicio de obra

Se da claridad a residente del conjunto Flora Club House, sobre este desde el punto donde se ubica el pozo

- Ingreso al parque: Se plantea por turnos, sin embargo desde el área técnica de supervisión se está revisando si se cierra el parque o se mantiene operativo.

kiwa >CQR COMPAÑÍA ISO 14001:2015 CERTIFICADA

kiwa >CQR COMPAÑÍA ISO 14001:2015 CERTIFICADA

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

En cuanto a la ubicación de comerciantes informales (vendedores de frutas/ salpicon etc), se da la explicación de fases constructivas del proyecto
- Cierre de vía
24-30 - Excavaciones en el límite del parque → No habrá impacto social
Septiembre

Posterior a lo anterior se hará el cierre de la vía frente al parque, proyectado para 4 meses en condiciones ideales.

El representante del DADEP, plantea dos opciones de reubicación de los vendedores: - temporal - ubicados al interior del parque, frente a ello los señores vendedores proponen el punto de parque los leones. posterior a lo anterior se informará cual punto es viable para la reubicación y se acuerda que la medida se toma para y durante la ejecución de la obra.

El DADEP, queda a cargo de revisar donde serán ubicados los comerciantes (dentro del parque en la bahía frente al restaurante el rotario, entrada a semáforos o parque bosque lagos de comuneros), se concertara con comerciantes e informara a JAC que será prioritario

Punto 2 de la Reunión, Conjunto Floral Club Campestre.

Desde el área técnica de la contratista, se da claridad que el área aferente y perimetral, se da desde termino la loza hacia el poste.

Los delegados del conjunto manifiestan su preocupación sobre el PMT y las acciones necesarias de socialización acerca de cierres, restricciones y demás aspectos correspondientes al PMT, especialmente el acceso y salida.

- Solicitud de Socialización del proyecto al Conjunto? Se da claridad, que Si se proyecta, y se hará la respectiva programación e invitación formal.

Desde el área Social de la alcaldía, teniendo en cuenta las solicitudes de los representantes del conjunto, se solicita a contratista?
- Elaborar el flyer de la línea de PAC y remitirlo a la entidad para enviarlo al área de comunicaciones
- Realizar visita del área técnico, Sugiriendo la recomendación del representante del conjunto
- Elaborar Comunicación del PMT, fechas de inicio y recomendaciones para los residentes, dando claridad que el acceso continua Sin afectaciones

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7) 6809966
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Compromisos:

1. Dar cumplimiento a los esquemas de señalización vial aprobados en el PMT general.
2. Dar cumplimiento a las resoluciones N° 268 del 20 de mayo del 2024 y N° 397 del 19 de julio de 2024.
3. Si se adelantan actividades de cargue y descargue, incluir los permisos emanados por la Dirección de Transito de Bucaramanga.
4. La interventoría y/o supervisión del contrato deberá presentar un Plan de seguimiento que incluya inspecciones rutinarias de seguridad vial al cumplimiento del PMT.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS Consorciolaflora2023@gmail.com	Consorcio La flora 2023	Director de obra	3208570956	
2	KAREN PALOMINO GUEVARA Consorciolaflora2023@gmail.com	Consorcio La Flora 2023	Coordinador de HSEQ	3102765420	
3	JULIO LOZANO GARCIA	Consorcio interventoría canal bga	Ingeniero Residente Interventoría	3183952316	
4	Osvaldo Ariza Castillo	Dirección de Tránsito Bucaramanga	Profesional universitario	3186899796	

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: Gogal constructores
INSPECCIONADO POR: Oscar Avdila
SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOV DEL 2025

SERIE N°: DX55 MODELO: 2024 MARCA: DEVELOW
LOCALIZACIÓN: Bucaramanga

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS				NO FUNCIONA		NO FUNCIONA		NO FUNCIONA		NO FUNCIONA		NO FUNCIONA		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO			NO FUNCIONA		NO FUNCIONA		NO FUNCIONA		NO FUNCIONA		NO FUNCIONA			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE			Oscar Avdila		Oscar Avdila		Oscar Avdila		Oscar Avdila		Oscar Avdila			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Joana Jaidi Sot
	FIRMA: Karen G	FIRMA:
	CARGO: Prof. SST	CARGO: Ing SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: Gogal (constructores) | SERIE N°: DX55 | MODELO: 2024 | MARCA: DEVELON

INSPECCIONADO POR: Oscar Avila | LOCALIZACIÓN: Bucaramanga

SEMANA DEL 10 AL 15 DE Nov DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO TIENE		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Oscar Avila		Oscar Avila		Oscar Avila		Oscar Avila		Oscar Avila		Oscar Avila			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE:
	FIRMA:	FIRMA:
	CARGO: Prof. SST	CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: Gogal constructore
INSPECCIONADO POR: Oscar Avila
SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOV DEL 2025

SERIE N°: DX 55 MODELO: 2024 MARCA: DEVELON
LOCALIZACIÓN: Bucaramanga

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS				NO Func		NO Func		NO Func		NO Func		NO Func		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO				NO Func		NO Func		NO Func		NO Func		NO Func		
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE			Oscar Avila		Oscar Avila		Oscar Avila		Oscar Avila		Oscar Avila			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen G		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: Gogal constructores — SERIE N°: DX 55 — MODELO: 2021 — MARCA: DEVELON

INSPECCIONADO POR: Oscar Ardila — LOCALIZACIÓN: Bucaramanga

SEMANA DEL 24 — AL 29 DE ABRIL DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓	NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC	✓	NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: Consorcio la flora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR S 570
INSPECCIONADO POR: Eluer Gomez	SERIE NUMERO: A JU 714619
NOMBRE DEL OPERADOR: Eluer Gomez	PERIODO DEL 18 AL 22

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)			X		X		X		X		X		
	Direccionales													
	De parqueo			X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco			X		X		X		X		X		
	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS			X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor			X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo escape)			X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)													
	Alarma de retroceso													
	Pito			X		X		X		X		X		
	Apoyos de acceso			X		X		X		X		X		
	Espejos laterales													
	Espejo central convexo													
	Palancas de mando en buen estado			X		X		X		X		X		
	Pedales en buen estado			X		X		X		X		X		
	Frenos (de emergencia, servicio)			X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)			X		X		X		X		X		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite			X		X		X		X		X		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)			X		X		X		X		X		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)			X		X		X		X		X		
	Estado de los gatos de estabilización													
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)			X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)			X		X		X		X		X		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)			X		X		X		X		X		
	Operación del cucharón			X		X		X		X		X		
	Frenos del brazo y del cucharón			X		X		X		X		X		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)			X		X		X		X		X		
	Huellas en buen estado = 5mm			X		X		X		X		X		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Eluer		Eluer		Eluer		Eluer		Eluer		Eluer		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: Consorcio la Flora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR S 570
INSPECCIONADO POR: Eluer Gomez	SERIE NUMERO: A7U71646
NOMBRE DEL OPERADOR: Eluer Gomez	PERIODO DEL 24 AL 29

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	Direccionales													
	De parqueo	X		X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco	X		X		X		X		X		X		
	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS	X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor	X		X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo escape)	X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)													
	Alarma de retroceso													
	Pito	X		X		X		X		X		X		
	Apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales													
	Espejo central convexo													
	Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Frenos (de emergencia, servicio)	X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)	X		X		X		X		X		X		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)	X		X		X		X		X		X		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	X		X		X		X		X		X		
	Estado de los gatos de estabilización													
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)	X		X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	X		X		X		X		X		X		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)	X		X		X		X		X		X		
	Operación del cucharón	X		X		X		X		X		X		
	Frenos del brazo y del cucharón	X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)	X		X		X		X		X		X		
	Huellas en buen estado = 5mm	X		X		X		X		X		X		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Eluer		Eluer		Eluer		Eluer		Eluer		Eluer		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: Yeyana Garcia
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S
SERIE N°: DX740IC MODELO: 2013 MARCA: DOOSAN
INSPECCIONADO POR: OMAR NEL GALLARDO URUEÑA
LOCALIZACIÓN: LA FLORA
SEMANA DEL 10 AL 15 DE NOV DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE														
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
FIRMA:		FIRMA:
CARGO: Prof. SST		CARGO:

Consorcio La Flora 2023

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES SAS — SERIE N°: DX140LC — MODELO: 2013 — MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: PEDRO NEL GALLARDO VIVEROS — LOCALIZACIÓN: LA FLORA

SEMANA DEL 48 — AL 22 DE NOV DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE														
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S — SERIE N°: DX340LC — MODELO: 2013 — MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: PEDRO NEL GALLARDO UREÑA — LOCALIZACIÓN: LA FLORA

SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOV DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓	•	✓		✓		✓		✓					
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓	?	✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓					
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE														
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL

INSPECCIONADO POR: William Moreno

SEMANA DEL 04 AL 8 DE 11 DEL 2025

SERIE N°: DX220LC MODELO: 2022 MARCA: Doosan

LOCALIZACIÓN: La Flora

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado			✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE			William		William		William		William		William			
	FIRMA			—		—		—		—		—			

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: Gogal. SERIE N°: DX220L MODELO: 2022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: William Alvarado LOCALIZACIÓN: La Flora

SEMANA DEL 10 AL 15 DE _____ DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	William		William		William		William		William		William			
	FIRMA	—		—		—		—		—		—			

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE:
	FIRMA:	FIRMA:
	CARGO: Prof. SST	CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S
SERIE N°: DX140LC MODELO: 2013 MARCA: DOOSAN
INSPECCIONADO POR: PEDRO NEL GALLARDO URGIÑA
LOCALIZACIÓN: LA FLORA
SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE														
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL | SERIE N°: DX 220L | MODELO: 2022 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Wilmer Palomino | LOCALIZACIÓN: La Flora

SEMANA DEL 19 AL 22 DE 11 DEL 2025

	ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado			✓		—		—		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE			Wilmer		Wilmer		Wilmer		Wilmer		Wilmer			
	FIRMA			—		—		—		—		—			

Nota Importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Andrea Garcia SST.
	FIRMA: Karen P.	FIRMA:
	CARGO: Prof. SST	CARGO: Ing SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL

INSPECCIONADO POR: William Marroquin

SEMANA DEL 24 AL 29 DE 11 DEL 2025

SERIE N°: DX220LC MODELO: _____ MARCA: Doosan

LOCALIZACIÓN: La Flora

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	William		William		William		William		William		William			
	FIRMA	—		—		—		—		—		—			

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jhonny Garcia Soto.
	FIRMA: Karen	FIRMA:
	CARGO: Prof. SST	CARGO: Jefe Insp SST

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 2

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA — LUGAR-AREA: Parque la Flora

SERIE N°: CASE 580 V. — MARCA: CASE 580 V

PERIODO DEL 4 AL 8 DE Noviembre 2025

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION														
RADIADOR CON TAPA														
LIQUIDO REFRIGERAN.														
RECIPIENTE RESERVA														
SOPORTES RADIADOR														
PROTECT. RADIADOR														
MANG. Y ABRAZADER.														
TERMOSTATO														
VENTILADOR Y CORREA														
TANQUE COMB. Y TAPA														
LLAVE DE DRENAJE														
COLADOR														
TRAMPA DE AGUA														
FILTRO PRIMARIO														
FILTRO SECUNDARIO														
BOMBA TRANSFERENC.														
BOMBA INYECCION														
INYECTORES														
FILTRO DE AIRE														
DUCTOS YABRAZADER.														
MULTIPLE														
TAPA TUBO DE ESCAPE														
SILENCIADOR Y ABRAZ.														
BATERIAS														
ALTERNADOR														
MOTOR DE ARRANQUE														
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO														
SOLENOIDE DE ENCENDIDO														
AUTO DESACELERADOR														
PERA PRESION ACEITE														
PERA DE TEMPERATURA														
SWITCH DE ENCENDIDO														
LUCES														
LUZ DE LA CABINA														
PITO														
SWITCH VEL. DE TRABAJO														
INDICADOR TEMPERATURA														
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.														
INDICADOR NIVEL REFRIGER.														
INDICADOR PRESION DE ACEITE														
INDICADOR CARGA DE BATERIA														
ALARMA DE ENCENDIDO														
ALARMA DE REVERSA														
MOTOR LIMPIA VIDRIOS														
RESERVA VIDRIOS														
PLUMILLAS														
TACOMETRO														
HOROMETRO														
AMPERIMETRO														
PORTAFUSIBLES														
VENTILADOR CABINA														
AIRE ACONDICIONADO														
AVISOS														
MIRILLA														
NIVEL DE ACEITE														
MANGUERAS														
BOMBA HIDRAULICA														
GATOS DE LEVANTE														
GATO DEL BRAZO														

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 2 de 2

GATO DEL BALDE																
MOTOR DE GIRO																
FRENO DE GIRO																
MOTORES TRASLACION																
FRENO TRASLACION																
BLOQUES VALVULAS																
MANDOS MANUALES																
MANDOS DE PIE																
FUGAS																
BOOM																
BRAZO																
BALDE																
BASE DEL BALDE																
DIENTES Y ADAPTADOR																
ESQUINERAS																
ESTRUCTURA																
REDUCTORA DE GIRO																
NIVEL DE ACEITE																
ANCLAJE																
FISURAS																
CORONA DE GIRO																
NIVEL DE GRASA																
TORNILLOS																
FUGAS																
REDUCTORAS																
SPROCKET DERECHO																
SPROCKET IZQUIERDO																
RUEDA GUIA DERECHA																
RUEDA GUIA IZQUIERDA																
GATOS TENSORES																
CARRILES SUPERIORES																
CARRILES INFERIORES																
CADENAS																
ZAPATAS																
GRASERAS																
GUARDAS																
PECHERAS																
CABINA																
VIDRIOS																
PUERTAS Y CHAPAS																
ASIENTO																
CINTURON SEGURIDAD																
EXTINTOR Y BASE																
HERRAMIENTA MANUAL																
PARASOLES																
PASAMANOS																
CAPO																
LATONERIA																
OPERADOR CERTIFICADO																

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE FIRMA									

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA FIRMA: CARGO: Prof. SST		NOMBRE: FIRMA: CARGO:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 2

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: La Flora.

SERIE N°: CASE 580V

MARCA: CASE 580V

PERIODO DEL 10 AL 15 DE Noviem DE 25

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION														
RADIADOR CON TAPA														
LIQUIDO REFRIGERAN.														
RECIPIENTE RESERVA														
SOPORTES RADIADOR														
PROTECT. RADIADOR														
MANG. Y ABRAZADER.														
TERMOSTATO														
VENTILADOR Y CORREA														
TANQUE COMB. Y TAPA														
LLAVE DE DRENAJE														
COLADOR														
TRAMPA DE AGUA														
FILTRO PRIMARIO														
FILTRO SECUNDARIO														
BOMBA TRANSFERENC.														
BOMBA INYECCION														
INYECTORES														
FILTRO DE AIRE														
DUCTOS YABRAZADER.														
MULTIPLE														
TAPA TUBO DE ESCAPE														
SILENCIADOR Y ABRAZ.														
BATERIAS														
ALTERNADOR														
MOTOR DE ARRANQUE														
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO														
SOLENOIDE DE ENCENDIDO														
AUTO DESACELERADOR														
PERA PRESION ACEITE														
PERA DE TEMPERATURA														
SWITCH DE ENCENDIDO														
LUCES														
LUZ DE LA CABINA														
PITO														
SWITCH VEL. DE TRABAJO														
INDICADOR TEMPERATURA														
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.														
INDICADOR NIVEL REFRIGER.														
INDICADOR PRESION DE ACEITE														
INDICADOR CARGA DE BATERIA														
ALARMA DE ENCENDIDO														
ALARMA DE REVERSA														
MOTOR LIMPIA VIDRIOS														
RESERVA VIDRIOS														
PLUMILLAS														
TACOMETRO														
HOROMETRO														
AMPERIMETRO														
PORTAFUSIBLES														
VENTILADOR CABINA														
AIRE ACONDICIONADO														
AVISOS														
MIRILLA														
NIVEL DE ACEITE														
MANGUERAS														
BOMBA HIDRAULICA														
GATOS DE LEVANTE														
GATO DEL BRAZO														

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 2 de 2

GATO DEL BALDE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTORES TRASLACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO TRASLACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BLOQUES VALVULAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANDOS MANUALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANDOS DE PIE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOOM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BALDE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BASE DEL BALDE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DIENTES Y ADAPTADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESQUINERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTRUCTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REDUCTORA DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ANCLAJE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FISURAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CORONA DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVEL DE GRASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TORNILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REDUCTORAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SPROCKET DERECHO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SPROCKET IZQUIERDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RUEDA GUIA DERECHA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RUEDA GUIA IZQUIERDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GATOS TENSORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CARRILES SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CARRILES INFERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CADENAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ZAPATAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUARDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PECHERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PUERTAS Y CHAPAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ASIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CINTURON SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EXTINTOR Y BASE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HERRAMIENTA MANUAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARASOLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CAPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LATONERIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR CERTIFICADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE FIRMA							

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA FIRMA: CARGO: Prof. SST		NOMBRE: Nelson García FIRMA: CARGO: Insp SST

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 2

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: _____

SERIE N°: CASE 580 V

MARCA: CASE 580 V

PERIODO DEL 18 AL 22 DE Noviembre DE 25

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION														
RADIADOR CON TAPA														
LIQUIDO REFRIGERAN.														
RECIPIENTE RESERVA														
SOPORTES RADIADOR														
PROTECT. RADIADOR														
MANG. Y ABRAZADER.														
TERMOSTATO														
VENTILADOR Y CORREA														
TANQUE COMB. Y TAPA														
LLAVE DE DRENAJE														
COLADOR														
TRAMPA DE AGUA														
FILTRO PRIMARIO														
FILTRO SECUNDARIO														
BOMBA TRANSFERENC.														
BOMBA INYECCION														
INYECTORES														
FILTRO DE AIRE														
DUCTOS YABRAZADER.														
MULTIPLE														
TAPA TUBO DE ESCAPE														
SILENCIADOR Y ABRAZ.														
BATERIAS														
ALTERNADOR														
MOTOR DE ARRANQUE														
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO														
SOLENOIDE DE ENCENDIDO														
AUTO DESACELERADOR														
PERA PRESION ACEITE														
PERA DE TEMPERATURA														
SWITCH DE ENCENDIDO														
LUCES														
LUZ DE LA CABINA														
PITO														
SWITCH VEL. DE TRABAJO														
INDICADOR TEMPERATURA														
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.														
INDICADOR NIVEL REFRIGER.														
INDICADOR PRESION DE ACEITE														
INDICADOR CARGA DE BATERIA														
ALARMA DE ENCENDIDO														
ALARMA DE REVERSA														
MOTOR LIMPIA VIDRIOS														
RESERVA VIDRIOS														
PLUMILLAS														
TACOMETRO														
HOROMETRO														
AMPERIMETRO														
PORTAFUSIBLES														
VENTILADOR CABINA														
AIRE ACONDICIONADO														
AVISOS														
MIRILLA														
NIVEL DE ACEITE														
MANGUERAS														
BOMBA HIDRAULICA														
GATOS DE LEVANTE														
GATO DEL BRAZO														

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 2 de 2

GATO DEL BALDE																
MOTOR DE GIRO																
FRENO DE GIRO																
MOTORES TRASLACION																
FRENO TRASLACION																
BLOQUES VALVULAS																
MANDOS MANUALES																
MANDOS DE PIE																
FUGAS																
BOOM																
BRAZO																
BALDE																
BASE DEL BALDE																
DIENTES Y ADAPTADOR																
ESQUINERAS																
ESTRUCTURA																
REDUCTORA DE GIRO																
NIVEL DE ACEITE																
ANCLAJE																
FISURAS																
CORONA DE GIRO																
NIVEL DE GRASA																
TORNILLOS																
FUGAS																
REDUCTORAS																
SPROCKET DERECHO																
SPROCKET IZQUIERDO																
RUEDA GUIA DERECHA																
RUEDA GUIA IZQUIERDA																
GATOS TENSORES																
CARRILES SUPERIORES																
CARRILES INFERIORES																
CADENAS																
ZAPATAS																
GRASERAS																
GUARDAS																
PECHERAS																
CABINA																
VIDRIOS																
PUERTAS Y CHAPAS																
ASIENTO																
CINTURON SEGURIDAD																
EXTINTOR Y BASE																
HERRAMIENTA MANUAL																
PARASOLES																
PASAMANOS																
CAPO																
LATONERIA																
OPERADOR CERTIFICADO																
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE															
	FIRMA															

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 2

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: _____

SERIE N°: CASE 580 V

MARCA: CASE 580 V

PERIODO DEL 24 AL 29 DE Noviembre DE 25

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION														
RADIADOR CON TAPA														
LIQUIDO REFRIGERAN.														
RECIPIENTE RESERVA														
SOPORTES RADIADOR														
PROTECT. RADIADOR														
MANG. Y ABRAZADER.														
TERMOSTATO														
VENTILADOR Y CORREA														
TANQUE COMB. Y TAPA														
LLAVE DE DRENAJE														
COLADOR														
TRAMPA DE AGUA														
FILTRO PRIMARIO														
FILTRO SECUNDARIO														
BOMBA TRANSFERENC.														
BOMBA INYECCION														
INYECTORES														
FILTRO DE AIRE														
DUCTOS YABRAZADER.														
MULTIPLE														
TAPA TUBO DE ESCAPE														
SILENCIADOR Y ABRAZ.														
BATERIAS														
ALTERNADOR														
MOTOR DE ARRANQUE														
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO														
SOLENOIDE DE ENCENDIDO														
AUTO DESACELERADOR														
PERA PRESION ACEITE														
PERA DE TEMPERATURA														
SWITCH DE ENCENDIDO														
LUCES														
LUZ DE LA CABINA														
PITO														
SWITCH VEL. DE TRABAJO														
INDICADOR TEMPERATURA														
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.														
INDICADOR NIVEL REFRIGER.														
INDICADOR PRESION DE ACEITE														
INDICADOR CARGA DE BATERIA														
ALARMA DE ENCENDIDO														
ALARMA DE REVERSA														
MOTOR LIMPIA VIDRIOS														
RESERVA VIDRIOS														
PLUMILLAS														
TACOMETRO														
HOROMETRO														
AMPERIMETRO														
PORTAFUSIBLES														
VENTILADOR CABINA														
AIRE ACONDICIONADO														
AVISOS														
MIRILLA														
NIVEL DE ACEITE														
MANGUERAS														
BOMBA HIDRAULICA														
GATOS DE LEVANTE														
GATO DEL BRAZO														

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 2 de 2

GATO DEL BALDE																							
MOTOR DE GIRO																							
FRENO DE GIRO																							
MOTORES TRASLACION																							
FRENO TRASLACION																							
BLOQUES VALVULAS																							
MANDOS MANUALES																							
MANDOS DE PIE																							
FUGAS																							
BOOM																							
BRAZO																							
BALDE																							
BASE DEL BALDE																							
DIENTES Y ADAPTADOR																							
ESQUINERAS																							
ESTRUCTURA																							
REDUCTORA DE GIRO																							
NIVEL DE ACEITE																							
ANCLAJE																							
FISURAS																							
CORONA DE GIRO																							
NIVEL DE GRASA																							
TORNILLOS																							
FUGAS																							
REDUCTORAS																							
SPROCKET DERECHO																							
SPROCKET IZQUIERDO																							
RUEDA GUIA DERECHA																							
RUEDA GUIA IZQUIERDA																							
GATOS TENSORES																							
CARRILES SUPERIORES																							
CARRILES INFERIORES																							
CADENAS																							
ZAPATAS																							
GRASERAS																							
GUARDAS																							
PECHERAS																							
CABINA																							
VIDRIOS																							
PUERTAS Y CHAPAS																							
ASIENTO																							
CINTURON SEGURIDAD																							
EXTINTOR Y BASE																							
HERRAMIENTA MANUAL																							
PARASOLES																							
PASAMANOS																							
CAPO																							
LATONERIA																							
OPERADOR CERTIFICADO																							

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE						
	FIRMA						

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO:

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

LOCALIZACIÓN: CONSORCIO LA FLORA 20-23	PLACAS: VIBRO
INSPECCIONADO POR: BERNABE PEÑA R.	MODELO: 2004
NOMBRE DEL OPERADOR: BERNABE PEÑA R.	MARCA: DYNAPAC
PERIODO DEL 11 AL 16 NOVIEMBRE	EQUIPO N°:

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (Tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanico de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Dirección (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mando de estacionamiento (Emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Resguardo			✓										
	Anclaje de contrapeso			✓										
OTROS														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: BERNABE PEÑA R.
	FIRMA: Karen		FIRMA: BERNABE PEÑA R.
	CARGO: Prof. SST		CARGO: OPERADOR

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

LOCALIZACIÓN: CONSORCIO LA FLORA 20-23	PLACAS: VIBRO
INSPECCIONADO POR: BERNABE PEÑA R	MODELO: 2004
NOMBRE DEL OPERADOR: BERNABE PEÑA R.	MARCA: DYNAPAC
PERIODO DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE	EQUIPO N°:

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (Tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanico de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Dirección (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mando de estacionamiento (Emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Resguardo													
	Anclaje de contrapeso													
OTROS														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	BPP		BPP		BPP		BPP		BPP		BPP		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: BERNABE PEÑA R
	FIRMA:		FIRMA: BERNABE PEÑA R
	CARGO: Prof. SST		CARGO: OPERADOR

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

LOCALIZACIÓN: Consorcio La Flora 20-23	PLACAS: Vibro
INSPECCIONADO POR: Bernabe Reña	MODELO: 2004
NOMBRE DEL OPERADOR: Bernabe Reña	MARCA: Dynapac
PERIODO DEL_____ AL 29 Noviembre	EQUIPO N°:

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (Tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanico de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Dirección (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mando de estacionamiento (Emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Resguardo													
	Anclaje de contrapeso													
OTROS														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: Bernabe Reña R.
	FIRMA: Karen G		FIRMA: Bernabe Reña R
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Operador

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: La Flora 2023	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR
INSPECCIONADO POR: William Ramirez.	SERIE NUMERO: CAT-0025OC5L601981
NOMBRE DEL OPERADOR: William Ramirez.	PERIODO DEL 04 AL 08 Noviembre 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)					✓	✓	✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Direccionales					N/A	N/A	✓		✓		✓		
	De parqueo					✓	✓	✓		✓		✓		
CABINA	Protección antivuelco					✓	✓	✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad					✓	✓	✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS					N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor					✓	✓	✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (tubo escape)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Asiento en buen estado					✓	✓	✓		✓		✓		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso					✓	✓	✓		✓		✓		
	Pito					✓	✓	✓		✓		✓		
	Apoyos de acceso					✓	✓	✓		✓		✓		
	Espejos laterales					N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		
	Espejo central convexo					✓	✓	✓		✓		✓		
	Palancas de mando en buen estado					✓	✓	✓		✓		✓		
	Pedales en buen estado					✓	✓	✓		✓		✓		
	Frenos (de emergencia, servicio)					✓	✓	✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite					✓	✓	✓		✓		✓		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Estado de los gatos de estabilización					✓	✓	✓		✓		✓		
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Mandos de levante del brazo					✓	✓	✓		✓		✓		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Operación del cucharón					✓	✓	✓		✓		✓		
	Frenos del brazo y del cucharón					N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)					✓	✓	✓		✓		✓		
	Huellas en buen estado = 5mm					✓	✓	✓		✓		✓		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE					William		William		William		William		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: William Ramirez.
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof SST		CARGO: Operador.

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: Lo Flora 2023	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR
INSPECCIONADO POR: William Ramirez	SERIE NUMERO: CAT 0R250 C5L 60198
NOMBRE DEL OPERADOR: William Ramirez	PERIODO DEL 10 AL 15 Noviembre

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	V		V		V	X	V		V		V		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	V		V		V		V		V		V		
	Direccionales	NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De parqueo	V		V		V		V		V		V		
CABINA	Protección antivuelco	V		V		V		V		V		V		
	Cinturon de seguridad	V		V		V		V		V		V		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS	NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor	V		V		V		V		V		V		
	Control ingreso humo (tubo escape)	V		V		V		V		V		V		
	Asiento en buen estado	V		V		V		V		V		V		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)	V		V		V		V		V		V		
	Alarma de retroceso	V		V		V		V		V		V		
	Pito	V		V		V		V		V		V		
	Apoyos de acceso	V		V		V		V		V		V		
	Espejos laterales	NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Espejo central convexo	V		V		V		V		V		V		
	Palancas de mando en buen estado	V		V		V		V		V		V		
	Pedales en buen estado	V		V		V		V		V		V		
	Frenos (de emergencia, servicio)	V		V		V		V		V		V		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)	V		V		V		V		V		V		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite	V		V		V		V		V		V		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)	V		V		V		V		V		V		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	V		V		V		V		V		V		
	Estado de los gatos de estabilización	V		V		V		V		V		V		
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)	V		V		V		V		V		V		
	Mandos de levante del brazo	V		V		V		V		V		V		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	V		V		V		V		V		V		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)	V		V		V		V		V		V		
	Operación del cucharón	V		V		V		V		V		V		
	Frenos del brazo y del cucharón	NA		NA		NA		NA		NA		NA		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)	V		V		V		V		V		V		
	Huellas en buen estado = 5mm	V		V		V		V		V		V		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE													
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota Importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: William Ramirez M.
	FIRMA: Karen G		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Op. Minicargador

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: La Flora.	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR
INSPECCIONADO POR: William Ramirez	SERIE NUMERO: CAT. 250.
NOMBRE DEL OPERADOR: William Ramirez	PERIODO DEL 18 AL 22

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)			X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)			X		X		X		X		X		
	Direccionales			NA		NA		NA		NA		NA		
	De parqueo			X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco			X		X		X		X		X		
	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS			NA		NA		NA		NA		NA		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor			X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo escape)			X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)			X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		
	Pito			X		X		X		X		X		
	Apoyos de acceso			X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			NA		NA		NA		NA		NA		
	Espejo central convexo			X		X		X		X		X		
	Palancas de mando en buen estado			X		X		X		X		X		
	Pedales en buen estado			X		X		X		X		X		
	Frenos (de emergencia, servicio)			X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)			X		X		X		X		X		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite			X		X		X		X		X		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)			X		X		X		X		X		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)			X		X		X		X		X		
	Estado de los gatos de estabilización			NA		NA		NA		NA		NA		
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)			X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)			X		X		X		X		X		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)			X		X		X		X		X		
	Operación del cucharón			X		X		X		X		X		
	Frenos del brazo y del cucharón			X		X		X		X		X		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)			X		X		X		X		X		
	Huellas en buen estado = 5mm			X		X		X		X		X		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	William		Ramirez										
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: William Ramirez
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Operador de Minicargador

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: La Flora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR
INSPECCIONADO POR: William Ramirez	SERIE NUMERO: CAT. 250
NOMBRE DEL OPERADOR: William Ramirez	PERIODO DEL 24 AL 29

	ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	Observación
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)													
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)													
	Direccionales													
	De parqueo													
CABINA	Protección antivuelco													
	Cinturon de seguridad													
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS													
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor													
	Control ingreso humo (tubo escape)													
	Asiento en buen estado													
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)													
	Alarma de retroceso													
	Pito													
	Apoyos de acceso													
	Espejos laterales													
	Espejo central convexo													
	Palancas de mando en buen estado													
	Pedales en buen estado													
	Frenos (de emergencia, servicio)													
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)													
	Control de fugas hidraulicas, de aceite													
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)													
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)													
	Estado de los gatos de estabilización													
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)													
	Mandos de levante del brazo													
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)													
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)													
	Operación del cucharón													
	Frenos del brazo y del cucharón													
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)													
	Huellas en buen estado = 5mm													
Vo. Bo. Operador	William Ramirez NOMBRE FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: William Ramirez
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Operador Minicargador

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la flora 2023	**REFERENCIA:**	**MODELO:** X516DER	**MARCA:** HONDA
PERIODO: DEL 04 **AL** 08 **DEL** Nov	**LOCALIZACION:** San Martin		**EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓		✓				✓					
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓				✓					
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓		✓				✓					
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓		✓				✓					
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓		✓				✓					
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓		✓				✓					
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓				✓					
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓		✓				✓					
CORREA	✓		✓		✓				✓					
POLEA	✓		✓		✓				✓					
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓				✓					
	✓		✓		✓				✓					

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	Jesus Andres B-6	Jesus Andres B-6	Jesus Andres B-6				
RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	Karen	Karen	Karen				

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la Flora 2023	**REFERENCIA:**	**MODELO:** XS16 DEF	**MARCA:** Honda.
PERIODO: DEL 10 **AL** 15 **DEL** Nov.	**LOCALIZACION:** San Martin.		**EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓				✓		✓		✓					
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓		✓					
PALANCA DE ACELERADOR	✓				✓		✓		✓					
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓				✓		✓		✓					
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓				✓		✓		✓					
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓				✓		✓		✓					
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓		✓					
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓				✓		✓		✓					
CORREA	✓				✓		✓		✓					
POLEA	✓				✓		✓		✓					
NIVEL DE ACEITE	✓				✓		✓							
	✓				✓				✓					

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:							
FIRMA	Jesus Andres B.G		Jesus Andres B.G	Jesus Andres B.G	Jesus Andres B.G		
RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	Kabre6		Kabre6	Kabre6	Kabre6		

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023		
DEPENDENCIA Consorcio la Flora 2023	**REFERENCIA:**	**MODELO:** XS16 DER	**MARCA:** Honda
PERIODO: DEL 18 **AL** 22 **DEL** Nov	**LOCALIZACION:** San Martin		**EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS			✓		✓		✓							
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓							
PALANCA DE ACELERADOR			✓		✓		✓							
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS			✓		✓		✓							
ESTADO DE LAS ZAPATAS			✓		✓		✓							
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE			✓		✓		✓							
FUGAS DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓							
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO			✓		✓		✓							
CORREA			✓		✓		✓							
POLEA			✓		✓		✓							
NIVEL DE ACEITE			✓		✓		✓							
			✓		✓		✓							

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA		Jesus Andres 13-6	Jesus Andres 13.6	Jesus Andres 13-6			
RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA		Xoreb	Xoreb	Xoreb			

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la flora 2023	**REFERENCIA:**	**MODELO:** X316 PEP	**MARCA:** Honda
PERIODO: DEL 24 **AL** 2 **DEL** 2025	**LOCALIZACION:** San Martin		**EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓				✓		✓					
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓				✓		✓					
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓				✓		✓					
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓				✓		✓					
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓				✓		✓					
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓				✓		✓					
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓				✓		✓					
CORREA	✓		✓				✓		✓					
POLEA	✓		✓				✓		✓					
NIVEL DE ACEITE	✓			✓			✓			✓				
	✓		✓				✓			✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	Jesús Andres B.6	Jesús Andres B.6		Jesús Andres B.6	Jesús Andres B.6		

RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	Karen	Karen		Karen	Karen		

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTO BOMBA	Versión No: 03
	SIG-HSEQ-F-41	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA **LUGAR-AREA:** operativa

SERIE N°: MOD186FA. **MARCA:** SUKIYAMA

PERIODO DEL 04 **AL** 08 **DE** Nov. **DE** 2025.

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor			✓		✓									
Filtro de aceite			✓		✓									
Motor de arranque			✓		✓									
Salida de agua			✓		✓									
Entrada de agua			✓		✓									
Tapón de purga			✓		✓									
Tapón de tanque de combustible			✓		✓									
Escape			✓		✓									
Filtro de aire			✓		✓									
Bujía			✓		✓									
Tapón de abastaecimiento de aceite			✓		✓									
Tapón para drenaje de agua			✓		✓									
Manivela			✓		✓									
Bomba			✓		✓									
Carcasa			✓		✓									
Guardas			✓		✓									
Acople			✓		✓									
Manguera de admision			✓		✓									
Manguera de escape			✓		✓									
Niveles de agua (Radiador)			✓		✓								✓	
Vo.Bo. Operador:			[signature]		[signature]									
Vo.Bo. Supervisor:			[signature]		[signature]									

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTO BOMBA	Versión No: 03
	SIG-HSEQ-F-41	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA **LUGAR-AREA:** Operativa.

SERIE N°: MOD 186 FA **MARCA:** SUKIYAMA

PERIODO DEL 10 **AL** 15 **DE** Nov **DE** 2023

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor					✓	✓								
Filtro de aceite					✓	✓								
Motor de arranque					✓	✓								
Salida de agua					✓	✓								
Entrada de agua					✓	✓								
Tapón de purga					✓	✓								
Tapón de tanque de combustible					✓	✓								
Escape					✓	✓								
Filtro de aire					✓	✓								
Bujía					✓	✓								
Tapón de abastaecimiento de aceite					✓	✓								
Tapón para drenaje de agua					✓	✓								
Manivela					✓	✓								
Bomba					✓	✓								
Carcasa					✓	✓								
Guardas					✓	✓								
Acople					✓	✓								
Manguera de admision					✓	✓								
Manguera de escape					✓	✓								
Niveles de agua (Radiador)					✓	✓								
Vo.Bo. Operador:														
Vo.Bo. Supervisor:					Kevin									

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No **Fecha de Corrección:** _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA PORTATIL	Versión No: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	CNSORCIO LA FLORA 2023	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada la Iglesia. LUGAR-AREA: Operativa.

SERIE Nº: 428 W1700 43. MARCA: SURA

PERIODO DEL 10 AL 15 DE Nov DE 2025.

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2			✓		✓		✓							
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2			✓		✓		✓							
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas			✓		✓		✓							
	* Balinera y bujes de rotación	Completas			✓		✓		✓							
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas			✓		✓		✓							
	* Palanca de giro para vaciado	Completas			✓		✓		✓							
	* Seguro en buen estado	1			✓		✓		✓							
	Corona de rotación del trompo	Completas			✓		✓		✓							
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1			✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo			✓		✓		✓							
	*Motor en buena condicion	Completos			✓		✓		✓							
	Tubo de escape en buena condicion	1			✓		✓		✓							
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos			✓		✓		✓							
	* Resguardos correas motor.	Completos			✓		✓		✓							
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	Completos			✓		✓		✓							
	Tapa del motor con seguro	Completos			✓		✓		✓							
	Clutch de giro del trompo	Completos			✓		✓		✓							
	Corona de arranque del motor	Completos			✓		✓		✓							
	Control de fugas de combustible	Completos			✓		✓		✓							
	Control de fugas hidraulicas	Completos			✓		✓		✓							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				Orlando		Orlando		Orlando							
	FIRMA				[signature]		[signature]		[signature]							
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE															
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA PORTATIL	Versión No: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	CNSORCIO LA FLORA 2023	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada la flora

LUGAR-AREA: operativa

SERIE N°: 428 W 1700 43.

MARCA: SKRA

PERIODO DEL 24 AL 29 DE NOV. DE 2025

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2	✓		✓						✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2	✓		✓						✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas	✓		✓						✓					
	* Balinera y bujes de rotación	Completas	✓		✓						✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas	✓		✓						✓					
	* Palanca de giro para vaciado	Completas	✓		✓						✓					
	* Seguro en buen estado	1	✓		✓						✓					
	Corona de rotación del trompo	Completas	✓		✓						✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1	✓		✓						✓					
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo	✓		✓						✓					
	*Motor en buena condicion	Completos	✓		✓						✓					
	Tubo de escape en buena condicion	1	✓		✓						✓					
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos	✓		✓						✓					
	* Resguardos correas motor.	Completos	✓		✓						✓					
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	Completos	✓		✓						✓					
	Tapa del motor con seguro	Completos	✓		✓						✓					
	Clutch de giro del trompo	Completos	✓		✓						✓					
	Corona de arranque del motor	Completos	✓		✓						✓					
	Control de fugas de combustible	Completos	✓		✓						✓					
	Control de fugas hidraulicas	Completos	✓		✓						✓					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE															
	FIRMA		Oviedo		Oviedo						Oviedo					
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE															
	FIRMA		Rosero		Rosero						Rosero					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada la Iglesia LUGAR-AREA: San Martin

SERIE N°: TB6500CR. MARCA: TOYAM.

PERIODO DEL 04 AL 08 DE Nov DE 2025

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor			✓		✓									
	Soportes de motor			✓		✓									
	Motor de arranque			✓		✓									
	Alternador			✓		✓									
	Sistema electrico			✓		✓									
	Generador			✓		✓									
	Soporte de generador			✓		✓									
	* Niveles de aceite			✓		✓									
	Conexiones electricas			✓		✓									
	* Puestas a tierra			✓		✓									
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.			✓		✓									
	Baterias			✓		✓									
	Exhosto			✓		✓									
	* Guardas			✓		✓									
	Tanque Combustible			✓		✓									
	* Mangueras Combustible			✓		✓									
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA			✓		✓									
	* Insonorización			✓		✓									
	Control Antivibraciones (Patines)			✓		✓									
	* Caja de Totalizadores			✓		✓									

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE								
	FIRMA		[signature]	[signature]					
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE								
	FIRMA		[signature]	[signature]					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Cebrada la Mesa LUGAR-AREA: Santa Marta

SERIE N°: TB6500CR. MARCA: YOYAMA

PERIODO DEL 24 AL 29 DE NOV DE 2023

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor	✓		✓											
	Soportes de motor	✓		✓											
	Motor de arranque	✓		✓											
	Alternador	✓		✓											
	Sistema electrico	✓		✓											
	Generador	✓		✓											
	Soporte de generador	✓		✓											
	* Niveles de aceite	✓		✓											
	Conexiones electricas	✓		✓											
	* Puestas a tierra	✓		✓											
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	✓		✓											
	Baterias	✓		✓											
	Exhosto	✓		✓											
	* Guardas	✓		✓											
	Tanque Combustible	✓		✓											
	* Mangueras Combustible	✓		✓											
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓		✓											
	* Insonorización	✓		✓											
	Control Antivibraciones (Patines)	✓		✓											
	* Caja de Totalizadores	✓		✓											

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE								
	FIRMA								
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE								
	FIRMA								

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 255BA0122 MARCA: DEWALT. LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 04 AL 08 DE Nov DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor			✓		✓									
	Boton de uso continuo			✓		✓									
	Broquero o porta brocas			✓		✓									
	Cable de alimentacion			✓		✓									
	Palanca selectora de giro			✓		✓									
	Perilla reguladora de velocidad			✓		✓									
	Sistema electrico			✓		✓									
	Llave para broquero			✓		✓									
	Carcasa			✓		✓									
	Mango principal y lateral			✓		✓									
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA			Kore6		Kore6									

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: _____

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 255BA0122. MARCA: DEWALT. LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 10 AL 15 DE Nov DE 2023.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor							✓				✓			
	Boton de uso continuo							✓				✓			
	Broquero o porta brocas							✓				✓			
	Cable de alimentacion							✓				✓			
	Palanca selectora de giro							✓				✓			
	Perilla reguladora de velocidad							✓				✓			
	Sistema electrico							✓				✓			
	Llave para broquero							✓				✓			
	Carcasa							✓				✓			
	Mango principal y lateral							✓				✓			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA							[signature]				[signature]			
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA							Kaled				Kaled			

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: _____

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 255BA0122. MARCA: DEWALT. LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 18 AL 22 DE Mayo DE 2023.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor			✓	✓			✓	✓						
	Boton de uso continuo			✓	✓			✓	✓						
	Broquero o porta brocas			✓	✓			✓	✓						
	Cable de alimentacion			✓	✓			✓	✓						
	Palanca selectora de giro			✓	✓			✓	✓						
	Perilla reguladora de velocidad			✓	✓			✓	✓						
	Sistema electrico			✓	✓			✓	✓						
	Llave para broquero			✓	✓			✓	✓						
	Carcasa			✓	✓			✓	✓						
	Mango principal y lateral			✓	✓			✓	✓						
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ____ no Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: _____

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 800W MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operativo

PERIODO DEL 04 AL 08 DE noviembre DE 2025

ITEM	CONCEPTO		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor		X		X		X		X							
	Boton de uso continuo		X		X		X		X							
	Broquero o porta brocas		X		X		X		X							
	Cable de alimentacion		X		X		X		X							
	Palanca selectora de giro		X		X		X		X							
	Perilla reguladora de velocidad		X		X		X		X							
	Sistema electrico		X		X		X		X							
	Llave para broquero		X		X		X		X							
	Carcasa		X		X		X		X							
	Mango principal y lateral		X		X		X		X							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		Deiner P		Deiner P		Deiner P		Deiner P							
	FIRMA		Deiner P		Deiner P		Deiner P		Deiner P							
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		David Delgado		David D		David D		David Delgado							
	FIRMA															

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ____ no X Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: martin peñaranda Botello

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 8000 MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 20 AL 24 DE noviembre DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor			X		X				X					
	Boton de uso continuo			X		X				X					
	Broquero o porta brocas			X		X				X					
	Cable de alimentacion			X		X				X					
	Palanca selectora de giro			X		X				X					
	Perilla reguladora de velocidad			X		X				X					
	Sistema electrico			X		X				X					
	Llave para broquero			X		X				X					
	Carcasa			X		X				X					
	Mango principal y lateral			X		X				X					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE			Jaime P		Jaime P				Jaime P					
	FIRMA			Jaime P		Jaime P				Jaime P					
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE			David Peñaloza		David Peñaloza				David Peñaloza					
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X Fecha de corrección: ___

Nombre del Representante del Contratista: Martin Peñaranda Botello.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 8000 W MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operativos

PERIODO DEL 18 AL 22 DE noviembre DE 2023.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor			X		X		X							
	Boton de uso continuo			X		X		X							
	Broquero o porta brocas			X		X		X							
	Cable de alimentacion			X		X		X							
	Palanca selectora de giro			X		X		X							
	Perilla reguladora de velocidad			X		X		X							
	Sistema electrico			X		X		X							
	Llave para broquero			X		X		X							
	Carcasa			X		X		X							
	Mango principal y lateral			X		X		X							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE			Deiner Padilla		Deiner Padilla		Deiner Padilla							
	FIRMA			Deiner P		Deiner P		Deiner P							
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE			David Delgado		David Delgado		David Delgado							
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ____ no X Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: martin penaranda Bulla.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 800W MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 24 AL 28 DE noviembre DE 2025

ITEM	CONCEPTO		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor		X		X		X				X					
	Boton de uso continuo		X		X		X				X					
	Broquero o porta brocas		X		X		X				X					
	Cable de alimentacion		X		X		X				X					
	Palanca selectora de giro		X		X		X				X					
	Perilla reguladora de velocidad		X		X		X				X					
	Sistema electrico		X		X		X				X					
	Llave para broquero		X		X		X				X					
	Carcasa		X		X		X				X					
	Mango principal y lateral		X		X		X				X					
Vo.Bo. Operador:		NOMBRE	Deiner Padilla		Deiner Padilla		Deiner Padilla				Deiner Padilla					
		FIRMA	Deiner P.		Deiner P		Deiner P				Deiner P					
Vo.Bo. Supervisor:		NOMBRE	David Delgado		David D		David Delgado				David Delgado					
		FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X Fecha de corrección: ___

Nombre del Representante del Contratista: Martin Peñaranda Bitemo.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: 12936000 obra: Canalización semana 10 al 15 Nov 2025

Horas inicio de semana: 7:00 am hora fin de seman 5:00 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta				✓			✓														
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.				✓			✓														
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y				✓			✓														
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras				✓			✓														
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.				✓			✓														
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.				✓			✓														
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				✓			✓														
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).				✓			✓														

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis Ernesto Marfuca Pare	Karen Palomino
CARGO:	AYU	prof SST.
FIRMA:		Kare 6.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: 1293600 obra: Cualizacion semana 18 al 22 Mal 2025

Horas inicio de semana: 7:00 a.m. hora fin de seman 5:00 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta							✓	✓		✓	✓		✓	✓							
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.							✓	✓		✓	✓		✓	✓							
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos							✓	✓		✓	✓		✓	✓							
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras							✓	✓		✓	✓		✓	✓							
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.							✓	✓		✓	✓		✓	✓							
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.							✓	✓		✓	✓		✓	✓							
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓	✓		✓	✓		✓	✓							
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).							✓	✓		✓	✓		✓	✓							

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis Eduardo Machado Rond	Karen Palomino
CARGO:	AYU	Prof SST.
FIRMA:		Kare G.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: X obra: semana 04- al 08 noviembre 2025.

Horas inicio de semana: 7:00 Am hora fin de seman 4:30 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta				X			X			X			X			X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.				X			X			X			X			X					
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y				X			X			X			X			X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras				X			X			X			X			X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.				X			X			X			X			X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.				X			X			X			X			X					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				X			X			X			X			X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).				X			X			X			X			X					

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Deiner Padilla Campo	
CARGO:	Oficial	
FIRMA:	Deiner Padilla Campo	

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: X obra: semana 20 – al 24 Noviembre 2025

Horas inicio de semana: 7:00 pm hora fin de seman 4:30 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X			X								
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X			X								
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos	X			X			X			X			X								
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X			X								
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X			X								
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X			X			X			X			X								
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X			X								
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X			X								

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Deiner padilla campo	
CARGO:	oficial de construccion	
FIRMA:	Deiner Padilla C	

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: x obra: semana 18 al 22 noviembre

Horas inicio de semana: 7:00 am hora fin de seman 4:30 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta				x			x			x			x			x					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.				x			x			x			x			x					
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y				x			x			x			x			x					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras				x			x			x			x			x					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.				x			x			x			x			x					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.				x			x			x			x			x					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				x			x			x			x			x					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).				x			x			x			x			x					

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Deiner Padilla campo	
CARGO:	oficial de construccion	
FIRMA:	Deiner Padilla C	

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: X obra: semana 24 al 28 noviembre 2025

Horas inicio de semana: 7:00 am hora fin de seman 4:30 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X			X								
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X			X								
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos	X			X			X			X			X								
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X			X								
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X			X								
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X			X			X			X			X								
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X			X								
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X			X								

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Deiner Padilla campo	
CARGO:	oficial de construccion	
FIRMA:	Deiner Padilla campo	Deiner

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada la Flora. LUGAR-AREA: Operativa

SERIE Nº: 4218W170043. MARCA: SUKPA.

PERIODO DEL 04 AL 08 DE Nov DE 2023

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO				✓		✓						✓			
	Estado del Disco				/		/						/			
	Tuerca de acople del disco				/		/						/			
	Guarda del disco				/		/						/			
	Ajuste del disco				/		/						/			
	Switch de encendido				/		/						/			
	Enchufe				/		/						/			
	Cable de Energía				/		/						/			
	Escobillas				/		/						/			
	Manija de sujecion				/		/						/			
OTROS	Extintor 20 Lbs				/		/						/			
	Señalización del área				/		/						/			
	Soporte				/		/						/			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				[illegible]		[illegible]						[illegible]			
	FIRMA				[illegible]		[illegible]						[illegible]			
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE				[illegible]		[illegible]						[illegible]			
	FIRMA				[illegible]		[illegible]						[illegible]			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada la Flora.

SERIE N°: 4218 W170043

LUGAR-AREA: Operativa

MARCA: SUKPA

PERIODO DEL 10 AL 15 DE Nov DE 2023

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO		✓		✓											
	Estado del Disco		✓		✓											
	Tuerca de acople del disco		✓		✓											
	Guarda del disco		✓		✓											
	Ajuste del disco		✓		✓											
	Switch de encendido		✓		✓											
	Enchufe		✓		✓											
	Cable de Energia		✓		✓											
	Escobillas		✓		✓											
	Manija de sujecion		✓		✓											
OTROS	Extintor 20 Lbs		✓		✓											
	Señalización del área		✓		✓											
	Soporte		✓		✓											
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		[illegible]		[illegible]											
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		[illegible]		[illegible]											
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada La Flora

SERIE Nº: 4218W170049

LUGAR-AREA: Operativa

MARCA: SUKIRA

PERIODO DEL 18 AL 22 DE Abril DE 2025.

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO				✓		✓									
	Estado del Disco				✓		✓									
	Tuerca de acople del disco				✓		✓									
	Guarda del disco				✓		✓									
	Ajuste del disco				✓		✓									
	Switch de encendido				✓		✓									
	Enchufe				✓		✓									
	Cable de Energia				✓		✓									
	Escobillas				✓		✓									
	Manija de sujecion				✓		✓									
OTROS	Extintor 20 Lbs				✓		✓									
	Señalización del área				✓		✓									
	Soporte				✓		✓									
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE															
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE															
	FIRMA				Xavier		Xavier									

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ SI ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: _____ LUGAR-AREA: _____

SERIE N°: 3601m7756 MARCA: _____

PERIODO DEL 04 AL 08 DE noviembre DE 2025

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1	X		X		X		X		X					
	Estado del Disco		X		X		X		X		X					
	Tuerca de acople del disco		X		X		X		X		X					
	Guarda del disco		X		X		X		X		X					
	Ajuste del disco		X		X		X		X		X					
	Switch de encendido		X		X		X		X		X					
	Enchufe		X		X		X		X		X					
	Cable de Energia		X		X		X		X		X					
	Escobillas		X		X		X		X		X					
	Manija de sujecion		X		X		X		X		X					
OTROS	Extintor 20 Lbs		X		X		X		X		X					
	Señalización del área		X		X		X		X		X					
	Soporte		X		X		X		X		X					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		Orlando T		Orlando T		Orlando T		Orlando T		Orlando T					
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		David D		David D		David D		David D		David D					
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No X Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: canalizacion Zuchrada Ln Tulosin LUGAR-AREA: Operativa

SERIE Nº: 36 01M 7760 MARCA: BOSCH

PERIODO DEL 20 AL 24 DE noviembre DE 2025

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	7			X		X		X							
	Estado del Disco				X		X		X							
	Tuerca de acople del disco				X		X		X							
	Guarda del disco				X		X		X							
	Ajuste del disco				X		X		X							
	Switch de encendido				X		X		X							
	Enchufe				X		X		X							
	Cable de Energia				X		X		X							
	Escobillas				X		X		X							
	Manija de sujecion				X		X		X							
OTROS	Extintor 20 Lbs				X		X		X							
	Señalización del área				X		X		X							
	Soporte				X		X		X							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				orlando T		orlando T		orlando T							
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE				David Delgado		David Delgado		David Delgado							
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No X Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: canalizacion grabada la iglesia LUGAR-AREA: Operativa

SERIE Nº: 3601m7760 MARCA: Bosch

PERIODO DEL 18 AL 22 DE noviembre DE 2025.

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1			✓		✓		✓				✓			
	Estado del Disco				✓		✓		✓				✓			
	Tuerca de acople del disco				✓		✓		✓				✓			
	Guarda del disco				✓		✓		✓				✓			
	Ajuste del disco				✓		✓		✓				✓			
	Switch de encendido				✓		✓		✓				✓			
	Enchufe				✓		✓		✓				✓			
	Cable de Energia				✓		✓		✓				✓			
	Escobillas				✓		✓		✓				✓			
	Manija de sujecion				✓		✓		✓				✓			
OTROS	Extintor 20 Lbs				✓		✓		✓				✓			
	Señalización del área				✓		✓		✓				✓			
	Soporte				✓		✓		✓				✓			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				orlando T		orlando T		orlando T				orlando T			
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE				David D		David D		David D				David D			
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No X Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalizacion Fachada la iglesia LUGAR-AREA: Operativa.

SERIE N°: 36 01 m 7760 MARCA: BOSCH

PERIODO DEL 24 AL 28 DE noviembre DE 2025.

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	7	X		X		X		X		X					
	Estado del Disco		X		X		X		X		X					
	Tuerca de acople del disco		X		X		X		X		X					
	Guarda del disco		X		X		X		X		X					
	Ajuste del disco		X		X		X		X		X					
	Switch de encendido		X		X		X		X		X					
	Enchufe		X		X		X		X		X					
	Cable de Energia		X		X		X		X		X					
	Escobillas		X		X		X		X		X					
	Manija de sujecion		X		X		X		X		X					
OTROS	Extintor 20 Lbs		X		X		X		X		X					
	Señalización del área		X		X		X		X		X					
	Soporte		X		X		X		X		X					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		Orlando T		Orlando T.		Orlando T		Orlando T		Orlando T					
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		David D		David Delgado		David D		David D		David D					
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No X Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.







4

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA 2023 PERIODO DEL 3 AL 8 DE NOV DEL 2025

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Oscar Mauricio Ramírez

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:






2

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA 2023 PERIODO DEL 10 AL 17 DE DIC DEL 2023

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: ALEX DUQUE

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vías afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada	✓		X			X			X			X			X			X
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			X			X			X			X			✓			X
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:




3

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA 2023 | PERIODO DEL 17 AL 22 DE DIC DEL 2023

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: OLGA VILLEGAS

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la vía - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vías afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:






9

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA 2023 | PERIODO DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2025

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Olga Ruiz

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✗			✗			✗			✗			✗			✗
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✗			✗			✗			✗			✗			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		






OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 24 AL 08 DE Nov DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Julian Pabón

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Julian Pabón

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		







OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 10 AL 15 DE NOV DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Julian Pabón

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Julian Pabón

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		







OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 18 AL 22 DE Nov DEL 202

INSPECCIONADO POR: Jose Julian Pabón

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Julian Pabón

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		



OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 24 AL 29 DE Nov DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Julian Pabón

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Julian Pabón

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		





OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 4 AL 8 DE 11 DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Torres

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Torres

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		







OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 12 AL 15 DE 11 DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Torres

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Torres

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		




OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 18 AL 22 DE 11 DEL 25

INSPECCIONADO POR: José Torres.

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: José Torres.

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		









OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA. PERIODO DEL 24 AL 29 DE 11 DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Torres

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Torres

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-2526720

Fecha de emisión: 2025-11-27

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INVERSIONES REY ORTIZ E HIJOS Y CIA S. EN C. // INDUSTRIAS LA ESMERALDA
Nit	900713058-1
Direccion	Km 6 VIA Giron Carrera 12
Ciudad	BUCARAMANGA
Responsable	Deisy Parra
Cargo	Jefe de producción
Tel/Fax	+573168312560
E-mail	calidad@hielolaesmeralda.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Andres Olarte
Fecha y Hora	2025-11-20 - 09:54:53
Cadena Custodia	23320
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Agua potable tratada envasada		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-11-20	**No. de Muestra**	2526720
Fecha de análisis	2025-11-20	**Matriz**	AGUA ENVASADA
Lote (+)	324	**Temperatura**	25,0 °C
Fecha Elaboración (+)	N/A	**Fecha Vencimiento (+)**	19/MAY/26
Cantidad	1100 mL	**Proveedor (+)**	N/A
Empaque	Propio	**Área**	Proceso
Observaciones	-		

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Método	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Coliformes*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
E. coli*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
Pseudomonas aeruginosa*	SM 9213 E	UFC/100mL	0	< 1

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

Observaciones:

Valores de referencia según: RESOLUCIÓN 1407/2022 - 4.3

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-2526720

Fecha de emisión: 2025-11-27

PROCESA: **AUTORIZA:**

Gabriela Sánchez F. S. Bohórquez

GABRIELA SANCHEZ / ANALISTA MICROBIOLOGÍA **SANDRA BOHÓRQUEZ / COORDINACIÓN TÉCNICA**

*** FIN DEL INFORME ***

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS F-2526721

Fecha de emisión: 2025-11-27

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INVERSIONES REY ORTIZ E HIJOS Y CIA S. EN C. // INDUSTRIAS LA ESMERALDA
Nit	900713058-1
Direccion	Km 6 VIA Giron Carrera 12
Ciudad	BUCARAMANGA
Responsable	Deisy Parra
Cargo	Jefe de producción
Tel/Fax	+573168312560
E-mail	calidad@hielolaesmeralda.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Andres Olarte
Fecha y Hora	2025-11-20 - 09:54:53
Cadena Custodia	23320
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Agua potable tratada envasada		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-11-20	**No. de Muestra**	2526721
Fecha de análisis	2025-11-21	**Matriz**	AGUA ENVASADA
Lote (+)	324	**Temperatura**	25,0 °C
Fecha Elaboración (+)	N/A	**Fecha Vencimiento (+)**	19/MAY/26
Cantidad	1100 mL	**Proveedor (+)**	N/A
Empaque	Propio	**Área**	Proceso
Observaciones	-		

RESULTADOS FISICOQUÍMICOS

Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
Alcalinidad total*	mg CaCO3/L	SM 2320-B	87	N/A
Cloruros*	mg Cl-/L	ASTM D512-12	18	250
Color Aparente*	UPC	SM 2120 C	0	15
Dureza total*	mg CaCO3 /L	SM 2340 C	41	150
Hierro Total*	mg Fe/L	SM3500 Fe-B	0,01	0.3
Magnesio*	mg Mg/L	SM 3500 Mg B	1,94	36
Nitritos*	mg NO2/L	EPA 354.1	0,0	0.1
pH*	Unidades de pH	AOAC 943.02	7,41	- 6.5
Sulfatos*	mg SO4 2-/L	USEPA 375.4	4	250
Turbidez*	NTU	SM 2130B	0,0	2

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS F-2526721

Fecha de emisión: 2025-11-27

4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

Observaciones:
Valores de referencia según: RESOLUCIÓN 12186/1991

PROCESA: **AUTORIZA:**

LISI MILDRED RUEDA DUARTE / ANALISTA FISICOQUÍMICA

EDGAR RAMIREZ ZULETA / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***

BU-DIC-1007-25

baños portatiles

baños portatiles	**CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL**	Código: BP-MB-040
		Ver.: 02 – Rev.: 00
		Fecha: MAR 2018

BAÑOS PORTÁTILES SAS

CERTIFICA QUE:

En el mes de **noviembre** de 2025 se presta el servicio de mantenimiento a tres (3) baños portátiles, localizados en CR 27 87-52 BR. San Martin Bucaramanga- Santander, para la empresa **CONSORCIO LA FLORA 2023** identificada con **NIT: 901.702.490-7** Se realizó la disposición final de **345 Lts. Aprox.** de aguas residuales en la planta de tratamiento **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS PURIFIC** identificada con NIT:900.380.440-1

La presente se expide a petición del interesado el día once (11) de diciembre de 2025.

Cordialmente,

baños portatiles S A S
Nit 900.332.063-7

Mónica Bendek

Subgerente

Tel: 57 1 4560162
e-mal: contacto@banosportatiles.com
www.banosportatiles.com

BU-DIC-1008-25

baños portatiles

baños portatiles	**CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL**	Código: BP-MB-040 Ver.: 02 – Rev.: 00 Fecha: MAR 2018

BAÑOS PORTÁTILES SAS

CERTIFICA QUE:

Desde el 06 del mes de **noviembre** de 2025 se presta el servicio de alquiler y mantenimiento a un (1) baño portátil, localizado en PARQUE LA FLORA. Bucaramanga- Santander, para la empresa **CONSORCIO LA FLORA 2023** identificada con **NIT: 901.702.490-7** Se realizó la disposición final de **90 Lts. Aprox.** de aguas residuales en la planta de tratamiento **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS PURIFIC** identificada con NIT:900.380.440-1

La presente se expide a petición del interesado el día once (11) de diciembre de 2025.

Cordialmente,

baños portatiles
s a s

Mónica Bendek

Subgerente

Tel: 57 1 4560162
e-mal: contacto@banosportatiles.com
www.banosportatiles.com

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 04 Nov 2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	Jorge Guerra
2	Alvaro Barajas Pobon	Oficial	7am	5pm	Alvaro Barajas P.
3	Jose Torres	Extrafico	7am	5pm	Jose Torres
4	Luis Torres	Ayudante	7am	5pm	
5	Hugo Perieta	AYU	7:00	5pm	Hugo Perieta
6	Carlos Cuello	oficial	7am	5pm	
7	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
8	DUVAN	extrafico	7am	5pm	DUVAN
9	Jose Tapia	Ayudante	7am	5pm	
10	Luis Miguel M.	AYU	7:00	5pm	
11	Jhon Andrey Aparicio Sanchez	Topógrafo	7:00 am	5pm	Jhon Aparicio
12	Alexander Vilorio	Ayudante	7am	5pm	
13	Pedro Rojas	oficial	7am	5pm	
14	Ivan Londoño Cabal	ayudante	7am	5pm	Ivan Londoño
15	Anthony Cuadrado	Portería	7am	5pm	
16	Ivan Arroyo	Oficial	7am	5pm	
17	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B.G
18	Javier Carvajal	Ayudante	7am	5pm	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 05 NOV 2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Wilgenilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	
2	Jose Tomas	Auxiliar	7am	5pm	
3	Julian	Auxiliar	7am	5pm	
4	Iván Alfaro	oficial	7am	5pm	
5	Atanasio Vilorio	Ayudante	7am	5pm	
6	Alvaro Barajas pobon	oficial	7am	5pm	Alvaro Barajas P.
7	Luis Torres	Ayudante	7am	5pm	
8	Hugo Arrieta	AyC	7:00	5pm	
9	Jawyer Carvajal	Ayudante	7am	5pm	
10	Cesar Cuadrado	oficial	7am	5pm	
11	Luis Batista Martinez	ayudante	7am	5pm	
12	Jairo Miguel Mi	AyC	7:00	5pm	
13	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Tab
14	Jonathan	Ayudante	7am	5pm	
15	Ivan Londoño	Ayudante	7am	5pm	
16	Pedro Rojas	oficial	7am	5pm	
17	Jesus Andres Becerra Bolivar	Ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 06 NOV 2025			LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Leonardo Vilaria	Ayudante	7am	5pm	
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	
3	Alvaro Barajas Pabon	Oficial	7am	5pm	
4	Hugo Sobrieta	A y U	7:00	5pm	
5	Jose Toms	aux trafico	7am	5pm	
6	Ivan Almeyda	Oficial	7am	5pm	
7	Luis Toms	ayudante.	7am	5pm	
8	Luis Miguel M	A y U	7:00	5pm	
9	J y Jan	aux trafico	7am	5pm	
10	Gerald Ortiz	oficial	7am	5pm	
11	Luis Edwin Mejia	Ayudante	7am	5pm	
12	Orlando Tabarda	Oficial	7am	5pm	
13	Javier Carvajal	Ayudante	7am	5pm	
14	Leonardo	Motorizado	7am	5pm	
15	Ivan Anjaraday	Ayudante	7am	5pm	
16	Jesus Andres Acevedo	Ayudante	7am	5pm	
17	pedro rojas	oficial	7am	5pm	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 07 Nov 2025			LUGAR San Martin	
ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
2	Jorge Emilio GUERRA	ayudante.	7am	5pm	Jorge GUERRA
3	Alvaro Borojos pabon	oficial	7am	5pm	Alvaro Borojos P.
4	Javier Carvajal	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
5	Luis Torres	ayudante	7am	5pm	[illegible]
6	HYSOARRIETA	AYU	7:00	5pm.	[illegible]
7	JOSE TORRES	Aux trapico	7am	5pm	JOSE TORRES
8	Ivan Almeyda	oficial	7am	5pm	[illegible]
9	Duvan	aux trapico	7am	5pm	Julian
10	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Tabor
11	[illegible]	ayudante	7am	5pm	[illegible]
12	Luis Miguel M.	AYU	7:00	5pm	[illegible]
13	Luis Ernesto	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
14	[illegible]	AYUDANTE	7am	5pm	[illegible]
15	Ivan landazabal	ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
16	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B.G
17	pedro Reyes	oficial	7am.	5pm	pedro Reyes
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 08 Nov 2023.			LUGAR: San Martin	
ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	JOSE EMILIO GUERRA	Ayudante	7am	5pm	JOSE GUERRA
2	[illegible]	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
3	Alvaro Barajos pobon	oficial	7am	5pm	Alvaro Barajos P.
4	[illegible]	Auxtrafico	7am	5pm	[illegible]
5	[illegible]	auxtrafico	7am	5pm	[illegible]
6	Ivan Alcoba	oficial	7am	5pm	[illegible]
7	[illegible]	ayudante.	7am	5pm	[illegible]
8	[illegible]	ayudante.	7am	5pm	[illegible]
9	[illegible]	C Ay	7:00	5pm	[illegible]
10	HUGO ALLIETA	AyC	7 00	5pm	[illegible]
11	[illegible]	ayudante	7am	5pm	[illegible]
12	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
13	[illegible]	oficial	7am.	5pm	[illegible]
14	Ivan bandazeba	ayudante	7am	5pm.	Ivan bandazeba
15	[illegible]	oficial	7am	5pm.	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	7am	5pm	[illegible]
17	Jesus Andres Brocero Correa	ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B C
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 10 Nov 2025		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
2	JORGE EMILIO GUEVARA	Ayudante	7am	5pm	JORGE GUEVARA
3	Alvaro Borojos pobon	oficial	7am	5pm	Alvaro Borojos P.
4	Iyan Alexander	oficial	7am	5pm	[illegible]
5	Jose Tomas	auxiliar	7am	5pm	Jose Tomas
6	HUGO BARRIETA	A y U	7:00	5pm	Hugo
7	Luis Torres	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
8	Javier Carvajal	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
9	Carlos [illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
10	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
11	[illegible]	auxiliar	7am	5pm	[illegible]
12	Luis Alberto Martinez	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
13	Luis Miguel M	A y U	7:00	5pm	[illegible]
14	Jhon Edgar Pinzon	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
15	pedro Rojas	oficial	7am	5pm	pedro rojas
16	Ivan Landazabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
17	Jesus Andres Becerra Baez	ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B.B
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 11 Nov 2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Leonardo Silva	Ayudante	7am	5pm	
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	
3	Alvaro Borrojos pobon	oficial	7am	5pm	Alvaro Borrojos P.
4	Javier Carvajal	Ayudante	7am	5pm	
5	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
6	Jose Tony	auxtrafico	7am	5pm	
7	Carlos Cantero	Oficial	7am	5pm	
8	Jhon	auxtrafico	7am	5pm	
9	Hp Ramirez	AyU	7cc	5pm	
10	Juan Miguel M.	AyU	7:00	5pm	
11	Luis Torres	AyU	7:00	5pm	
12	Monroy	oficial	7am	5pm	
13	Luis Ramos	ayudante	7am	5pm	
14	Ivan Londoño	Ayudante	7am	5pm	
15	Jesus Andres Barreiro Gonzalez	Ayudante	7am	5pm	
16	Ivan Almeyda	oficial	7am	5pm	
17	Daniel	Practica	7am	5pm	
18	pedro	oficial	7am	5pm	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 17 NOV 2023			LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
2	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
3	Javier Carvajal	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
4	Alvaro Borojos pobon	Ayudante	7am	5pm	Alvaro Borojos P.
5	Luis Torres	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
6	Jose TORRES	Auxiliar	7am	5pm	[illegible]
7	Orlando Taborda	Oficial	7am	5pm	[illegible]
8	[illegible]	AYU	700	5pm	[illegible]
9	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
10	[illegible]	Auxiliar	7am	5pm	[illegible]
11	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
12	Luis Miguel M.	AYU	7:00	5pm	[illegible]
13	Ivan Landazabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
14	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B. G
15	Juan Almeyda	Oficial	7am	5pm.	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	7am	5pm	[illegible]
17	pedro [illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7			Codigo: FT-SST-012 Version: 1.0 Fecha 05/05/2023
	FECHA 23-11-2023		LUGAR [redacted]	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	JORGE EMILIO GUERRA	Ayudante	7am	5pm	JORGE GUERRA
2	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
3	Alvaro Borajos pobon	oficial	7am	5pm	Alvaro Borajos P.
4	Jose Tony	ax bajas	7am	5pm	Jose Tony
5	Luis Torres	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
6	Hugo Arrieta	A y C	7:00	5pm	[illegible]
7	Juan Miguel Montoya	Ayu	7:00	5pm	[illegible]
8	Carlos Cuesta	act. fijas	7am	5pm	[illegible]
9	Julian	ax bajas	7am	5pm	Julian
10	Luis Estrada	ayudante	7am	5pm	[illegible]
11	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
12	[illegible]	[illegible]	7am	5pm	[illegible]
13	Jesus Andres Becerra Garcia	ayudante	7:00	5pm	Jesus Andres B. G
14	Ivan Pineda	oficial	7am	5pm	[illegible]
15	Juan Londazabal	Ayudante	7am	5pm	Juan Londazabal
16	Pedro Rios	Oficial	7am	5pm	[illegible]
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 14 Nov 2025			LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7:00 AM	5:00 Pm	Jorge Guerra
2	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
3	Jayer Carvajal	Oficial	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
4	Jose Tony	aux trapeo	7:00 AM	5:00 Pm	Jose Tony
5	Ivan londoño	Ayudante.	7:00 AM	5:00 Pm	Ivan londoño
6	Alvaro Borrajos pabon	oficial	7:00 AM	5:00 Pm	Alvaro Borrajos P
7	Luis Torres	Ayudante	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
8	[illegible]	oficial	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
9	Hugo Nieto	ayudante.	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
10	Ivan Pineda	Ayudante.	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
11	Juan Miguel Mo	AYU	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
12	Luis Estrada	ayudante	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
13	[illegible]	Oficial	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
14	Julian	aux trapeo	7:00 AM	5:00 Pm	Julian
15	Luis Daniel Escamilla R.	AUX SST.	7:00 AM	5:00 Pm	[illegible]
16	Jesus Andres Becerra Cotrado	Ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B G
17	[illegible] K	PINTURA	7am	5pm	[illegible]
18	Orlando Taborda	Oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 15 - 11 - 2023			LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Onelcimido Guerra	ayudante	7am	8:30am	Onelcimido Guerra
2	[illegible]	Ayudante	7am	8:30am	[illegible]
3	Alvaro Borojos pobon	Oficial	7am	8:30am	Alvaro Borojos P.
4	Jose Torres	auxiliar	7am	8:30am	Jose Torres
5	Jesus Carvajal	Ayudante	7am	8:30am	[illegible]
6	Hugo Arrieta	A y u	7:00	8:30am	[illegible]
7	Luis Torres	Ayudante	7am	8:30am	[illegible]
8	[illegible]	auxiliar	7am	8:30am	[illegible]
9	[illegible]	oficial	7am	8:30am	[illegible]
10	Juan Miguel Molina	Ayu	7:00	8:30am	[illegible]
11	Orlando Tabares	oficial.	7am	8:30am	[illegible]
12	Luis Eduardo	Ayudante	7am	8:30am	[illegible]
13	Luis Daniel Escamilla R.	Aux SST.	7:00	8:30am	[illegible]
14	Jesus Andres Barrero Baez	Ayudante	7am	8:30am	Jesus Andres B. G.
15	Ivan [illegible]	ayudante	7am	8:30am	[illegible]
16	Ivan Almeyda	oficial	7am	8:30 am	[illegible]
17	[illegible]	Auxiliar	7am	8:30am	[illegible]
18	[illegible]	oficial	7am	8:30am	[illegible]
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	[redacted]501702490-7				Fecha 08/05/2023
	FECHA [redacted]			LUGAR [redacted]	
ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Alexander Yilotic	Ayudante	7am	5pm	
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	
3	Javier Carvajal	Ayudante	7am	5pm	
4	J C Lion	Aux Trafico	7am	5pm	
5	Alvaro Borrajos pobon	Oficial	7am	5pm	
6	Iven Alarcon	Oficial	7am	5pm	
7	Gil J Torres	Ayudante	7am	5pm	
8	Oficial	Oficial	7am	5pm	
9	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	
10	Luis Ernesto Medina	ayudante	7am	5pm	
11	Jhon Florez	ayudante	7am	5pm	
12	Hugo Arrieta	ayudante	7am	5pm	
13	Luis Daniel Escamilla	ayx SST	7am	5pm	
14	Luis Miguel M.	AYC	7:00	5pm	
15	[illegible]	PASTECAS	7am	5pm	
16	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7:00	5 PM	
17	Ivan Landazabal	Ayudante	7am	5pm	
18	Pedro Rojo	Oficial	7am	5pm	
19	José Torres	Aux trafico	7am	5pm	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7			Codigo: FT-SST-012 Version: 1.0 Fecha 05/05/2023
	FECHA 19-11-2025		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	JULIAN	Ayudante	7:00 Pm	5:00 PM	JULIAN
2	[illegible]	Ayudante	7:00 Pm	5:00 Pm	[illegible]
3	JORGE EMILIO GUERRA	Ayudante	7:00 PM	5:00 PM	JORGE GUERRA
4	JOSE DORY	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	JOSE DORY
5	Alvaro Borrajos pobon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Alvaro Borrajos P
6	Javier Carvajal	Ayudante	7:00 AM	5:06 PM	[illegible]
7	Luis Torres	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
8	Orlando Tabares	Oficial	7:06 AM	5:00 PM	Orlando Tabares
9	Luis Alberto Mafla	Ayudante	7:00 PM	5:06 PM	[illegible]
10	HUGO GONZALEZ	AYV	7:00 PM	5:00 PM	[illegible]
11	Juan Miguel Mo.	AUX V	7:00 PM	5:06 PM	[illegible]
12	Cesar Ospina	Oficial.	7:00 PM	5:06 PM	[illegible]
13	Luis Daniel Escamilla R.	Aux SST	7:00 PM	5:00 PM	[illegible]
14	Ivan Alegria	Oficial	7am	5pm	[illegible]
15	Jesus Andres Becerra Cortes	AUX	7am	5pm	Jesus Andres B.
16	Ivan Londoño Zabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan Londoño Zabal
17	[illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
18	[illegible]	PORTERIA	7am	5pm	[illegible]
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 20-11-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Otoniel Xilotic	Ayudante	7am	5pm	
2	Alvaro Borojos pobón	Oficial	7am	5pm	Alvaro Borojos P.
3	Jorge emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	Jorge Guerra
4	José Tomas	Auxiliar	7am	5pm	José Tomas
5	J U L i an	Ayudante	7am	5pm	J U L i an
6	Luis Torres	Ayudante	7am	5pm	
7	Jairo Coronel	Ayudante	7am	5pm	
8	Hugo Nieto	AYU	7:00	5pm	
9	Jorge Miguel M.	Ayu	7:00	5pm	
10	[illegible]	Oficial	7am	5pm	
11	Orlando Tabares	Oficial	7am	5pm	Orlando Tabares
12	Man Fredy	Ayudante	7am	5pm	
13	Luis Daniel Escamilla R	Aux SST.	7:00 AM	5:00 PM	
14	Ivan Landazabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan Landazabal
15	pedro Rojas	Oficial	7am	5pm	pedro Rojas
16	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7:00 AM	5:00pm	Jesus Andres B-G
17	Ivan Pimienta	Oficial	7am	5pm	
18	Alfonso Rocha	Portero	7am	5pm	Alfonso Rocha
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 11-11-2023		LUGAR SAN MARTIN	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	Jorge Guerra
2	Atanael Xilopia	Ayudante	7am	5pm	Atanael
3	Alvaro Borrojos pobon	Oficial	7am	5pm	Alvaro Borrojos P
4	Jose Torres	aux bodega	7am	5pm	Jose Torres
5	Jhoner Carvajal	ayudante	7am	5pm	Jhoner
6	Luis Torres	ayudante	7am	5pm	Luis
7	Jhon	aux bodega	7am	5pm	Jhon
8	Hugo Arrieta	AYU	7:00	5pm	Hugo
9	Cristo Cuadro	oficial	7am	5pm	Cristo
10	Juan Miguel M.	AYU	7:00	5pm	Juan
11	Juan Daniel Escamilla.	AUX SST.	7:00	5pm	Juan
12	Jesus Andres Becerra Bacca	AYU	7:00	5 pm	Jesus Andres
13	Luis Eduardo Machuca	Ayudante	7am	5pm	Luis
14	Ivan Pineda	Oficial	7am	5pm	Ivan
15	Ivan landazabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
16	pedro pozo	Oficial	7am	5pm	pedro
17	Darlin Barrios	MAESTRA	7am	5pm	Darlin
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 22-11-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	JUAN	Auxiliar	7am	5pm	JUAN
2	MIGUEL EMILIO GUERRA	Ayudante	7am	5pm	MIGUEL GUERRA
3	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
4	Jose TORRES	Auxiliar	7am	5pm	Jose TORRES
5	Javier CARVAJAL	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
6	HUGO HENRIETA	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
7	Alvaro Barrojos pobon	Oficial	7am	5pm	Alvaro Barrojos P.
8	Luis Torres	ayudante	7am	5pm	[illegible]
9	[illegible]	Ayu	7:00	5pm	[illegible]
10	Luis Eliecer Martinez	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
11	Orlando Taborda	Oficial	7am	5pm	[illegible]
12	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
13	Ivan Landazabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan Landazabal
14	Jesus Andres Becerra Barrios	ayudante	7:am	5 PM	Jesus Andres B.
15	[illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
16	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
17	Ivan Arroyo	oficial	7am	5pm	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 24 NOV 2023			LUGAR San Martin	
ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
2	Jorge Emilio Guevara	Ayudante.	7am	5pm	Jorge Guevara
3	Alvaro Borrajos pobon	Oficial	7am	5pm	Alvaro Borrajos P.
4	José Torres	Aux Impres	7am	5pm	José Torres
5	Hugo Arrieta	A y O	7:00	5pm	H Arrieta
6	Luis Torres	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
7	Javier Carvajal	ayudante.	7am	5pm	[illegible]
8	Juan Miguel M.	Ay O	7:00	5pm	[illegible]
9	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
10	Carlos Cayarco	oficial	7am	5pm	[illegible]
11	Luis Eduardo machuca	ayudante	7am	5pm	[illegible]
12	Ivan landazabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
13	Jesus Andres Becerra Garcia	ayudante	7:am	5PM	Jesus Andres B C
14	pedro rojas	Oficial	7am	5pm	pedro rojas
15	[illegible]	AYUDANTE	7am	5pm	[illegible]
16	Juan Almeyda	Oficial	7am	5pm	[illegible]
17	Luis David Escamilla	Aux SST.	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 25-11-2025		LUGAR SOA MATHA	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorle Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	Jorle Guerra
2	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
3	Alvaro Borrajos pabon	oficial	7am	5pm	Alvaro Borrajos P.
4	Julian	extrafio	7am	5pm	Julian
5	Jose Tomas	extranjero	7am	5pm	Jose Tomas
6	Hugo Arrieta	A y C	7am	5pm	[illegible]
7	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
8	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
9	Luis Ekkta	ayudante	7am	5pm	[illegible]
10	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
11	Jaiver Carvajal	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
12	Juan Mieres	A y C	7am	5pm	[illegible]
13	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7am	5pm	
14	Ivan londoza bal	Ayudante	7am	5pm	Jesus Andres B.G
15	[illegible]	oficial	7am	5pm	Ivan londozabal
16	Juan Alfonso	oficial	7am	5pm	[illegible]
17	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 26-11-2025			LUGAR SOA MANTA	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jhon Edilio Guerrero	Ayudante.	7am	5pm	Jhon Edilio Guerrero
2	Jorge Edilio Guerrero	Ayudante.	7am	5pm	Jorge Guerrero
3	Jaguer Carvajal	Ayudante	7am	5pm	Jaguer Carvajal
4	Jose Tony	Aux bodeco	7am	5pm	Jose Tony
5	Alvaro Borrajos pobon	Oficial	7am	5pm	Alvaro Borrajos P.
6	Julian	Aux bodeco	7am	5pm	Julian
7	Luis Torres	Ayudante	7am	5pm	Luis Torres
8	Hugo Arrieta	Ayudante	7am	5pm	Hugo Arrieta
9	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
10	Jose Quiroga	Oficial.	7am	5pm	Jose Quiroga
11	Luis Ernesto	Ayudante	7am	5pm	Luis Ernesto
12	Juan Miguel	AYU	2:00	5pm	Juan Miguel
13	Juan Almeyda	Oficial	7am	5pm	Juan Almeyda
14	Oscar Eduardo Ortiz	HORMIGONERO	7am	5pm	Oscar Eduardo Ortiz
15	Pedro Rojas	Oficial	7am	5pm	Pedro Rojas
16	Juan Landazabal	ayudante	7am	5pm	Juan Landazabal
17	Jesus Andres Becerra Garcia	AYU	7:00	5pm	Jesus Andres Becerra
18	Luis Daniel Escamilla R.	Aux SST	7:00	5pm	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA				Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023				Version: 1.0
	NIT: 901702490-7				Fecha 05/05/2023
	FECHA 27-11-2023			LUGAR Soa Martha	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Emilio Guevara	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	Jose Guevara
2	Jesus Alexis Rica	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	Jesus Alexis Rica
3	Alvaro Barajas Pobon	Oficial	7:00 Am	5:00 Pm	Alvaro Barajas P.
4	Jose Tomas	Aux Trafico	7:00 Am	5:00 Pm	Jose Tomas
5	Luis Torres	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	Luis T
6	Julian	Aux Trafico	7:00 Am	5:00 Pm	Julian
7	Hugo Arrieta	Ayu	7:00 Am	5:00 Pm	Hugo Arrieta
8	Luis Ebrato	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	
9	Javier Carvajal	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	Javier Carvajal
10	Orlando Tabarda	Oficial	7:00 Am	5:00 Pm	Orlando Tabarda
11	Luis Miguel	Ayu	7:00 Am	5:00 Pm	Luis Miguel
12	Oscar Hernandez	Auxiliar	7:00 Am	5:00 Pm	Oscar Hernandez
13	Ivan Pineyda	Oficial	7:00 Am	5:00 Pm	
14	Ivan Bacazabal	ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	Ivan Bacazabal
15	Jesus Andres Bonetto Cabrera	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	Jesus Andres B.
16	Pedro Reyes	Oficial	7:00 Am.	5:00 Pm	Pedro Reyes
17	Luis David Escamilla R.	Aux SST.	7:00 Am	5:00 Pm	
18	Carlos Ortega	Oficial	7am	5PM	Carlos Ortega
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 28-11-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jonle Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	Jonle Guerra
2	Alvaro Borojos poboa	oficial	7am	5pm	Alvaro Borojos P.
3	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
4	Luis Torres	ayudante	7am	5pm	[illegible]
5	Jose Tonny	aux trafico	7am	5pm	Jose Tonny
6	Jurion	aux trafico	7am	5pm	Jurion
7	Javier Carvajal	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
8	Hf Bohorquez	A y c	7:00	5pm	[illegible]
9	Jose Miguel M	Ayudante	7:00	5pm	[illegible]
10	Luis Cristo Montero	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
11	Carlos Cantor	oficial	7am	5pm	[illegible]
12	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
13	Pedro Rojas	oficial	7am	5pm	[illegible]
14	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7:00	5pm	Jesus Andres B.C
15	Juan Alveyo	oficial	7am	5pm	[illegible]
16	Ivan Londoño	ayudante	7am	5pm	Ivan Londoño
17	Luis Daniel Escamilla R.	Aux SST.	7:00	5pm	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 29-11-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRE Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7 AM	5 PM	
2	Manuel Silva	Ayudante	7 AM	5 PM	
3	Alvaro Barajas Pabon	Oficial	7 AM	5 PM	Alvaro Barajas P.
4	Hugo Arrieta	Ayu	7:00	5 PM	
5	Julian	Aux Trafico	7AM	5 PM	
6	Jose Toro	Aux Trafico	7AM	3 PM	
7	Javier Carvajal	Ayudante	7 AM	3 PM	
8	Luis Toro	Ayudante	7AM	3 PM	
9	Luis Cantillo	Ayudante	7AM	5 PM	
10	Jose Miguel M	Ayu	7:00	5 PM	
11	Carlos Ochoa	Oficial	7AM	5 PM	
12	Orlando Taborda	Oficial	7 AM.	5 PM	Orlando Tabo
13	Luis Daniel Escamilla	Aux SST.	7:00	5 PM	
14	Jesus Andres Bocello Bolaño	Ayudante	7:00	5PM	Jesus Andres B.B
15	Julian Gomez	Aforo	7:00 AM	5PM	
16	Ivan Landazabal	Ayudante.	7AM	5PM	
17	Ivan Olmeyda	Oficial	7AM	5 PM	
18	Pedro Rojas	Oficial.	7 AM	5 PM	
19			7 AM		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

NIT 804003240-1
Bucaramanga, 01 de Diciembre del 2025

Señores
CONSORCIO LA FLORA 2023
Ciudad

CERTIFICACION

SANTANDEREANA DE MADERAS SAS con Nit. 804.003.240-1 certifica que le suministro materiales al **CONSORCIO LA FLORA 2023** con **Nit. 901.702.490-7** durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2025, mediante las siguientes facturas:

FECHA	No FACTURA	DETALLE	VR TOTAL
04/11/2025	FE11432	MADERA CARACOLI - ORDINARIA - ROLLIZA PARAL X 3.00 MTS	$ 3.963.750
04/11/2025	FE11433	MADERA CARACOLI - ORDINARIA 3.00 MTS	$ 214.200
19/11/2025	FE11554	MADERA CARACOLI - ORDINARIA 3.00 MTS	$ 5.197.500
	TOTAL FACTURAS	**$9.375.450**	

Por un valor total de $9.375.450 (Nueve millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos MCTE).

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 01 días del mes de Diciembre del 2025.

Cordialmente

Santandereana de Maderas
FIRMA AUTORIZADA

ELBA MARIA ROMAN CORREDOR
Gerente

Consorcio La Flora 2023	COMITÉ PARITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	Versión: 000
	CONSORCIO LA FLORA 2023	05 mayo 2023

"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	Hora Inicio	Hora final
	24	NOVIEMBRE	2025	7:00 AM	11:00 AM

ASUNTO: ACTA 030 COMITÉ COPASST MES NOVIEMBRE 2025

TEMA A TRATAR

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
4. Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
5. Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
6. Revisión de accidentes, incidentes y enfermedades laborales reportados.
7. Informe de inspecciones y observaciones de seguridad.
8. Capacitaciones y campañas de prevención programadas y ejecutadas.
9. Inspección obligatoria del uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC).
10. Solicitud de documentación del SG-SST al subcontratista Peñaranda y Ramírez Construcciones S.A.S.
11. Control de ingresos no autorizados a obra – llamado de atención al área administrativa.
12. Supervisión y acompañamiento en actividades de alto riesgo.
13. Identificación, evaluación y control del riesgo biológico.
14. Identificación, evaluación y control del riesgo público.
15. Verificación del cumplimiento de funciones y compromisos del COPASST.
16. Evaluación de alternativas para la atención de emergencias médicas – contratación de ambulancia privada.
17. Fortalecimiento del compromiso de comunicación permanente entre la dirección, área administrativa, personal operativo y SST.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Verificación del quórum

Se realizo la verificación de asistencia de los integrantes del Comité COPASST, constatándose la presencia de la totalidad de los miembros principales. Se cuenta además con el acompañamiento del Director de Obra, personal del área SST&A y el asesor de la ARL Seguros Bolívar, por lo cual se declara quórum válido para el desarrollo de la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El orden del día es leído y puesto a consideración de los asistentes, quienes manifiestan su conformidad, siendo aprobado por unanimidad.

3. Seguimiento al SG-SST

Se socializan los informes semanales y mensuales del SG-SST, evidenciando las actividades desarrolladas, capacitaciones ejecutadas, controles implementados y acciones correctivas derivadas de inspecciones previas. Se resalta la importancia de fortalecer la participación activa del personal operativo en los programas de prevención y autocuidado.

4. Cumplimiento del PMA

Se socializan los informes del Plan de Manejo Ambiental, verificándose su cumplimiento y la adecuada implementación de las medidas ambientales establecidas en obra.

Scanned with CamScanner

5. Cumplimiento del PMT

Se informa la realización de los comités mensuales del PMT y la aplicación de medidas preventivas en todos los frentes de trabajo. Se enfatiza la necesidad de reforzar la señalización, la demarcación de zonas peatonales y la comunicación efectiva entre operadores de maquinaria y personal en campo.

6. Accidentes, incidentes y enfermedades laborales

Se revisan los registros del período, sin reportes de accidentes graves ni incidentes con tiempo perdido. Se socializan los siguientes casos relevantes:

- Enfermedad laboral: José de Jesús Torres, diagnosticado con epicondilitis lateral derecha (diciembre de 2024).
- Accidente grave: Gerardo Quintero, ocurrido el 1 de febrero de 2024, actualmente en proceso de atención y seguimiento médico.

Ambos casos cuentan con acompañamiento permanente por parte del área SST y la ARL correspondiente.

7. Inspecciones y observaciones de seguridad

Se presentan los resultados de las inspecciones realizadas en frentes de trabajo y equipos, identificándose oportunidades de mejora en aspectos de orden, aseo y almacenamiento seguro de materiales.

8. Capacitaciones y campañas

Se informa la realización de charlas y capacitaciones durante el mes, destacando:

- Resolución 3461 de 2025 – Actualización COCOLAB y funciones.
- Orden y aseo en obra.
- Investigación de accidentes de trabajo.
- Socialización de funciones de los comités COPASST y COCOLAB.

9. Inspección obligatoria de EPP y EPCC

Se recuerda a responsables de frentes y supervisores la obligación de verificar diariamente el correcto uso y estado de los EPP y EPCC, garantizando la reposición inmediata de aquellos elementos deteriorados o vencidos.

10. Solicitud de documentación a subcontratista

Se solicita formalmente al área SST del subcontratista Peñaranda y Ramírez Construcciones S.A.S. la entrega de la documentación vigente del SG-SST, incluidas planillas de pago de seguridad social y demás soportes pendientes.

11. Control de ingresos a obra

Se reportan ingresos no autorizados de visitantes. Se emite llamado de atención al área administrativa y se solicita reforzar los procedimientos de control de acceso, identificación y registro del personal externo.

12. Supervisión en actividades de alto riesgo

Se determina la obligatoriedad del acompañamiento permanente del área SST en todas las actividades de alto riesgo, tales como trabajos en alturas, espacios confinados, excavaciones, izajes, entre otros.

13. Gestión del riesgo biológico

Se revisan las medidas preventivas implementadas, reforzándose la importancia del uso adecuado de guantes, tapabocas y elementos de desinfección durante la manipulación de residuos y aguas residuales.

14. Gestión del riesgo público

Se analizan las condiciones del entorno del proyecto, recomendándose fortalecer la seguridad perimetral, señalización externa y coordinación con autoridades locales para prevenir situaciones de violencia o hurto y/o accidentes viales.

15. Funciones del COPASST

Se realiza seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los integrantes del comité, promoviendo su participación activa en inspecciones, capacitaciones y reuniones periódicas.

16. Atención de emergencias médicas

Se reitera la contratación de un servicio de ambulancia privada para garantizar atención oportuna ante posibles emergencias en obra.

17. Comunicación interna

Se establece mantener una comunicación permanente, efectiva y estructurada entre la dirección, área administrativa, personal operativo y SST, a fin de optimizar la coordinación, el reporte de novedades y la toma de decisiones preventivas.

COMPROMISOS

1. Elaborar y entregar oportunamente los informes semanales y mensuales de SST, PMA y PMT.
2. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente:
    - Resolución 0312 de 2019 – SG-SST.




Scanned with CamScanner

- Resolución 4272 de 2021 – Trabajo en alturas.
- Resolución 0491 de 2023 – Espacios confinados.

3. Realizar seguimiento permanente al PMT en todas las actividades que lo requieran.
4. Promover y garantizar el uso responsable de la dotación suministrada por el Consorcio La Flora 2023.
5. Mantener condiciones óptimas de orden y limpieza en toda la obra, fomentando la cultura de aseo y organización.
6. Identificar de manera proactiva actos y condiciones inseguras, implementando acciones correctivas inmediatas.
7. Garantizar inspección obligatoria y acompañamiento permanente del área SST y subcontratistas en todas las actividades, especialmente excavaciones.
8. Mantener instalada toda la señalización preventiva, informativa, de prohibición y obligatoria, así como la delimitación con cinta de peligro en excavaciones y estructuras tipo Box Culvert.
9. Ejecutar inspecciones diarias a los EPP y EPCC (arneses, eslingas, líneas de vida, entre otros).
10. Asegurar el uso adecuado, obligatorio y permanente de los EPP y EPCC por parte de todo el personal durante la ejecución de las actividades.

CONVOCATORIA PROXIMA COMITÉ: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	DANIEL ALBERTO GÓMEZ BARRAGÁN	PRINCIPAL-EMPLEADOR	
2	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	PRINCIPAL-TRABAJADORES	
3	LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	SUPLENTE -TRABAJADORES	
4	KAREN PALOMINO GUEVARA	PROFESIONAL SST	
5	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS	DIRECTOR DE OBRA	
6	LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	AUXILIAR SST	

Scanned with CamScanner

Consorcio La Flora 2023	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Versión: 000
	CONSORCIO LA FLORA 2023	Abril 2024

"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

	DIA	MES	AÑO	Hora Inicio	Hora final
FECHA	04	11	2025	7:00 a. m.	10:00 a. m.

ASUNTO: ACTA 001 COMITÉ COCOLAB MES NOVIEMBRE 2025

TEMA A TRATAR

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Socialización de la Resolución 3461 de 2025 – Actualización normativa del Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB) y sus funciones.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Verificación del quórum

Se realiza la verificación de asistencia de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral – COCOLAB, constatándose la presencia de la totalidad de los miembros principales. Se cuenta con el acompañamiento del personal del área SST&A y del asesor de la ARL Seguros Bolívar, por lo cual se declara quórum válido para el desarrollo de la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El orden del día es leído y puesto a consideración de los asistentes, quienes manifiestan su conformidad, siendo aprobado por unanimidad

3. la capacitación fue dirigida por la ARL SEGUROS BOLIVAR donde se socializo la Resolución 3461 de 2025, la cual establece la actualización normativa relacionada con la conformación, funcionamiento y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB).

La reunión estuvo dirigida a los miembros del comité, Director y área SST&A, con el objetivo de socializar los cambios normativos, fortalecer el conocimiento sobre las funciones del comité y promover la adecuada gestión de situaciones asociadas al acoso laboral y a los factores de riesgo psicosocial dentro del entorno de trabajo.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con:

- Marco normativo vigente del Comité de Convivencia Laboral.
- Funciones, deberes y responsabilidades de los integrantes del COCOLAB.
- Principios de confidencialidad, imparcialidad y manejo adecuado de la información.
- Mecanismos de prevención, promoción de la sana convivencia y mejora del clima laboral.

Esta reunión permitió fortalecer las competencias del personal en la identificación y manejo oportuno de situaciones que puedan afectar la convivencia laboral, contribuyendo a la promoción de ambientes de trabajo respetuosos, seguros y saludables, en cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMPROMISOS

1. Programar y ejecutar capacitaciones periódicas dirigidas a todo el personal en temas de prevención del acoso laboral, comunicación asertiva y convivencia laboral.
2. Asegurar la socialización permanente de las funciones del COCOLAB para fortalecer su visibilidad y accesibilidad entre los trabajadores.
3. Garantizar la aplicación de los principios de confidencialidad, imparcialidad y respeto en la atención, seguimiento y manejo de los casos reportados.

Scanned with CamScanner

4. Implementar estrategias de promoción del buen trato, respeto mutuo y resolución pacífica de conflictos en todos los frentes de trabajo.
5. Realizar seguimiento continuo a los factores de riesgo psicosocial, articulando acciones preventivas con el área de SST&A y la ARL.
6. Divulgar los canales de comunicación disponibles para la recepción de inquietudes, quejas o situaciones asociadas a convivencia laboral.
7. Mantener el desarrollo de reuniones periódicas del COCOLAB conforme al cronograma establecido, asegurando la participación activa de todos sus integrantes.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	TOPOGRAFO	
2	ANGIE MORENO SANGUINO	PROFESIONAL SOCIAL	
3	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	OFICIAL OBRA	
4	OLGA PATRICIA MONOGA RIAÑO	AUXILIAR TRAFICO	
5	ATANEL VILORIA CADENA	AYUDANTE OBRA	
6	JAVIER CARVAJAL CERVANTES	AYUDANTE OBRA	
7	KAREN PALOMINO GUEVARA	PROFESIONAL SST	
8	LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	AUXILIAR SST	

Scanned with CamScanner

INFORME SOCIAL # 31.

PROYECTO.

CONTRATO No. 069: OBRA CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

PROFESIONAL SOCIAL:

ANGIE LICETH MORENO SANGUINO.


	NOMBRE	FIRMA
ELABORO	ANGIE LICETH MORENO S.	
REVISADO		
APROBADO		

TABLA DE CONTENIDO.

1. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 3
1.1. INTRODUCCION. 3
2. OBJETIVO. 3
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 3
4. PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA. 5
4.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 5
4.2 PROCESOS DE PQR 9
4.3 RECORRIDOS URBANOS 10
5. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11
6. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS 17
10. TALENTO HUMANO. 19
10.1 CAPACITACITACION AL PERSONAL DE OBRA 20
11. CONCLUSIONES. 23

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 PROCESOS DE PQR NOVIEMBRE 2025 8
ANEXO 2 REGISTRO ASISTENCIA CAPACITACIONES NOVIEMBRE. 16

LISTADO DE IMAGENES

IMAGEN 1 PENDÓN INFORMATIVO DEL PAC;22/11/2025; FUENTE CONSORCIO LA FLORA 2023 6
IMAGEN 2 ATENCIONES DIVERSAS VÍA WHATSAP NOVIEMBRE 2025; FUENTE CONSORCIO LA FLORA 2023 ..8
IMAGEN 3 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD NOVIEMBREE 2025; FUENTE CONSORCIO LA FLORA 2023.....¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 4 VERIFICACIÓN DEL BUZÓN DE PQR NOVIEMBRE 2025; FUENTE CONSORCIO LA FLORA 2023¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 5 FORMULARIO RECEPCIÓN PQR NOVIEMBRE 2025; FUENTE CONSORCIO LA FLORA 2023...¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

LISTADO DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 VOLANTE ACTIVIDADES EN EL SECTOR NOV 2025; FUENTE CONSORCIO LA FLORA 2023 ....¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 RECORRIDOS URBANOS.....10
TABLA 2 COLABORADORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.....19

1. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

1.1. INTRODUCCION.

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades de gestión social desarrolladas en el marco de la ejecución del Contrato 69 - Canalización de Cauces: Quebrada La Flora y La Iglesia Parte Alta, e Interceptores: La Flora II y La Iglesia Parte Alta, en el municipio de Bucaramanga; dichas actividades fueron realizadas por la profesional social Angie Liceth Moreno Sanguino, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre 2025, como parte de la implementación del Plan de Gestión Social del proyecto.

Este plan tiene como propósito principal acompañar el desarrollo técnico y contractual del proyecto mediante un enfoque social, comunitario y participativo. El programa de gestión social en obras es una herramienta orientada a manejar de manera adecuada los impactos sociales derivados de la ejecución de infraestructuras.

El plan busca mitigar los efectos generados durante la fase de construcción, tales como alteraciones en las rutinas cotidianas de los residentes del sector, cambios en la dinámica laboral y la aparición de nuevas expectativas o inquietudes por parte de la comunidad. Asimismo, se pretende generar impactos positivos que fortalezcan la relación entre el proyecto y la comunidad.

En el presente informe se detallan las actividades correspondientes al componente social desarrolladas entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, organizadas en torno a seis (6) ejes principales

- Programa de Servicio a la ciudadanía.
- Programa de Dialogo y participación ciudadana.
- Programa de Acompañamiento actividades técnicas.
- Programa de Gobernanza para movilidad.
- Programa de información para el desarrollo del proyecto.
- Programa Talento Humano

2. OBJETIVO.

✓ Brindar a la comunidad una visión general del proyecto, destacando el rol fundamental que desempeña dentro de él y la importancia de su participación para lograr un desarrollo adecuado.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

La quebrada la Flora, la Cascada y la Iglesia se encuentran localizadas en sector oriental del casco urbano del Municipio de Bucaramanga. Quebrada la Flora Esta corriente nace en el sector rural de

los cerros orientales, se encuentra en condiciones naturales y sin mayor afectación erosiva, dada la buena cobertura vegetal de su cuenca, al ingresar a la zona urbana lo hace por dos (2) líneas de drenaje, la mayor viene entre el sector de los lavaderos de carros y el Barrio Buenos Aires, iniciando su ingreso al contexto urbano, en el cruce con la carretera intermunicipal a Cúcuta. La segunda viene por la zona oriental de La Milaña y la PTAP La Flora del AMB, denominada Quebrada El Botadero, recibiendo algunas contaminaciones menores de estos desarrollos y los desagües periódicos del sistema de lavado de la PTAP.

Estas corrientes se unen cruzando esta vía, a la altura del barrio Miraflores y dan comienzo a la Quebrada La Flora, siguiendo el trazado de la corriente hasta su confluencia con la quebrada La Cascada; la quebrada dentro del sector urbano tiene una longitud total cercana a los 4,5 kla, Quebrada La Iglesia la conforman en su parte alta dos quebradas afluentes, que son La Flora y La Cascada, a la altura del barrio El Sol, la cual transita a partir de este punto, por cerca de 9 km hasta su entrega al Río de Oro.

Este tramo se caracteriza por ser un sistema de canalización en conjunto cerrado que da continuidad a las canalizaciones de las Quebradas La Flora y La Cascada, mediante una estructura paralela de dos tuberías de diámetros de 1,9 m y 2,30 m, en una longitud aproximada de 806 m, finalizando con el empalme al primer módulo de la canalización abierta, a la altura del Viaducto García Cadena y El Parque Extremo.

A lo largo de su trayecto transporta el caudal combinado de los aportes de las dos quebradas que lo forman y recibe adicionalmente entregas separadas y combinadas del sector urbano aferente a su cuenca, tales como el Barrio El Sol, San Pedro, San Martín, desarrollos entre el Motel La Granjita y Monviso, Torres de Alejandría, Mirador de San Lorenzo, Villa Diamante, la zona comercial aledaña a Motor este y el mayor caudal en este tramo, que corresponde al Tejar Zona Central, conformado por un número importante de barrios que se concentran en un colector de tipo combinado, que cruza la carretera antigua a la espalda de la Estación de Servicio cerca al viaducto La Flora y toma la Calle 32 hasta la Calle 75 en el barrio San Martin y de allí a su conexión final en la canalización de la Quebrada La Iglesia.



4. PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA.

4.1 PUNTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Durante el presente mes se continuó socializando el pendón informativo actualizado ubicado en el Punto de Atención a la Comunidad. En esta nueva versión se incorporaron de manera definitiva los canales de atención vigentes, incluyendo el número telefónico y el correo electrónico habilitados para contacto directo con el Consorcio.

Asimismo, se actualizó el horario de atención presencial, y se resaltaron los mecanismos disponibles para la recepción de solicitudes, como el buzón de PQR y el código QR, mediante el cual los usuarios pueden enviar hojas de vida y realizar consultas relacionadas con el proyecto.

Durante el presente mes se realizó la instalación del pendón informativo en el PAC del Frente 2, ubicado en el parque La Flora, con el propósito de garantizar que la comunidad del sector cuente con información actualizada relacionada con el área social del proyecto.





Imagen 1 Pendón informativo del PAC;30/11/2025; fuente Consorcio la Flora 2023

Esta gestión se adelantó con el propósito de incorporar herramientas digitales al componente de gestión social, fortaleciendo así los canales de comunicación y atención con la comunidad, el objetivo principal es promover una interacción más ágil, accesible y oportuna entre los ciudadanos y el proyecto.

Durante el presente mes, se continuo con la atención a la comunidad mediante los canales oficiales dispuestos por el contrato, tanto de forma física, como virtuales a través del correo electrónico, menajes de WhatsApp directos o mediante el grupo informativo del proyecto.

Número de celular	315 156 5816
Correo electrónico	gestionsocial.laflora2023@gmail.com
Punto de Atención a la Comunidad (PAC)	Parque Extremo B. San Martín
Horario de atención presencial	miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Durante la atención virtual se brindó acompañamiento a la comunidad en aspectos como la recepción de hojas de vida, la resolución de dudas e inquietudes relacionadas con los trabajos a ejecutar y la coordinación de visitas de campo y adecuaciones de la pavimentación a las viviendas en zonas donde se está interviniendo actualmente.

De igual forma se continuo con el seguimiento de la reubicación de los vendedores informales ubicados anteriormente frente al parque la flora, buscando de esta manera seguir apoyando los canales de comunicación entre los actores institucionales y los vendedores.

Anexo 1. imagen 2 atenciones diversas vías WhatsApp; noviembre 2025; fuente Consorcio la Flora 2023

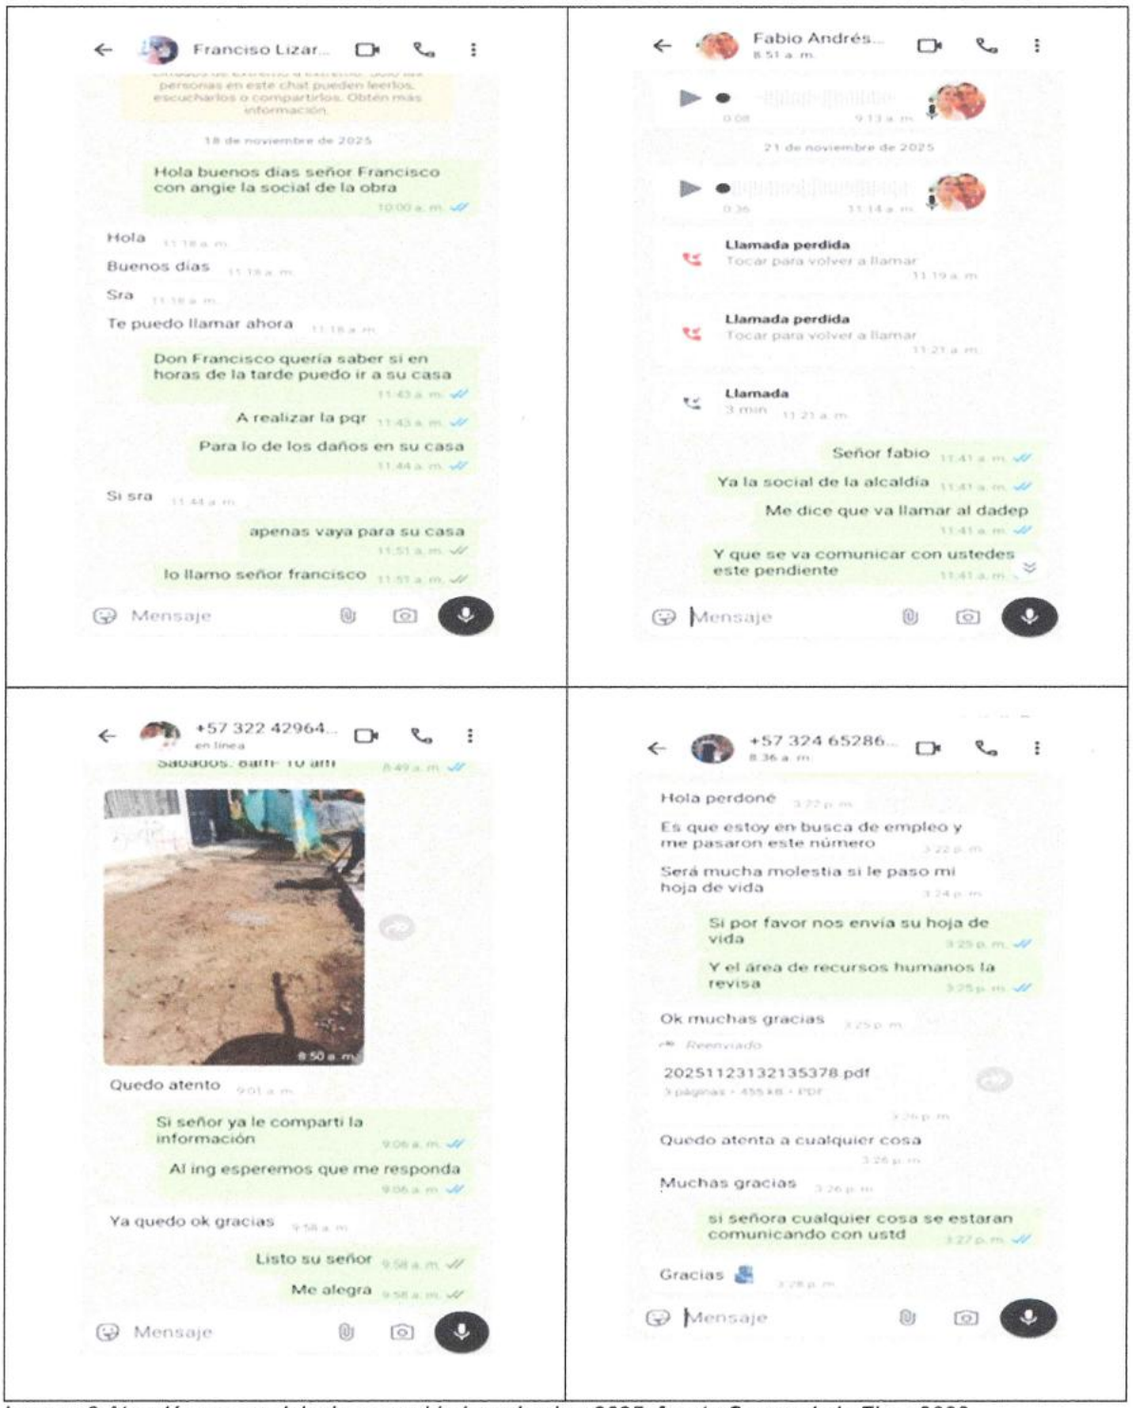
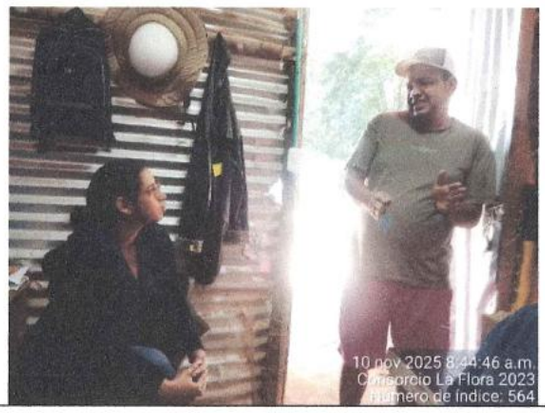


imagen 3 Atención presencial a la comunidad; noviembre 2025; fuente Consorcio la Flora 2023

PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD



- REVISIÓN BUZON DE SUGERENCIAS

Durante el mes de noviembre de 2025, no se recepcionaron PQR a través del Buzón ubicado en el exterior del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), la verificación del mismo se realizó lo días viernes de cada semana, finalizando la tarde.

imagen 4 verificación del buzón de PQR; noviembre 2025; fuente Consorcio la Flora 2023



De igual forma, se realizó la revisión del formulario habilitado para la recepción de PQR a través del código QR publicado, y se evidenció que no se ha recibido ninguna solicitud por este medio.

imagen 5 Formulario recepción PQR; noviembre 2025; fuente Consorcio la Flora 2023



4.2 PROCESOS DE PQR

Continuando con el seguimiento a la queja N° 23 presentada por la señora Paola Camacho, en relación con una presunta afectación en el inmueble ubicado en la Carrera 29A #72-17 se informa que el 17 de noviembre se terminaron los trabajos correspondientes en el segundo piso de la vivienda, las cuales consistieron en: apertura y retiro del revoque para verificar muros, pisos, o elementos afectados por las fisuras. Posteriormente se realizó la verificación del especialista estructural, donde identificó la carencia de un sistema estructural competente, encontrando como causa principal de las fallas un leve asentamiento consolidado e inactivo actualmente , determinando la construcción de una columna y una viga complementaria confinado y mejorando el comportamiento estructural de la vivienda.

-Se encuentra pendiente la firma del paz y salvo correspondiente a la PQR. Ya se informó al representante del propietario sobre la necesidad de realizar una visita conjunta con la interventoría; sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible establecer comunicación y respuesta a la petición.

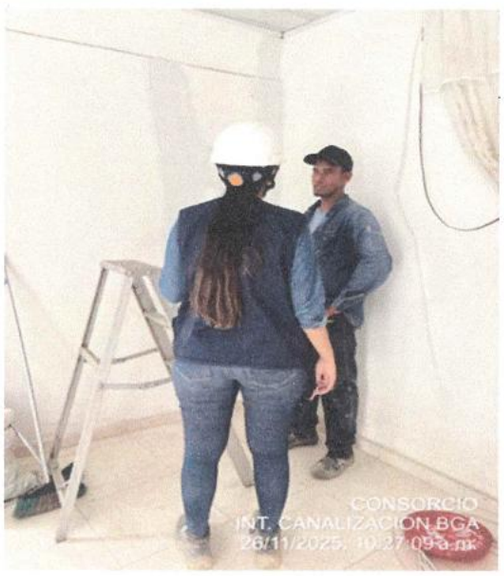
-El 24 de noviembre se inicia las reparaciones requeridas en la queja N° 37 presentada por la señora Roció Moreno donde la propietaria manifiesta que en su vivienda, se presentaron agrietamientos en la zona exterior e interior de la vivienda, por el uso de maquinaria en la zona.

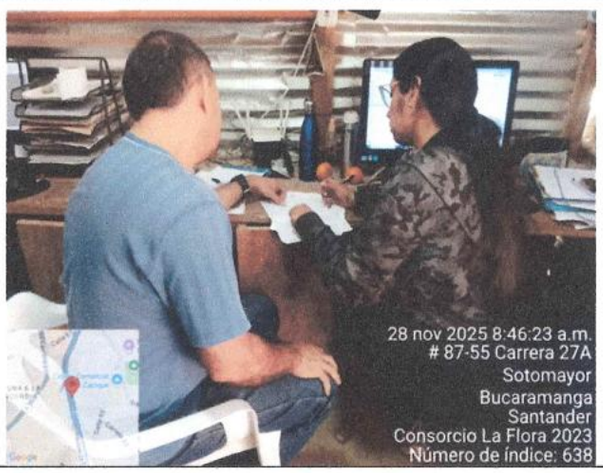
-El 28 de noviembre se entrega respuesta formal a la queja N° 38 presentada por la señor José Guillermo Rey, donde una vez analizado el requerimiento por parte del equipo técnico del Consorcio La Flora 2023 y en el marco de las actividades desarrolladas dentro del proyecto de intervención urbana en el sector, se procedió a excluir el tramo correspondiente al andén de su predio de cualquier actividad constructiva, tales como demolición, conformación, nivelación, fundida de concreto, acabados o cualquier otro tipo de intervención civil. En consecuencia, se deja constancia que el andén ubicado frente a su vivienda fue conservado en su estado original, sin que se haya ejecutado modificación, mejora, reparación o adecuación alguna, dando así estricto cumplimiento a su solicitud. Por consiguiente, se realiza el cierre de la PQR, con total aprobación del propietario.

-Para el periodo correspondiente al mes de noviembre, se evidenció la radicación de 1 PQR queja N° 40 presentada por el señor José Guillermo Rey, donde refiere que debido a las actividades constructivas y al uso de maquinaria se ocasionaron daños estructurales en la entrada principal de

su propiedad, el usuario refiere que la banca cedió causando visiblemente el agrietamiento de las baldosas, solicita que se realicen las respectivas reparaciones.

imagen 6 Seguimiento PQR Paola; noviembre 2025; fuente Consorcio la Flora 2023
Anexo 2 Matriz de PQRS y formato de PQRS

SEGUIMIENTO PQR N° 37	SEGUIMIENTO PQR N° 29
	

CIERRE PQR PQR N° 38


4.3 RECORRIDOS URBANOS

Durante el mes de noviembre de 2025, el área social llevó a cabo recorridos urbanos en los sectores que conforman el área de influencia del proyecto, en los barrios San Martín, San Pedro, Sol I, Sol II y Quebrada La Iglesia, el objetivo principal de estas visitas fue identificar de manera preventiva situaciones del entorno que pudieran representar posibles factores de conflicto con la comunidad.

De igual forma se realizaron recorridos en los sectores aledaños al parque la flora, debido a las intervenciones que se están realizando.

Es importante destacar que los días 18,26,27 se llevaron a cabo recorridos técnico por la obra, en conjunto con la interventoría. Adicionalmente, durante estos recorridos se realizaron atenciones directas a los residentes, donde se resolvieron inquietudes que no requerían la apertura formal de procesos de PQR, también se brindó información relevante sobre el avance y alcance del proyecto, promoviendo el diálogo transparente y fortaleciendo el vínculo de confianza con la comunidad, tales como solicitudes en la gestión de limpieza de acceso a senderos peatonales, inicio de labores, entre otros.

No. RECORRIDOS	SECTOR	FECHA DE RECORRIDO
1	SAN PEDRO	18/11/2025
2	SAN MARTIN	26/11/2025
3	SOL I Y SAN MARTIN	27/11/2025

Tabla 1 recorridos Urbanos

RECORRIDOS URBANOS









5. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El programa de Diálogo y Participación Ciudadana tiene como propósito generar espacios de encuentro, conversación y atención directa con la ciudadanía, con el fin de fortalecer el conocimiento,

la apropiación y la corresponsabilidad de la comunidad frente al desarrollo del proyecto, este programa se concibe como un mecanismo clave para garantizar la transparencia, el control social y el diálogo constante entre los actores involucrados en la ejecución de la obra.

En el marco de este programa, el pasado 27 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el Comité de Participación Ciudadana, en el salón comunal del B. Quebrada la iglesia, con una asistencia de 27 personas, un espacio convocado mediante diversas estrategias dirigidas al ente contratante (Alcaldía de Bucaramanga), el área técnica y social del contratista (quien lideró la r reunión), líderes sociales, comunidad en general, entre otros actores de interés.

Durante el desarrollo del comité, se resaltó la importancia de estos espacios como mecanismos de participación democrática, transparencia y corresponsabilidad, donde la comunidad tiene la posibilidad de expresar sus inquietudes, aportar ideas y mantenerse informada sobre el avance de la obra. Se recordó a los asistentes que las intervenciones se realizarían de manera moderada para mantener el orden y garantizar un desarrollo eficiente de la jornada, se hizo énfasis en la necesidad de mantener un ambiente de respeto mutuo, así como en la importancia de sostener una participación activa y continua por parte de todos los asistentes.

Durante el encuentro se presentó el orden del día, que incluyó intervenciones del área social, técnica, la comunidad; El área de gestión social presentó los canales de atención a la comunidad, incluyendo número de teléfono, WhatsApp, correo electrónico y atención presencial en el Parque Extremo. Se reportó que, a la fecha, se han recibido 39 solicitudes y consultas, de las cuales 33 han sido gestionadas y cerradas de manera satisfactoria, las cinco restantes están en proceso de gestión con compromisos activos de reparación, cuando se terminen las labores constructivas colindantes con las zonas. Asimismo, se socializaron las estrategias de comunicación implementadas (perifoneo, volanteo, mensajería, entre otros), y se abordaron problemáticas como el deterioro del cerramiento de obra y la disposición inadecuada de residuos.

Por la parte técnica se explica a la comunidad que se están realizando actividades en los andenes, y los senderos en el barrio Sol 2. En torno a la parte final del boxculvert se están realizando loa filtros que van a cada lado del box. Se iniciaron actividades en la Cra 36 allá se está instalando una tubería como la que ven acá que tiene un diámetro de 1,80m que es una tubería y esa tubería ya se está instalando y se está trabajando a buen ritmo, se están realizando excavaciones y por ende debimos realizar el cierre vehicular en esa zona.

Para terminar, se recuerda que ya se están realizando trabajos en el barrio san Martín, en el replanteo de la cancha, las zonas verdes y demás actividades constructivas que iniciaremos en el sector, con el fin de que la comunidad pueda en el menor tiempo disfrutar de estos espacios de esparcimiento que tanto espera la comunidad.

imagen 9 reunión comité de participación ciudadana; noviembre 2025; fuente consorcio la flora 2023

CONVOCATORIA	REUNION COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA
	

- **Reunión virtual - Inicio de actividades – Obras sobre la Carrera 36**

Durante el presente mes se adelantó socialización el día 07 de noviembre con los actores sociales sobre el inicio de actividades de la Cra 36. Donde la parte técnica explica que las labores constructivas corresponden a la instalación de una tubería de un metro ochenta de diámetro con una longitud aproximadamente de 498 metros lineales. En este mismo tramo se concentran la construcción de 17 pozos de inspección, los cuales sirven para cambios de dirección y de altura que solicite la tubería. La profundidad de la excavación son aproximadamente cinco metros. Esta excavación es variable, depende de la pendiente de la vía por la cual estamos ejecutando la obra. Adicionalmente viene la construcción de una estructura de separación y un tramo box culvert de dos por dos en una longitud aproximada de 16 metros. Esta socialización fue de gran importancia para dar la información de primera mano a los actores sociales, responder sus dudas e inquietudes y buscar soluciones a los posibles inconvenientes que se puedan presentar.

-Anexo 2 acta de reunión.



- PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

El presente programa busca fortalecer la relación entre el contratista, la comunidad, el ente contratante y los grupos de interés, mediante una comunicación asertiva, clara y cercana. Para ello, se implementarán acciones virtuales y presenciales ajustadas al territorio y a las necesidades de información de la población.

Se generarán contenidos relevantes y oportunos sobre el avance, beneficios e impacto del proyecto, los cuales se difundirán a través de medios digitales (como redes sociales, WhatsApp, correo electrónico y estados) y presenciales (como pendones en obra, jornadas de diálogo, socialización y perifoneo).

Durante el periodo, se mantuvo comunicación permanente con los residentes de los barrios Sol I y Sol II, informando la habilitación de paso exclusivo para motocicletas en el sector intervenido y solicitando transitar con precaución debido a la presencia de personal operativo y maquinaria en la vía. De igual forma, se notificó a la comunidad de los barrios San Pedro y San Martín sobre las actividades de vaciado de concreto en los andenes, recordando la importancia de no transitar, subir ni estacionar vehículos sobre estas superficies, con el fin de garantizar un adecuado proceso de fraguado. Así mismo, se reiteró la prohibición de depositar escombros o materiales en las áreas intervenidas, con el propósito de prevenir la contaminación y el deterioro de las zonas ya ejecutadas.

La estrategia priorizará mensajes clave que ayuden al posicionamiento del proyecto, destacando el cumplimiento del contrato, los beneficios para la comunidad, el compromiso con la seguridad, la transparencia y la atención a inquietudes; los contenidos se adaptarán al lenguaje y canales apropiados para cada grupo de interés, garantizando así una comunicación efectiva y participativa. El 21 de noviembre se llevó a cabo un refuerzo digital en la convocatoria a la comunidad para participación del comité de participación comunitaria, mediante este refuerzo estuvo acompañado de un perifoneo mediante la red de megáfono local, en diferentes puntos de los barrios del área de influencia, lo que se busca es que la comunidad participe de estos espacios de dialogo, donde están las entidades asignadas para resolver las inquietudes y necesidades con respecto al proyecto.De igual forma el día 27 de noviembre se realizó un perifoneo directo por parte del contratista de obra en los barrios El Sol, San Martín, Quebrada y San Pedro, con el propósito de reforzar las estrategias de convocatoria al Comité de Participación comunitaria.

- **Piezas de divulgación**

El 28 de noviembre de 2025 se hizo entrega física de un volante informativo dirigido a la comunidad en general y a los visitantes del parque La Flora. En este material se informó a la comunidad usuaria y a los visitantes recurrentes del Parque La Flora que, en razón a las actividades constructivas en ejecución, el único acceso habilitado al parque corresponde al ingreso por el barrio Terrazas, toda vez que la entrada principal será clausurada de manera permanente, como medida preventiva para mitigar riesgos y evitar la ocurrencia de accidentes.

Por otra parte, el día 24 de noviembre se realizó la difusión virtual de un volante respecto a que actualmente se están ejecutando actividades catalogadas como de alto riesgo en el barrio san Martín, específicamente excavaciones a gran profundidad. Por tal motivo, se solicita acatar de manera estricta la señalización temporal de obra y la delimitación perimetral con cinta de peligro, con el fin de mitigar riesgos operativos y garantizar la integridad de peatones, ciclistas y conductores.

- **Valla informativa**

El Contratista continúa dando cumplimiento a los compromisos establecidos, realizando la instalación de la valla informativa conforme a los requerimientos exigidos por el proyecto.

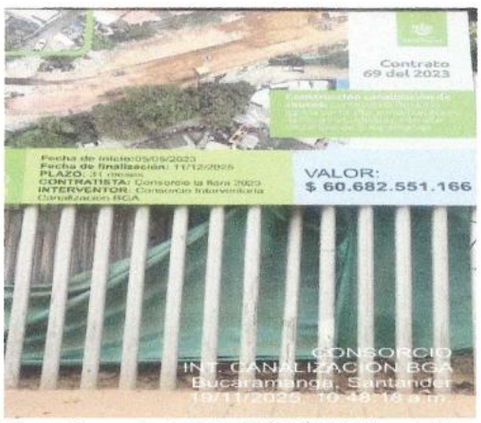


imagen 17 Valla informativa contrato 069; 19/ 11/2025; fuente Consorcio la flora 2023

REGISTRO DE COMUNICACIONES	
	



imagen 10 Volante compartido con la comunidad; fuente consorcio la flora 2023

- **DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO LA FLORA CARRERA 36 CON 56**

Este programa está relacionado con todas las acciones necesarias para los procesos de socialización tanto del Plan de Manejo de Tráfico-PMT. Por consiguiente, el contratista debe garantizar que se informe de manera oportuna a la comunidad afectada por los cambios en el PMT y que se beneficiarán con el nuevo esquema de movilidad.

Dentro del mismo se realizó el día 5 de noviembre se llevó a cabo nuevamente junto con interventoría la divulgación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y el inicio de actividades sobre la Cra 36 ante los

actores sociales cercanos a la obra, con el fin de socializar las medidas y ajustes viales necesarios para la ejecución del cierre de la Carrera 36. Durante la jornada se explicaron los desvíos, restricciones y recomendaciones para garantizar la movilidad segura y el adecuado desarrollo de las actividades de obra.







6. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Este programa fue planteado como una estrategia de apoyo social integral al componente técnico del proyecto, con el objetivo de facilitar la articulación entre la comunidad y el equipo técnico, brindar información clara y oportuna sobre las intervenciones, atender inquietudes de los residentes y hacer seguimiento a los posibles impactos generados por el proceso constructivo, asimismo, busca establecer un punto de partida para identificar y gestionar las variaciones que puedan surgir en el tiempo a raíz de las obras.

El día 20 de noviembre se hizo entrega formal de oficio a los presidentes y ediles de los barrios san Martín y san pedro, debido a la situación identificada en el tramo intervenido correspondiente a la Carrera 27ª con Cra 28, sector Barrio San Pedro y San Martín, donde se ha evidenciado una acumulación recurrente de residuos sólidos sobre la vía pública, específicamente en el punto donde

se encuentra un sumidero de drenaje pluvial, que, a corto plazo, estaría colapsado por la acumulación de basura en su interior.

Este oficio se envió con copia a la administración buscando la articulación institucional y una pronta solución a esta situación problemática, la cual se ha presentado recurrentemente a lo largo de la ejecución del proyecto.

ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TECNICAS



imagen 11 acompañamiento actividades; noviembre 2025; fuente Consorcio la flora 2023

7. PROGRAMA DE LA GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD. (ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL).

En el marco del presente programa, cuyo objetivo busca establecer una coordinación interinstitucional efectiva que facilite la implementación de acciones sociales a lo largo del desarrollo del contrato, se han adelantado gestiones clave para garantizar el trabajo articulado entre entidades

públicas y privadas. Este proceso busca fortalecer la planificación y ejecución responsable de las obras, minimizando los impactos en la comunidad y promoviendo la seguridad vial y urbana.

Durante el mes de noviembre, específicamente el día 18, se realizó acompañamiento a las labores ejecutadas por la empresa de telecomunicaciones Claro en el área intervenida, con el fin de verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos presentados por la comunidad en relación con el cableado existente en el sector, el cual en algunos puntos se encontraba en condición inestable o caída, representando un posible riesgo para la seguridad de peatones y vehículos.

El día 13 de nombre se realizó articulación junto con la administración Municipal y el DADEP, donde se realizó una socialización con los vendedores informales ubicados frente al parque la Flora, se da como respuesta a un compromiso adquirido por la administración municipal en la reunión del día 07 de noviembre. En la misma se socializo por parte del representante del DADEP la ubicación exacta donde serán reubicados los vendedores y se dejó claridad que será un traslado provisional durante la ejecución de la obra.

imagen 12 Articulación institucional; noviembre 2025; fuente Consorcio la flora 2025



8. TALENTO HUMANO.

En el marco del contrato de obra, se realiza la vinculación de personal que cumpla con los perfiles y requerimientos establecidos por la Alcaldía de Bucaramanga, así como con los requisitos legales y contractuales correspondientes para su adecuada contratación.Es importante señalar que el proyecto busca contribuir al desarrollo económico del área de influencia del proyecto, por lo cual a la fecha, del personal contratado 8 colaboradores residente en los diferentes barrios aledaños a la zona de obra, a continuación se desglosa la información

colaboradores del área de influencia directa				
N°	**Nombre**	**Cargo**	**Sector**	**Empresa**
1	Luis Miguel Martínez Martínez	Ayudante	San Martin	Consorcio la Flora 2023
2	Hugo Alberto Arrieta Luna	Ayudante	San Martin	Consorcio la Flora 2023

3	Luis Enrique Romero Brieva	Oficial del obra	San Martin	Subcontratista Ramírez Peñaranda
4	Javier Andrés Jerez	Ayudante	San Martin	Subcontratista Ramírez Peñaranda
5	Fredy Constante Hernández	Ayudante	San Martin	Subcontratista Ramírez Peñaranda
6	Deiner Padilla Campo	Oficial del obra	Quebrada La Iglesia	Subcontratista Ramírez Peñaranda
7	Eusebio Padilla Campo	Ayudante	Quebrada La Iglesia	Subcontratista Ramírez Peñaranda
8	Steven Mauricio Galeano Villamizar	Ayudante	Sol	Subcontratista Ramírez Peñaranda

Tabla 2 colaboradores del área de influencia directa

Durante este periodo se recepcionaron un total de 6 hojas de vida a través de los diferentes canales dispuestos por el Consorcio La Flora 2023, incluyendo la atención presencial en el Punto de Atención a la Comunidad, el correo electrónico y el canal de WhatsApp, estas postulaciones fueron inicialmente recibidas por el Área de Gestión Social, que posteriormente las remitió al director de obra, quien en apoyo con gestión humana son los responsable de su revisión y eventual evaluación conforme a las necesidades del proyecto.

Durante este periodo no se recibieron hojas de vida mediante el formulario en Google Forms, al cual se accede escaneando el código QR publicado en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) y socializado por diferentes medios.

10.1 CAPACITACITACION AL PERSONAL DE OBRA

Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron 4 capacitaciones de tipo psicosocial a los colaboradores vinculados a la obra, con los siguientes temas:

Anexo 2 Registro asistencia capacitaciones septiembre.

- El 05 de noviembre de 2025 se abordó el tema de **violencia de género en obra**, donde se explicó a los trabajadores que es cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o laboral a una persona por razón de su género, dentro del entorno de trabajo de la obra: campamentos, frentes de trabajo, oficinas técnicas, transporte, etc.



Imagen 17 Capacitación imagen corporativa; 05/ 11/2025; fuente Consorcio la flora 2023

- El 12 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una capacitación acerca del **manejo de estrés y presión laboral,** la constituye una herramienta preventiva fundamental en entornos de alta exigencia operativa, como las obras de construcción, donde los trabajadores se encuentran expuestos a jornadas extensas, exigencias físicas, cumplimiento de cronogramas y condiciones ambientales variables.



imagen 18 Imagen corporativa capacitación; 12/ 11/2025; fuente Consorcio la flora 2023

- El 20 de noviembre de 2025 se realizó la capacitación sobre **liderazgo en obra**, donde se explicó a los trabajadores del tema, ya que es la capacidad de una persona para guiar, influir, organizar y motivar al equipo de trabajo, asegurando el cumplimiento de las actividades de forma segura, eficiente y respetuosa, bajo condiciones exigentes de tiempo, clima y riesgo.



imagen 19 Imagen corporativa capacitación; 20/ 11/2025; fuente Consorcio la flora 2023

- El 26 de noviembre de 2025 se realizó la capacitación sobre **cultura de autocuidado en obra**, este tema es un pilar fundamental para la seguridad, la salud y la eficiencia en los proyectos de construcción. Más que una norma, es una forma de actuar consciente y responsable frente a los riesgos diarios que existen en este tipo de entornos laborales.



imagen 20 Imagen corporativa capacitación; 26/ 11/2025; fuente Consorcio la flora

9. CONCLUSIONES.

Durante el mes de noviembre de 2025, la gestión social del proyecto evidenció un avance significativo en el fortalecimiento del vínculo entre el Consorcio La Flora 2023 y la comunidad del área de influencia directa, a través de acciones continuas de atención a la ciudadanía, acompañamiento social a las actividades técnicas, atención de PQR, socializaciones, diálogos comunitarios y articulación interinstitucional, se consolidó una estrategia participativa que ha permitido abordar de manera oportuna las inquietudes, necesidades y expectativas de los actores sociales involucrados.

Las acciones desarrolladas desde el componente social permitieron fortalecer la comunicación entre el proyecto y la comunidad, generando espacios de diálogo que facilitaron la comprensión del alcance, avance e impacto de las actividades constructivas. A través de las jornadas de socialización, recorridos y atención directa, se logró informar oportunamente a los residentes y transeúntes sobre los cambios en la movilidad, accesos temporales, zonas intervenidas y riesgos asociados a la obra, contribuyendo a la prevención de incidentes.

Se concluye que el acompañamiento social en obra es fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto, minimizar conflictos comunitarios y promover la participación ciudadana en los procesos de transformación del territorio.

Fabio Andrés...
8:51 a. m.



0:08 9:13 a. m.

21 de noviembre de 2025



0:36 11:14 a. m.

Llamada perdida
Tocar para volver a llamar
11:19 a. m.

Llamada perdida
Tocar para volver a llamar
11:21 a. m.

Llamada
3 min 11:21 a. m.

Señor fabio 11:41 a. m.

Ya la social de la alcaldía 11:41 a. m.

Me dice que va llamar al dadep
11:41 a. m.

Y que se va comunicar con ustedes este pendiente
11:41 a. m.

Mensaje

+57 322 42964...
en línea

Sábados: 8am- 10 am 8:49 a. m.



Quedo atento 9:01 a. m.

Si señor ya le comparti la información 9:06 a. m.

Al ing esperemos que me responda 9:06 a. m.

Ya quedo ok gracias 9:58 a. m.

Listo su señor 9:58 a. m.

Me alegra 9:58 a. m.

Mensaje



cifrados de extremo a extremo. Solo las personas en este chat pueden leerlos, escucharlos o compartirlos. Obtén más información.

18 de noviembre de 2025

Hola buenos días señor Francisco con angie la social de la obra
10:00 a. m.

Hola 11:18 a. m.

Buenos días 11:18 a. m.

Sra 11:18 a. m.

Te puedo llamar ahora 11:18 a. m.

Don Francisco quería saber si en horas de la tarde puedo ir a su casa
11:43 a. m.

A realizar la pqr 11:43 a. m.

Para lo de los daños en su casa
11:44 a. m.

Si sra 11:44 a. m.

apenas vaya para su casa
11:51 a. m.

lo llamo señor francisco 11:51 a. m.

Mensaje



+57 324 65286...
8:36 a. m.

Hola perdoné 3:22 p. m.

Es que estoy en busca de empleo y me pasaron este número 3:22 p. m.

Será mucha molestia si le paso mi hoja de vida 3:24 p. m.

Si por favor nos envía su hoja de vida 3:25 p. m.

Y el área de recursos humanos la revisa 3:25 p. m.

Ok muchas gracias 3:25 p. m.

Reenviado

20251123132135378.pdf
3 páginas • 455 kB • PDF

3:26 p. m.

Quedo atenta a cualquier cosa 3:26 p. m.

Muchas gracias 3:26 p. m.

si señora cualquier cosa se estaran comunicando con ustd 3:27 p. m.

Gracias 3:28 p. m.

Mensaje

CONSORCIO La Flora 2023

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

PROYECTO N° 69

OBRA CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONSECUTIVOS: 38

COMUNIDAD INSTITUCIONAL	MUNICIPIO	FECHA
	Bucaramanga	31/10/2025

DEFINICION DE PQR

PETICIÓN	Toda solicitud de información, de algún bien material, apoyo logístico y/o donación que realice algún miembro de las autoridades locales, instituciones y las comunidades del área de influencia.	X
QUEJA	Toda reclamación que interponga algún miembro de las autoridades locales, institucionales y/o comunidad por el desarrollo del proyecto.	
RECLAMO	Toda reclamación interpuesta por un trabajador no calificado o calificado que esté vinculado en el proyecto, que esté relacionado con sus condiciones laborales y/o salariales.	

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PQR:

NOMBRE Y APELLIDOS:	Jose Guillermo Reyes	CEL: 3174178731	DIRECCIÓN: 74 # 29a - 117

SOCIAL		M. AMBIENTE		ADMON		TECNICO	X	CORREO:

DESCRIPCIÓN DE LA PQR

El propietario de la vivienda manifiesta que desea que se mantenga el diseño original del anden frente a su vivienda, refiere que si se realizan las modificaciones se modifique la altura del mismo, para no tener problemas con los demás propietarios para que no utilizen el espacio como parqueadero.

SOLICITANTE:	Jose Guillermo Rey	PROFESIONAL QUE RECEPCIONÓ:	Angie Moreno

ACCIONES A SEGUIR

Se realizo visita junto con interventoria y se levanto acta de dicha situación se explica al propietario que se elevara la peticion al area tecnica.

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA PQR

Se da respuesta escrita al señor Jose Guillermo, donde se explica que no se realizara ninguna actividad constructiva frente a su vivienda con el fin de dar cumplimiento a la solicitud.

FECHA DE CIERRE DE LA PQR:		DIA:		MES:		AÑO:	

OBSERVACIONES

Se envia respuesta con oficio y se remite a la interventoria, para el respectivo tramite, de cierre de PQR.

FIRMAS

SOLICITANTE	PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL SOCIAL

CONSORCIO La Flora 2023

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

PROYECTO N° 69

OBRA CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONSECUTIVOS: 40

COMUNIDAD INSTITUCIONAL	MUNICIPIO	FECHA
	Bucaramanga	28 - NOV - 2025

DEFINICION DE PQR

PETICIÓN	Toda solicitud de información, de algún bien material, apoyo logístico y/o donación que realice algún miembro de las autoridades locales, instituciones y las comunidades del área de influencia.
QUEJA	Toda reclamación que interponga algún miembro de las autoridades locales, institucionales y/o comunidad por el desarrollo del proyecto.
RECLAMO	Toda reclamación interpuesta por un trabajador no calificado o calificado que esté vinculado en el proyecto, que esté relacionado con sus condiciones laborales y/o salariales.

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PQR:

NOMBRE Y APELLIDOS:	Jose Guillermo Reyes	CEL: 3174178731	DIRECCIÓN: 74 # 29a - 117.

SOCIAL		M. AMBIENTE		ADMON		TECNICO	X	CORREO:

DESCRIPCIÓN DE LA PQR

El usuario refiere que debido a los trabajos realizados por el consorcio con maquinaria (excavación y talado) ocasionaron daños estructurales en la entrada de su propiedad. El usuario refiere que la banca producto de la excavación cedió, cuyando visiblemente el agrietamiento de la baldosa.
El señor Jose Guillermo pide se realicen las reparaciones requeridas.

SOLICITANTE:

PROFESIONAL QUE RECEPCIONÓ: Angie Moreno J

ACCIONES A SEGUIR

Se realizara una visita a la vivienda en compañía de interventoria y la parte tecnica para evaluar la situación y decidir acciones que se deben realizar.

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA PQR

FECHA DE CIERRE DE LA PQR:		DIA:		MES:		AÑO:	

OBSERVACIONES

FIRMAS

SOLICITANTE	PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL SOCIAL

Consorcio La Flora 2023

Consorcio La Flora 2023
NIT. 901.702.490-7

Bucaramanga-Santander, 27 noviembre del 2025

Señor: José Guillermo Reyes
Bucaramanga, Santander

Referencia: CONTRATO 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Asunto: Respuesta técnica a solicitud de no pavimentación del andén frente a su predio.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por usted, mediante la cual manifestó de manera expresa su decisión de que el andén localizado frente a su vivienda ubicada en la calle (74# 29ª-117 piso 1) no fuera objeto de pavimentación ni adecuación, con el propósito de conservar sus condiciones físicas actuales y restringir su uso como zona de parqueo o maniobra vehicular, nos permitimos informar lo siguiente:

Una vez analizado su requerimiento por parte del equipo técnico del Consorcio La Flora 2023 y en el marco de las actividades desarrolladas dentro del proyecto de intervención urbana en el sector, se procedió a excluir el tramo correspondiente al andén de su predio de cualquier actividad constructiva, tales como demolición, conformación, nivelación, fundida de concreto, acabados o cualquier otro tipo de intervención civil.

En consecuencia, se deja constancia que el andén ubicado frente a su vivienda fue conservado en su estado original, sin que se haya ejecutado modificación, mejora, reparación o adecuación alguna, dando así estricto cumplimiento a su solicitud.

La presente comunicación constituye respuesta formal y técnica a su requerimiento, quedando registrado dentro del seguimiento y control de las actividades ejecutadas por este Consorcio. Agradecemos la comunicación oportuna y reiteramos nuestro compromiso con el respeto de las solicitudes de la comunidad.

ANGIE LICETH MORENO S
Profesional Social
Consorcio La flora 2023

28/11/2025

Se anexa registro fotográfico del estado actual del andén.





Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**ACTA DE REUNIÓN**	CONTRATO N° 69 VERSION 1.0 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 69: OBRA CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
HORA INICIO:	**HORA FINAL:**	**LUGAR:**	**FECHA:**
6:00 pm	7.15 pm	Salón comunal Quebrada la iglesia	27/11/2025

OBJETIVO

Reunión de comité de participación comunitaria: Socializar con la comunidad los avances de la obra (septiembre-octubre 2025), resolver inquietudes ciudadanas, fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad y los actores del proyecto, y establecer compromisos para garantizar una ejecución responsable, transparente y participativa.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se dio apertura a la reunión dando gracias por la participación a la reunión, seguidamente la profesional social Angie Moreno, se presenta con los asistentes como la nueva profesional social del contratista.

Se reiteró que, este espacio de comité de participación ciudadana, busca que la comunidad tenga conocimiento detallado del avance de la obra en sus distintos frentes (social, técnico, administrativo), y resolver cualquier dudas o solicitudes, se enfatizó en el respeto mutuo y la importancia de mantener la participación activa.

Se socializa el orden de la reunión:

- Saludo, presentación
- Objetivo de la reunión
- Área de gestión social
- Área técnica
- Intervención de la comunidad
- Conclusiones - compromisos

Informe del área de Gestión Social

El área social del Consorcio la flora informó sobre la disposición de nuevos canales de atención, como códigos QR que direccionan a formularios digitales para la recepción de solicitudes de empleo y PQR. Además, se reiteraron los canales ya existentes: contacto telefónico, WhatsApp, correo electrónico y punto de atención físico. Se resaltó la importancia de difundir esta información con vecinos que no pudieron asistir a la reunión.
Se reportó que, a la fecha, se han recibido 39 solicitudes y consultas, de las cuales 33 han sido gestionadas y cerradas de manera satisfactoria, las seis restantes están en proceso de gestión con compromisos activos de

reparación, cuando se terminen las labores constructivas colindantes con las zonas.

En cuanto a la divulgación de las actividades de obra, se detallaron las estrategias empleadas:

- Perifoneo directo por parte del Consorcio La Flora 2023.
- Perifoneo a través de la red de megáfonos locales con apoyo de líderes sociales.
- Instalación de posters en sitios estratégicos como panaderías, tiendas, supermercados y canchas.
- Volanteo personalizado con residentes y comerciantes.
- Comunicación digital por medio de grupos y estados de WhatsApp.

Estas herramientas han permitido mantener a la comunidad informada sobre cierres viales, actividades específicas y convocatorias. Se informó que el Consorcio mantiene activa una cuadrilla de reparaciones destinada exclusivamente a la atención de daños e imprevistos que afectan a viviendas e infraestructura localizada en la zona de intervención; se aclaró que las viviendas donde se ejecutan estas reparaciones se encuentran en sectores donde ya no habrá presencia de maquinaria pesada ni actividades de alto impacto, brindando así mayor tranquilidad a los propietarios.

El Consorcio La Flora enfatizó las siguientes recomendaciones a la comunidad:

•Respetar el cerramiento de la obra: Este tiene como objetivo principal proteger la seguridad de los residentes y trabajadores; dañar o retirar los cerramientos pone en riesgo a niños, peatones y mascotas que pudieran accidentalmente ingresar a zonas de riesgo.

•No dañar la señalización: La señalización es indispensable para la seguridad vial y peatonal en las zonas intervenidas, alterar o remover estas señales puede generar accidentes y poner en peligro a la comunidad.

•No arrojar basuras en la zona de obra: Se ha evidenciado que algunas zonas internas y externas del cerramiento están siendo utilizadas para depositar basura doméstica, residuos sanitarios e incluso escombros. Esta práctica afecta el avance de la obra, genera focos de contaminación, proliferación de insectos y mosquitos, y deteriora el ambiente de la zona; Se solicitó a la comunidad hacer uso adecuado de los contenedores dispuestos y reportar a las autoridades cualquier mal manejo de residuos. La limpieza de las zonas intervenidas es responsabilidad compartida entre la comunidad y el consorcio.

Se expuso a la comunidad asistente el inadecuado manejo de residuos que se está presentando en el sector Carrera 27ª con Cra 28, sector Barrio San Pedro y San Martín, donde se encuentra ubicado un sumidero ro de drenaje pluvial, que, a corto plazo, estaría colapsado por la acumulación de basura en su interior, debido a dicha situación se envió un oficio a los lideres y ediles de la comunidad para buscar una pronta solución.

•Mal Parqueo: Se pidió a la comunidad apoyar la gestión de la obra evitando el estacionamiento indebido que dificulta el paso de maquinaria y transporte de materiales, se solicitó mayor disposición al diálogo para solucionar estos inconvenientes de manera pacífica.

Informe del área Técnica

Se explica a la comunidad que se están realizado las siguientes actividades, en estos momentos estamos realizando unos trabajos unos pozos de construcción, conectados a una tubería subterráneos nuevos, que van a servir para conectar las aguas que vienen de los demás pozos, los que van por toda esa carretera.

En los sitios donde ya tenemos las vías completas, pues tienen unas zonas verdes increíbles, estas zonas ya se están nivelando y adaptando para empezar a construir lo que son los senderos en concreto y para poder instalar los senderos gimnásticos.

En la zona del Sol 2 y Sol 1. Aquí ya está completamente pavimentado hasta la vía provisional que se hizo para la salida del

barrio del Sol 1. También frente al Sol 2, se iniciaron lo que son los andenes, los senderos ya que la pavimentación de la vía esa lista.

Por otra parte, en el box se están realizando unos filtros que van a un lado del bus que sirve para proteger el box.

Las actividades que nos decía la profesional social que corresponde a la carrera 36 allá se está instalando una tubería como la que ven acá que tiene un diámetro de 1,80m que es una tubería y esa tubería ya se está instalando.

Las actividades constructivas van avanzando conforme a los tiempos, estamos realizando los trabajos de la mejor manera y cumpliéndole a la comunidad.

Intervención de la comunidad.

1. Los asistentes del barrio el Sol I preguntan si su barrio va tener alguna intervención en sus vías?
   Rta: El Ing Jairo responde que en las intervenciones que la alcaldía nos contrato no existe ninguna adecuación constructiva para el barrio el sol y deben gestionar ante las entidades dichas adecuaciones.
   Interviene la ing Dayana de la secretaria de infraestructura, quien expresa a la comunidad que el objeto del proyecto es la canalización, pero que en días anteriores se tuvo una reunión con el señor Juan líder del barrio en donde se le pido que acercara a la alcaldía unos documentos del barrio para que el banco de proyectos de la alcaldía, para la construcción de salón comunal y demás proyectos que puedan participar.

2. Ingeniero yo tengo una propuesta mi nombre es José Reyes, entorno al tema de las basuras, en este sector es falta de cultura, es necesario que se implementen las multas a las personas que lo hagan, ya que tenemos acá a la alcaldía que nos colaboren.
   Interviene la señora roció quien expresa que ella a realizado varias gestiones entorno al tema de las basuras, como un derecho de petición, el cual no ha sido respondido y que como van las cosas lo más viable es interponer una tutela para que la EMAB, va a tocar doctora gestionar con eso con los comparendos ambientales eso está articulado en el código de la policía, como dijo él señor José porque aquí ya no es más nada sino tocar el bolsillo a la persona cuando a la persona le tocan el bolsillo, que tiene que ir a pagar entonces aprende a tener cultura o aprende.

3. Ing queremos saber sobre el muro que se hizo en el barrio san Martín?
   Rta: Interviene la profesional social quien expresa que ese muro se realizo como obra de mitigación, y en las actas esta estipulado que es la comunidad quien debe decidir si se demuele o se deja el muro, en la reunión pasada yo les explicaba que son ustedes como comunidad los que deben elevar dicha petición a la alcaldía, ya sea recogiendo firmas y nosotros realizamos el requerimiento a la alcaldía que es quien nos ordena a nosotros realizan las adecuaciones.

4. La señora Roció pregunta sobre el tema de la luz, es importante que nos colaboren Dra Dayana ya que ese tema ayuda en cierta medida el tema de la seguridad del barrio. También el tema del cableado suelto.
   Interviene la Ing Dayana quien expresa que tenemos los oficios donde se les ha repetido que por favor vengan, que necesitamos que vengan, pero la verdad no hemos recibido respuesta de ninguna empresa, pero vamos a seguir insistiendo en que se atienda la petición.

5. La comunidad pregunta si es posible utilizar el espacio al lado del parque extremo para que no lo adecuen para una canchita, nosotros como comunidad donamos las banquitas y evitamos que utilicen ese espacio como basurero, esa propuesta es para reponer el cuarto del aseo y el quiosco.

Nosotros queríamos pedirle al contratista que nos ayude adecuando el espacio con una placa de concreto para hacer la canchita y también que puedan jugar voleibol

Rta: La ing Dayana el tema es saber qué esa zona ya se sale del lugar de la intervención porque pues está un costado. Entonces, sí o sí nos toca revisar porque pues eso puede inculcar en temas jurídicos. Entonces, sí nos toca entrar a revisar primero ese pedacito a nombre de quien está.

Con las profesionales sociales nos envíen la ubicación exacta del lugar para averiguar si eso le pertenece al municipio y realizar la gestión.

6. Interviene el señor Libardo propietario del barrio el sol II quien pide una colaboración para talar los árboles de la zona, ya que están en muy mal estado y necesitan cortar ya que están junto con cables, ya hemos elevado peticiones y nada.

   Rta: Se pide al señor Libardo que nos compartan los oficios que han emitido para nosotros dar aviso a la alcaldía.

Por último, Se pide a las personas asistentes del barrio el sol que nos ayuden a que las personas manejen con mucha precaución ya que tenemos trabajadores en la vía. Se dan las gracias a todos por la asistencia y por la participación.

Siendo las 7.15 pm se da por terminada la reunión.

CONCLUSIONES

- Se ratifico el compromiso de mantener reuniones informativas y de escucha.
- Se destacó la importancia de mantener una comunicación abierta, respetuosa y directa entre la comunidad y el equipo de proyecto.
- La obra avanza conforme a lo programado, con avances notables en canalización, pavimentación y manejo de aguas lluvias.
- La cuadrilla de reparaciones del Consorcio La Flora 2023 se encuentra activa para atender afectaciones reportadas por la comunidad.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Cuidar y preservar la infraestructura construida, reconociendo que es un beneficio para la comunidad.	Lideres sociales y comunidad
Apoyar la seguridad del sector y divulgar la información suministrada sobre el proyecto.	Comunidad
Apoyar el tema de la mala disposición de residuos junto a los sumideros.	Comunidad

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES**	CONTRATO N° 69
		VERSION 1.0
		ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

FECHA	27/11/2025
LUGAR	Salón Comunal Quebrada la Iglecia
HORA	6:00 PM
REUNIÓN	Comite de Participación Ciudadana.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Raúl Ardila G.	B.S. Martin	3187010189	
2	Gloria Florez Z	San Martin	3164665857	
3	Maria Leonor Pinto Lozano	SOL 2.	3188327676	
4	Nelly Sanchez	SOL II	3024604497	
5	José Guillermo Rey	San Pedro	317-4178731	
6	Claudia Rodriguez	SOL I	3178373759	
7	Hernando Pedroza	San Martin	3208080231	
8	jimmy mosquera	CALLE 27 #875	3209839892	jimmy mosquera
9	Jorge Cortes	Punto 12	3164704000	
10	Julio Lozano	INGENIERO	3183952316	
11	Carolina Garcia	Socia Interventor	3212731403	Carolina Garcia
12	Dayana C. Arenas B.	Apoyo Supervision	3103682719	Dayana Arenas.
13	Rocio Moreno D.D.	San Pedro	3204963517	Rocio Moreno
14	Wilberto Garcia	Quebrada H. grueso	3174696400	
15	Libni Mantilla	Los Soles	3242613689	
16	John Ortega	San martin	3158737603	
17	Teofilo pinto	sanmartin	3153114030	Teofilo pinto viudado flores
18	Elsa pinto	sanmartin	------	maria elsa pinto
19	Pedro-Miguel Ardila	San pedro	3132189035	
20	Guillermo Soto	San pedro	3793658477	

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES**	CONTRATO N° 69
		VERSION 1.0
		ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

FECHA	27/11/2025
LUGAR	Salon Comunal Quebrada la Iglesia
HORA	6:00 pm
REUNIÓN	Comite de Participación Ciudadana.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Yury Acevedo Osses	San Martin	3235733592	Yury Acevedo O.
2	Oscar Javier Villamizar	San Martin	3203580165	Oscar Villamizar.
3	Michael Molina T.	San Martin	3012782364	
4	Angie Moreno	Prof. Social	3150511842	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

INVITACIÓN A LA COMUNIDAD

El Consorcio La Flora 2023 ínvita a todos los habitantes de los barrios:
San Martín, Quebradà La Iglesia,San Pedro, Sol 1 y Sol 2

A un espacio de diálogo y construcción conjunta.

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

27 Noviembre 2025

5:30 P.M.

SALÓN COMUNAL QUEBRADA LA IGLESIA

TEMAS A TRATAR:

- ✔ Avance de a obra del Contrato 069 de 2023
- ✔ Proceso de pavimentación
- ✔ Resolución de inquíetudes

Alcaldia de Bucaramanga

CONSORCIO La Flora 2023

¡LOS ESPERAMOS! Su voz es fundamental

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS**	CONTRATO N° 69
		VERSION 1.0
		ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

FECHA	26/11/2025
ASUNTO	Entrega Invitación Comite de Participación Ciudadana.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Raul Ardila	B. San Martin	3187010189	
2	Gloria Florez Z	B. San Martin	3164665857	
3	Teofilde Pinto	San Martin	3153114030	Teofilde Pinto vuelta
4	Elsa Pinto	San Martin	— o —	mana elsa Pinto.
5	Yury Acevedo Osses	San Martin	3235733592	Yury Acevedo O.
6	Oscar Javier Villamizar	San Martin	320358 0165	Oscar Villamizar
7	José Guillermo Reyes	San Pedro	317 417 8731	
8	Rocio Moreno DeD	San Pedro	3204963517	Rocio Moreno.
9	Pedro Miguel Ardila	San Pedro	3132189032	
10	Maria Leonor Jimes	Sol 2	3188327670	
11	Nolberto Garcia	Quebrada la Iglesia	3174696400	
12	Leonor Jimes	Sol. II	318832 7670	Leonor Jimes.
13	Silva Peña	San Pedro	3235732165	Silvia Peña
14	Tatiana Forero	San Martin	3053625356	Tatiana Forero.
15	Lucia Chaparro	San Martin	3185168382	Lucia Chaparro.
16	Jimmy Mosquez	San Martin	3209839892	Jimmy Mosquera
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**ACTA DE REUNIÓN**	CONTRATO N° 69 VERSION 1.0 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 69: OBRA CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
HORA INICIO:	**HORA FINAL:**	**LUGAR:**	**FECHA:**
4:00 PM	5:30 PM	Socialización virtual	07/11/2025

OBJETIVO
Socializar con los actores el inicio de actividades de la Cra 36.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la reunión con la presentación de la social del contratista Angie Moreno, quien expresa que se da inicio a la reunión. "Creo que ya estamos todos conectados, entonces vamos a iniciar con la presentación, la cual va explicar las actividades de obra sobre la carrera 36, y este es el motivo de la reunión, socializar nuevamente estas actividades. En estos momentos nos acompañan representantes de la alcaldía, secretaria de infraestructura, la interventoría y el contratista de obra". Se comenta a los participantes que, una vez finalizada la reunión, vamos a levantar un acta, la cual será compartida por correo electrónico, para tenerla como soporte. Es importante señalar a las representantes de los colegios San pedro, La Merced y la Presentación los convocamos a esta reunión, para que ustedes también estén en conocimiento de que en esa zona se va a iniciar una obra, la cual no les va afectar directamente, pero es importante que ustedes conozcan a detalle la información. También queremos resaltar el tema de socialización de inicio de labores constructivas en este sector con los actores se viene adelantando desde el mes de julio, donde se realizaron los primeros acercamientos. Seguidamente se da inicio a la presentación por parte del director de Obra, Jairo Buitrago quien mediante diapositivas explica que el contrato está registrado bajo el número 069 del 2023. El objeto de este proyecto es la obra canalización de cauces quebrada a la flora y la iglesia, parte alta e interceptores la flora 2 y la iglesia parte alta. El tiempo de ejecución para este tramo, para el cual estamos hablando el día de hoy, es aproximadamente de cuatro meses. El nombre del contratista es el Consorcio La Flora 2023, el interventor es el Consorcio Interventoría Canalización BGA, y el tramo es la carrera 36 desde la vía Antigua a Floridablanca hasta la calle 56. Este tramo del contrato le corresponde a la instalación de una tubería de un metro ochenta de diámetro con una longitud aproximadamente de 498 metros lineales. En este mismo tramo se concentran la construcción de 17 pozos de inspección, los cuales sirven para cambios de dirección y de altura que solicite la tubería. La profundidad de la excavación son aproximadamente cinco metros. Esta excavación es variable, depende de la pendiente de la vía por la cual estamos ejecutando la obra. Adicionalmente viene la construcción de una estructura de separación y un tramo box culvert de dos por dos en una longitud aproximada de 16 metros. En el esquema del lado izquierdo, lo que vemos en verde es lo que actualmente se encuentra, que es un canal existente con una sección aproximada de dos metros por dos metros que se encuentra atravesando todo el

parque ecológico de La Flora. Adicionalmente a este canal le están llegando todas las alcantarillas que vienen del barrio terrazas, y una tubería de la calle 56. Todo esto ingresa al parque. El problema radica es que el canal del parque no es suficiente para recibir todas estas aguas, por lo cual es que colapsa cuando hay lluvias fuertes. Entonces, la construcción contempla, interceptar toda el agua que le está llegando desde la calle 56, interrumpirla ahí y no dejar que entre al parque y bajarla por toda la carrera 36 por medio de la tubería de 1.80m, que es la que vemos en la imagen de la parte alta al lado derecho. Toda esta tubería ingresa ya en la parte final del parque. Simplemente para poder pasar por debajo del puente que se encuentra cruzando la vía antigua. Y allí se une con un box culvert, que es la línea roja que vemos en la parte final.

Es un box culvert de 3.50m x 3.50m. Es la imagen que vemos al lado derecho, parte inferior, el cual ya se encuentra construido. Son 1.020m lineales que ya están terminados, Simplemente se está esperando a que le llegue la tubería que vamos a instalar ahora o que ya iniciamos a instalar para conectarse a este box culvert, aquí vemos el esquema de cómo será el cierre. El cierre corresponde desde la parte de la vía antigua, que es lo que ya tenemos cerrado el primer tramo, donde estamos trabajando en estos momentos. Y se adicionará la próxima semana el cierre de la calle 67, la que pasa por el frente de los apartamentos Flora Club House. Es importante recalcar nuevamente que no se va a trabajar directamente sobre la calle 67, lo que pasa es que como toda la calle 67 se une con la Carrera 36, es por es necesario cerrarla durante los trabajos de la obra, para evitar para el ingreso a los vehículos que no pertenecen al conjunto o al edificio como tal, porque no van a tener ningún paso para poder continuar por la Cra 36.

Es importante recalcar como ya se ha socializado que los residentes del conjunto Flora Club House, tienen entrada y salida sin ningún inconveniente, pero lo que deben hacer desde inicio de las obras es entrar y salir por esta misma calle, por donde entran, por la Carrera 33.

Para los demás usuarios de la ciudad como tal que desean llegar a la Carrera 36, pues tienen dos opciones. Los que vienen del lado de Floridablanca, pues deberán ingresar por el lado de Terrazas por la Carrera 45 y los que vienen por el viaducto deberán continuar por la Carrera 33. Aquí esta imagen es ya de lo que se está ejecutando en estos momentos en la obra.

Seguidamente como lo pueden observar en la diapositiva, la tubería tiene un metro ochenta de altura y se ve pequeña en la excavación, por lo que les aclaraba que la excavación tiene una profundidad aproximada de hasta cinco metros. Aquí también vemos más imágenes como tal de lo que se está ejecutando. Ya se han instalado dos tubos, estamos en el tercero el día de hoy.

Seguidamente se dio pasa a la ronda de preguntas por parte de los actores asistentes a la reunión.

1. El señor Jefferson Barbosa nos comunica qué inquietud tiene: ¿desde dónde va a estar la señalización para que nosotros podamos voltear a la derecha sin ningún problema? Y lo mismo, ¿cómo va estar la señalización para que podamos salir a coger la 33 sin ningún inconveniente y obstruir el tráfico?

Respuesta: vamos a tener un controlador vial y una señalización con distanciadores y maletines como tal. Pero lo más importante radica en tener ahí el controlador vial, el cual va obviamente a estar muy pendiente tanto al ingreso como a la salida de cualquier vehículo.

Seguidamente realiza la intervención Mayerly Medina quien lidera el componente social de la secretaria de infraestructura, quien expresa que se encuentra junto a Jacqueline Hernández del equipo social y la ingeniera Dayana, pues acompañando acá al contratista y a la interventoría en esta importante reunión.

Quisiéramos preguntar en torno a la pregunta anterior que es como la inquietud más latente para los residentes

del conjunto, que recomendaciones se les haría.

La idea es que estos espacios se puedan mantener a lo largo de la ejecución del proceso. Es decir, a nosotros como Secretaría de Infraestructura nos interesa mucho que las personas del Área de Influencia Directa, tanto los líderes como los residentes, puedan mantener ese canal de comunicación con las profesionales sociales del equipo, que ustedes pues las han visto en terreno por parte de la obra y de la interventoría.

2. El señor Carlos Andrés: el ingeniero nos habla de un controlador vehicular, mi pregunta es ese controlador vehicular, ¿qué horario va a tener? ¿Va a estar 24 horas disponibles? ¿Unas cuantas horas va a estar ahí disponibles? Porque el tráfico en hora pico por el puente de la Flora es grande y las horas pico inician prácticamente desde las 7 de la mañana, ya se ve una condición ahí en el puente de la Flora, la carrera 33 igual, y nuevamente en las horas de la noche.?

Respuestas: nosotros como contratistas tenemos reunión con el tránsito, el día miércoles nuevamente, vamos a solicitar el apoyo que si es vital que ellos también estén ahí apoyando mientras toda la ciudad en general se socializa sobre el tema y entiende lo que está pasando.

Es importante resaltar que se socializo que el cierre sería el día lunes 10 de noviembre, pero lo dejaremos para el día jueves 13 de noviembre, con el fin de tener la reunión con la dirección de tránsito, también desde la dirección de tránsito puedan revisar qué otras estrategias de acompañamiento y presencia en la zona pueden hacer para mitigar cualquier tipo de acontecimiento negativo.

3. La gente que visita el parque la Flora, va en carro en su mayoría, entonces ellos se parquean enfrente del parque. ¿En este momento dónde irían a parquear ellos o por dónde sería la entrada de ellos?

Respuesta: Solamente tienen acceso por el lado del barrio de terrazas, ya por la carrera 36 es imposible el ingreso. La socialización del funcionamiento dentro del parque ya se hizo, allá incluso hay también publicidad sobre la situación. Ya con respecto a que los vehículos no se parqueen frente al edificio, pues para eso requerimos del apoyo desde el tránsito que es la única entidad autorizada para hacer cualquier movimiento de esos vehículos. Pero nuevamente le digo en la reunión se les va a solicitar a ellos eso.

4. La participante expresa que tiene varias inquietudes: La socialización que realizaron con unas hojitas tamaño carta con respecto al cierre del parque, si sería necesario que se continue socializando con la comunidad que el ingreso se va a realizar por el barrio Terrazas.

Por otra parte, agradecemos a la Secretaría de Infraestructura que nos sigan teniendo en cuenta acá en el conjunto porque en la teoría todo pues uno espera que todo fluya, el plan de manejo de tráfico pues seguramente la dirección de tránsito lo revisó y lo avaló sin embargo de la teoría a la práctica pues en temas de conducción, como ustedes pueden ver, vamos a salir a una vía muy congestionada y una vía donde la gente viene rápido desde el viaducto de La Flora.

- ¿Entonces nuestra pregunta claramente es, el controlador de tráfico va a estar desde qué horas hasta qué horas? De lunes a domingo, por ejemplo, ¿esa es mi primera inquietud?

Entonces creería que si es urgente saber digamos la dirección de tránsito, qué otros mecanismos van a disponer, entendiendo pues que ellos no tienen una gran disponibilidad de personal así que creo que el consorcio deberá

brindarnos la mayor de las seguridades y de las garantías. Ya hemos visto en estos días la presencia de habitantes de calle. Y justamente porque claro, ya se cerró el acceso por la vía antigua y pues ya como hay poco, poco, digamos, no hay vehículos que estén por allí pues se sienten cómodos.

Entonces también pues digamos le hacemos ese llamado a la administración y a la gestora social que tiene, a la trabajadora social que tiene el consorcio pues para que tengan habilitados los mecanismos de comunicación inmediatos pues con desarrollo social pues para evitar que esto se nos vuelva aún más, ya es un sitio inseguro, aún más insegura digamos el estar en el exterior del conjunto. A mí de manera particular me gustaría ver cuál es el plan ambiental que vamos a tener pues porque estamos en un espacio donde hay fauna, donde hay arborización muy emblemáticos y que creo pues que ameritan, que tengan la mayor de los cuidados posibles. Tenemos ardillas, tenemos diferentes especies de aves y otras, otros animalitos pues que requerimos que sean muy cuidados. Ese digamos es como la tercera inquietud que me surge.

Y la última pero no menos importante es conocer cuáles son los factores de riesgo que ustedes ven en la ejecución de la obra que pudieran afectarnos y los factores administrativos del contrato como tal, es decir, qué va a pasar en los meses de diciembre, enero y febrero, tienen previsto suspender obras, no van a suspender obras, tienen cubierta la interventoría durante todos los meses de ejecución del contrato de obra porque somos conocedores que si no hay contrato de interventoría no se puede. Entonces creo que esta es una gran pregunta porque es importante que no nos ilusionemos todos en los cuatro meses, sino que sepamos a qué realmente nos estamos enfrentando. En los medios de comunicación ha sido muy claro a lo largo de los últimos dos años las dificultades que han enfrentado los vecinos del Paseo España y otra serie de obras que emprende la administración con total buena intención y con absoluta necesidad y contundencia por supuesto, pero siempre al pifio de lo que haga el contratista o deje de ser el contratista de turno.

Eso señores contratistas ustedes lo entienden muy bien y es importante que no lo expresen en este momento y lo mismo la administración, el supervisor de la obra por parte de la Secretaría de infraestructura, porque pues no queremos ser sujetos de titulares o que tengamos que llegar a una cantidad de situaciones muy aburridas porque pues prácticamente hoy quedamos encajonados en el conjunto con buena dificultad para movilizarnos, para transitar. Y las obras finales, cómo entregan la obra, nos pueden mostrar cómo va a quedar. Me imagino que irán a aprovechar para arreglar andenes, para arreglar la vía y demás. Y bueno, y obviamente, pues, en qué condiciones queda la vía que pues obviamente sí vemos que está en gran deterioro. Esas son mis inquietudes. Muchas gracias por su atención.

Respuesta: Bueno, con respecto a lo del tránsito nuevamente que, pues se hace parte de las primeras preguntas, yo creo que lo mejor sí es esperar a la reunión que tengamos el miércoles con el tránsito para ver hasta dónde llega el alcance de que ellos van a apoyar en la situación como tal. Igual no queremos que ocurra ningún accidente como tal, por lo tanto, vamos a poner todo el apoyo que se requiera o que veamos que se necesite para evitar cualquier tipo de accidentes, llenar de señalización más de lo que se tiene. Sin embargo, hay un PMT aprobado como tal, al cual no hay ningún problema.

En la parte ambiental hay unos aprovechamientos que se solicitaron, pero corresponden a la parte interna del parque. En la parte de la vía no se toca absolutamente nada. En la parte interna del parque se requiere el aprovechamiento de 17 individuos, pero estamos esperando todavía la aprobación por parte de la corporación. Por lo tanto, por eso no se ha ingresado ni se ha hecho ninguna actividad dentro del parque. Todo está ejecutándose sobre la vía, y que lo único que se está afectando es el pavimento existente de la vía como tal. El

resultado del proyecto terminado, va a ser la vía nuevamente pavimentada.

Lo que contempla el proyecto es lo que se requiera dañar o retirar, se debe instalar nuevamente. No contemplan hacer unos andenes nuevos completos de toda la calle como tal, ni nada. Se está evitando al máximo no tocar los andenes, porque así nos lo pidió la administración. Se cree que solamente se va a tocar y se requiere el pavimento de la vía como tal, y eso es lo que se proyecta. Repavimentar nuevamente la calle únicamente. Si algún andén se llega a ver afectado por algún motivo, pues se reparará como tal.

Por otra parte, es importare resaltar que no se tiene la verdad contemplada detener en ningún momento el proyecto, de pronto, las fechas especiales como tal, pero son muy puntuales, de uno o dos días como tal, de pronto el fin de semana. Pero lo que es diciembre, enero, se tiene contemplado trabajar continuamente sin detener el proyecto. Y tiene, aparte la interventoría, claro, la tiene incluida para el acompañamiento del proyecto hasta que termine.

La presencia de habitantes de calles no se contempla, pues en ningún proyecto lo hemos tenido contemplado porque hacemos parte de obras que se cuentan sobre la vida como tal. pues lo que se puede hacer es solicitar apoyo de la policía, pero dentro del proyecto no se contempla esta parte.

El horario laboral es todos los días es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábados. Por eso es importantísimo lo que nosotros hablemos con el tránsito para ver ellos en qué horario van a prestar el apoyo para nosotros también así acomodarnos y ver si se aplica o qué podemos hacer. Entonces en teoría el controlador estaría de lunes a sábado.

Seguidamente los residentes del conjunto expresaron que para ellos es de vital importancia contar con la señalización requerida, y con un controlador vial 24/7, a lo que le contratista de obra le responde que está a la espera qué pasa en la reunión con el tránsito y les informaremos nuevamente.

Los participantes expresan la necesidad que todas estas inquietudes que han manifestado de manera reiterada queden en el acta que se está levantando y que entienden que nos van a socializar porque a ustedes también les sirve justamente para la gestión con la administración, y con la dirección de tránsito.

5. El señor Fabio Calderón pregunta: Nosotros los vendedores nos estamos viendo muy afectados con ese cierre de la Cra 36. ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando ya se cierre totalmente la vía que viene de la carrera 33? ¿qué vamos a hacer con nuestro trabajo? porque somos cuatro familias que tendremos que dejar de trabajar y obtener nuestros ingresos, nuestro sustento.

Respuesta: La social del contratista expone al comerciante que, como le hemos comentado en todos los acercamientos que hemos realizado nosotros como contratista de interventoría hemos realizado la gestión para que el DADEP, que es el ente encargado pues tenga conocimiento de la situación y se busque conjuntamente una solución pues entendemos que ustedes van a ser afectados ya que no pueden seguir trabajando sobre la carrera 36, en la última reunión que estuvimos en el Parque La Flora el DADEP les dio respuesta, estaba presente la señora Sabina donde estaban buscando un lugar para que ustedes se ubicaran durante los cuatro meses de la obra a nosotros el DADEP no nos ha dado respuesta luego de esa reunión y pues ya que hoy están conectadas personas de la administración pues elevamos nuevamente la petición de ustedes como vendedores de que la necesidad de que se reubiquen en otro lugar mientras la ejecución de la obra.

Interviene Mayerly medina quien expresa que un tema importante a tener en cuenta ustedes saben que en una

obra pública y como lo manifiesta el contratista tiene un alcance que ya está definido técnico, jurídico, presupuestalmente bajo unos pliegos de condiciones que la institucionalidad permite para que se cumpla a cabalidad entonces el contratista siempre lo que nos menciona lo menciona en el marco de su objeto contractual ahora bien, nosotros como administración municipal estamos justamente acá para poder hacer este canal de comunicación y de gestión ante las dudas que tiene la comunidad entonces para el caso del señor Fabio complementando un poco lo que menciona la trabajadora social del consorcio es importante tener en cuenta que se ha hecho la gestión correspondiente de hecho también hablarles desde el punto de vista de la realidad desde el marco informativo sabemos que acá hay una ocupación de espacio público sabemos que ustedes realizan ahí una actividad y por eso debemos actuar en el marco con ellos. La idea es mejorar de manera articulada ,hicimos por esto la gestión se dio la notificación , se realizó una reunión con ustedes en el parque La Flora pues muy positiva porque siendo sincera no es lo común que estas actividades en espacios públicos se reubiquen por los diferencias digamos en el contexto, que esto tiene por la normativa y demás pero ha sido muy positivo el panorama porque en el acercamiento con ellos se evidencio la actividad y el servicio que ustedes prestan en los alrededores del parque la Flora, ya el DADEP nos socializo que sí se van a reubicar de hecho a ustedes mismos se les consultó cual sería ese lugar idóneo para esta reubicación, ayer la trabajadora social que no está conectada en estos momentos ya que tiene un problema de conexión habló con el DDEP Y le dijeron que de hecho estaban haciendo la consulta, ellos tenían que hacer la consulta en cada uno de los puntos que ustedes mencionaron, entonces ellos hacen la consulta de ese espacio y hacen también una reunión con la Junta de Acción Comunal en la que ya queda instaurado ese acuerdo para que precisamente ustedes durante la obra no tengan inconvenientes sino al contrario este plan de contingencia y ustedes puedan continuar su actividad normalmente.

Es muy importante tener en cuenta que sí se ha adelantado la gestión y para que lo ubiquen de hecho ellos ya confirmaron que creo que uno de los puntos es el más idóneo, entonces ya ellos se comunicarían con el equipo correspondiente a informarles y también a la junta de acción comunal para que ellos estén al tanto de este acuerdo, ¿por qué se hace así? porque es importante tenerlo en cuenta porque es que no todas las actividades en el espacio público se pueden comunicar entonces en esta ya se logra la ubicación.

-Interviene nuevamente el señor Fabio quien expresa que le gustaría que se les comunique en donde van a estar ubicados durante los 4 meses, ya que en el sitio donde están actualmente ubicados están legalmente en los sitios que se había previsto provisional y que se había estado mirando pues no sabemos lo que habíamos hablado, el tema de energía el tema de agua potable cómo se maneja ese tema porque en estos momentos en esos sitios no contamos con eso con el sitio en que estamos, sí lo tenemos energía, se paga el servicio llega la cultura, llega todo legal todo normal, tenemos agua, luz y demás.

Respuesta: Mayerly medina responde que es el DADEP el que puede, digamos, en esa visita que les va a realizar a ustedes acá me comentan que el día jueves entonces ahí les van a poder contar todos esos detalles porque pues nosotros hacemos la articulación, pero en ese momento ya decir cómo se maneja, porque son ellos quienes tienen que dar toda la información de cada y la actividad que tienen, el jueves ellos ya van a ir a hablar con ustedes acá me lo acaba de confirmar la profesional social. ya el jueves les dirían dónde es la ubicación y ya el tema a detalles y como te comentaba, son ellos quienes tienen digamos, esa información porque eso no es de ni de la obra, ni de la infraestructura entonces entendemos la preocupación y la inquietud por esto ya se hizo el enlace, pero ellos son quienes, según la norma te pueden dar la información a detalle.

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**ACTA DE REUNIÓN**	CONTRATO N° 69 VERSION 1.0 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

La profesional social del contratista expresa a el señor Julio desde el mes de julio iniciamos la socialización que se iba a iniciar la obra en la carrera 36. Anterior a mí estaba Jennifer, ella dejó actas firmadas de socialización, se iniciaron las comunicaciones con la administración, con la parte social, con el DADEP, y esa gestión se ha visto reflejada en las reuniones que hemos tenido con el DADEP, La última fue el 18 de octubre, en donde el DADEP dio algunos posibles sitios y ustedes como vendedores también dieron unos posibles lugares. Entiendo que ya ellos tienen un sitio, yo estoy en toda la disposición de comunicarles a ustedes apenas a mí me llegue la información, pero la verdad sí se ha realizado la gestión tanto por parte de nosotros, de Interventoría, de la Alcaldía, porque en realidad estamos prestos a escucharlos, prestos a buscarles una solución porque entendemos la situación que ustedes van a pasar y esperemos que el DADEP nos responda y como les decíamos el día miércoles que nos reunimos con ustedes, eso sería una ubicación transitoria durante la ejecución y ya luego ustedes pueden volver al lugar, al frente del Parque de la Flora.

Nosotros hemos tenido un acercamiento muy, muy estable con los vendedores y siempre le hemos dicho, le vamos a avisar 3, 4 días antes para que no pierdan ninguno de sus productos y demás. Señor Fabio, el día LUNES, ya no se va a realizar el cierre, sino el día jueves. Entonces, ya ustedes este fin de semana y el transcurso de la otra semana pueden realizar sus ventas sin ningún inconveniente.

El acta será compartida vía correo electrónico a las personas participantes, a la administradora del conjunto para que ella la comparta con las personas y a los demás por WhatsApp o por correo electrónico. Muchas gracias por la asistencia. Cualquier cosa estamos prestos.

Tendremos un punto de atención a la comunidad también en el Parque La Flora, se pueden acercar. Vamos a tener toda la parte de pancartas y pendón, donde está mi número de contacto, qué días voy a estar atendiendo a la comunidad presencial. Todo eso se realizará la próxima semana, la socialización en el Parque La Flora, para que todas las personas que transcurren en el parque tengan la información.

También le enviaremos un volantico a la administradora y demás.

Muchas gracias a todos. Buena tarde.

CONCLUSIONES

Se dio por terminada la reunión agradeciendo a los asistentes por su tiempo y participación. Se reiteró el compromiso del Consorcio, la Alcaldía y la Interventoría para cumplir con el desarrollo de la obra conforme a lo establecido.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Solicitar reunión Dadep y comerciantes Cra 36	Alcaldía
Contar con la señalización requerida para el cierre adecuado de la vía	Consorcio la Flora 2023
Compartir el acta de la reunión con los asistentes.	Consorcio la Flora 2023

Consorcio La Flora 2023

Consorcio La Flora 2023
NIT. 901.702.490-7

Bucaramanga-Santander, 18 noviembre del 2025

Señores:
FLORA CLUB HOUSE
Adm. Farley Dayana Serrano.

SUBESTACION ELECTRICA CONUCOS
Líder Subestación-Juan Carlos Jiménez

CONSTRUCTORA URBAMARES
Ing. Yerly Paola García

VENDEDORES INFORMALES CRA 36
Fabio Andres Calderon Herrera
Sabina Carvajal

Referencia: CONTRATO 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Asunto: SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRAS SOBRE LA CARRERA 36.

Cordial saludo,

El Consorcio La Flora 2023 informa a la comunidad que el día de mañana, **19 de noviembre de 2025,** se realizará el cierre de la Carrera 36, con motivo del inicio de las actividades previamente socializadas.
Estas labores corresponden a la instalación del colector sanitario sobre la Carrera 36, obra prioritaria dentro del proyecto de adecuación del canal de la quebrada La Flora.

En relación con los cierres viales, se precisa que estos se llevarán a cabo garantizando en todo momento el ingreso de vehículos a los parqueaderos y accesos previamente establecidos para el conjunto La Flora Club House. De igual manera, solicitamos a la comunidad respetar la señalización que será instalada en la zona de obra (maletines, conos, cerramientos, entre otros).

Finalmente, reiteramos que se mantendrá una comunicación constante con el fin de identificar oportunamente cualquier inconveniente o posible afectación tanto a los residentes como al normal desarrollo de la obra.

Cordialmente,

ING JAIRO J BUITRAGO RIOS.
Director de Obra
Consorcio La flora 2023

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**ACTA DE REUNIÓN**	CONTRATO N° 69 VERSION 1.0 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 69: OBRA CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
HORA INICIO:	**HORA FINAL:**	**LUGAR:**	**FECHA:**
10:30 am	11:30 am	Cra 36 con calle 56 frente al parque la flora	13/11/2025

OBJETIVO

Socializar con los vendedores ubicados sobre la Cra 36 donde serian reubicados durante la ejecución de la obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de la social Jaqueline Hernández, profesional de la Secretaría de Infraestructura. Hoy contamos con la acompaña acá el DADEP, contratista e interventoría.

Esta reunión se da como respuesta a un compromiso adquirido por la administración municipal en la reunión del día 07 de noviembre. Hoy estamos acá atendiendo ese compromiso, escucharlos a ustedes y también escuchar al DADEP, quien es la entidad responsable de ese punto en específico.

Se da paso al mayor Miguel A Lozano, quien está en representación del DADEP, quien expresa que ya ha estado en dos ocasiones, inclusive vino el doctor José Carlos, habló con algunos de ustedes, es el director de Espacio Público. Como tal, nos encargamos de la recuperación y también de prevenir la invasión del espacio público.

El año pasado nosotros con ustedes, en el mes de noviembre, viene personalmente y se realizó una caracterización, donde se identificaron quiénes están acá, cuánto tiempo llevan, cuáles son las actividades comerciales que realizan, cuántas personas dependen de ustedes. La Secretaría de Infraestructura nos solicitó el apoyo de acompañamiento Mientras dura la obra, la cual que ya inició, y son de tres a cuatro meses.Por otro lado, hace un mes estuvimos acá también en reunión y uno de los compromisos era buscar un punto donde se pudieran reubicar. Uno de los posibles puntos era la bahía diagonal al restaurante Batutto. Ya, eso pertenece al municipio de Bucaramanga.

En un primer momento se pensó en ese punto, pero como esto no solamente es una decisión del Dadep, porque aquí se generaría otro problema, que lo tenemos aquí inclusive, que es el espacio ya de la vía. Se generaría ahí ya mucha congestión vial. Entonces Tránsito nos dijo no, porque nos va a generar un problema a nosotros.

Por lo cual se continuó buscando más espacios. Seguimos avanzando, llegamos al CAI, identificado el CAI, diagonal a la calle a mano izquierda, hay un espacio, donde hay un gimnasio al aire libre. Ese sería el espacio que, para nosotros, es el perfecto para ustedes. Tocaría ir con ustedes a revisarlo, para que ustedes den su aprobación.

Esa es la opción sería de manera temporal, mientras dura la obra acá. Cuando se termine la obra ustedes vuelven a retornar su espacio normal de trabajo.

Interviene la social Mayerly Medina y explica a los participantes que este traslado será provisional ya que, si se quedan acá durante la ejecución de la obra, no van a atender a nadie. Esta articulación que hacemos desde la Administración Municipal, para que, conociendo, digamos, la actividad que ustedes desarrollan, el servicio que le prestan a la ciudad, que estén en otro punto durante el tiempo de la obra, los cuatro meses. Después de ese tiempo, ustedes retornan acá. Cómo Vienen desarrollando su actividad, Y entonces, acá siempre hay dos panoramas: Uno que es, pues, se cierra la obra, ya hay que hacerla, y ya.

Esa no es la intención. La idea es que, de manera conjunta, por eso el mayor a estado muy comprometido con el tema, el de la dirección de tránsito, y desde la obra y la interventoría, para darles esa solución a ustedes. Es un tiempito de incomodidad, como toda obra, pero la idea es que en ese punto en el que ustedes estén, van a atender público, va a haber flujo de personas, y que los clientes sepan, como no va a haber servicio acá, que sepan que los van a encontrar allá.

No los vamos a trasladar ni al centro, ni a otro sector, ¿cierto?, de nuestra oferta institucional, sino acá en su misma zona. Esto es como lo que queremos traer. Esto va a quedar bajo el acta de la reunión de hoy, Y obviamente siempre va a estar el área social del contratista y la interventoría y nosotros respaldando cualquier, digamos, tema, pregunta, inquietud.

Interviene el señor Fabio Andrés comerciante quien pregunta: al ubicarnos allá, el tema de la energía. Por ejemplo, acá tenemos todo, pagamos el servicio de luz y tenemos contador. Y obviamente nos vamos a ver afectados un poco, y nos hemos visto ya afectados en las ventas. Le toca a uno, y uno entiende la problemática y que sí o sí, eso se debe hacer.

Una opción al tema de la luz es que podamos nosotros, en un tiempo la tuvimos, la caseta ubicada en la entrada principal del parque la Flora, para guardar ahí las cositas, preparar y de pronto llevar las cositas ya preparadas. Y no generar ya de pronto tanto montón de tramites, tantas cosas y no, porque nosotros tuvimos esa caseta un tiempo.

El representante del dadep expresa que revisara el tema, si es viable si se puede, pues de mi parte no hay ningún inconveniente, yo le comento al director.

Se anexará al acta fotografías y listado de asistencia a la reunión.

CONCLUSIONES

- Se socializo por parte del representante del dadep la ubicación exacta donde serán reubicados los vendedores y se dejó claridad que será un traslado provisional durante la ejecución de la obra.

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**ACTA DE REUNIÓN**	CONTRATO N° 69 VERSION 1.0 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**
Compromiso por parte de los vendedores a retornar al terminar las actividades constructivas	VENDEDORES
revisar la opción propuesta para permitan el ingreso a la caseta dentro del parque la flora para preparar los alimentos	DADEP
Solicitar a los administradores del parque la Flora la adecuación para el ingreso y salida de la comunidad la puerta cercana al CAÍ de la 56-44.	**ADMINISTRACIÓN**

Anexos:


13 nov 2025 11:08:35 a. m.
7.1070778N 73.1090904W
CONSORCIO INT CANALIZACION BGA


13 nov 2025 11:08:33 a. m.
7.1070778N 73.1090904W
CONSORCIO INT CANALIZACION BGA

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**ACTA DE REUNIÓN**	CONTRATO N° 69 VERSION 1.0 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

LISTADO DE ASISTENCIA

Asistencia socialización 13/NOV/2025
DADEP - Vendedores Cra 36.

- Miguel A. Zorrilla H. DADEP.
- Sabina Carvajal.
- Fabio Andres Calderón Herrera
- Sera Fil Herrera García
- Yenny Marcela Calderón Herrera
- Hapilly Alejandra Medina Chally (infraestructura)

Alcaldía de Bucaramanga / CONSORCIO La Flora 2023	**CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES**	CONTRATO N° 69
		VERSION 1.0
		ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

FECHA	05 - NOV. 2025
LUGAR	Parque la flora (Cra 36)
HORA	9:00 am
REUNIÓN	Socialización Cierre Cra 36 y lineamientos PMT.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Fully Dayany Serrano P.	Conj. Flora Club House	3160533144	Fully SP.
2	Orlando Z. Gvel.	Sub. Corucos.	315.692 5173	
3	Sabina Carvajal	Vendedora Flora	3178777105	Sabina Carvajal
4	Sera Fin. Herra	Vendedor	3134068 38	
5	Fabio Andres Caldera	entrada Principal parque la Flora	3158705027.	
6		Vendedor.	3176309	
7		Ubanimetro	3137533419	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

AVISO A LA COMUNIDAD
BARRIO SOL I Y SOL II



Se informa a la comunidad de los barrios sol I y sol II que se ha habilitado el paso exclusivo para motocicletas en el sector intervenido. No obstante, se solicita a los conductores transitar con máxima precaución, debido a la presencia de trabajadores y maquinaria en la vía.

Agradecemos su comprensión y colaboración, respetando la señalización y las indicaciones del personal autorizado, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos.

CONSORCIO
La Flora 2023

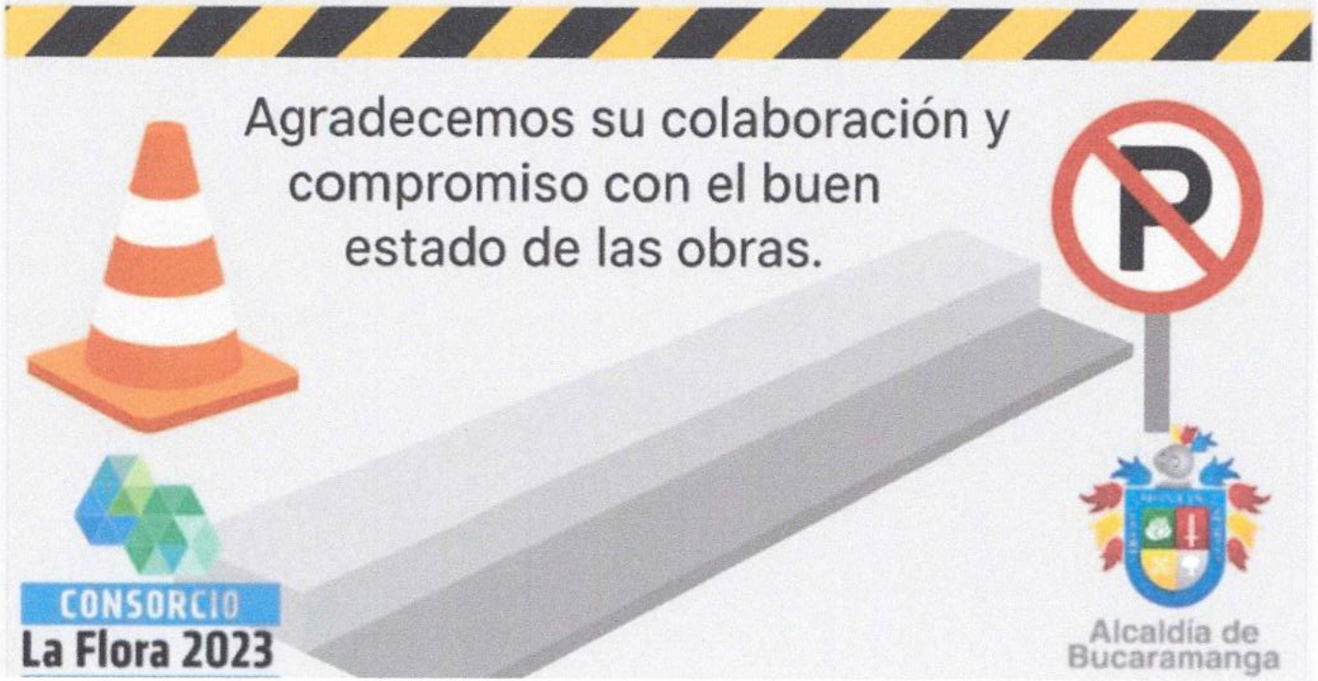
GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN

Alcaldía de Bucaramanga

¡AVISO IMPORTANTE!

Se informa a la comunidad del barrio San Pedro que el concreto de los andenes fue vaciado el día de ayer.

Por favor, eviten subir o estacionar vehículos sobre estas áreas para garantizar su adecuado fraguado y conservación.



Agradecemos su colaboración y compromiso con el buen estado de las obras.

CONSORCIO
La Flora 2023

Alcaldía de Bucaramanga



AVISO A LA COMUNIDAD

CIERRE TEMPORAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE LA FLORA

Se informa a todos los visitantes y a la comunidad en general que, debido al desarrollo de la de obra que se adelantan, la entrada principal permanecerá cerrada de manera temporal por razones de seguridad y para garantizar el adecuado avance de los trabajos.

El acceso habilitado durante este periodo para el ingreso al parque,**sera exclusivamente por la entrada del barrio Terrazas.**

Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad mientras avanzamos en este proyecto que busca el disfrute de todos.

Cualquier información comunicarse 3151565816

AVISO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD

Buenas tardes,

Se informa a la comunidad que actualmente se están ejecutando **actividades catalogadas** como de **alto riesgo**, especificamente **excavaciones a gran profundidad** en el sector.



Por tal motivo, se solicita acatar de manera **estricta** la **señalización temporal de obra** y la **delimitación perimetral con cinta de peligro,** con el fin de mitigar riesgos operativos y garantizar la integridad de peatones, ciclistas y conductores.

Agradecemos su atención, comprensión y colaboración.

Consorcio La Flora 2023

AVISO IMPORTANTE

Se informa a todos los residentes y transeúntes de los barrios San Martin y San Pedro que está totalmente prohibido sacar escombros o depositar materiales en la zona actualmente intervenida por la obra.

En este sector se adelantan actividades de nivelación y replanteo con tierra, necesarias para las siguientes fases del proyecto. Cualquier disposición inadecuada de residuos puede afectar el avance de los trabajos, generar retrasos y poner en riesgo la seguridad del área intervenida.

Agradecemos a la comunidad su colaboración y compromiso para mantener el espacio libre de materiales y permitir el correcto desarrollo de las obras.

CONSORCIO
La Flora 2023
